



XX SESIÓN. Evaluación septiembre

5 de octubre de 2021











Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia



Reportes Institucionales



Autoridad del Centro Histórico





Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 01/10/2021	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Quincenal	85	15 de octubre
Mantenimiento a infraestructura con apoyo de Justicia Cívica	Número de atenciones en parques, plazas o áreas verdes del Perímetro del Centro Histórico	Quincenal	2	15 de octubre





Autoridad del Centro Histórico | Obras menores

Pino Suárez República de Venezuela Madero Plaza del Empedradillo Leandro Valle República de Perú Plaza del Seminario 20 de Noviembre Tacuba Av. Hidalgo Belisario Domínguez Bolívar Mariana R. del Toro de Lazarín Izazaga Isabel la Católica Roldán 2 de Abril República de **Ecuador**

Los trabajos realizados consistieron en reparación de 1 tapa de registro y colocación de 14 piezas de piso tipo recinto en Pino Suárez entre Regina y San Jerónimo, se repararon 2 tapas de registro en República de Venezuela esquina República de Argentina, se reparó 1 tapa de registro en Madero esquina Callejón de la Condesa, se repusieron 14 piezas de piso tipo recinto en Plaza del Empedradillo, se reparó banqueta en Leandro Valle esquina República de Perú. se reparó 1 tapa de registro en República de Perú frente al No. 88 entre República de Brasil y República de Chile, se retiró 1 banca en Plaza del Seminario, se reparó 1 tapa de registro en 20 de Noviembre esquina Regina, se repararon 2 huecos de banqueta en Tacuba entre Callejón de la Condesa y Filomeno Mata, se realizaron perforaciones a 12 macetones para drenar agua en Av. Hidalgo entre Eje Central y 2 de Abril, se reparó 1 tapa de registro en Belisario Domínguez esquina República de Brasil, se reparó banqueta en Bolívar entre República del Salvador y Mesones, se pintó un muro de 78 m2 en Mariana R. del Toro casi esquina República de Chile, se repararon 2 m2 de banqueta en Izazaga entre Bolívar e Isabel la Católica, se retiraron esparragos y se reparó banqueta en Isabel la Católica casi esquina 5 de Mayo, se retiraron esparragos, se reparó banqueta y se colocaron 2 piezas de piso tipo recinto en Isabel la Católica entre Madero y 5 de Mayo, se retiraron esparragos y se reparó banqueta en Isabel la Católica casi esquina Mesones, se repusieron 5 piezas de piso tipo recinto en Roldán entre Manzanares y República de Uruguay, se reparó 1 tapa de registro en 2 de Abril entre Pensador Mexicano y Santa Veracruz, se reparó 1 tapa de registro en República de Ecuador No. 110, se reparó 1 tapa de registro en Pino Suárez entre Corregidora y Venustiano Carranza, se demolieron 7 ml de rampas en Zapata No. 68.











Autoridad del Centro Histórico | Gráficos de obras menores













Pino Suárez esquina Corregidora

República de Ecuador

Roldán










Autoridad del Centro Histórico | Mantenimiento con apoyo de infractores de justicia cívica







Plaza Santísima con apoyo de 26 infractores






Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores

2,169

Incidencias atendidas enero - septiembre


Atención a incidencias de daño en infraestructura del perímetro de la ACH



2,335 m²

Graffitis eliminados enero - septiembre













Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores

12


Riegos por vecinos abril - septiembre 13

Riegos por ACH abril - septiembre 07

Riegos por ACH - DGSUS abril - septiembre 04

Riegos por SEDEMA abril - septiembre

Riegos de áreas verdes Centro Histórico





Alcaldía Cuauhtémoc





Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

SIN REPORTE POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN






Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores

reparaciones de luminarias enero - septiembre



sujetos forestales podados enero - septiembre












Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores

1,588 m

de desazolve en red de drenaje enero - septiembre


Desazolve de la red de drenaje



rejillas de piso desazolvadas enero - septiembre

coladeras desazolvadas enero - septiembre

Desazolve de accesorios





Alcaldía Venustiano Carranza





Alcaldía Venustiano Carranza | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 1/10	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de Iuminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	0	15 de octubre	No se realizó reporte.
Tiraderos Clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base 26 tiraderos	Quincenal	570	15 de octubre	Se recolectaron 38 toneladas diariamente de Residuos Sólidos
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	0	15 de octubre	La Coordinación Territorial Morelos no reporta trabajos de poda de sujetos forestales en el periodo.
Desazolve	Metros lineales de drenaje desazolvados	Quincenal	0	15 de octubre	No se realizó reporte






Alcaldía Venustiano Carranza | Seguimiento de indicadores

reparaciones de luminarias enero - septiembre


Reparaciones de luminarias en vías secundarias de CH



16,148.8 ton.

de residuos sólidos recolectados enero - septiembre

Residuos sólidos recolectados en tiraderos clandestinos












Alcaldía Venustiano Carranza | Seguimiento de indicadores


sujetos forestales podados enero - septiembre

Sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas



4,030

de desazolve en red de drenaje enero - septiembre





SACMEX

Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje










SACMEX Drenaje | Ejecución del programa

Desazolve de la red de drenaje y accesorios hidráulicos


> 92 % **DE AVANCE**

	PROGRAMADO	ANTERIOR	EJECUTADO	AVANCE
ATARJEA (METROS)	21,000	18,370	1,030	19,400
POZOS DE VISITA	370	318	21	339
REJILLAS DE PISO	150	201	13	214
COLADERA PLUVIAL	160	241	16	257
ALBAÑAL (METROS)	1,500	1,607	64	1,671

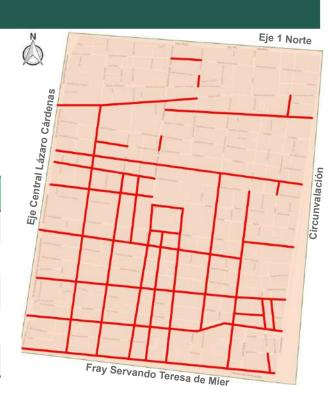



SACMEX Drenaje | Reporte Fotográfico

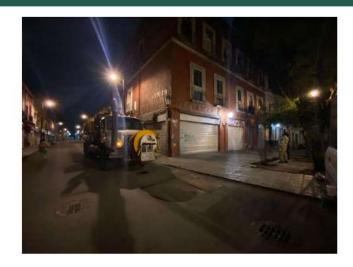



PLAZA SANTA CATARINA NO. 4
(ENTRE REPÚBLICA DE HONDURAS Y REPÚBLICA DE PARAGUAY)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 80 ML DE ATARJEA, 2 PV, 4 ML DE ALBAÑAL.









SACMEX Drenaje | Reporte Fotográfico






JUSTO SIERRA (ENTRE REPÚBLICA DE ARGENTINA Y CIRCUNVALACIÓN)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 400 ML DE ATARJEA, 8 PV, 6 CP, 4 RP, 20 ML DE ALBAÑAL.



SACMEX Drenaje | Reporte Fotográfico



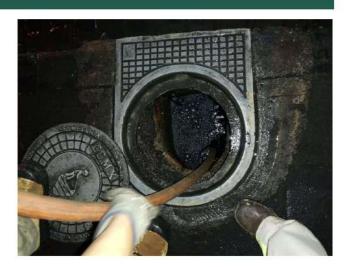

CORREO MAYOR


(ENTRE REPÚBLICA DE GUATEMALA Y PLAZA SAN PABLO)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 550 ML DE ATARJEA, 11 PV, 10 CP, 9 RP, 40 ML DE ALBAÑAL.





SACMEX Drenaje | Seguimiento de indicadores

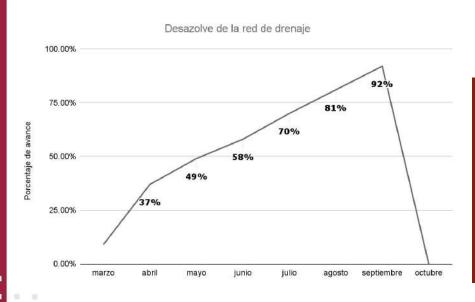

92 % avance acumulado marzo - septiembre

19.40 km en atarjea
339 pozos de visita
214 rejillas de piso
257 coladeras pluviales
1,671 m de albañal

Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Obras de Infraestructura Vial





SOS-DGOIV | Indicadores - Fechas de terminación de obra 2021

OBRA	ALCALDÍA	AVANCE FÍSICO	FECHA DE TÉRMINO REAL	COMENTARIOS
TACUBA	CUAUHTÉMOC	94.06%	18/10/2021	Por concluir
				Por concluir, en proceso señalamiento horizontal
5 DE MAYO	CUAUHTÉMOC	85.00%	04/10/2021	en general, para servicios turísticos y ciclovía
PLAZA EMPEDRADILLO	CUAUHTÉMOC	00.00%	30/12/2021	Inició trabajos 04/10
PLAZA SOLIDARIDAD	CUAUHTÉMOC	07.91%	30/10/2021	En ejecución
PLAZA MARTÍ	CUAUHTÉMOC	05.80%	30/10/2021	En ejecución
SAN HIPÓLITO (MINA-SOTO-HÉROES-VIOLETA-SAN FERNANDO Y AV. HIDALGO)	CUAUHTÉMOC	08.03%	30/12/2021	En ejecución
REPÚBLICA DE CHILE	CUAUHTÉMOC	08.86%	30/12/2021	En ejecución
SAN ILDEFONSO Y JUSTO SIERRA	CUAUHTÉMOC	02.80%	30/11/2021	En ejecución
REFORMA, DE AV. HIDALGO A GLORIETA VIOLETA	CUAUHTÉMOC	01.50%	30/12/2021	En ejecución
URBANISMO TÁCTICO EN BALDERAS – PLAZA SOLIDARIDAD	CUAUHTÉMOC	00.00%	15/12/2021	En proceso de licitación
URBANISMO TÁCTICO EN BALDERAS – CIUDADELA Y EMILIO DONDÉ	CUAUHTÉMOC	00.00%	15/12/2021	En proceso de licitación
CICLOVÍA REFORMA	CUAUHTÉMOC	00.00%	15/12/2021	En proceso de licitación





SOS-DGOIV | Tacuba

EN PROCESO:

Se realiza suministro y colocación de luminarias de alumbrado público, colado de ajustes para arriates y colocación de tierra vegetal en









Alcaldia	Presupuesto	Periodo	Avance	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	4.73 mdp	Junio - Octubre	94.06 %	Octubre 2021	Por programar









SOS-DGOIV | 5 de mayo

EN PROCESO:

Se realiza colocación de tierra vegetal y colocación de arbolado, esta en proceso la instalación de ciclovía con confibici, adecuación de bahías para










Alcaldía Periodo Fecha de conclusión Inauguración o visita Presupuesto Avance Cuauhtémoc 5.12 mdp Junio - Octubre 85.00 % Octubre 2021 Por programar




SOS-DGOIV | Plaza Empedradillo - Obra nueva

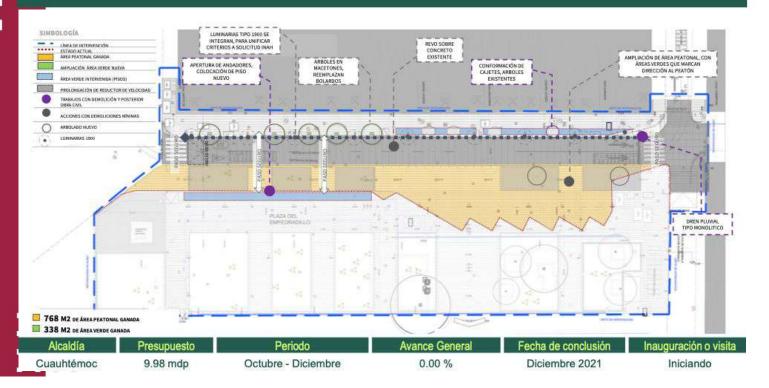





SOS-DGOIV | Plaza Empedradillo - Mantenimiento

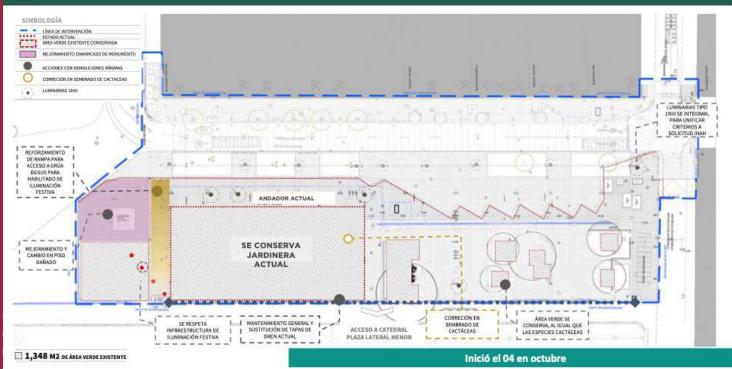





SOS-DGOIV | Plaza Solidaridad

EN PROCESO:

Se realizan trabajos de levantamiento topográfico, trazo y nivelación, demolición de guarniciones y banquetas.





Alcaldía	Presupuesto	Periodo	Avance General	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	5.16 mdp	Agosto - Octubre	7.91 %	Octubre 2021	Por programar









SOS-DGOIV | Plaza Solidaridad







SOS-DGOIV | Plaza Martí

EN PROCESO:

Por iniciar trabajos de mantenimiento, se realizan cambios de piezas de mármol en pasillos de la plaza.





Alcaldía	Presupuesto	Periodo	Avance General	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	3.45 mdp	Agosto - Octubre	5.80 %	Octubre 2021	Por programar









SOS-DGOIV | República de Chile

EN PROCESO:

Se realizan recorridos de tramos con SACMEX, INAH, DCOIV, SSC, semáforos y CFE, se realizan trabajos de excavación y tendido de tubería para ducto maestro, baja y media







Alcaldia Cuauhtémoc Presupuesto 22.84 mdp

Periodo Agosto - Diciembre

8.86 %

Fecha de conclusión


Inauguración o visita

Diciembre 2021





SOS-DGOIV | Polígono de San Hipólito

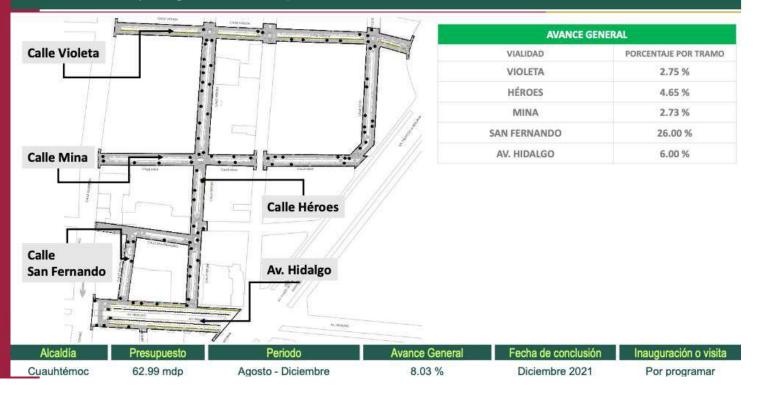









SOS-DGOIV | Polígono de San Hipólito - Violeta

EN PROCESO:

Se realizan trabajos de levantamiento topográfico, trazo y nivelación , inician trabajos de demolición de guarniciones y banquetas, carga y retiro de escombro.









SOS-DGOIV | Polígono de San Hipólito - Héroes

Se realiza levantamiento topográfico, trazo y nivelación , inician trabajos de demolición de guarniciones y banquetas, carga y retiro de















SOS-DGOIV | Polígono de San Hipólito - Mina

EN PROCESO:

Se realiza levantamiento topográfico, trazo y nivelación , inician trabajos de demolición de guarniciones y banquetas, carga y retiro de











SOS-DGOIV | Polígono de San Hipólito - San Fernando

EN PROCESO:

Se realizan trabajos de levantamiento topográfico, trazo y nivelación, inician trabajos de demolición.















SOS-DGOIV | Polígono de San Hipólito - Av. Hidalgo

EN PROCESO:

Se realiza levantamiento topográfico, trazo y nivelación, inician trabajos de demolición de guarniciones y banquetas, carga y retiro de escombro.









SOS-DGOIV | San Ildefonso y Justo Sierra

Se realizan trabajos de levantamiento topográfico, demolición de guarniciones y banquetas, colado de guarniciones y colocación de relleno fluido en área de banqueta.









Alcaldia

Presupuesto

Periodo

Avance General

Fecha de conclusión

Inauguración o visita

Cuauhtémoc

6.04 mdp

Septiembre - Noviembre

2.80 %

Noviembre 2021

Por programar









SOS-DGOIV | Reforma (Av. Hidalgo a Glorieta Violeta)



En trabajos preliminares

Acciones generales

- · Obra inducida de Av. Hidalgo a Glorieta Violeta
- · Adecuaciones geométricas
- Acabados unificados con Intervenciones anteriores
- · Cruces seguros
- · Mantenimiento y Actualización de tecnologia en luminarios
- · Mantenimiento a vegetación
- Señalización
- · Mantenimiento a ciclovía
- Balizamiento

Periodo

Fecha de conclusión

Inauguración o visita

Cuauhtémoc

56.43 mdp

Septiembre-Diciembre

1.50 %

Diciembre 2021

Iniciando





SOS-DGOIV | Reforma (Av. Hidalgo a Glorieta Violeta)
















SOS-DGOIV | Av. Balderas - Urbanismo Táctico - Solidaridad

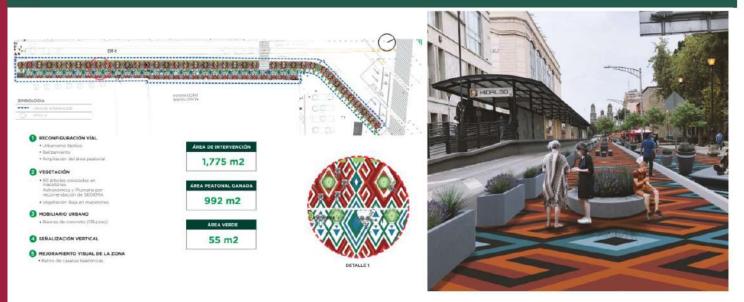


Alcaldia Periodo Fecha de conclusión Inauguración o visita Presupuesto Avance 1.2 mdp Octubre 00.00% Diciembre 2021 En licitación Cuauhtémoc





SOS-DGOIV | Av. Balderas - Urbanismo Táctico - Ciudadela







0.90 mdp

Periodo Octubre

Avance 00.00%

Fecha de conclusión Diciembre 2021 Inauguración o visita En licitación










SOS-DGOIV | Seguimiento de indicadores

Frentes de obra - Revitalización Integral Centro Histórico 2021

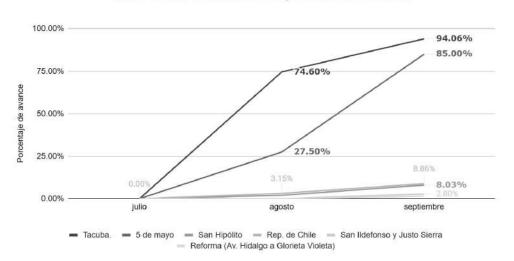

33 % avance promedio julio - septiembre

Revitalización Integral Centro Histórico 2021


6Frentes de obra en ejecución





SOS-DGOIV | Seguimiento de indicadores



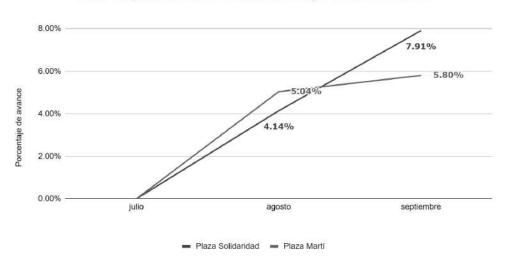

7 % avance promedio

Revitalización Integral Centro Histórico 2021

Plazas en ejecución de obra





Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Construcción de Obras Públicas





SOS-DGCOP | Indicadores - Construcción de PILARES "La Pulga"

DATOS GENERALES CONTRATISTA No. CONTRATO DGCOP-LPN-L-1-275-20 INOVACION Y PROMOCION DE LA CONTRATISTA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. PLAZO DE EJECUCIÓN 149 DIAS CALENDARIO FECHA DE INICIO 02/10/2020 FECHA DE TEMINACIÓN 27/02/2021 SUPERFICIE DEL TERRENO 3,076.31 AREA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL 2,214.00 M2 AREAS EXTERIORES 3,625.00 M2

ESTADO FINANCIERO		
IMPORTE DEL CONTRATO S/IVA	S	19,989,459.25
IMPORTE ESTIMADO (PAGADO) S/IVA		\$12,005,252.52
IMPORTE POR ESTIMAR S/IVA	S	7,984,206,73

ANTICIPO		
ANTIOPO OTORGADO	SIN A	ANTIGPO
ANTIOPO AMORTIZADO	\$	2
ANTIC PO POR AMORTIZAR	\$	-






PERSPECTIVA DEL PROYECTO

ARQ. GRACIELA DUARTE CALIXTO J.U.D. DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION C2





SOS-DGCOP | Indicadores - Construcción de PILARES "La Pulga"

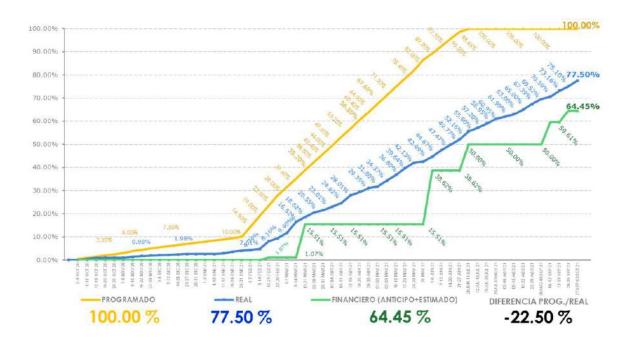









FABRICACION DE BARANDAL DE HERRERÍA H-02 Y H-03 DE 1.43 M. DE DESAROLLO EN PRIMER NIVEL (A BASE DE POSTES, PASAMANOS Y PROTECCIONES HORIZONTRALES DE VARILLA CORRUGADA)









SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES "La Pulga"





COLOCACION DE ALFARDAS, ESCALONES Y BARANDALES METALICOS DE LAS 2 ESCALERAS INTERIORES DE LA PLANTA BAJA (EJES B/4-5 Y C/2-3)







LAVADO EN MUROS DE CONCRETO ARMADO EN PRIMER NIVEL



CABLEADO ELECTRICO EN CANALIZACIONES PARA CONTACTOS EN PRIMER NIVEL









SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES "La Pulga"



COLOCACION DE MARCOS METALICOS PARA PUERTAS P-01 Y P-02 DE LA PLANTA BAJA (EJES B/1-6 Y C/1-6)



COLOCACION DE VIGA Y MARCOS METALICOS PARA CANCEL C-02 DE LA P.B.-1N (EJE 6/B-C)







COLOCACION DE CIMBRA DE MADERA EN MURO DE COLINDANCIA (EJES F/5-6)



COLADO CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2 EN MURO DE COLINDANCIA (EJES F/5-6)









SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES "La Pulga"



COLOCACION DE CIMBRA Y APUNTALAMIENTO PARA ESCALERA QUE CONDUCE AL NIVEL DE AZOTEA (EJES C/4-5)




ARMADO CON ACERO DE REFUERZO PARA ESCALERA QUE CONDUCE AL NIVEL DE AZOTEA (EJES C/4-5)









COLOCACIÓN DE PISO DE ADOCRETO CIRCULAR NEGRO DE 10 CM. DE ESPESOR Y 10 CM. DE DIÁMETRO (EJES 6-7/A-D)









SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES "La Pulga"



VISTA PANORAMICA NORESTE



VISTA PANORAMICA NOROESTE







VISTA PANORAMICA SURESTE



VISTA PANORAMICA SUROESTE






SOS-DGCOP | Seguimiento de Indicadores

77.50%

avance de obra

enero - septiembre

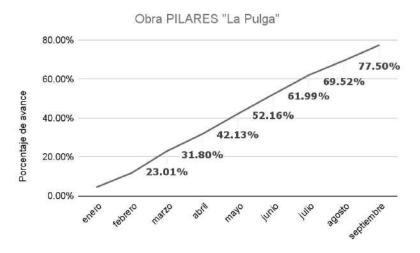





Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad Alumbrado Público









SOS-DGSUS Alumbrado Público | **Indicadores**

	o reporte	te
Número de Iuminarias Alumbrado reparadas en Público vías del Semanal 142 57 19 de octu	octubre	е





SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA 39

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	мотіvо
Av. Juárez	Calle Dolores y Calle López	CENTRO	25	Reconexión de líneas	Circuito apagado
	Calle Dolores y Calle López	CENTRO	25	Reconexión de líneas	Circuito apagado
	Calle Dolores y Calle López	CENTRO	19	Reconexión de líneas	Circuito apagado
	Calle Dolores y Calle López	CENTRO	6	Reconexión de líneas	Circuito apagado
	Calle José Azueta y Calle Revillagigedo	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	76		





SOS-DGSUS Alumbrado Público | **Anexo de indicadores**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA 39

DIRECCIÓ	I ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	мотіvо	
Alameda Cen	tral Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Cambio de Lámpara	Luminaria apagada	
	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Cambio de Lámpara y Balastro	Luminaria apagada	
	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Cambio de Lámpara y Balastro	Luminaria apagada	
	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Cambio de Balastro	Luminaria apagada	
	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Cambio de Balastro	Luminaria apagada	
	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Cambio de Lámpara	Luminaria apagada	
5.5		SUBTOTAL	6			





SOS-DGSUS Alumbrado Público | **Anexo de indicadores**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA 39

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	мотіvо
Calle Francisco I. Madero	Calle Fray Pedro de Gante y Calle Simón Bolívar	CENTRO	1	Cambio de Lámpara	Luminaria apagada
	Calle Fray Pedro de Gante y Calle Simón Bolívar	CENTRO	1	Cambio de Lámpara y Balastro	Luminaria apagada
	Calle Fray Pedro de Gante y Calle Simón Bolívar	CENTRO	20	Restablecimiento de control	Circuito Apagado
Av. Congreso de la Unión	Calle La Candelaria y Calle Juan de la Granja	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Av. Arcos de Belén	Calle Luis Moya y Calle Revillagigedo	CENTRO	1	Cambio de Lámpara	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	24		





SOS-DGSUS Alumbrado Público | **Anexo de indicadores**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA 39

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	мотіvо
Av. José María Pino Suárez	Calle República del Salvador y Calle Mesones	CENTRO	1	Cambio de Lámpara y Balastro	Luminaria apagada
Calle Bravo	Calle Hortelanos y Calle Felipe Berriozábal	CENTRO	34	Reconexión de líneas	Circuito Apagado
Calle República de Ecuador	Calle República de Brasil y Calle República de Argentina	CENTRO	1	Cambio de Lámpara y Balastro	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	36		
		TOTAL	142		





SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA 40

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	мотіvо
Alameda Central	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	cambio de balastro	Luminaria apagada
	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	cambio de balastro	Luminaria apagada
	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	cambio de lámpara	Luminaria apagada
	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	cambio de balastro	Luminaria apagada
	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	4	cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
	Dr. Mora y Ángela Peralta	CENTRO	6	reposición de cable por robo	Circuito apagado
Avenida Juárez	Dolores y López	CENTRO	19	Restablecimiento de control	Circuito apagado
	Humboldt y Balderas	CENTRO	14	Cambio de fotocelda	Luminaria en 24 hrs
	Dolores y López	CENTRO	1	Restablecimiento de control	Circuito apagado
	Luis Moya y Dolores	CENTRO	4	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
H H		SUBTOTAL	52		
(E 1)					





SOS-DGSUS Alumbrado Público | **Anexo de indicadores**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA 40

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	мотіvo
Calle Doctor Mora	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Se realiza reconexión de líneas	Luminaria Apagada
	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Se realiza reconexión de líneas	Luminaria Apagada
	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Se realiza reconexión de líneas	Luminaria Apagada
	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Se realiza reconexión de líneas	Luminaria Apagada
Calle Francisco I. Madero	Calle Francisco I. Madero	CENTRO	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria Apagada
		SUBTOTAL	5		





SOS-DGSUS Alumbrado Público | **Gráficas de Indicadores**

SEMANA 39

AV. JUÁREZ







RECONEXIÓN DE LÍNEAS / CIRCUITO APAGADO.









SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA 39

ALAMEDA CENTRAL







CAMBIO DE LÁMPARA / LÁMPARA APAGADA.





SOS-DGSUS Alumbrado Público | **Gráficas de Indicadores**

SEMANA 39

CALLE FRANCISCO I. MADERO







CAMBIO DE LÁMPARA / LÁMPARA APAGADA.





SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA 39

AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ







CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO / LÁMPARA APAGADA.





SOS-DGSUS Alumbrado Público | **Gráficas de Indicadores**

SEMANA 40

ALAMEDA CENTRAL







CAMBIO BALASTRO.









SOS-DGSUS Alumbrado Público | **Gráficas de Indicadores**

SEMANA 40

AVENIDA JUÁREZ







SE RESTABLECE BREAKER.



SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA 40

CALLE DOCTOR MORA







RECONEXIÓN DE LÍNEAS.









SOS-DGSUS Alumbrado Público | **Gráficas de Indicadores**

SEMANA 40

CALLE FRANCISCO I. MADERO







CAMBIO BALASTRO.






SOS-DGSUS Alumbrado Público | Seguimiento de indicadores

7,503

enero - septiembre

Reparación a luminarias en CH







Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad Subdirección de Parques "B"





Tema	Indicador	Periodicidad	06 al 19/09	20/09 al 1 /10	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros Barridos de guarnición en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	8,618.512 km	8,618.512 Km	19 de Octubre
Limpieza	Metros cuadrados Barridos de Banquetas en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	16,768,780 m2	16,768,780 m2	
Limpieza	Metros Cuadrados Barridos de Plazas y Corredores en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	8,474,312 m2	8,474,312 m2	





SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	06 al 19/09	20/09 al 1 /10	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros de Barrido Mecánico en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	1,279.040 km	1,279.040 km	19 de Octubre
Limpieza	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos y recolección de residuos producto del barrido en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	8,103 m3	7,235 m3	
Recolección de tierra	Metros cúbicos de tierra recolectada en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	114.00 m3	117.50 m3	





Tema	Indicador	Periodicidad	06 al 19/09	20/09 al 1 /10	Próximo reporte
Lavado de papeleras	Piezas de papeleras lavadas en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	1,120 piezas	1,120 piezas	19 de Octubre
Lavado	Metros cuadrados lavados en Plazas, Calles, Corredores peatonales y semipeatonales en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	706,774 m2	639,064 m2	
Lavado de sitios críticos	Sitios críticos lavados en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	18 Sitios (256 promedio en la quincena)	18 Sitios (255 promedio en la quincena)	





SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	06 al 19/09	20/09 al 1 /10	Próximo reporte
Recolección tiraderos clandestinos	Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos en el Perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	25 Tiraderos (350 promedio en la quincena)	25 Tiraderos (350 promedio en la quincena)	19 de Octubre
Retiro de chicles	Piezas de Chicles retiradas en el Corredor Madero	Quincenal	4,554 piezas	3,698 piezas	
Eliminación de grafiti	Metros Cuadrados de grafiti eliminado en el Perímetro "A" el Centro Histórico	Quincenal	4,329 m2	9,302.50 m2	





_	Tema	Indicador	Periodicidad	06 al 19/09	20/09 al 1 /10	Próxim o reporte
	Desratización	Desratización en el Perímetro "A" y "B" del Centro Histórico		Colocación 2,753 Cebos Lanirat, 983 Racumin pasta en una superficie de 127,230 m2	Colocación 181 Cebos Lanirat , 3,980 Racumin pasta y 756 Cereal B en una superficie de 94,340 m2	19 de Octubre
	Retiro de propaganda	Piezas retiradas de propaganda en el Perímetro "A" del Centro Histórico		2,483 piezas	2,849 piezas	
115						





SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas - Acciones preventivas con el personal por COVID-19

- Toma la temperatura todos los días en los tres turnos.
- Entrega de caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.











ELIMINACIÓN DE GRAFITI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
ECHEVESTE DE SIMÓN BOLÍVAR A ALDACO	12	m2
CALLEJÓN DEL 57 DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A DONCELES	7.50	m2
BANQUETAS DE PALACIO NACIONAL	23	m2
BUSTO DE CUAUHTÉMOC EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	04	m2
AV. JUÁREZ ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA (PROTESTA)	74	m2
AV. HIDALGO DE AV. PASEO DE LA REFORMA A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (PROTESTA)	845	m2
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS DE AV. HIDALGO A AV. 5 DE MAYO (PROTESTA)	15	m2
AV. 5 DE MAYO DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MONTE DE PIEDAD (PROTESTA)	1,195	m2
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (PROTESTA)	6,464	m2
AV. JUÁREZ DE AV. PASEO DE LA REFORMA A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (PROTESTA)	663	m2
TOTAL	9,302.50	m2









SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE 9,256 M2 DE GRAFITI DE PROTESTA Y 46.50 M2 DE GRAFITI VANDÁLICO













































SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores





































SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores





















Atención Fauna Nociva

























SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas de indicadores



















Atención Fauna Nociva

IVa		i
Cuadrantes	Ubicación	Actividad
В	Congreso de la Unión a Calzada de la Viga, Col. Jamaica, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 36 racumin pasta y 46 cebos cereal B en un área de 850 m2.
В	Emiliano Zapata a Herreros de Oriente a Poniente, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 36 racumin pasta y 52 cebos Lanirat en un área de 800 m2.
В	De Fray Servando a Sidar y Rovirosa, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 27 racumin pasta y 66 cebos Lanirat en un área de 1,200 m2.
В	Congreso de la Unión lado Oriente, Calzada Mixiuhca y Melchor Ocampo, Col. Magdalena Mixiuhca, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 21 racumin pasta y 25 cebos Lanirat en un área de 650 m2.
В	Calzada Zaragoza y Troncoso, Col. Unidad Kennedy, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 18 racumin pasta y 38 cebos Lanirat en un área de 260 m2.
В	Fray Servando Teresa de Mier, esquina Congreso de la Unión, Col. Parque, Venustiano Venustiano Carranza	Desratización 45 racumin pasta y 64 cebos cereal B en un área de 800 m2.
В	Rio Consulado y Av. 608, Col. Pensador Mexicano, Alcaldía Gustavo A. Madero	Desratización 183 racumin pasta y 45 cebos cereal B en un área de 680 m2.
	B B B B	B Congreso de la Unión a Calzada de la Viga, Col. Jamaica, Alcaldía Venustiano Carranza B Emiliano Zapata a Herreros de Oriente a Poniente, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza B De Fray Servando a Sidar y Rovirosa, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza B Congreso de la Unión lado Oriente, Calzada Mixiuhca y Melchor Ocampo, Col. Magdalena Mixiuhca, Alcaldía Venustiano Carranza B Calzada Zaragoza y Troncoso, Col. Unidad Kennedy, Alcaldía Venustiano Carranza B Fray Servando Teresa de Mier, esquina Congreso de la Unión, Col. Parque, Venustiano Venustiano Carranza B Rio Consulado y Av. 608, Col. Pensador Mexicano, Alcaldía









SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Tiradero Clandestino	В	Congreso de la Unión Herreros a Hortelanos (Tiradero Clandestino), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 201 racumin pasta en un área de 100 m2.
Vialidad Congreso de la Unión	В	Congreso de la Unión esquina Hortelanos (Tiradero Clandestino), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 204 racumin pasta en un área de 100 m2.
Canal del Norte	В	De Plomeros a Eje 2 Oriente (Canal del Norte), Col. Michoacán, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 219 racumin pasta en un área de 1,750 m2.
Canal del Norte	В	De Bonanza a Eje 2 Oriente Congreso de la Unión, Col. Ampliación Michoacana, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 198 racumin pasta en un área de 350 m2.
Vialidad Congreso de la Unión Camellón	В	De Aluminio a Estaño, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 135 racumin pasta en un área de 380 m2.
Vialidad Aluminio	В	De Congreso de la Unión a Pabellón, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 120 racumin pasta en un área de 760 m2.
Exterior del Mercado del Rastro	В	Ing. Eduardo Molina Aluminio, Sorpresa y Estaño, Exterior del Mercado el Rastro, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 150 racumin pasta en un área de 2,150 m2.
Vialidad Av. Del Trabajo	В	De Panaderos a Mecánicos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 204 racumin pasta en un área de 850 m2.
Tramo	В	Av. Del Trabajo No. 28, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 128 racumin pasta en un área de 350 m2.





Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Tiradero Clandestino	В	Plutarco Elías Calles y Congreso de la Unión, Col. Barrio Zapotla, Alcaldía Iztacalco	Desratización y fumigación 190 racumin pasta en un área de 580 m2.
Parque S/N	В	Manuel Doblado y Obreros, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 90 racumin pasta y 60 cebos cereal B en un área de 220 m2.
Eje 2 Norte	В	Esquina Eje Central Lázaro Cárdenas, Col. Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 54 racumin pasta y 90 cereal B en un área de 350 m2.
Tiradero Clandestino No. 62	В	Eje 1 Oriente esquina Constancia, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 54 racumin pasta y 75 cebos cereal B en un área de 100 m2.
Vialidad Eje 1 Oriente	В	Esquina Caridad, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 24 racumin pasta y 28 cebos cereal B en un área de 250 m2.
Tiradero Clandestino No. 64	В	Eje 1 Oriente Manuel Doblado, Col. Morelos Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 66 racumin pasta y 75 cebos cereal B en un área de 100 m2.
Vialidad Eje 1 Oriente Circunvalación	В	De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 95 racumin pasta en un área de 2,200 m2.









SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Eje 1 Oriente Circunvalación	В	De República de Guatemala a San Pablo Col. Centro , Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 78 racumin pasta en un área de 1,600 m2.
Exterior Mercado San Lucas	В	Escuela Médico Militar Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 42 racumin pasta en un área de 1,800 m2.
Parque Área Verde	В	Balderas, Tolsa y Enrico Martínez Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 28 racumin pasta en un área de 800 m2.
Vialidad Plaza de la Ciudadela	В	Av. Balderas, Enrico Martínez y José María Morelos, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 45 racumin pasta en un área de 850 m2.
Vialidad Arcos de Belem	В	De Luis Moya a Balderas Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 39 racumin pasta en un área de 1,500 m2.
Plaza de la Soledad	В	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 39 cereal B en un área de 560 m2.
Vialidad General Anaya	В	De Eje 1 Oriente a San Ciprián Col Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 32 cereal B en un área de 1,200 m2.
Vialidad San Ciprian	В	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier Col. Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 30 cereal B en un área de 1,200 m2.
Exterior del Mercado Candelaria	В	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprián y General Anaya , Col. Merced Balbuena Venustiano Carranza	Desratización 20 cereal B en un área de 1,140 m2.





Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Mercado de la Merced	В	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Ote. Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 32 cereal B en un área de 8,200 m2.
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	В	Eje 1 Norte a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 300 racumin pasta en un área de 1,800 m2.
Vialidad San Pablo	Α	De Eje 1 Oriente a Av. José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 28 cereal B en un área de 1,800 m2.
Av. José María Izazaga	Α	De Isabel la Católica a Bolívar, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 12 cereal B en un área de 1,400 m2.
Eje 1 Norte Mosqueta	Α	Eje 1 Poniente Guerrero a Paseo de la Reforma, lado sur Norte, Col Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 20 cereal B en un área de 1,400 m2.
Vialidad Roldan	В	De Fray Servando Teresa de Mier a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 10 cereal B en un área de 1,800 m2.
Plaza de la Constitución	Α	Av. 20 de Noviembre, Av. José María Pino Suárez, Av. 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 8 cereal B en un área de 46,800 m2.
Plaza Teatro Blanquita	В	Eje Central Lázaro Cárdenas, Pensador Mexicano y Mina, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 12 cereal B en un área de 1,800 m2.
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	В	Fray Servando y Calzada de la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 30 cereal B en un área de 650 m2.









SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Av. Del Trabajo	В	De Gorostiza a Panaderos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 393 racumin pasta en un área de 680 m2.
Vialidad Congreso de la Unión	В	De Canal del Norte a Aluminio, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 210 racumin pasta en un área de 380 m2.
Vialidad Congreso de la Unión	В	De Circunvalación a Eje 2 Norte, Col. Michoacana, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 261 racumin pasta en un área de 350 m2.
Vialidad Eje 1 Oriente Circunvalación	В	De Av. San Pablo a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 86 racumin pasta en un área de 800 m2.





LAVADO

















SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas de indicadores

BARRIDO MANUAL













RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

















SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS











LAVADO DE PAPELERAS



















SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas de indicadores

RETIRO DE CHICLES











SOS-DGSUS Recolección Zona I | Seguimiento de indicadores


134,239 m³


enero-septiembre

67,792.5 m²

enero - septiembre

Recolección en tiraderos clandestinos y barrido en PA










SOS-DGSUS Recolección Zona I | Seguimiento de indicadores

81,850


enero - septiembre

Chicles retirados en PA



45,516

enero - septiembre








SOS-DGSUS Recolección Zona I | Seguimiento de indicadores

El equivalente a

14,366 km²

enero - septiembre


Lavado de Plazas, calles y corredores peatonales y semipeatonales en PA



17,076

piezas de propaganda retirada enero - septiembre

Retiro de propaganda



* En junio 2063 piezas fueron de **propaganda electoral**





Sistema de Transporte Colectivo Metro







STC Metro | Indicadores

Indicador	Periodicidad	al 1/10/2021	Próximo reporte
75 Escaleras eléctricas en las 29 estaciones del Centro Histórico		2 escaleras detenidas (en mantenimiento)	
	Quincenal		19 de octubre

1 elevador detenido

19 Elevadores en estaciones del Centro Histórico










STC Metro | Seguimiento de indicadores

93.55%


de eficiencia en funcionamiento de escaleras eléctricas CH enero - septiembre


Funcionamiento de escaleras instalados en 29 estaciones de metro en Centro Histórico



96.36%

de eficiencia en funcionamiento de elevadores CH enero - septiembre













Metrobús | Corredor Centro Histórico Inaugurada el 1 de abril del 2012 | Cuenta con 62 parabuses y 3 terminales.

CONCEPTO	PENDIENTES	REALIZADOS
Rehabilitación de Guarnición y Recinto en para bus.	18 ESTACIONES	63%
Rehabilitación de Estelas informativas.	57 PIEZAS	5 piezas
Suministro de Estelas informativas.	6 PIEZAS	3 pieza
Colocación de Bolardos .	49 PIEZAS	0%
Colocación de Elementos de Confinamiento.	5880 PIEZAS	3359 PIEZAS
Balizamiento general	73,795.15 ml	58%







Metrobús | Para bus al 90% pero que faltan bolardos en cruces peatonales.



Delegación Cuauhtémoc





México Tenochtitlán











Metrobús | Para bus al 90% pero que faltan bolardos en cruces peatonales.



Vocacional 5





Juárez





Metrobús | Para bus al 80%.



Museo de San Carlos





Plaza de la República











Metrobús | Para bus al 80%.



Glorieta de Colón





Expo Reforma







Metrobús | Para bus al 80%.



Eje Central





Cecilio Robelo











Metrobús | Para bus al 80%.



Morelos





Ferrocarril de Cintura







Metrobús | Para bus al 80%.



Mixcalco





República de Argentina











Metrobús | Para bus al 80%.



República de Chile





Teatro Blanquita







Metrobús | Balizamiento.

















Metrobús | Elementos de confinamiento
















Metrobús | Seguimiento de indicadores

Rehabilitación de Metrobús

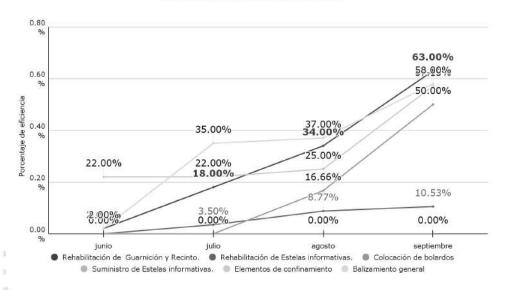

39.78% avance de proyecto*

***SE INICIARON TRABAJOS EN JUNIO 2021**



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Comisión Federal de Electricidad





Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 1. Detalle de ubicaciones Número de robos registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
SIN DATO	SIN DATO SIN DATO		SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO





Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 2. Detalle de ubicaciones Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
VENUSTIANO CARRANZA	EJE CENTRAL	CORREO MAYOR	SIN DATO	COL. CENTRO	23	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
PALMA	BELISARIO DOMÍNGUEZ	16 DE SEPTIEMBRE	SIN DATO	COL. CENTRO	11	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
REPÚBLICA DE PERÚ	EJE CENTRAL	REPÚBLICA DE BRASIL	SIN DATO	COL. CENTRO	8	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
BELISARIO DOMÍNGUEZ	EJE CENTRAL	REPÚBLICA DE ARGENTINA	SIN DATO	COL. CENTRO	12	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
				TOTAL	44	





Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 3. Detalle de ubicaciones Número de atenciones de fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
REP. DE PERÚ	ESQUINA	REP. DE CHILE	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
16 DE SEPTIEMBRE	ESQUINA	PALMA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
MÉDICO MILITAR 14, 28, 20	IZAZAGA	FRAY SERVANDO	SIN DATO	COL. CENTRO	3	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
LAZARÍN DEL TORO 16, 20	ALLENDE	REP. DE CHILE	SIN DATO	COL. CENTRO	2	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE VENEZUELA	ESQUINA	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE BOLIVIA 45	DEL CARMEN	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE BOLIVIA 2	REP. DE ARGENTINA	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE PARAGUAY	ESQUINA	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
LEANDRO VALLE 20	ESQUINA	REP. DE PERÚ	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE PERÚ 115	REP. DE ARGENTINA	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE BRASIL 49	REP. DE COLOMBIA	REP. DE BOLIVIA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	14	









Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 4. Detalle de ubicaciones Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
CIRCUNVALACIÓN	ESQUINA ZAPATA		SIN DATO	COL. CENTRO	1	REPARACIÓN DE TAPA EN BÓVEDA
MÉDICO MILITAR	FRAY SERVANDO	IZAZAGA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	REPARACIÓN DE TAPA EN BÓVEDA
VENUSTIANO CARRANZA	CORREO MAYOR	MIXCALCO	SIN DATO	COL. CENTRO	1	REPARACIÓN DE TAPA EN BÓVEDA
REPÚBLICA DE PERÚ	ESQUINA	REPÚBLICA DE CHILE	SIN DATO	COL.CENTRO	1	REPARACIÓN DE TAPA EN BÓVEDA
				TOTAL	4	





Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
REP. DE BOLIVIA 2	REP. DE ARGENTINA	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE PERÚ 115	REP. DE ARGENTINA	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE BRASIL 49	REP. DE COLOMBIA	REP. DE BOLIVIA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
MÉDICO MILITAR 14, 28, 20	IZAZAGA	FRAY SERVANDO	SIN DATO	COL. CENTRO	3	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
LAZARÍN DEL TORO 16, 20	ALLENDE	REP. DE CHILE	SIN DATO	COL. CENTRO	2	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	8	










Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de indicadores

18

Robos de elementos de infraestructura enero - septiembre


Robos registrados de elementos de infraestructura



765

bóvedas con acciones de desagüe enero - septiembre

Bóvedas atendidas con acciones de desagüe








Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de indicadores

158

Atenciones de fallas en suministro de energía eléctrica

enero - septiembre


Atenciones de fallas en el suministro de energía eléctrica



69

tapas de registros y/o bóvedas reparadas enero - septiembre

Tapas de registros y/o bóvedas reparadas












Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de indicadores

158

obras de mantenimiento que implican rompimiento enero - septiembre

Mantenimiento que implique rompimiento en vía pública





Comisión Nacional de Vivienda

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA CON VALOR PATRIMONIAL "CIUDAD DE MÉXICO"

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 CONAVI









SC/DGSMPC/COLAB/01136/2020 CIUDAD DE MÉXICO SC/DGSMPC/COLAB/01313/2020 PRIMERAS ETAPAS							
NO. ACCIONES	ENTIDAD	MONTO TOTAL	% PROYECTO	INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA		
8	CIUDAD DE MÉXICO	\$ 17,081,265.00	100%	FEBRERO-JUNIO 2021	JULIO-NOVIEMBRE 2021		

	SC/DGSMPC/COLAB/01136/2020 CIUDAD DE MÉXICO									
NO.	ESTADO	MONTO TOTAL	MONTO PROYECTO	% PROYECTO	MONTO DE OBRA	% AVANCE FÍSICO 30 ABRIL 2021	SUPERVICIÓN			
1	MAGNOLIA #162	\$ 4,000,000.00	\$ 239,520.00	100%	\$ 3,604,782.34	78%	\$ 150,199.26			
2	MANZANARES # 21	\$ 3,500,000.00	\$ 222,717.04	100%	\$ 3,140,354.36	75%	\$ 127,764.60			
3	MINA # 42	\$ 900,000.00	\$ 125,743.41	100%	\$ 741,526.84	100%	\$ 30,896.95			
4	MINA # 106	\$ 1,799,865.00	\$ 249,671.77	100%	\$ 1,472,350.11	75%	\$ 61,347.92			
5	PENSADOR MEXICANO # 12	\$ 1,881,400.00	\$ 400,350.00	100%	\$ 1,416,529.54	100%	\$ 59,022.06			
6	SEMINARIO # 12	\$ 300,000.00	\$ 44,725.08	100%	\$ 243,304.44	100%	\$ 10,137.68			
7	SOLEDAD # 45	\$ 4,200,000.00	\$ 373,637.94	100%	\$ 3,643,396.29	98%	\$ 151,808.18			
8	REPÚBLICA DE VENEZUELA # 93	\$ 500,000.00	\$ 69,230.22	100%	\$ 408,260.51	100%	\$ 17,010.87			
	TOTAL CONVENIO	\$ 17,081,265.00								







MAGNOLIA # 162, INICIO DE TRABAJOS 22/02/2021





REINTEGRACIÓN DE ENLADRILLADO EN CUBIERTA





COLOCACIÓN DE APUNTALAMIENTOS DE CIMBRA PARA CUBIERTAS









MAGNOLIA # 162, INICIO DE TRABAJOS 22/02/2021





REINTEGRACIÓN DE VIGAS Y ENTABLADO, ASI COMO APLANADOS





REINTEGRACIÓN DE SOPORTES PARA ENTARIMADO EN PISOS







MANZANARES # 21 INICIO DE TRABAJOS 02/02/2021



LIMPIEZA DE CANTERA



COLOCACIÓN DE APUNTALAMIENTOS DE CIMBRA PARA CUBIERTAS



REINTEGRACIÓN DE APLANADOS EN MUROS DE MEZCLA CAL-ARENA









MANZANARES # 21 INICIO DE TRABAJOS 02/02/2021



LIBERACIÓN DE CUBIERTA





INTEGRACION DE CUBIERTA REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA



LIBERACIÓN DE APLANADOS EN MUROS Y REINTEGRACIÓN DE INSTALACIONES







MINA # 106, INICIO DE TRABAJOS EL 12/04/2021



LIBERACIÓN DE CUBIERTA





INTEGRACIÓN DE VIGETA Y BOVEDILLA E INSTALACIÓN ELECTRICA



REINTEGRACIÓN DE CORONA DE CERRAMIENTO



VACIADO DE CONCRETO







PENSADOR MEXICANO # 15 INICIO DE TRABAJOS 17/02/2021







CONCLUSIÓN DE LA REHABILITACIÓN







SOLEDAD # 45 **INICIO DE TRABAJOS 02/06/2021**



LIBERACIÓN DE MUROS DONDE SE INTEGRARÁN LOS CONTRAFUERTES EN PLANTA ALTA





INTEGRACIÓN DE CONTRAFUERTE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON CEMENTO- CAL- ARENA



INTEGRACIÓN DE CONTRAFUERTE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS







SOLEDAD # 45 INICIO DE TRABAJOS O2/06/2021







LIBERACIÓN DE CONTRAFUERTE EN PALTA ALTA





INTEGRACIÓN DE CONTRAFUERTES DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN PLANTA BAJA Y ALTA
















CONAVI | Seguimiento de indicadores

Rehabilitación de vivienda con valor patrimonial en CH

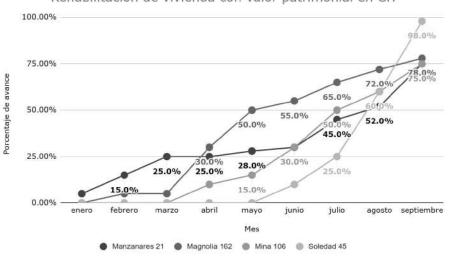

82 % avance promedio enero - septiembre

Programa Nacional de Reconstrucción 2020

04 proyectos concluidos

- Mina no. 42
- Pensador Mexicano no. 12
- Seminario no. 12
- Rep. de Venezuela no. 93

04 proyectos en proceso



Instituto Nacional de Antropología e Historia





Instituto Nacional de Antropología e Historia | Indicadores

Tema	Indicador	Quincena del 20/09 al 01/10	Próximo reporte
Obras	Número de trámites de solicitud de autorización de obra en inmuebles	14	
Programa Ciudad al Aire Libre	Número de trámites de solicitud de autorización de colocación de enseres	rización de 1	
Obras	Número de autorizaciones de obras emitidas en inmuebles	20	19 de octubre
Programa Ciudad al Aire Libre	Número de autorizaciones emitidas para la colocación de enseres	9	





Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
20/09/2021	CALLE 57	1	CUAUHTÉMOC	Reestructuración en superestructura, trabajos en muros para los cuales se realizará el retiro de recubrimientos, lambrines y aplanados existentes.	Obra mayor
20/09/2021	PALMA NORTE	413	CUAUHTÉMOC	Remodelación en el interior del edificio en los 6 niveles existentes -Sustitución de pisos en mal estado por piso de loseta anti derrapanteRetiro de acabados de yeso en muros interiores en mal estado y colocación de nuevos acabados o similaresAplicación de pintura vinílica.	Obra menor
21/09/2021	REPÚBLICA DE BRASIL	22	CENTRO HISTÓRICO	Adecuaciones de obra menor, adecuaciones con tabla roca en el interior, sin tocar estructura original.	Obra menor
21/09/2021	ADALCO	6	CUAUHTÉMOC	Arreglo de filtraciones en la fachada en lugares detectados donde los paneles de durock han sido afectados por la intemperie los trabajos a realizar es el sellado de ventanas por el exterior y la impermeabilización del durock.	Obra menor
22/09/2021	FRANCISCO I. MADERO	1	CUAUHTÉMOC	Limpieza exterior de cristales de la sucursal de banco inbursa que ocupa la planta baja y segundo piso .	Obra menor
22/09/2021	FRANCISCO I. MADERO	17	CENTRO HISTÓRICO	Demolición de un muro intermedio del tercer vano de poniente a oriente en la sección poniente de la fachada.	Obra mayor









Instituto Nacional de Antropología e Historia | **Anexo de indicadores**

Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
16/09/2021	16 DE SEPTIEMBRE	73	CUAUHTÉMOC	Obras menores de acuerdo al art. 62 reglamento de construcciones para la cdmx, forrado de muros, columnas de tablaroca, colocacion de pisos mantenimiento en fachada, trabajos de pintura cambio de luminarias.	Obra menor
24/09/2021	JUSTO SIERRA	17	CUAUHTÉMOC	Prórroga de la autorización No. 220/20 del 7 de Octubre del 2020, que ampara los trabajos de rehabilitación: Ampliación, consolidación, reestructuración y modificación del inmueble con valor patrimonial para su uso como hotel boutique	Obra mayor
27/09/2021	MADERO	33	CUAUHTÉMOC	Cambio de Mobiliario y Acabados de la Sucursal para integrarla a la Nueva Imagen Institucional del Banco.	Obra menor
29/09/2021	LUIS MOYA	73	CUAUHTÉMOC	Demolición parcial de espacios posteriores. sin afectaciones de crujia principal, demolicion por medios manuales, los trabajos involucran, plata baja, nivel 1, nivel 2.	Obra mayor
29/09/2021	BOLIVAR	38	CENTRO HISTÓRICO	Retiro de aplanados dañados, suministro y colocación de aplanados a base de cemento-arena aplicacion de pintura vinilica color gris perla	Obra menor
29/09/2021	BOLIVAR	76	CENTRO HISTÓRICO	Obra que se llevará a cabo en la fachada del edificio, retiro de aplanados dañados, pintura respetando el color que actualmente tiene, así como mantenimiento de herrería en balcones, aplicación de barniz y/o pintura en puertas de madera, repintado de zaguán de acceso y cortinas de acero.	Obra menor





Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
29/09/2021	Palma	43	CUAUHTÉMOC	Solicitud de prórroga debido a que las intervenciones físicas para la incorporación de instalaciones electromecánicas en el inmueble de referencia	Obra menor
29/09/2021	Bucareli, Barcelona, Lucerna, Leona Vicario, Callejón de Ecuador y Seminario	S/N	CENTRO HISTÓRICO	Arreglo de fachadas	Obra mayor

Solicitudes de Colocación de enseres Programa Ciudad al Aire Libre

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
21/09/2021	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	27/11/ 1900		COLOCACION DE ENSERES EN LA VIA PUBLICA COMO PARTE DEL PROGRAMA CIUDAD AL AIRE LIBRE	Obra menor





Instituto Nacional de Antropología e Historia | **Anexo de indicadores**

Autorizaciones de obra

AUTORIZACIÓN	DOMICILIO	MOTIVO	TIPO
362/21	INDEPENDENCIA 31	REMODELACIÓN INTERIOR EN LOCAL COMERCIAL.	OBRA MENOR
364/21	AV. HIDALGO 120	TRABAJOS DE REMODELACIÓN.	OBRA MENOR
365/21	BUCARELI 42	TRABAJOS DE ADECUACIÓN EN LOCAL COMERCIAL.	OBRA MENOR
PRO-366/21	REPÚBLICA DEL SALVADOR 20	PRÓRROGA PARA REFORZAMIENTO DE COLUMNAS.	OBRA MAYOR
367/21	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN SN	RESTAURACIÓN EMERGENTE EN LA TORRE PONIENTE DE LA CATEDRAL Y EN EL TAMBOR DE LA CÚPULA DEL SAGRARIO METROPOLITANO.	OBRA MAYOR
368/21	DR. ENRIQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ 10	TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN DE PISOS, ZAPATAS Y CONTRA TRABES.	OBRA MAYOR
369/21	LIC. PRIMO VERDAD 2	MODERNIZACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS.	OBRA MENOR
370/21	LIC. PRIMO VERDAD 2	CONSOLIDACIÓN DE MUROS.	OBRA MAYOR
PRO-371/21	SAN ILDEFONSO 33	PRÓRROGA DE MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS SALAS DE EXHIBICION.	OBRA MAYOR
373/21	AV. CUAUHTÉMOC EJE 1 PONIENTE 44	TRABAJOS DE REMODELACIÓN.	OBRA MENOR





Instituto Nacional de Antropología e Historia | **Anexo de indicadores**

Autorizaciones de obra

AUTORIZACIÓN	DOMICILIO	MOTIVO	TIPO
378/21	REPÚBLICA DE PARAGUAY 36	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL.	OBRA MAYOR
379/21	PALACIO NACIONAL-VENTANAS SN	SUSTITUCIÓN DE 6 VENTANAS DE MADERA EN EL 4TO. NIVEL.	OBRA MAYOR
380/21	ISABEL LA CATÓLICA 25	RETIRO DE ANUNCIOS.	OBRA MENOR
		TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL Y ADECUACIÓN	
381/21	DONATO GUERRA 5	DE ESPACIOS INTERIORES.	OBRA MAYOR
382/21	INDEPENDENCIA 56	RECOLOCACIÓN DE 9 ALBARDILLAS (CABALLETES).	OBRA MENOR
383/21	TOPACIO 5	REGULARIZACIÓN Y CONTINUIDAD DE OBRA.	OBRA MAYOR
384/21	ALLENDE 23	TRABAJOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS.	OBRA MAYOR
PRO-386/21	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS 71	PRÓRROGA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 70 DEPARTAMENTOS.	OBRA MAYOR
387/21	PALMA 4416	SUSTITUCIÓN DE CORTINAS METÁLICAS.	OBRA MENOR
367/21	. , , , , , , , , , , , , , , , , ,	REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO EN FACHADAS E INTERIOR DEL	SSIVINENON
388/21	REPÚBLICA DE BRASIL 49	INMUEBLE.	OBRA MAYOR





Instituto Nacional de Antropología e Historia | **Anexo de indicadores**

Autorizaciones Programa Ciudad al Aire Libre


AUTORIZACIÓN	DOMICILIO	MOTIVO	TIPO	
356/21	GANTE-ENSERES 1-2BIS	COLOCACIÓN DE ENSERES	OBRA MENOR	
357/21	MOTOLINIA-ENSERES 40	COLOCACIÓN DE ENSERES	OBRA MENOR	
358/21	SANTÍSIMA-ENSERES 23-B2	COLOCACIÓN DE ENSERES	OBRA MENOR	
359/21	DR. MORA-ENSERES 9-B	COLOCACIÓN DE ENSERES	OBRA MENOR	
360/21	SANTÍSIMA-ENSERES 22-D	COLOCACIÓN DE ENSERES	OBRA MENOR	
361/21	INDEPENDENCIA-ENSERES 100-B	COLOCACIÓN DE ENSERES	OBRA MENOR	
363/21	REGINA-ENSERES 59-61	COLOCACIÓN DE ENSERES	OBRA MENOR	
374/21	FRANCISCO I. MADERO-ENSERES 39PB	COLOCACIÓN DE ENSERES	OBRA MENOR	
390/21	REGINA-ENSERES 70-A	COLOCACIÓN DE ENSERES	OBRA MENOR	






Instituto Nacional de Antropología e Historia | Seguimiento de indicadores

solicitudes de autorización de obra enero - septiembre



autorizaciones de obra

enero - septiembre













Instituto Nacional de Antropología e Historia | Seguimiento de indicadores

Solicitudes de Colocación de enseres en vía pública enero - septiembre



Autorizaciones para Colocación de enseres

enero - septiembre





Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura











Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura | Indicadores

Tema	Indicador	Quincena al 30/09	Próximo reporte	Observaciones
Obras	Número de solicitudes de autorización	10	03 de noviembre	 06 consultas de calidad artística 04 solicitudes de obra
Obras	Número de autorizaciones de obra	04	03 de noviembre	04 obras menores







Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura | Indicadores

Consultas de Calidad Artística

UBICACIÓN	CATÁLOGO
San Jerónimo no. 74	No incluído
Marques Sterling no. 28A	Incluído
Dr. Lucio no. 13	Colindante
Callejón del 57 no. 1	Incluído
Victoria no. 53	Incluído
Primo de Verdad no. 2	No Incluído



San Jerónimo 74



Dr. Lucio 13



Victoria 53



Marques Sterling 28A



Callejón del 57 1



Primo de verdad 2









Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura | Indicadores

Autorizaciones de Obra

UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	DESCRIPCIÓN
Bucareli no. 38	Menor	Adecuación de local comercial
Independencia no. 31PB	Menor	Adecuación de local comercial
Enrico Martinez no. 35	Menor	Limpieza de fachada
República de Uruguay no. 68	Menor	Mantenimiento a fachada de cortina





Independencia 31PB



Enrico Martínez 35



República de Uruguay 68









Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura | Seguimiento de Indicadores













Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX





SEDUVI | Indicadores

Tema	Indicador	3er trimestre	Próximo reporte	Observaciones	
Trámites	Número de autorización para obras mayores (demolición total, obra nueva)	21	Diciembre	13 favorables08 de prevención	
	Número de autorización para obras menores (dictamen obras menores)	20	Diciembre	 20 obras menores favorables 	
	Número de colocación de anuncios (dictamen para anuncios y tapiales)	10	Diciembre	07 favorables2 de prevención	
	Número de opinión de condición patrimonial y factibilidades	09	Diciembre	04 favorables06 de prevención	





SEDUVI | Autorización para obras mayores (demolición total, obra nueva)

Tipo de trámite (SITE)	CALLE	NÚM	COLONIA	ALCALDÍA	RESPUESTA	
Dictamen demolición total, obra nueva	Nacional	37	Morelos	Venustiano Carranza	Prevención	
Dictamen demolición total, obra nueva	Dr. Mora	11	Centro	Cuauhtémoc	Prevención	
Dictamen demolición total, obra nueva	Galeana	37	Guerrero	Cuauhtémoc	Dictamen Têcnico	
Dictamen demolición total, obra nueva	República del Salvador	20	Centro	Cuauhtémoc	Opinión técnica	
Dictamen demolición total, obra nueva	Isabel La Católica	94	Centro	Cuauhtémoc	Prevención	
Dictamen demolición total, obra nueva	San Jerónimo	46 Centro		Cuauhtémoc	Prevención	
Dictamen demolición total, obra nueva	República de Argentina	95	Centro	Cuauhtémoc	Prevención	
Dictamen demolición total, obra nueva	Dr. Río de la Loza	250	Doctores	Cuauhtémoc	Dictamen técnico	
Dictamen demolición total, obra nueva	República de Paraguay	36	Centro	Cuauhtémoc	Prevención	
Dictamen demolición total, obra nueva	Correo Mayor	89	Centro	Cuauhtémoc	Opinión técnica	
Dictamen demolición total, obra nueva	República del Perú	122	Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico	





SEDUVI | Autorización para obras mayores (demolición total, obra nueva)

Tipo de trámite (SITE)	CALLE	NÚM	COLONIA	ALCALDÍA	RESPUESTA
Dictamen demolición total, obra nueva	Moctezuma	216	Buenavista	Cuauhtémoc	Prevención
Dictamen demolición total, obra nueva	San Antonio Abad	58	Transito	Cuauhtémoc	Prevención
Dictamen demolición total, obra nueva	Alhondiga	7	Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen demolición total, obra nueva	República de Argentina	94 Centro		Cuauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen demolición total, obra nueva	Palma	43	Centro	Cuauhtémoc	Opinión técnica
Dictamen demolición total, obra nueva	Dr. Río de la Loza	250	Doctores	Cuauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen demolición total, obra nueva	Palma	413 Centro		Cuauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen demolición total, obra nueva	de la Igualdad	32	Centro	Cuauhtémoc	Opinión técnica
Dictamen demolición total, obra nueva	Fray Servando Teresa de Mier	107	Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen demolición total, obra nueva	República de Argentina	95	Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico









SEDUVI | Autorización para obras menores(dictamen obras menores)

Tipo de trámite (SITE)	CALLE	NÚM		COLONIA	ALCALDÍA	RESPUESTA
Dictamen obras menores	República de Brasil	33		Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen obras menores	Revillagigedo	18		Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen obras menores	San Idelfonso	38		Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen obras menores	Tacuba	53		Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen obras menores	San Idelfonso	33		Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen obras menores	Monte de Piedad	15	Loc. 3 P.A.	Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen obras menores	16 de Septiembre	82	Loc. 5 B	Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen obras menores	Donceles	57		Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen obras menores	Colón	27		Centro	Cuauhtémoc	Opinión técnica
Dictamen obras menores	Independencia	31	Local C3	Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico







SEDUVI | Autorización para obras menores(dictamen obras menores)

Tipo de trámite (SITE)	CALLE	NÚM		COLONIA	ALCALDÍA	RESPUESTA	
Dictamen obras menores	Jesus María	63		Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico	
Dictamen obras menores	5 de Mayo	34		Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico	
Dictamen obras menores	Eje Central Lázaro Cárdenas	21	CyD	Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico	
Dictamen obras menores	República de Brasil	49		Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico	
Dictamen obras menores	Bucareli	38		Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico	
Dictamen obras menores	Bucareli	161,171 y 181		Juárez	Cuauhtémoc	Dictamen técnico	
Dictamen obras menores	Loreto	12		Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico	
Dictamen obras menores	16 de Septiembre	61		Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico	
Dictamen obras menores	Francisco I. Madero	20	Int. 109	Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico	
Dictamen obras menores	Mesones	60		Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico	









SEDUVI | Dictamen para anuncios y tapiales

Tipo de trámite (SITE)	CALLE	NÚM		COLONIA	ALCALDÍA	RESPUESTA
Dictamen para anuncios y tapiales	Francisco I. Madero	60	Loc. 02	Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen para anuncios y tapiales	Flamencos	9		Centro	Cuauhtémoc	Prevención
Dictamen para anuncios y tapiales	Bucareli	12		Centro	Cuauhtémoc	Prevención
Dictamen para anuncios y tapiales	EjeLázaro Cárdenas	2		Centro	Cuauhtémoc	Prevención
Dictamen para anuncios y tapiales	Leandro Valle	4		Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen para Anuncios y tapiales	Av. Paseo de la Reforma	26 piso 15		Juárez	Cuauhtémoc	Prevención
Dictamen para Anuncios y tapiales	Av. Fray Servando Teresa de Mier	26	*	Centro	Cuauhtémoc	Prevención
Dictamen para Anuncios y tapiales	República del Salvador	96		Centro	Cuauhtémoc	Prevención
Dictamen para Anuncios y tapiales	Las Cruces	32		Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen para anuncios y tapiales	San Idelfonso	38		Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico







SEDUVI | Opinión de condición patrimonial y factibilidades

Tipo de trámite (SITE)	CALLE	NÚM		COLONIA	ALCALDÍA	RESPUESTA
Opinión de condición patrimonial y factibilidades	Del Carmen	82-86	Loc. 37	Centro	Cuauhtémoc	Opinión técnica
Opinión de condición patrimonial y factibilidades	Regina	58		Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico
Opinión de condición patrimonial y factibilidades	Bolivar	29		Centro	Cuauhtémoc	Prevención
Opinión de condición patrimonial y factibilidades	Belisario Domínguez	65		Centro	Cuauhtémoc	Opinión técnica
Opinión de condición patrimonial y factibilidades	Eje 1 Poniente Bucareli	144		Centro	Cuauhtémoc	Opinión técnica
Opinión de condición patrimonial y factibilidades	Juárez	56		Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico
Opinión de condición patrimonial y factibilidades	Florida	36		Morelos	Cuauhtémoc	Opinión técnica
Opinión de condición patrimonial y factibilidades	5 de Mayo	19	Local A	Centro	Cuauhtémoc	Prevención
Opinión de condición patrimonial y factibilidades	Bucareli	23 y 25		Juárez	Cuauhtémoc	Opinión Técnica










SEDUVI | Seguimiento de indicadores

Tipo de trámite ingresado ante SEDUVI



■ Certificado de restauración
 ■ Dictamen demolición total, obra nueva
 ■ Dictamen obras menores
 ■ Dictamen para anuncios y/o tapiales
 ■ Obras mayores
 ■ Opinión de condición patrimonal y factibilidades
 ■ Opinión de exención de cajones de estacionamiento
 ■ Registro de intervenciones

136 trámites ingresados enero - septiembre



Instituto de Vivienda de la Ciudad de México





INVI | Indicadores

PREDIO	COLONIA	ACCIONES	ESTATUS DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE
2 DE ABRIL No. 42	GUERRERO	11	OBRA EN PROCESO	80.37%
ACADEMIA No.33	CENTRO	20	OBRA EN PROCESO	86.70%
ARCOS DE BELÉN No. 49	CENTRO	24	OBRA CONCLUIDA	100.00%
EJE 1 PONIENTE GUERRERO No. 164	GUERRERO	58	OBRA EN PROCESO	88.22%
EJE 1 PONIENTE GUERRERO No. 110	BUENAVISTA	37	OBRA CONCLUIDA	100.00%
MAGNOLIA No. 12 (ANTES No. 12 Y 16)	GUERRERO	19	OBRA EN PROCESO	91.43%
REPÚBLICA DE ARGENTINA No. 58	CENTRO	16	POR INICIAR	0.00%
REPÚBLICA DE ARGENTINA No. 87	CENTRO	25	OBRA EN PROCESO	99.80%
REPÚBLICA DE PERÚ No. 40	CENTRO	33	OBRA EN PROCESO	93.61%






INVI | Indicadores

PREDIO	COLONIA	ACCIONES	ESTATUS DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE
ALLENDE No. 46	CENTRO	32	OBRA CONCLUIDA	100.00%
LERDO No. 12	GUERRERO	53	POR INICIAR	0.00%
PEDRO MORENO No. 154	GUERRERO	18	POR INICIAR	0.00%
TALAVERA No. 24	CENTRO	63	POR INICIAR	0.00%
VIOLETA No. 15	GUERRERO	26	POR INICIAR	0.00%
PEDRO MORENO No. 156	GUERRERO	18	POR INICIAR	0.00%
LECUMBERRI No. 66	ZONA CENTRO	54	OBRA CONCLUIDA	100.00%
BELISARIO DOMINGUEZ No. 78	CENTRO	23	OBRA EN PROCESO	98.14%
NACIONAL No. 57	MORELOS	42	OBRA EN PROCESO	85.48%





INVI | Seguimiento de Indicadores

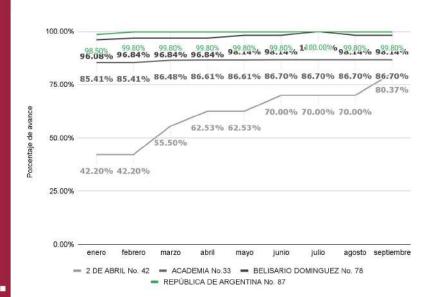

91.77% avance global enero - septiembre

04 Obras de vivienda terminadas

- Arcos de Belén No. 49
- Eje 1 Pte. Guerrero No. 110
- Allende No. 46
- Lecumberri No. 66

08 Obras en proceso

06 Obras por iniciar



Procuraduría Social de la Ciudad de México





PROSOC | Indicadores


LISTADO DEFINITIVO DE UNIDADES HABITACIONALES BENEFICIADAS **RIPUH 2020**







PROSOC | Indicadores













PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Cuauhtémoc 2020

-	NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
	1	BOLIVAR 158	OBRERA	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	TERMINADA	100%	В	NO CATALOGADA
	2	DR. JIMENEZ 41	DOCTORES	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	TERMINADA	100%	В	NO CATALOGADA
	3	CALZADA DE LA VIGA 18	ESPERANZA	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	В	NO CATALOGADA
	4	CALZADA DE LA VIGA 16	ESPERANZA	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	В	NO CATALOGADA
	5	LIBERTAD 21 C3	MORELOS	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	EN PROCESO	55%	В	NO CATALOGADA
	6	3ra CERRADA DE LIBERTAD 6	MORELOS	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	В	
	7	VIOLETA 58	GUERRERO	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMINADA	100%	В	NO CATALOGADA





PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Cuauhtémoc 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
8	GALEANA 36	GUERRERO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	В	NO CATALOGADA
9	MAGNOLIA 90	GUERRERO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	В	NO CATALOGADA
10	JOSE JOAQUIN HERRERA 10-12	C ENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMINADA	100%	В	NO CATALOGADA
11	JOSE JOAQUIN HERRERA 28-32	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	В	NO CATALOGADA
12	FLORIDA 57	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	A	CATALOGADA
13	CALLEJON MONTERO 7	CENTRO	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	TERMINADA	100%	В	NO CATALOGADA
14	MANUEL TOLSA 56	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESTRUCTURA	TERMINADA	100%	В	NO CATALOGADA





PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Cuauhtémoc 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
15	REPUBLICA DE CHILE 49	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMINADA	100%	Α	CATALOGADA
16	BUCARELI 66	CENTRO	CUAUHTEMOC	CUBOS DE AREA COMUN	TERMINADA	100%	В	CATALOGADA
17	SAN IDELFONSO 65	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	Α	
18	REPUBLICA DE VENEZUELA 77	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	
19	SAN CAMILITO 25	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100 %	В	NO CATALOGADO
20	MESONES 138	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	Α	
21	REPUBLICA DE PERU 32	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	CATALOGADA





PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Cuauhtémoc 2020

NO.	PREDIO CO	DLONIA	ALCA	LDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	c	ATALOGACIÓN
22	EJE CENTRAL LAZARO CARDEN	AS 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACI	ON TI	ERMINADA	100%	Α	NO CATALOGADA
23	NEZAHUALCOYOTL 136		CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACI	ON TI	ERMINADA	100%	В	NO CATALOGADA
24	JOSE JOAQUIN HERRERA 6		CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTUR HIDRAULICA	А ТІ	ERMINADA	100%	В	NO CATALOGADA
25	REPUBLICA DE CHILE 47		CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	Ti	ERMINADA	100%	Α	NO CATALOGADA
26	REPUBLICA DE PARAGUAY 62		CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACI	ON TI	ERMINADA	100%	Α	NO CATALOGADA
27	JOSE JOAQUIN HERRERA 17		CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACI		ERMINADA	100%	Α	NO CATALOGADA









PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Venustiano Carranza 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	ROSARIO 32	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMINADA	100%	В	NO CATALOGADA
2	CORREGIDORA 148	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	В	NO CATALOGADA
3	CORREGIDORA 140	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMINADA	100%	В	NO CATALOGADA
4	ANILLO DE CIRCUNVALACION 40	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA	TERMINADA	100%	В	NO CATALOGADA
5	CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA 4	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	CALLES Y ANDADORES	TERMINADA	100%	В	NO CATALOGADA
6	JOAQUIN HERRERA 64	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	В	NO CATALOGADA





PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Venustiano Carranza 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
7	ANILLO DE CIRCUNVACION 20	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESTRUCTURAS	PROCESO	90%	A	NO CATALOGADA
8	LECUMBERRI 59	CENTRO	VENUSTANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
9	UNIDAD HABITACIONAL CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA I	MORELOS	VENUSTANO CARRANZA	HERRERIA	TERMINADA	100%	В	NO CATALOGADA
10	UNIDAD HABITACIONAL CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA II	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	В	NO CATALOGADA
.11	UNIDAD HABITACIONAL CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA III	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	В	NO CATALOGADA
12	CIRCUNVALACION 48	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	PINTURA	TERMINADA	100%	В	NO CATALOGADA









PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Venustiano Carranza 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
13	4TA LECUMBERRI 60	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	PROCESO	30%	B N	O CATALOGADA
14	NACIONAL 44	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	ESTRUCTURAS	TERMINADA	100%	B N	O CATALAGAFDA
.15	NACIONAL 32	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (TINACOS)	TERMINADA	100%	B N	O CATALOGADA
16	NACIONAL 52	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B N	O CATALOGADA
17	VANEGAS ARROYO 30	MERCED	VENUSTIANO CARRANZA	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B N	O CATALOGADA







PROSOC | Indicadores

LISTADO DE UNIDADES HABITACIONALES SELECCIONADAS **RIPUH 2021**







PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Cuauhtémoc 2021

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	LUIS MOYA 115	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
2	REPUBLICA DE	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION:	PROCESO	70%	A	NO CATALOGADA
	VENEZUELA 77							
3	JOSE JOAQUIN HERRERA 6	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	POR INICIAR	0%	A	NO CATALOGADA
4	MARQUEZ STERLING 2	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	POR INICIAR	0%	A	NO CATALOGADA
5	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 142	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	PROCESO	40%	A	NO CATALOGADA
	BELIZARIO DOMINGUEZ	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA				
6	17			ELECTRICA	POR INICIAR	0%	A	NO CATALOGADA
	MARIANA DEL TORO 19	CENTRO	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES			A	
7					POR INICIAR	0%	^	NO CATALOGADA





PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Cuauhtémoc 2021

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
8	ITURBIDE 18	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	POR INICIAR	0%	A	NO CATALOGADA
9	VIZCAINAS 18	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	POR INICIAR	0%	Α	NO CATALOGADA
10	SOL 58 - 66	GUERRERO	CUAUHTEMOC	ALBAÑILERIA	PROCESO	10%	В	NO CATALOGADA
11	3RA. CERRADA DE LIBERTAD 6	MORELOS	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	POR INICIAR	100%	В	NO CATALOGADA
12	FLORIDA 57	MORELOS	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	POR INICIAR	100%	В	NO CATALOGADA





PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Venustiano Carranza 2021

NO	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	CORREGIDORA 140	ZONA CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	В	NO CATALOGADA
2	HABITACIONAL CANDELARIA DE LOS PATO MANZANA II	SZONA CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	CALLES Y ANDADORES	POR INICIAR	100%	В	NO CATALOGADA
3	JOAQUIN HERRERA 64	ZONA CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	POR INICIAR	0%	В	NO CATALOGADA
4	NACIONAL 52	ZONA CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	PROCESO	40%	В	NO CATALOGADA
5	NACIONAL 32	ZONA CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	В	NO CATALOGADA
6	JARDINEROS 9	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	В	NO CATALOGADA
7	CIRCUNVALACION 48	MORELOS	VENUSTIANO	PINTURA	TERMINADA	100%	В	NO CATALOGADA





PROSOC | Seguimiento de indicadores

100.00% 75.00% 61.76% Porcentaje de avance 69.63% 65.19% 50.00% 25.00% 0.00% febrero abril iunio julio agosto septiembre enero marzo mavo

Avance - Al. Cuauhtémoc 2020
 Avance - Al. Venustiano Carranza 2020

Mes

Unidades Habitacionales Beneficiadas RIPUH 2020

44

Unidades habitacionales beneficiadas año 2020

39 UNIDADES HAB.
TERMINADAS

05 UNIDADES HAB. EN





PROSOC | Seguimiento de indicadores

Unidades Habitacionales Beneficiadas RIPUH 2021 100.00% 77.14% 75.00% 62.86% 61.43% Porcentaje de avance 46.92% 50.00% 28.46% 25.00% 12.69% 6.25% 5.38 0.00% 0.00 0.00% mayo junio agosto septiembre Avance - Al. Cuauhtémoc 2021 Avance- Al. Venustiano Carranza 2021

19

Unidades habitacionales beneficiadas año 2021

- 12 en Al. Cuauhtémoc
- 07 en Al. Venustiano Carranza

04 UNIDADES HAB. EN PROCESO OBRA

07 UNIDADES HAB. POR INICIAR

08 UNIDADES HAB. POR TERMINADAS



Fideicomiso Centro Histórico





FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021.

CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH - FCHCM	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO SAN JUAN DE DIOS	65 Suspensión temporal	65 Suspensión temporal	SEPTIEMBRE 2021
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO DE SANTA CATARINA	53 Suspensión temporal	53 Suspensión temporal	DICIEMBRE 2021





FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 - 2021.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA	AVANCE FISICO	AVANCE FÍSICO	TERMINACIÓN
FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM	ANTERIOR (%)	ACTUAL (%)	PROGRAMADA
REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO	95	95	JULIO 2021
PÚBLICO Y CULTURAL 'JARDÍN REGINA' . REGINA No. 40,	En espera de	En espera de	
CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	pago	pago	
SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B.	20	23	ENERO 2022





FCH | Obras en Proceso. Convenio de Participación Conjunta Fideicomiso F/54 - FCHCM.







Instalación de nomenclaturas de calle.





FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021.

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS	AVANCE FISICO	AVANCE FÍSICO	TERMINACIÓN
FCHCM - AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO	ANTERIOR (%)	ACTUAL (%)	PROGRAMADA
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA REJA PERIMETRAL EN EL TEMPLO MAYOR.	15	18	SEPTIEMBRE 2021





FCH | Obras en Proceso. Rehabilitación de Espacios Arqueológicos.





Actividades de desmontaje de elementos de reja anterior y preparación de base.







FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN PARA	AVANCE FISICO	AVANCE FÍSICO	TERMINACIÓN
AYUDAS SOCIALES.	ANTERIOR (%)	ACTUAL (%)	PROGRAMADA
FACHADAS: OBRAJE No. 7, LAS CRUCES No. 5, RIVA PALACIO No. 45, RIVA PALACIO No. 46-48 y RIVA PALACIO No. 52.	10.84	20	OCTUBRE 2021









FCH | **Obras en Proceso. Ayudas Sociales.**



Riva Palacio No. 46-48. Reintegración de aplanados.



Obraje 7. Reintegración de aplanados.



Riva Palacio No. 52. Liberación de aplanado incompatible con fábrica original.





FCH | Obras en Proceso. Ayudas Sociales.



Las Cruces No. 5. Consolidación de marcos y cornisas de cantera.



Riva Palacio No 45. Reintegración de aplanados.



Riva Palacio No. 45. Erradicación de flora parásita en elemento ornamental.

AYUDAS SOCIALES - FACHADAS.








MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA


FCH | Seguimiento de Indicadores

59% avance global marzo - septiembre



Proyecto terminadoT. Santísima Trinidad

59% avance global junio - septiembre



Proyecto terminadoMantenimiento Corredor San Jerónimo






FCH | Seguimiento de Indicadores

15%

avance

junio - septiembre



Construcción de nueva reja perimetral en el Templo Mayor

02 Proyectos terminados

- Escalera de acceso al templo de Ehécatl
 Mantanimiento y rababilitación a vantana
- Mantenimiento y rehabilitación a ventanas arqueológicas en Rep. de Argentina

20%

avance

julio - septiembre



01 Proyecto en proceso

 Fachadas en Fachadas: Obraje 7, Las Cruces 5, Riva Palacio 46-48 y Riva Palacio 52



Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la CDMX





ILIFE | Indicadores

Porcentaje de Próximo
Tema Inmueble Periodicidad Al 1/10 reporte

Mensual 2 de noviembre

Rehabilitación de Inmuebles escolares en el Centro Histórico


Escuela Secundaria Adriana García Corral (Tercera etapa)

97 %





ILIFE | Seguimiento de Indicadores



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO ROSARIO CASTELLANOS CAMPUS JUSTO SIERRA
 SECUNDARIA ADRIANA GARCIA CORRAL (TERCERA ETAPA)

99% avance global

enero - septiembre

02 Proyectos terminados

- Escuela Primaria Francisco
 González Bocanegra /enero 2021.
- Instituto de Educación Superior de la Ciudad de México Rosario Castellanos, Campus Justo Sierra

01 Proyecto en obra

• Escuela Secundaria Adriana García Corral (Tercera etapa).

Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)





C5 | Indicadores

Indicador	Periodicidad	17/09 al 01/10	Próximo reporte
No. cámaras con falla o intermitencia		03 cámaras	
	Quincenal		19 de octubre
Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura		01 cámara	






C5 | Seguimiento de indicadores

199


enero - septiembre


Cámaras con falla o intermitencia



35

enero - septiembre









SSC Tránsito







SSC Tránsito | Indicadores

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	21/09 al 01/10	Próximo reporte
Semáforos	Número de semáforos con mantenimiento preventivo		7	
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo	Quincenal	47	19 de octubre
Cámaras	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		0	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo		0	








SSC Tránsito | Anexo de Indicadores

CORRECTIVO						
ACOMETIDA	1					
APAGADO	8					
CORTO	7					
DESINSTALACION	1					
DESORIENTADO	5					
FOCO FUNDIDO	4					
FY-CINTILANTE	9					
MEMORIA DAÑADA	4					
PEATON APAGADO	1					
REINSTALACION	3					
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	4					
PREVENTIVO						
LIMPIEZA DE COMPONENTES	7					
TOTAL GENERAL 54						

MANTENIMIENTO SEMAFORICO

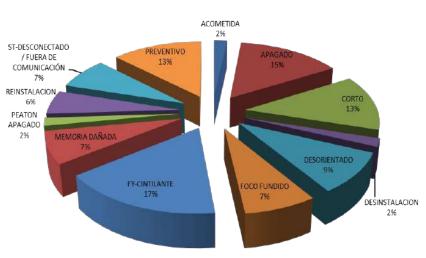






SSC Tránsito | Seguimiento de indicadores - enero a septiembre 2021


137

enero - septiembre

1,153

enero - septiembre













Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia





ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero a septiembre 2021

93% atención

ATIENDE	Atendido	Proceso	Suma total
ACH	23	3	26
Al. Cuauhtémoc	5	2	7
C5	3	1	4
CFE	5		5
CONAVI	1		1
FCH	1		1
INAH	1		1
INBAL	1		1
METRO	1		1
SACMEX	14		14
SEDEMA	27		1
SEDUVI	2		2
SOS-AP	1		1
SOS-DGCOP	2		2
SOS-DGOIV	14		14
SOS-DGSUS	6		6
Telmex	1		1
Tránsito	3		3
Suma total	85	6	91

211









ACH | Seguimiento a turnos ATENDIDOS

CLAVE =	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	= SOLICITUD =	ATIENDE +	EVIDENCIA	∓ ES	TATUS	▼ OBSERVACIONES ∓
TCH-070	24/08/2021	АСН	En cumplimiento del acuerdo de la Jefa de Gobierno y Erika Santillán con vecinos, se realice el balizado y la señalización del carril compartido de la acera oriente de Balderas y se informe en la Mesa	SOS-DGOIV		Α	Atendido	24/08. El Arq. Daniel Ruvalcaba de la DGOIV está gestionando con SEMOVI el boletín del refuerzo de la señalización También se comentó con el Ing. Luis Ruíz para que se acelere el proceso de la emisión del boletín Tras una medición de flujo vehicular por varias semanas, la Dirección General de Ingeniería de Tránsito determinó que no se requiere un balizado adicional a la señalización vertical existente
TCH-090	21/09/2021	SOS-AP	Gestione con SSC se refuerce vigilancia en Avenida Juárez y la calle de Dolores, donde se violenta la caja de controles de alumbrado público por los ambulantes para conectarse.	ACH-MR		А	Atendido	Se atendió a través de la Mesa de Reordenamiento. La Dirección de Alumbrado Público subió los conectores a una altura de más de 3 m para evitar manípulación de externos





ACH | Seguimiento a turnos EN PROCESO

CLAVE =	FECHA DE MESA	SOLICITANTE =	SOLICITUD =	ATIENDE =	EVIDENCIA =	ESTATUS	T OBSERVACIONES =
TCH-076	24/08/2021	ACH	ACH realizará la solicitud por oficio a petición de vecinos al C5 para la colocación de botón de pánico en Leona Vicario y Lecumberri.	CS		Proceso	Se solicitó mediante escrito ACH/CG/085/2021 de fecha 24 de agosto de 2021 Se le proporcionó copia al Ing Jorge Orozco que es nuestro enlace en la Mesa para que nos apoye con el seguimiento a la respuesta
TCH-079	02/09/2021	Reunión Vippsc 1	Se atienda la falla en el alumbrado público en la calle de Valerio Trujano de Av. Hidalgo a Paseo de la Reforma	Al. Cuauhtémoc		Proceso	Se habilitó el 15% de las luminarias de la acera oriente, la acera poniente continúa apagada en su totalidad
TCH-080	02/09/2021	Reunión Vippsc 1	Se atienda apuntalamiento en el predio de Violeta No. 62	Al. Cuauhtémoc		Proceso	-El miércoles 8 de agosto se contactó a la vecina -Se generó folio SUAC -ACH compartió el reporte al Ing. Fernando Corso del Área de Protección Civil de la Alcaldía -El dictamen está en proceso. La vecina Ma. Cristina tiene cita el lunes 27/09 -Se realizó la solicitud a la Alcaldía por oficio
TCH-081	02/09/2021		Se reforesten las jardineras de Santa Veracruz que aun quedan pendientes	ACH		Proceso	-La ACH a condiciona las jardineras -Se retiró cascajo y concreto de la jardinera en Santa Veracruz casi esquina 2 de abril y se sembró árbol tipo astronómica - Se retiró cascajo de las demás y se limpiaron, continúa el proceso de demolición de concreto -SEDEMA trabaja en la zona y esta semana se terminarán los trabajos, antes del 09 de octubre
TCH-083	07/09/2021	Tránsito	Reactivar comunicación con ADIP para dar seguimiento al funcionamiento de semáforos en calle República de Brasil	ACH		Princesto	Se solicitó copia del oficio que dirigieron a ADIP para apoyarlos con el seguimiento En espera de que Tránsito realice el ingreso formal
TCH-089	07/09/2021	Al. Venustiano Carranza	Acompañamiento para trámites de obra de un Presupuesto Participativo en calle San Ciprián y alrededores del perímetro B	ACH		Proceso	La Alcaldía aún está en licitaciones, en cuanto estén listos notificarán para darle seguimiento a sus solicitudes.









ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero a septiembre 2021

87% atención

Matriz de Incidencias	ESTATUS			
Dependencia	Atendido	En proceso	Pendiente	Suma total
ACH	58		9	67
ADIP	1		2	3
Al. Cuauhtémoc	113	2	19	134
C5	3			3
CFE	256		47	303
SACMEX	171	5	22	198
SEDEMA	1			1
SGIRyPC	3		1	4
SOS-AP	92	1	1	94
SOS-DGOIV	36		8	44
SOS-DGSUS	52			52
STC-Metro	2			2
TELMEX	22		13	35
Tránsito	58		4	62
Suma total	868	8	126	1002





Atención VIPPSC | Incidencias ATENDIDAS - del 26 de septiembre al 04 de octubre 2021

CLAVE	REPORTA	FECHA DE REPORTE	soucitud =	CALLE	ENTRE CALLE 1	ATTENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	POTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH:975	V3 - Santo Domingo -	27/9/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dariados	Donceles -	Palma .•	- SACMEX			Atendido
IUCH-977	VI - Santa Meria la Redonda	28/9/2021	Falta de luz al interior de los inmuebles	Soledad -	: š	CFE	er .		Atendido
IUCH-978	VI - Santa María Is Redonda	28/9/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o danados	2 de abril	Pensador Mexicano	- ACH			Atondido
IUCH-982	V5 - Zócalo -	29/5/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Uruguay	Eje Central	- SACMEX			Atendido









Atención VIPPSC | Incidencias ATENDIDAS - del 26 de septiembre al 04 de octubre 2021

CLAVE	REPORTA	FECHA DE REPORTE	soucitub	CALLE	ENTRE CALLE 1	ATTEMDE	FOTOGRAFIA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS	7
IUCH 984	V2 - Callojon del 57 - Plazo de la + Concepción	29/9/2021	Fallas en alumbrado público, - apagories y fallas en el voltaje	Mariana Rodríguez Del - Toro	: 18	SOS AP			Atendido	30
IUCH-984	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	29/9/2021	Fallas en alumbrado publico, apagones y fallas en el voltaje	Las Cruces -	Venustiano Carranza	SOS-AP			Atendida	2002
IUCH-985	VZ - Callopin del S7 - Plaza de la + Concepción	29/9/2021	Faita de luz al interior de los - inmuebles	Mariana Rodriguez Del - Toro	18	CFE	-		Atendido	2
IUCH-986	VI - Santa-Maria la Redonda	30/9/2021	Fuga de gas +	Héroes del 57	Violeta +	SGIRYPC			Atendido	246





Atención VIPPSC | Incidencias ATENDIDAS - del 26 de septiembre al 04 de octubre 2021

CLAVE =	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	*	ENTRE CALLE 1	Ŧ	ATTENDE	FC	TOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-990	V4 - Alameda-Sector Financiero	30/9/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Uruguay	+	Eje Central	292	SACMEX	Ť			Atendido
ЮСН-993	V3 - Santo Domingo -	30/9/2021	Fatta de luz al Interior de los – Inmuebles	República de Honduras	×			CFE	×			Atendido
IUCH-99S	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	30/9/2021	Fallas en alumbrado público, apasgones y fallas en el voltaje	Las Cruces		Venustiano Carranza	2002	SOS AP	ä			Atendido
IUCH-596	V≤ Zócalo	V10/2021	Falta de luz al interior de los – inmuebles	5 de febrero		Piaza de la Constitución		CFE				Atendido









217

Atención VIPPSC | Incidencias ATENDIDAS - del 26 de septiembre al 04 de octubre 2021

CLAVE	REPORTA	FECHA DE REPORTE	* soucrivo	CALLE	ENTRE CALLE 1	ATTENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1000	V6 - Antigua Merced - Mixcalco	\/10/2021	Tiraderos de basura	Vidal Alcocer	- Miguel Alemán -	SOS-DGSUS -			Atendido
IUCH-1001	V6 - Antigua Merced - Mixcalco	V10/2021	Tiraderos de basura	Vidal Alcocer	Emiliano Zapata	sos-pasus -			Atendido
IUCH-1005	V3 - Santo Domingo -	2/10/2021	Fallas en alumbrado público, abagenes y fallas en el voltaje	República de Colombia	, República de Brasil	SOS-AP •			Atendido
IUCH-1006	Vš - Santo Domingo	2/10/2021	Faita de luz al interior de los - inmuebles	República de Bolivia		CFE •			Atendiida





Atención VIPPSC | Incidencias EN PROCESO - del 26 de septiembre al 04 de octubre 2021

CLAVE	REPORTA =	FECHA DE REPORTE	T SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ATTENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS =	ESTATUS	Prioridad =
IUCH-976	VI - Santa Maria la Redonda	27/9/2021	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Cda. de Camelia	+ Carnelia +	SACMEX			En Proceso	Se atendió el desazolve, hay un problema con el drenaje interior del inmueble, la alcaldia quedo de atenderlo, hay que retomario con la nueva administración.



219









Atención VIPPSC | Incidencias PENDIENTES - del 26 de septiembre al 04 de octubre 2021

CLAVE =	REPORTA =	FECHA DE REPORTE	T SOLICITUD =	CALLE	ENTRE CALLE 1	REFERENCIA =	ATIENDE	▼ FOTOGRAFÍA ANTES ▼	ESTATUS T
IUСН-972	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	27/9/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Uruguay	▼ Talavera •	Frente a FEDEX	SACMEX		Pendiente •
IUCH-973	VI - Santa María la Redonda	27/9/2021	Mal estado de cables o equipamiento	Parque Pedro Moreno	Paseo de la Reforma		CFE		Pendiente •
IUCH-979	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	28/9/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Uruguay	- Jesús Maria -		CFE		Pendiente •





Atención VIPPSC | Incidencias PENDIENTES - del 26 de septiembre al 04 de octubre 2021

CLAVE =	REPORTA ₹	FECHA DE REPORTE	y SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	ESTATUS	7
IUCH-980	V7 - Vizcainas-Corredor → Cultural Regina	28/9/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	• Bolivar	▼ San Jerónimo →	Esquina	ACH		Pendiente	34(
IUCH-981	V8 - San Pablo ▼	29/9/2021	Baches	• Topacio	Fray Servando Teresa de Mier		Al. Cuauhtémoc		Pendiente	*
IUCH-982	V7 - Vizcaínas-Corredor ▼ Cultural Regina	29/9/2021	Baches	Çion. de San Salvador	▼ 5 de febrero →		Al. Cuauhtémoc		Pendiente	٠
UCH-984	V5 - Zócalo ▼	29/9/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República del Salvador	José Maria Pino Suárez		Telmex		Pendiente	22









Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia





Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

