



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Inicio de la transmisión en vivo

23 DE JULIO 2019



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Orden del día

- Reportes
- Turnos e incidencias urbanas (VIPPPSC-SUAC)
- Mesas de trabajo
- Asuntos generales
- Acuerdos
- Asistencia



ACH

| Tema | Línea base | Periodicidad | Semana al 16/07 | Semana al 22/07 | Próximo reporte |
|---------------------------------|--|--------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Tiraderos clandestinos | Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH | Semanal | 1,242 m ³ | 1,248 m ³ | 30 de julio |
| Limpieza | Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido) | Semanal | 2,385 m ³ | 2,301 m ³ | 30 de julio |
| Mantenimiento a infraestructura | Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas | Semanal | 29 | 23 | 30 de julio |



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en las calles de **Regina, Av. Hidalgo, Donceles, República de Brasil, Moneda, República de Argentina y Jardín del Obispo.**

Los trabajos realizados consistieron en **reparación de arroyo vehicular** en Av. Hidalgo y en Donceles, **reparación de banquetas** en Regina, Donceles y República de Brasil, **retiro de bases de papeleras y bases de bancas** en Regina, **retiro de espárragos** en Regina, **colocación de 2 bolardos** en Moneda, **reposición de tapa de registro** en República de Argentina y **retiro de malla** en Jardín del Obispo.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



ACH

Eliminación de grafiti

Calles atendidas: **33**

Cortinas metálicas: **3**

Fachadas: **8**

M² totales: 116

*La mayoría son reincidencias

31
M²
de cortinas



73
M²
de fachadas



12
M²
retirados con
thiner





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

ACH

Eliminación de grafiti en inmuebles catalogados

Templo de San Miguel Arcángel

(Av. 20 de Noviembre esquina José María Izazaga)

- El primer procedimiento que se está utilizando es a base de un gel desincrustante, se deja actuar 30 minutos, se talla con cepillo de ixtle y por último se enjuaga con agua a baja presión
- Se terminó de limpiar el Templo.

Templo de Tlaxcoaque - (Plaza Tlaxcoaque)

- Se realizaron pruebas con supervisión del INAH, utilizando el método de gel y el de esferas de carbonato, lanzadas en espiral. Se esta en espera de la respuesta del INAH.

Tacuba

- Se inició en inmuebles que no son catalogados con gel desincrustante.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



Antes



Después



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Alc. Cuauhtémoc

| Tema | Línea base | Periodicidad | Semana al 09/07 | Semana al 16/07 | Semana al 22/07 | Observaciones |
|------------|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Luminarias | Número de Luminarias reparadas en vías secundarias en PB de Cuauhtémoc | Semanal | 66 | 54 | 126 | Revisión a 180 luminarias |
| Poda | Número de sujetos forestales podados | Semanal | 49 | 30 | 23 | Poda a 53 sujetos forestales |



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Alc. Cuauhtémoc

| Tema | Línea base | Periodicidad | Semana al 09/07 | Semana al 16/07 | Semana al 22/07 | Observaciones |
|-----------------------------|---|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|--|
| Desazolve | Red de drenaje desazolvada en PB de Cuauhtémoc (m lineales) | Semanal | 586 | 122 | 149 | Desazolve de 271 metros lineales de desazolve, 42 rejillas de piso, 27 coladeras de banqueta y 25 registros |
| Limpia (Colecta de solidos) | Escuelas limpias y toque de campana | Semanal | 262 | 267 m ³ | 260 m ³ | 527 m ³ de residuos sólidos (48 m ³ de residuos orgánicos y 479 m ³ de inorgánicos) |



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Alc. Cuauhtémoc

Reporte de luminarias reparadas

Del 09 al 22 de julio

| REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC | | | | | |
|--|--------------------|---------------|-------------|----------|--------|
| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | | COLONIA | CANTIDAD | MOTIVO |
| PEÑA Y PEÑA | GONZALEZ ORTEGA | FLORIDA | CENTRO III | 10 | |
| MANUEL DOBLADO # 70 | J.J HERRERA | LECUMBERRI | CENTRO III | 1 | |
| SAN MIGUEL | FRAY SERVANDO | IZAZAGA | CENTRO VI | 9 | |
| ESCUELA MEDICO MILITAR | SAN PABLO | FRAY SERVANDO | CENTRO VI | 16 | |
| VICTORIA | REVILLAGIGEDO | BALDERAS | CENTRO VIII | 18 | |
| SAN JERONIMO | ISABEL LA CATOLICA | 5 DE FEBRERO | CENTRO V | 30 | |
| PLAZA SANTO DOMINGO | GONZALEZ OBREGON | REP.CUBA | CENTRO IV | 30 | |
| PLAZA SANTA CATARINA | REP.BRASIL | REP.HONDURAS | CENTRO I | 17 | |
| PLAZA JUAN JOSE BAEZ(PLAZA AGUILITA) | MISIONEROS | RAMON CORONA | CENTRO VII | 19 | |
| PLAZA LORETO | JUSTO SIERRA | SAN ILDEFONSO | CENTRO II | 30 | |
| | | | TOTAL | 180 | |



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Alc. Cuauhtémoc

Reporte de desazolve
Del 09 al 22 de julio

| REPORTE DE DESAZOLVES REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC | | | | | |
|--|-----------------------|------------------|------------|----------|----------------------------|
| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | | COLONIA | CANTIDAD | OBSERVACIONES |
| MOTOLINIA | MADERO | 16 DE SEPTIEMBRE | CENTRO IV | 60 MTS | |
| TORRES QUINTERO | PLAZA TORRES QUINTERO | REP.BOLIVIA | CENTRO II | 22 MTS | |
| SAN PABLO # 32 | TOPACIO | ROLDAN | CENTRO VII | 12 MTS | |
| REP.ECUADOR # 105 | REP.BRASIL | REP.ARGENTINA | CENTRO I | 8 MTS | |
| LAZARIN DEL TORO # 16 | REP. CHILE | ALLENDE | CENTRO IV | 6 MTS | VIERNES 12 07/2019 108 MTS |
| GIRON | PLAZA DEL ESTUDIANTE | RODRIGUEZ PUEBLA | CENTRO II | 8 MTS | |
| CORREO MAYOR | SAN PABLO | REP DEL SALVADOR | CENTRO V | 6 MTS | |
| DONCELES | EJE CENTRAL | REP.ARGENTINA | CENTRO IV | 90 MTS | |
| REP. ARGENTINA | REP.COLOMBIA | REP.VENEZUELA | CENTRO II | 32 MTS | |
| CIRCUNVALACION | SOLEDAD | ZAPATA | CENTRO VII | 3 MTS | |
| APARTADO | REP.ARGENTINA | REP.BRASIL | CENTRO II | 4 MTS | |
| FRAY SERVANDO # 344 | TOPACIO | SANTO TOMAS | CENTRO VI | 20 MTS | |
| | | | TOTAL | 271 | |



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Alc. Cuauhtémoc

Reporte de podas
Del 09 al 22 de julio

| REPORTE DE PODAS REALIZADOS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|---------------|
| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | | COLONIA | CANTIDAD | OBSERVACIONES |
| PLAZA SAN LUCAS | CION DEL HORMIGUERO | SAN MIGUEL | CENTRO MERCED | 7 | |
| JARDIN SANTIAGO | TRES CULTURAS | FLORES MAGON | JORNADA (TERRITORIAL TLAHELCO | 7 | |
| CIRCUNVALACION # 105 127 407,503 Y 505 | MIXCALCO | MERCED | CENTRO MERCED | 6 | |
| CION DE MIXCALCO # 42 | MIGUEL ALEMAN | LECUMBERRI | CENTRO MERCED | 6 | |
| 5 DE FEBRERO # 111 | NEZAHUALCOYOTL | FRAY SERVANDO T | CENTRO CENTRO | 2 | |
| PLAZA DE CONSTITUCION | REP.GUATEMALA | SEMINARIO | CENTRO CENTRO | 2 | |
| EL CARMEN | REP.BOLIVIA | REP.COLOMBIA | CENTRO ORIENTE | 7 | |
| REP.ARGENTINA | REP.COLOMBIA | REP.VENEZUELA | CENTRO ORIENTE | 4 | |
| MANUEL OTHON | AURRERA | | OBRERA | 9 | |
| SAN ILDEFONSO | EL CARMEN | REP.ARGENTINA | CENTRO ORIENTE | 2 | |
| PLAZA SAN SALVADOR EL SECO | BOLIVAR | CDA DE NEZAHUALCOYOTL | CENTRO CENTRO | 1 | |
| | | | TOTAL | 53 | |



Alc. Venustiano Carranza

| Tema | Línea base | Periodicidad | Semana al 09/07 | Semana al 22/07 | Observaciones |
|------------------------|---|--------------|----------------------|--------------------|--|
| Luminarias | Número de Luminarias reparadas en vías secundarias | Quincenal | 23 | 2 | |
| Tiraderos clandestinos | Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base: 26 tiraderos) m ³ | Quincenal | 951.7 m ³ | 960 m ³ | Se recolectaron 31.2 toneladas diariamente |
| Desazolve | Red de drenaje desazolvada en PB de Al. Venustiano Carranza (m lineales) | Semanal | -- | 7,800 | De marzo a la fecha |



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Alc. Venustiano Carranza

Reporte de luminarias reparadas

Del 09 al 22 de julio

| REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA | | | | | |
|---|--------------|--|----------|----------|---------------|
| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | | COLONIA | CANTIDAD | MOTIVO |
| ADOLFO GURRION 124 | | | CENTRO I | 1 | MANTENIMIENTO |
| GENERAL ANAYA | ROSARIO | | CENTRO I | 1 | MANTENIMIENTO |
| | | | TOTAL | 2 | |



Alc. Venustiano Carranza

Reporte de tiraderos clandestinos

Del 09 al 22 de julio

| RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------------|---------------|--------|
| Nº. CONSECUTIVO | UBICACIÓN | TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS % | CANTIDAD TONS | SECTOR |
| 01 | MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA | 90% BASURA 10% CASCAJO | 1.25 | S-1 |
| 02 | EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS | 90% BASURA 10% CASCAJO | 2.5 | S-1 |
| 03 | AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACAZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN | 85% BASURA 15% CASCAJO | 1.25 | S-2 |
| 04 | ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN | 85% BASURA 15% CASCAJO | 1 | S-2 |
| 05 | NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER | 85% BASURA 15% CASCAJO | 1 | S-2 |
| 06 | COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER | 85% BASURA 15% CASCAJO | 1.25 | S-2 |
| 07 | PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER | 85% BASURA 15% CASCAJO | 0.5 | S-2 |
| 08 | VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS | 85% BASURA 15% CASCAJO | 2 | S-2 |
| 09 | AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASCAJO | 2 | S-9 |
| 10 | AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASCAJO | 1 | S-9 |
| 11 | AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASCAJO | 1.25 | S-9 |
| 12 | JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASCAJO | 0.2 | S-9 |
| 13 | SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASCAJO | 0.5 | S-9 |

| RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------------|---------------|--------|
| Nº. CONSECUTIVO | UBICACIÓN | TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS % | CANTIDAD TONS | SECTOR |
| 14 | ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASCAJO | 0.5 | S-9 |
| 15 | AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASCAJO | 2 | S-9 |
| 16 | AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASCAJO | 2 | S-9 |
| 17 | JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASCAJO | 0.5 | S-9 |
| 18 | CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASCAJO | 0.2 | S-9 |
| 19 | GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASCAJO | 0.3 | S-9 |
| 20 | JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASCAJO | 2.5 | S-9 |
| 21 | CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO | 80% BASURA 20% CASCAJO | 0.2 | S-9 |
| 22 | PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO | 80% BASURA 20% CASCAJO | 0.5 | S-9 |
| 23 | TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASCAJO | 2.8 | S-9 |
| 24 | TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASCAJO | 3 | S-9 |
| 25 | AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO | 80% BASURA 20% CASCAJO | 0.5 | S-9 |
| 26 | JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO | 80% BASURA 20% CASCAJO | 0.5 | S-9 |

Dirección General de Agua Potable



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS


SACMEX

| Tema | Línea base | Periodicidad | Reporte al 23/07 | Próximo reporte |
|---------------------------------|---|--------------|------------------|-----------------|
| Obras en Antigua Merced | Porcentaje de avance físico real | Semanal | 85.37% ▼ | 06 de agosto |
| Obras en Antigua Merced | Porcentaje de avance físico programado | Semanal | 98.05% | 06 de agosto |
| Obras en Santa María la Redonda | Porcentaje de avance físico real | Semanal | 37.41% ▼ | 06 de agosto |
| Obras en Santa María la Redonda | Porcentaje de avance físico programado | Semanal | 60.66% | 06 de agosto |

Agua potable



Sustitución de redes de agua potable y drenaje en las Colonias Centro y Guerrero. Sustitución de tubería de 152 mm (6") de diámetro de agua potable y tuberías de 0.38 m de diámetro de polietileno de alta densidad, sobre la calle **Soledad** entre las calles de Correo Mayor y eje 1 Ote., Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.

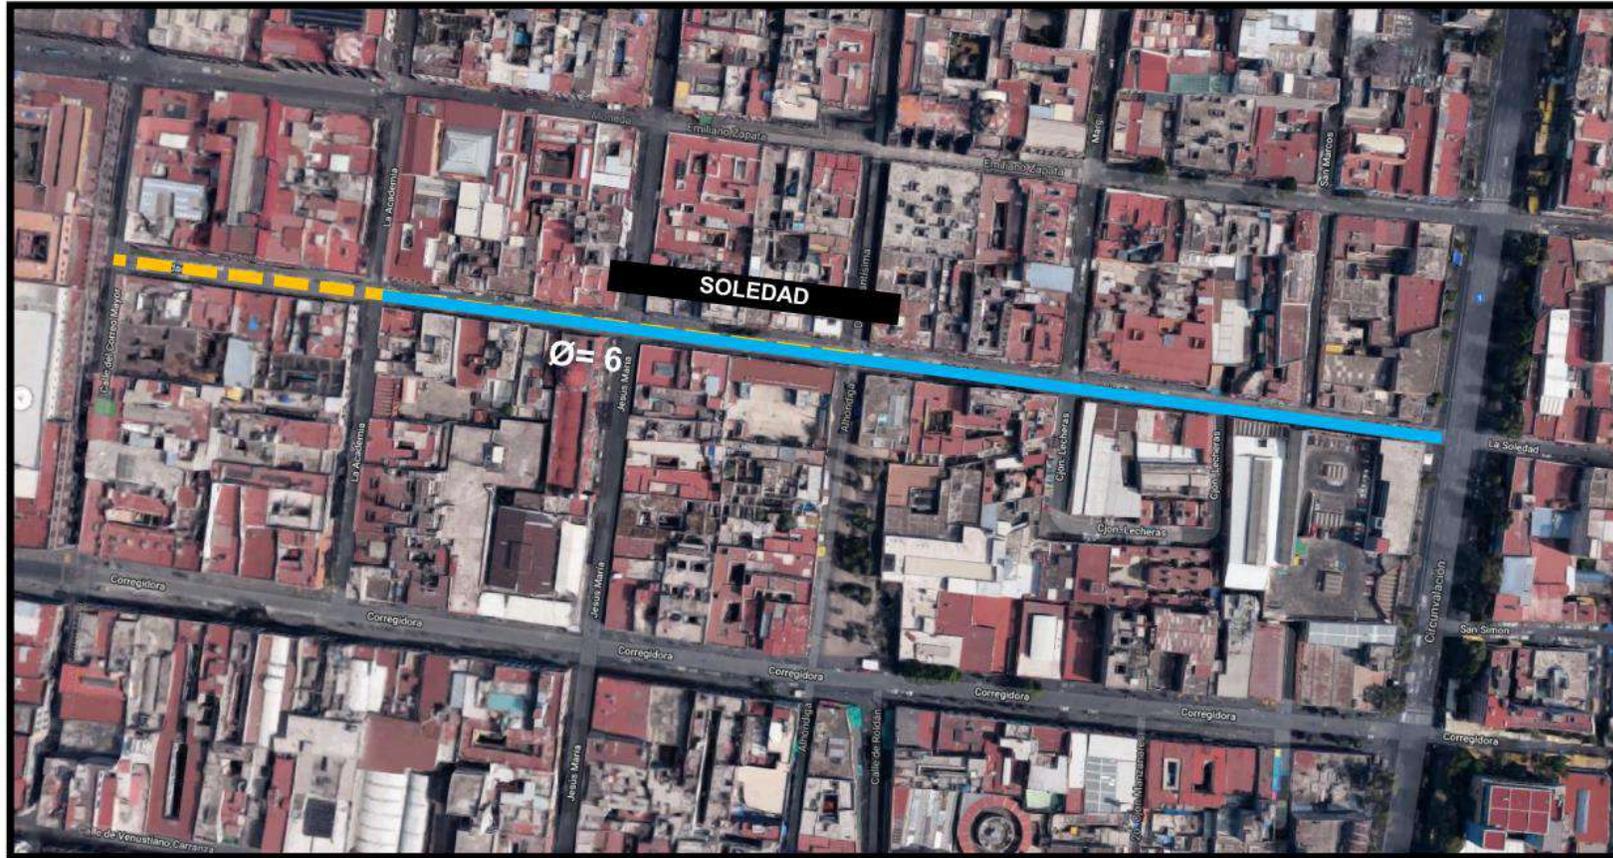

Tubería Existente



572.00 m.

Avance Real.

71.25 %

Tubería Instalada



430.00 m.

Avance Programado.

96.70 %

Drenaje



Sustitución de redes de agua potable y drenaje en las Colonias Centro y Guerrero. Sustitución de tubería de 152 mm (6") de diámetro de agua potable y tuberías de 0.38 m de diámetro de polietileno de alta densidad, sobre la calle **Soledad** entre las calles de Correo Mayor y eje 1 Ote., Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.



| | | | | |
|-------------------|---|-----------|--------------------|---------|
| Tubería Existente |  | 529.00 m. | Avance Real. | 71.25 % |
| Tubería Instalada |  | 438.00 m. | Avance Programado. | 96.70 % |



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

Agua potable



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Rehabilitación y/o Sustitución de redes de agua potable y drenaje en las Colonias Centro y Guerrero. Sustitución de tubería de 152 mm (6") de diámetro de agua potable y sustitución de tubería de 0.38 m y 0.45 m de diámetro de drenaje de polietileno de alta densidad, sobre la Calle de **Leona Vicario** entre las calles de Gral. Miguel Alemán y Soledad, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.

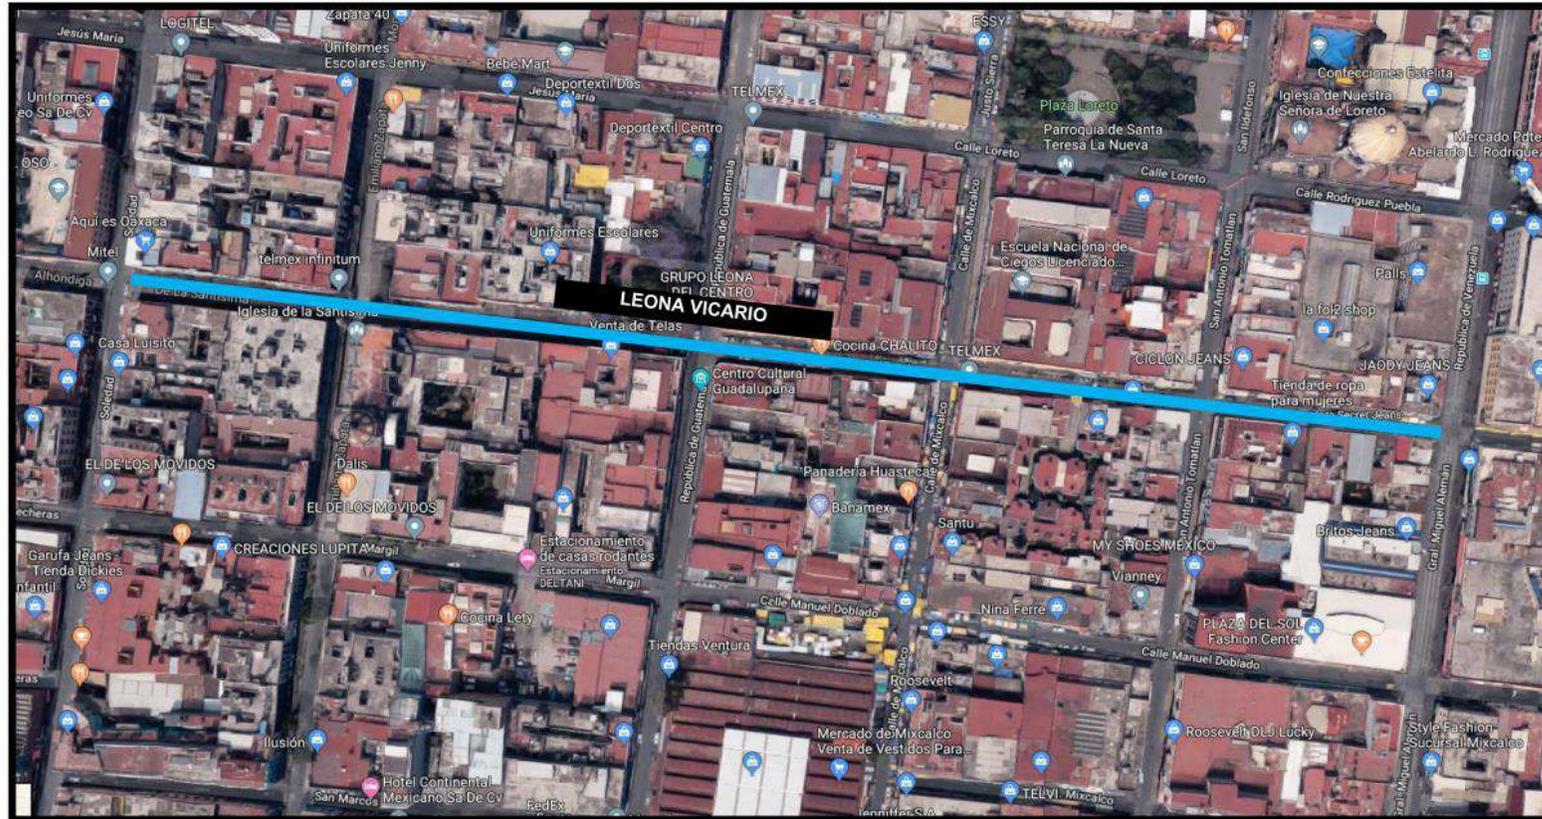

| | | | | |
|-------------------|---|-----------|--------------------|---------|
| Tubería Existente |  | 539.00 m. | Avance Real. | 99.50 % |
| Tubería Instalada |  | 539.00 m. | Avance Programado. | 99.40 % |



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

Drenaje



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Rehabilitación y/o Sustitución de redes de agua potable y drenaje en las Colonias Centro y Guerrero. Sustitución de tubería de 152 mm (6") de diámetro de agua potable y sustitución de tubería de 0.38 m y 0.45 m de diámetro de drenaje de polietileno de alta densidad, sobre la Calle de **Leona Vicario** entre las calles de Gral. Miguel Alemán y Soledad, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.



Tubería Existente



499.00 m.

Avance Real.

99.50 %

Tubería Instalada



499.00 m.

Avance Programado.

99.40 %



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Agua potable



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Sustitución de tubería de 305 mm. (12"), 152 mm. (6") y 101 mm. (4") de diámetro de agua potable y Sustitución de tuberías de 0.38, 0.45 y 0.61 m. de diámetro de drenaje de polietileno de alta densidad, sobre las calles **Mina**, Galeana, Riva Palacio y Violeta, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.



| | | | | |
|-------------------|---|------------|--------------------|---------|
| Tubería Existente |  | 1108.00 m. | Avance Real. | 43.70 % |
| Tubería Instalada |  | 577.00 m. | Avance Programado. | 80.09 % |



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



Drenaje



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Sustitución de tubería de 305 mm. (12"), 152 mm. (6") y 101 mm. (4") de diámetro de agua potable y Sustitución de tuberías de 0.38, 0.45 y 0.61 m. de diámetro de drenaje de polietileno de alta densidad, sobre las calles **Mina**, Galeana, Riva Palacio y Violeta, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.



| | | | | |
|-------------------|--|------------------|--------------------|----------------|
| Tubería Existente | | 852.00 m. | Avance Real. | 43.70 % |
| Tubería Instalada | | 302.40 m. | Avance Programado. | 80.09 % |



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



Agua potable



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Sustitución de tubería de 152 mm. (6") de diámetro de Agua Potable y Sustitución de tuberías de 0.38, 0.45 y 0.61 m. de diámetro de Drenaje de polietileno de alta densidad, sobre las calles **Santa Veracruz**, 2º y 3er. Callejón San Juan de Dios, Valerio Trujano, Plaza 2 de Abril, Andador Teatro Blanquita y Pensador Mexicano, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.



| | | | | |
|-------------------|---|------------|--------------------|---------|
| Tubería Existente |  | 1217.00 m. | Avance Real. | 31.12 % |
| Tubería Instalada |  | 564.50 m. | Avance Programado. | 41.23 % |

Drenaje



Sustitución de tubería de 152 mm. (6") de diámetro de agua potable y Sustitución de tuberías de 0.38, 0.45 y 0.61 m. de diámetro de drenaje de polietileno de alta densidad, sobre las calles **Santa Veracruz, 2º y 3er. Callejón San Juan de Dios, Valerio Trujano, Plaza 2 de Abril, Andador Teatro Blanquita y Pensador Mexicano, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.**



| | | | | |
|-------------------|---|------------|--------------------|---------|
| Tubería Existente |  | 1268.00 m. | Avance Real. | 31.12 % |
| Tubería Instalada |  | 480.00 m. | Avance Programado. | 41.23 % |



SOS-Alumbrado Público

| Tema | Línea base | Periodicidad | Semana al 16/07 | Semana al 22/07 | Próximo reporte |
|-------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Alumbrado Público | Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH | Semanal | 49 | 70 | 30 de julio |
| Alumbrado Público | Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH | Semanal | 0 | 0 | 30 de julio |



SOS-Alumbrado Público

| REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTORICO PERIMETRO A | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|---------|-----------|---|---------------------------|
| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | | COLONIA | CANTIDAD | MOTIVO | INCIDENCIA |
| Templo de San Juan de Dios | Av. Hidalgo | Santa Veracruz | CENTRO | 4 | SE REALIZA CAMBIO DE BALASTRO | LUMINARIO APAGADO |
| Av. Hidalgo | Av. Paseo de la Reforma | Trujano | CENTRO | 18 | SE REALIZA RECONEXIÓN DE LINEAS DE ALIMENTACIÓN | CIRCUITO APAGADO |
| Belisario Domínguez | República de Brasil | República de Argentina | CENTRO | 11 | SE REALIZA RECONEXIÓN DE LINEAS DE ALIMENTACIÓN | LUMINARIO APAGADO |
| República de Perú | Allende | República de Chile | CENTRO | 1 | SE CAMBIA LAMPARA | LUMINARIO APAGADO |
| Av. Hidalgo | Dr. Mora | Angela Peralta | CENTRO | 1 | SE CIERRA TAPA DE LUMINARIA ABIERTA | TAPA DE LUMINARIA ABIERTA |
| República de Argentina | República de Bolivia | República de Colombia | CENTRO | 1 | SE CAMBIA LAMPARA | LUMINARIO APAGADO |
| San Jerónimo | Correo Mayor | José Ma. Pino Suárez | CENTRO | 11 | SE REALIZA RECONEXIÓN DE LINEAS DE ALIMENTACIÓN | CIRCUITO APAGADO |
| Mesones | Las Cruces | Jesús María | CENTRO | 1 | SE CAMBIA LAMPARA | LUMINARIO APAGADO |
| Regina | Correo Mayor | José Ma. Pino Suárez | CENTRO | 1 | SE CAMBIA LAMPARA | LUMINARIO APAGADO |
| San Jerónimo | Isabel la Católica | Bolívar | CENTRO | 2 | SE CAMBIA LAMPARA | LUMINARIO APAGADO |
| República de Uruguay | Correo Mayor | Las Cruces | CENTRO | 3 | SE CAMBIA LAMPARA Y BALASTRO | LUMINARIO APAGADO |
| Mesones | Correo Mayor | José Ma. Pino Suárez | CENTRO | 1 | SE CAMBIA BALASTRO | LUMINARIO APAGADO |
| Alameda Central | Cara Av. Hidalgo | Av. Juárez | CENTRO | 1 | SE CAMBIA LAMPARA | LUMINARIO APAGADO |
| República de Uruguay | Eje Central | Bolívar | CENTRO | 1 | SE CAMBIA LAMPARA | LUMINARIO APAGADO |
| Donceles | Eje Central | Callejón del 57 | CENTRO | 1 | SE CAMBIA LAMPARA | LUMINARIO APAGADO |
| Tacuba | Motolinía | Isabel la Católica | CENTRO | 1 | SE CAMBIA LAMPARA | LUMINARIO APAGADO |
| Correo Mayor | Soledad | República de Guatemala | CENTRO | 1 | SE CAMBIA LAMPARA | LUMINARIO APAGADO |
| República de Paraguay | República de Brasil | República de Argentina | CENTRO | 4 | SE CAMBIA LAMPARA | LUMINARIO APAGADO |
| República de Bolivia | República de Argentina | República de Brasil | CENTRO | 1 | SE CAMBIA LAMPARA | LUMINARIO APAGADO |
| MESONES | 20 de Noviembre | José María Pino Suárez | CENTRO | 1 | SE CAMBIA LAMPARA | LUMINARIO APAGADO |
| 20 de Noviembre | José María Pino Suárez | Nezahualcóyotl | CENTRO | 4 | SE REALIZA RECONEXIÓN DE LINEAS DE ALIMENTACIÓN | LUMINARIO APAGADO |
| TOTAL | | | | 70 | | |



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SOS-DGOIV

| Tema | Línea base | Periodicidad | Reporte al 15/07 | Próximo reporte |
|---------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------|
| Obras menores | Avance real | Quincenal | 21% | 06 de agosto |
| Obras menores | Avance programado | Quincenal | 47% | 06 de agosto |



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SOS-DGOIV

REPORTE DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO HISTÓRICO

REPORTE AL 15 DE JULIO 2019

| CONCEPTO | UNIDAD | CONTRATADO | EJECUTADO | AVANCE ACUMULADO | PROGRAMADO |
|---|--------|------------|-----------|------------------|------------|
| | | CANT | CANT | CANT | CANT |
| REPARACION DE CONCRETO ESTAMPADO EN BANQUETA | | | | | |
| 10 CM | M2 | 781 | 159.33 | 159.33 | 368.56 |
| 15 CM | M2 | 13 | | | 6.13 |
| 20 CM | M2 | 20 | | | 9.44 |
| REPARACION DE PISO EN CORREDOR PEATONAL MADERO | M2 | 26 | | | 12.27 |
| COLOCACION DE BOLARDOS DE DIFERENTES MEDIDAS | PZA | 111 | | | 52.38 |
| REPARACION DE ARRIATES | PZA | 122 | 28.00 | 28.00 | 57.57 |
| CONSTRUCCION Y REPARACION DE REGISTROS | PZA | 13 | | | 6.13 |
| CONSTRUCCION DE TAPA DE REGISTRO DE CONCRETO | | | | | |
| 0.60 x 0.40 M | PZA | 214 | | | 100.99 |
| 0.80 x 0.70 M | PZA | 126 | | | 59.46 |
| 0.80 x 0.90 M | PZA | 45 | | | 21.24 |
| 1.20 x 1.30 M | PZA | 10 | | | 4.72 |
| REPARACION DE CONCRETO ESTAMPADO EN ARROYO VEHICULAR | M2 | 619 | 308.00 | 308.00 | 292.11 |
| FABRICACION DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES | M2 | 20 | | | 9.44 |
| REPARACION DE BANQUETA A BASE DE DREN BASALTEX 40 x 40 x 4 | M2 | 98 | | | 46.25 |



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SOS-DGOIV

REPORTE DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO HISTÓRICO

REPORTE AL 15 DE JULIO 2019

| CONCEPTO | UNIDAD | CONTRATADO | EJECUTADO | AVANCE ACUMULADO | PROGRAMADO |
|--|--------|------------|-----------|------------------|------------|
| | | CANT | CANT | CANT | CANT |
| REPARACION DE BANQUETA a base de loseta BASALTEX 40 x 40 x 4, 20 x 40 x 4 y 20 x 20 x 4 | M2 | 547 | 188.00 | 188.00 | 258.13 |
| REPARACION DE BANQUETA A BASE loseta BASALTEX CON BOLEO DE ARISTA EN UNO DE SUS LADOS 40 x 40 x 4, 20 x 40 x 4 y 20 x 20 x 4 | M2 | 10 | | | 4.72 |
| COLOCACION DE PIEZAS DE MARMOL SANTO TOMAS | M2 | 54 | | | 25.48 |
| RETIRO DE HERRERIA DE DIFERENTES MEDIDAS | M2 | 15 | 15.00 | 15.00 | 7.08 |
| REPARACION DE HERRERIA EN JARDINERAS Y ARRIATES | KG | 60 | | | 28.31 |
| REPOSICIÓN DE REJILLA METALICA TIPO IRVING | M2 | 32 | | | 15.10 |
| REPARACION Y NIVELACION DE COLADERAS, BOCAS DE TORMENTA Y CAJAS DE VALVULAS DE AGUA | M2 | 20 | | | 9.44 |
| COLOCACION DE ADOCRETO HEXAGONAL DE 8 CM DE ESPESOR | M2 | 195 | | | 92.02 |
| RENIVELACION DE ADOCRETO HEXAGONAL DE 8 CM DE ESPESOR | M2 | 20 | | | 9.44 |
| EXTRACCION MANUAL DE TOCONES | | | | | |
| DE 0.25 A 1.50 M | PZA | 44 | 15.00 | 15.00 | 20.76 |
| DE 1.51 A 4.50 M | PZA | 5 | | | 2.36 |
| CONSTRUCCION DE GUARNICION 15 x 20 x 50 | ML | 516 | | | 243.51 |
| COLOCACION DE ASFALTO EN FRIO EN ARROYO VEHICULAR | M2 | 500 | | | 235.96 |



INVI

| Tema | Línea base | Periodicidad | Semana al 22/07 | Próximo reporte |
|-------------------------------|--|--------------|-----------------------------------|-----------------|
| Proyectos de obra de vivienda | Porcentaje de avance por proyecto (línea base: 18 predios) | Mensual | <i>Por iniciar - 06</i> | |
| | | | <i>En proceso - 12 77.72%</i> | |



INVI

| No. | PREDIO | COLONIA | ALCALDIA | STATUS DE OBRA | PERIMETRO A Y B | Junio | Julio | Porcentaje de avance |
|-----|-------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|----------------------|
| 1 | 2 DE ABRIL NO 42 | GUERRERO | CUAUHTEMOC | OBRA EN PROCESO | A | 42.20% | 42.20% | 0.00% |
| 2 | ACADEMIA NO.33 | CENTRO | CUAUHTEMOC | OBRA EN PROCESO | A | 48.46% | 48.46% | 0.00% |
| 3 | ARCOS DE BELEN NO 49 | CENTRO | CUAUHTEMOC | OBRA EN PROCESO | B | 44.00% | 72.00% | 28.00% |
| 4 | EJE 1 PONIENTE GUERRERO NO 164 | GUERRERO | CUAUHTEMOC | OBRA EN PROCESO | B | 86.92% | 86.92% | 0.00% |
| 5 | EJE 1 PONIENTE GUERRERO NO. 110 | BUENAVISTA | CUAUHTEMOC | OBRA EN PROCESO | B | 90.81% | 90.81% | 0.00% |
| 6 | MAGNOLIA NO. 12 (ANTES NO. 12 Y 16) | GUERRERO | CUAUHTEMOC | OBRA EN PROCESO | B | 62.70% | 71.70% | 9.00% |
| 7 | REPUBLICA DE ARGENTINA NO. 58 | CENTRO | CUAUHTEMOC | POR INICIAR | A | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 8 | REPUBLICA DE ARGENTINA NO. 87 | CENTRO | CUAUHTEMOC | OBRA EN PROCESO | A | 83.10% | 86.26% | 3.16% |
| 9 | REPUBLICA DE PERU NO. 40 | CENTRO | CUAUHTEMOC | OBRA EN PROCESO | B | 90.99% | 91.35% | 0.36% |
| 10 | ALLENDE NO. 46 | CENTRO | CUAUHTEMOC | OBRA EN PROCESO | A | 95.40% | 97.00% | 1.60% |
| 11 | LERDO NO. 12 | GUERRERO | CUAUHTEMOC | POR INICIAR | B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 12 | PEDRO MORENO NO. 154 | GUERRERO | CUAUHTEMOC | POR INICIAR | B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 13 | TALAVERA NO. 24 | CENTRO | CUAUHTEMOC | POR INICIAR | A | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 14 | VIOLETA NO. 15 | GUERRERO | CUAUHTEMOC | POR INICIAR | B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 15 | PEDRO MORENO NO 156 | GUERRERO | CUAUHTEMOC | POR INICIAR | B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 16 | LECUMBERRI No 66 | ZONA CENTRO | CUAUHTEMOC | OBRA EN PROCESO | B | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 17 | BELISARIO DOMINGUEZ NO. 78 | CENTRO | CUAUHTEMOC | OBRA EN PROCESO | A | 49.55% | 60.90% | 11.35% |
| 18 | NACIONAL NO. 57 | MORELOS | VENUSTIANO CARRANZA | OBRA EN PROCESO | B | 75.35% | 84.98% | 9.63% |



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

TELMEX

| Tema | Línea base | Periodicidad | Semana al 22/07 | Próximo reporte | Observaciones |
|--|--|--------------|---|-----------------|-------------------------------|
| Infraestructura de Comunicación Telefónica | Número de reposiciones de tapas de registro y marcos que implican un riesgo (Línea base: 14) | Quincenal | 3 atendidas 10 en proceso 1 no se requirió | 06 de agosto | |
| Infraestructura de Comunicación Telefónica | Trabajos intensivos de limpieza, mantenimiento y rehabilitación de los Teléfonos Públicos del Centro Histórico (Línea base: 518 teléfonos) | Quincenal | 495 Funcionando (Representa el 95.55%) | 06 de agosto | Se retiraron 4 casetas |



TELMEX Renivelación de 14 tapas de registros

| DESCRIPCIÓN DISTRITO | | UBICACIÓN | TIPO | ESTATUS |
|-------------------------|---------|--|----------|----------------|
| 1 | VI_321 | AV. HIDALGO Y PASEO DE LA REFORMA | ARROYO | PENDIENTE |
| 2 | VI_100 | AV. EJE CENTRAL Y CLL. VENUSTIANO CARRANZA | ARROYO | PENDIENTE |
| 3 | VI_0284 | EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS Y REPUBLICA DEL SALVADOR | BANQUETA | NO SE REQUIERE |
| 4 | VI_0284 | REPUBLICA DEL SALVADOR | ARROYO | TERMINADO |
| 5 | VI_026 | CLL. REPUBLICA DE URUGUAY | BANQUETA | TERMINADO |
| 6 | VI_0026 | CLL. REPUBLICA DE URUGUAY Y CLL. ISABEL LA CATOLICA | ARROYO | TERMINADO |
| 7 | VI_026 | CLL. REPUBLICA DE URUGUAY Y CLL. ISABEL LA CATOLICA | ARROYO | TERMINADO |
| 8 | CT_0039 | REPUBLICA DEL SALVADOR E ISABEL LA CATOLICA | ARROYO | TERMINADO |
| 9 | CT_0038 | REPUBLICA DEL SALVADOR E ISABEL LA CATOLICA | ARROYO | TERMINADO |
| 10 | VI_231 | CLL. VENUSTIANO CARRANZA Y CLL. PALMA | ARROYO | TERMINADO |
| 11 | VI_029 | REPUBLICA DE URUGUAY | ARROYO | TERMINADO |
| 12 | VI_0235 | CLL. REPUBLICA DEL SALVADOR | ARROYO | TERMINADO |
| 13 | VI_0070 | CLL. REPUBLICA DEL SALVADOR Y 5 DE FEBRERO | ARROYO | TERMINADO |
| 14 | VI_0024 | AV. VICTORIA Y AV. EJE CENTRAL | ARROYO | PENDIENTE |



INAH

| Ubicación | Descripción |
|---|--|
| Jesús María 8 | Ya tiene autorización por parte del INAH para trabajos generales |
| San Ildelfonso 75 | Presentaron solicitud esta en proceso de dictaminar es para obra de baños públicos se recomienda la intervención de SEDUVI y la Alcaldía para revisar el uso de suelo. |
| Tacuba 71 | Se ordenó la reposición de los sellos oficiales. |
| Magnolia 162 | Se suspendió, ya presentaron solicitud para regularizar la obra pero denunciaron que aún siguen trabajando se solicita intervención de la Alcaldía para verificar y actuar es monumento artístico. |
| Del Carmen 68 | Hubo una nueva denuncia, esta pendiente la visita de inspección o en su caso suspensión, también se recomienda actúe el INVEA y la Alcaldía. |
| Mercado San Juan | Presentaron solicitud de asesoría técnica y esta semana presentan solicitud de obra. De la solicitud de Gerente de obras y mantenimiento ya se dictaminó el 23 de julio, la autorización estará el 24 o a más tardar el 25 de julio. |
| Correo Mayor 20, 36, 45-B, 45-C, 48, 55, 57, 62 y 66 | Se requirieron 10 anuncios fuera de norma. |



ADIP

| Tema | Línea base | Periodicidad | Reporte al 22/07 | Próximo reporte | Observaciones |
|--|---|--------------|-----------------------|-----------------|---|
| Conectividad e Infraestructura Tecnológica | Número de puntos de conexión wifi habilitados en postes de C5 (Línea base: 589) | Semanal | 21 puntos habilitados | 30 de julio | 147 puntos habilitados a la fecha (avance del 24.95%) |



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO




AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ADIP

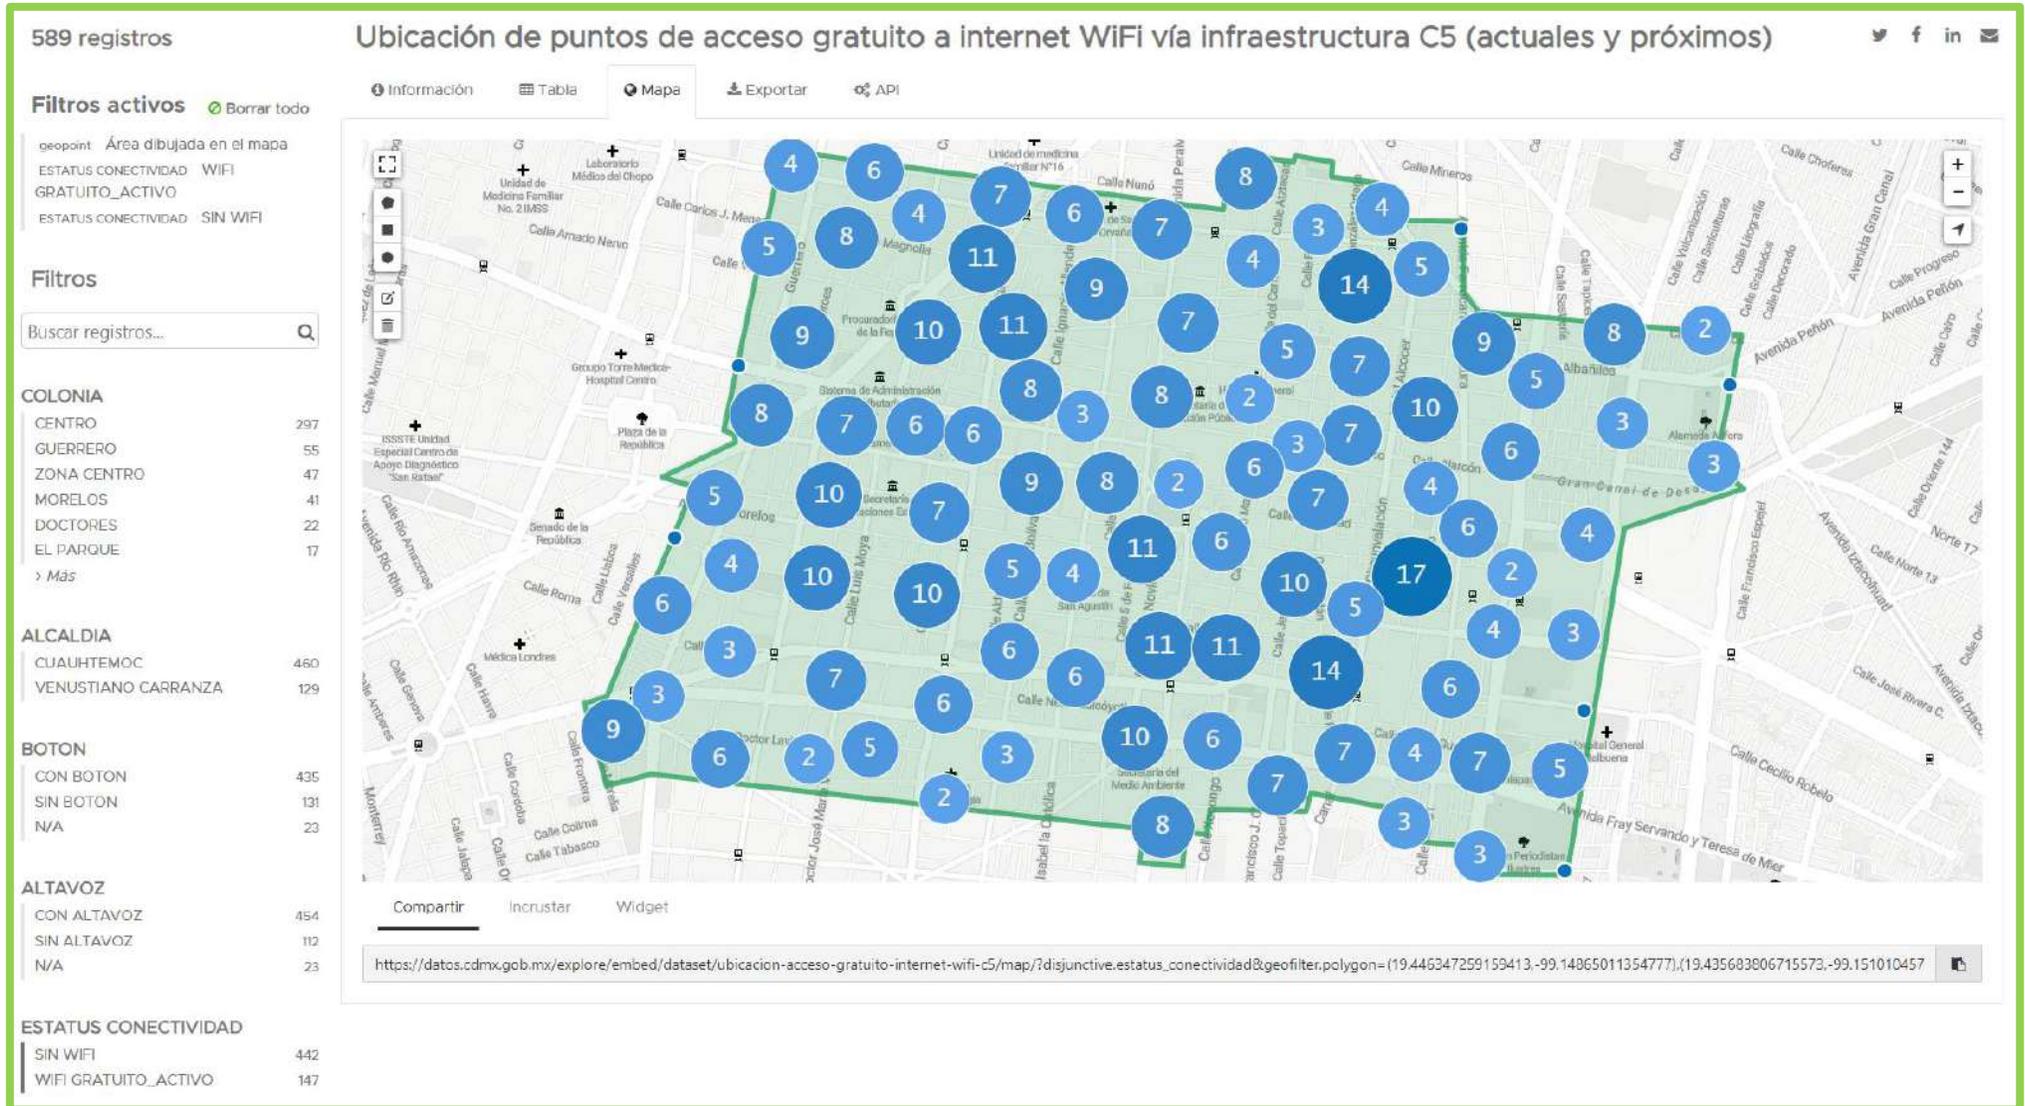



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SEDEMA

| Tema | Unidad de medida | Periodicidad | Semana al 16/06 | Semana al 22/07 | Próximo reporte | Observaciones |
|---------------|--|--------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|
| Reforestación | Número de sujetos forestales plantados (línea base: 162) | Quincenal | 12 árboles | 18 árboles | 06 de agosto | Avance del 82.73% (139 árboles) |



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SEDEMA

1. De la Semana del 8 al 12 de julio se plantaron 12 árboles en las Calles Palma, República de Uruguay, Mesones y Madero.

2. De la Semana del 15 al 19 de julio se plantaron 18 árboles en Avenida 5 de Mayo, en las Calles República de Uruguay, Mesones y Madero.





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SEDECO

PROTECCIÓN CIVIL:

Conjuntamente con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se está desarrollando el *“Acuerdo por el que se establecen los comités de gestión integral de riesgos y protección civil en los mercados Públicos de la Ciudad de México”*, se elaborará el *“Protocolo de abasto ante emergencias en los mercados públicos”*.

SEGURIDAD EN LOS MERCADOS PÚBLICOS:

Conjuntamente con la Dirección General de Administración Operativa del C5, se está trabajando a fin de que los mercados públicos cuenten con videocámaras (circuitos cerrados) instaladas al interior y puedan ser enlazados al C2 y C5.

Con fecha 30 de mayo del 2019, mediante oficio SEDECO/ACD/861/2019, se envió al Lic. Juan Antonio Suárez Sánchez, Director General de Administración Operativa del C5, *“Relación de los mercados públicos que cuentan con videocámaras instaladas al interior de los mismos”*.

Al respecto, nos informaron de manera verbal que la ADIP y el C5, convocaron a proveedores de sistemas de vigilancia y se llevó a cabo la licitación a través del llamado Tianguis Digital. Actualmente están haciendo pruebas **Telmex y Mizco**, revisando entre otros aplicativos, más o menos de ancho de banda, teniendo hasta la semana pasada por resolver la toma de flujo de video,

De los 32 mercados públicos en el centro histórico, a la fecha se identificó que un total **16 mercados públicos** dentro de los perímetros A y B del Centro Histórico cuentan con videocámaras instaladas al interior.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SEDECO

Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México

ESTATUS AL JULIO 22, 2019

| Alcaldía | Mercado | ESTATUS DE TRANSFERENCIA DE RECURSO | | | | OBSERVACIONES | PUBLICACIÓN DE BASES | OERA |
|------------|------------------------|---|--|------------------------|------------------------|---------------|----------------------|------|
| | | CLAVE PRESUPUESTAL NO ENTREGADA POR LA ALCALDÍA | CLAVE PRESUPUESTAL EN DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | FECHA DE TRANSFERENCIA | POSIBLE INICIO DE OERA | | | |
| Cuauhtémoc | San Camilito | | | 31/05/2019 | | | 01/08/2019 | |
| Cuauhtémoc | Lagunilla Ropa y Telas | | | 31/05/2019 | Recurso Transferido | 25/06/2019 | 01/08/2019 | |
| Cuauhtémoc | San Juan Curiosidades | | | 31/05/2019 | | | 01/08/2019 | |



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SEDECO

Tema: Reconstrucción y/o rehabilitación del Mercado San Juan Curiosidades, afectado por el Sismo del 19 de septiembre del 2017.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2019:

- La SEDECO a través del Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México apoyará a la Alcaldía de Cuauhtémoc, con 20 millones que corresponden al 60% según programa y la Alcaldía cubrirá el 40 % restante equivalente en este caso a 13.33 millones. Este recurso fue transferido el 31 de mayo del 2019.
- Inicio de obra en los primeros días de agosto del año en curso, por lo que se ha solicitado a los locatarios del mercado, que no han salido del inmueble, ocupar sus espacios en la reubicación temporal, ubicada en la Plaza de San Juan del Buen Tono y calle Aranda.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SEDECO

Obra de restitución y reconstrucción de mercados (siniestrados por incendio en febrero 2013)

| Alcaldía | Mercado | NO. OFICIAL | ACCIONES REALIZADAS | | |
|---------------------|-------------------|-------------|---|-------------------------------|---|
| | | | TEMA | PERÍODO | OBSERVACIONES |
| Venustiano Carranza | Merced Nave Mayor | 102 | - Levantamiento de censo de locatarios que serán afectados por la obras. - Reubicación de locatarios | Del 3 al 22 de julio del 2019 | El censo de locatarios se terminó el 16 de julio del 2019. En coordinación con la Alcaldía, la Subsecretaría de Programas de Alcaldías de la Secretaría de Gobierno y SEDECO, se continúa seguimiento a la desocupación de la calle de Rosario, para la colocación de carpas donde se reubicarán los locatarios que serán afectados por obras. |
| Venustiano Carranza | Merced Banquetón | 109 | | | El 23 de julio del 2019, la Alcaldía informó que desocupará un área sobre la calle de Rosario para colocar la segunda carpa. Se tendrá reunión con la COMISIÓN DEL MERCADO, el próximo miércoles para mostrar la propuesta de reubicación. CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL PROYECTO DE NAVE MAYOR: Se encuentra en últimas revisiones y próxima firma por las SOBSE, SEDECO, SSPARVP y ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA. |



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

C5

| Tema | Línea base | Periodicidad | Semanal al 23/07 | Próximo reporte |
|-----------------------------|---|---------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Cámaras de video-vigilancia | Número de cámaras con falla o intermitencia | Semanal | 40 | 30 de julio |



INCIDENTES DE GRAFITI Y ROBO DE COLADERAS

Perímetros A y B

Período: 5 de diciembre de 2018 al 21 de julio de 2019



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

C5

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

I. NOTAS METODOLÓGICAS

- Los datos se obtuvieron de la base ECHO, con incidentes con fecha de inicio del 5 de diciembre de 2018 al 21 de julio de 2019.
- Se consideran los incidentes con código de cierre afirmativo y negativo.
- Los submotivos incluidos en el reporte son Robo-Cable, Robo-Bienes Gubernamentales y Administrativos-Grafitis.
- Los robos de coladeras se identifican mediante lectura de comentarios de los incidentes de Robo-Bienes Gubernamentales.
- Robo-Cable y Robo-Bienes Gubernamentales fueron unificadas en: “Robo de cable y/o coladera”.


II. INCIDENTES POR PINTAS DE GRAFITI Y ROBO DE CABLE Y/O COLADERAS

| Colonia | Pinta de Grafitis | | | | | | | | Total | |
|-------------------------|-------------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| | Diciembre 2018 | Enero 2019 | Febrero 2019 | Marzo 2019 | Abril 2019 | Mayo 2019 | Junio 2019 | Julio 2019 | Incidentes | Proporción |
| Centro | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 31 | 65% |
| Doctores | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 13% |
| Penitenciaría | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6% |
| Guerrero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4% |
| El Parque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2% |
| Juárez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2% |
| Morelos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2% |
| Obrera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2% |
| Tránsito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2% |
| Roma Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2% |
| Merced Balbuena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Candelaria de los Patos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Total | 6 | 10 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 48 | 100% |

| Colonia | Robo de Cables o Coladeras | | | | | | | | Total | |
|-------------------------|----------------------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| | Diciembre 2018 | Enero 2019 | Febrero 2019 | Marzo 2019 | Abril 2019 | Mayo 2019 | Junio 2019 | Julio 2019 | Incidentes | Proporción |
| Centro | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 53% |
| Doctores | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16% |
| Guerrero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16% |
| Merced Balbuena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5% |
| Penitenciaría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5% |
| Candelaria de los Patos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5% |
| El Parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Juárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Morelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Obrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Tránsito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Roma Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Total | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 19 | 100% |

En total se registraron 67 incidentes, 48 de ellos corresponden a pintas de grafiti, mientras que 19 corresponden a robo de coladeras.


Destaca el caso de la colonia Centro en la cual se han suscitado más de 60% de los incidentes analizados.

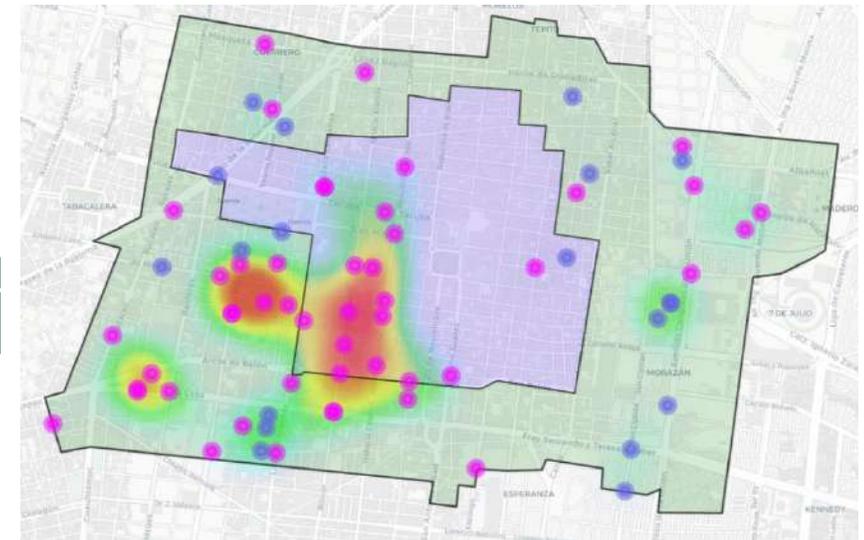

- Perímetro A
- Perímetro B
- Robo de cable o coladera
- Pinta de grafiti

Incidentes por pintas de grafiti y robo de cable y/o coladeras de C5, del 5 de diciembre de 2018 al 21 de julio de 2019.

II. DISTRIBUCIÓN DE LOS INCIDENTES POR TIPO DE ENTRADA

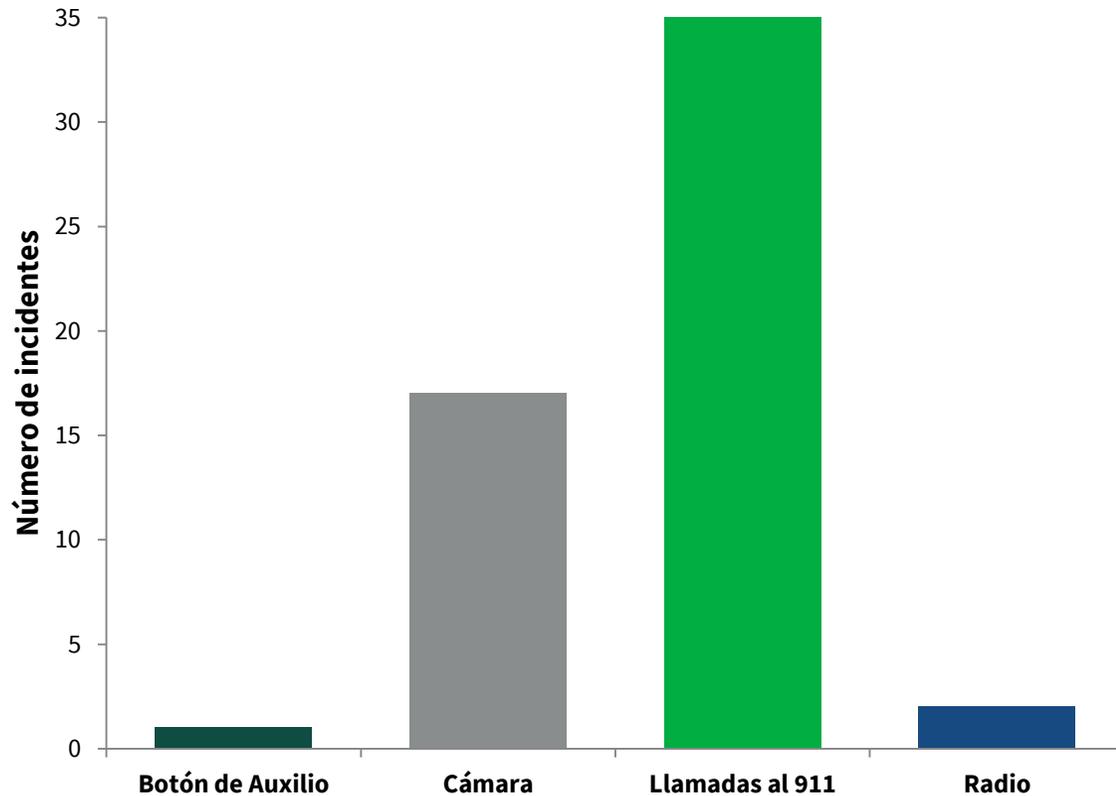


Incidentes C5

| HORA | BOTÓN DE AUXILIO | CÁMARA | LLAMADA DEL 911 | RADIO |
|--------------|------------------|-----------|-----------------|----------|
| 00:00 | | 2 | 4 | |
| 01:00 | | 1 | 6 | |
| 02:00 | | 1 | 14 | |
| 03:00 | | 3 | 4 | |
| 04:00 | | 4 | 4 | 1 |
| 05:00 | | 1 | 1 | |
| 06:00 | | | | |
| 07:00 | | 1 | 1 | |
| 08:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 10:00 | | | | |
| 11:00 | | | 1 | |
| 12:00 | | | | |
| 13:00 | | 1 | | |
| 14:00 | | | 1 | |
| 15:00 | | | 1 | |
| 16:00 | | | 3 | |
| 17:00 | | | 1 | |
| 18:00 | | | 1 | |
| 19:00 | | | | |
| 20:00 | | | 1 | |
| 21:00 | 1 | | | |
| 22:00 | | | 2 | 1 |
| 23:00 | | 3 | 2 | |
| Total | 1 | 17 | 47 | 2 |

Incidentes por pintas de grafiti y robo de cable y/o coladeras de C5, del 5 de diciembre de 2018 al 21 de julio de 2019.

II. DISTRIBUCIÓN DE LOS INCIDENTES POR DÍA DE LA SEMANA



Los incidentes analizados fueron registrados con mayor frecuencia los días **martes, jueves y viernes**.

El día **lunes** muestra una menor frecuencia en comparación con el resto de los días.

II. SÍNTESIS

- De los dos grupos de incidentes observados, 72% corresponden a pinta de grafitis, mientras 28% a robo de cable o coladera.
- La mayor zona de incidencia se ubica al sur poniente del perímetro A para pinta de grafitis y al oriente del perímetro B para robo de coladeras y cables.
- Los incidentes relacionados con pintas de grafitis y robo de coladeras y cables fueron reportados en el 70% de los casos por llamada al 911. Los incidentes detectados por cámara representan el 25% del total, mientras que el botón de auxilio y el radio se encuentran como las opciones menos utilizadas para reportar estos delitos, pues sólo han registrado uno y dos incidentes, respectivamente.
- Al observar la distribución de los incidentes de acuerdo al medio y la hora en que fueron reportados, se aprecia que en su mayoría estos incidentes se reportan en un horario de entre las 0:00 y las 05:00 horas del día. Asimismo, se aprecia que 68% de los incidentes reportados por llamadas al 911 ocurrieron entre las doce y las cuatro de la mañana.
- La mayoría de los incidentes se registraron los días jueves y viernes, siendo el lunes el día con menor registro de los mismos.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PGJ

| Tema | Línea base | Periodicidad | Semana al 22/07 | Próximo reporte |
|-----------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Infraestructura | Número de delitos en robo de cableado | Semanal | 1 | 30 de julio |

| No. CARPETA DE INVESTIGACION | FECHA Y HORA | DELITO | CALLE | COLONIA | SINTESIS DE LOS HECHOS |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|-------|--------------------------------------|---|
| CI-FCH/CUH-2/UI-3CD/5139/07-2019 | 15/07/2019 01:51 | ROBO DE OBJETOS | | CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1 | POLICIA PREVENTIVO PONE A DISPOSICION A LOS HOY IMPUTADOS CON EL ANTECEDENTE DE SUSTRAR CABLE DE FIBRA OPTICA DE UN REGISTRO DE DRENAJE |



SSC-SCT-DSOT (Tránsito)

| Tema | Unidad de medida | Periodicidad | Del 09 al 21 de julio | Próximo reporte |
|-----------------|--|--------------|-----------------------|-----------------|
| Semáforos (162) | Número de semáforos con mantenimiento preventivo | Quincenal | 45 | 06 de agosto |
| | Número de semáforos con mantenimiento correctivo | | 104 | |
| Cámaras (10) | Número de cámaras con mantenimiento preventivo | | 5 | |
| | Número de cámaras con mantenimiento correctivo | | 12 | |



SSC-SCT-DSOT (Tránsito)

CORRECTIVO

| | |
|-----------------------|----|
| ACOMETIDA | 1 |
| APAGADO | 3 |
| CABLE DE COMUNICACIÓN | 3 |
| CINTILANTE | 30 |
| CORTO | 20 |
| DESCONECTADO | 22 |
| DESCORDINADO | 1 |
| DESORIENTADO | 3 |
| FLEJADO | 1 |
| FOCO FUNDIDO | 10 |
| INSTALACION | 2 |
| REINSTALACION | 2 |
| SEMAFORO DAÑADO | 1 |
| TAPA DAÑADA | 1 |
| TARJETA DAÑADA | 2 |
| VISERA ROTA | 2 |


PREVENTIVO

45

TOTAL

149

MANTENIMIENTO A SEMÁFOROS

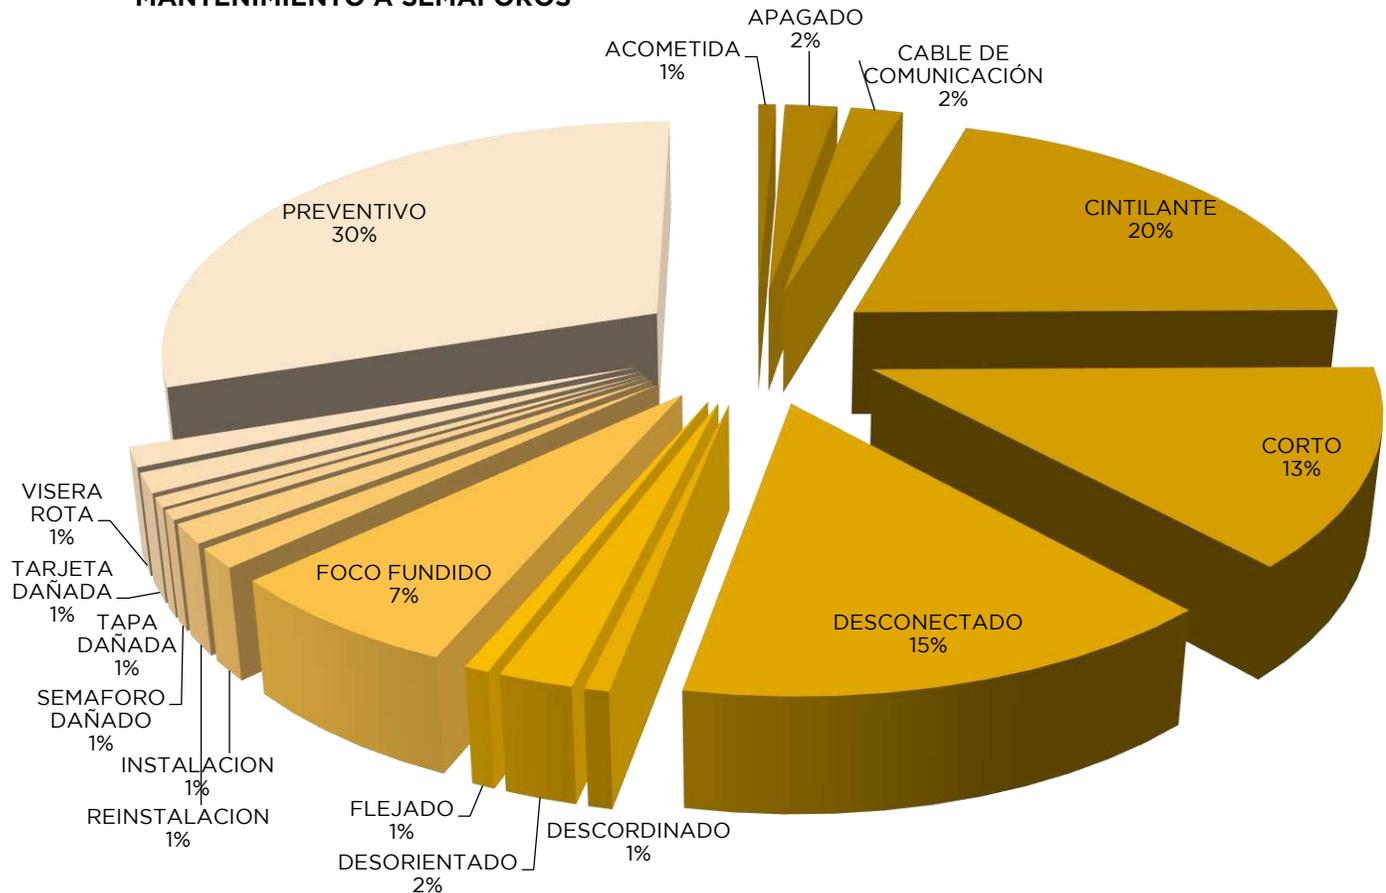

SSC-SCT-DSOT (Tránsito)

CORRECTIVOS

| | |
|---------------|---|
| INTERMITENTE | 2 |
| ACOMETIDA | 4 |
| CORTO | 4 |
| SISTEMA SPRIT | 2 |


PREVENTIVOS

5

TOTAL

17

MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE TRANSITO

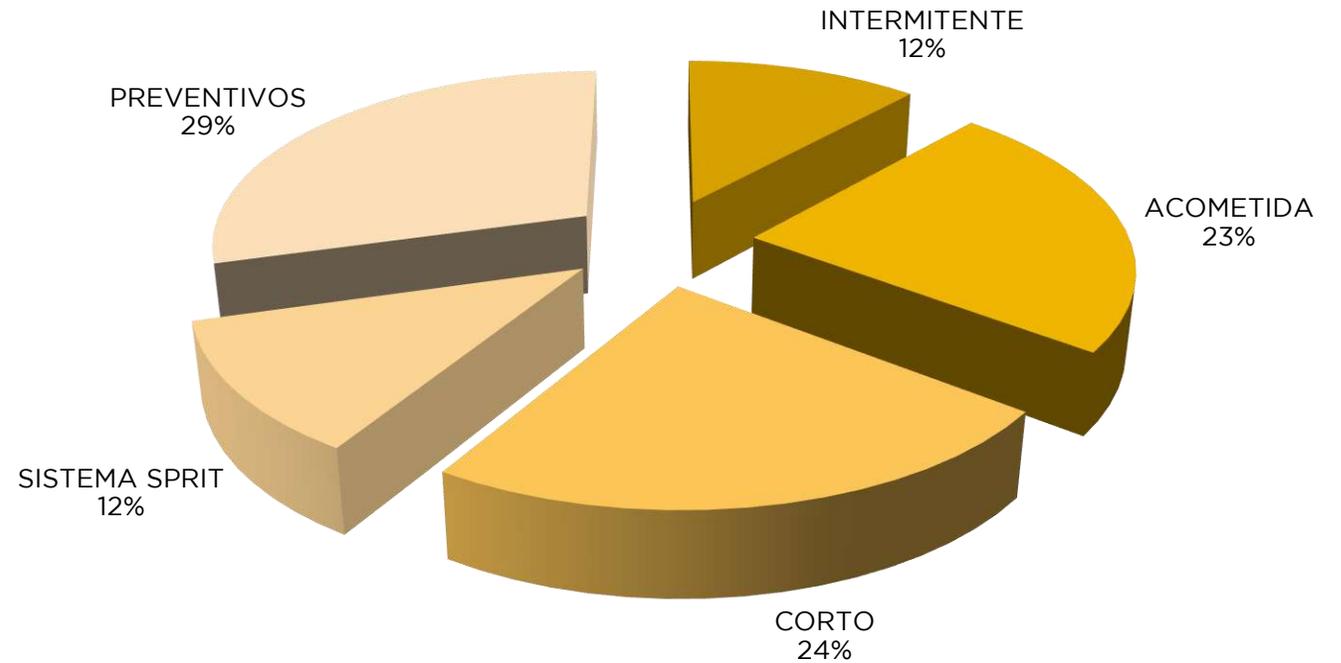



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Acuerdos

Continuamos transmitiendo en vivo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Asistencia

Continuamos transmitiendo en vivo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Próxima sesión

06 de agosto de 2019, a las 10:30 horas
