



ASOCIACIÓN DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



# MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

15 de junio de 2021




## Orden del día

Reportes institucionales mensuales

Turnos

Asuntos generales

Acuerdos Asistencia



# Reportes Institucionales

## Autoridad del Centro Histórico

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 28/05/2021	Quincena al 11/06/2021	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Quincenal	392	72	25 de junio

## Autoridad del Centro Histórico | obras menores

Se realizaron trabajos en:

Motolinía  
Plaza Vizcaínas  
Parque del  
Obispo  
República de  
Chile  
Donceles  
República de  
Argentina  
Plaza Lerdo de  
Tejada  
Plaza Tolsá  
Marconi  
Tacuba  
Las Cruces

Los trabajos realizados consistieron en **balizamiento de 200 ml** en Motolinía entre 5 de Mayo y 16 de Septiembre, **se reparó un registro** en Plaza Vizcaínas entre Eje Central y Bolívar, **se armaron colocaron y pintaron 2 bancas** en Parque del Obispo, **se colocaron 4 lonas** en República de Chile entre 5 de Mayo y Belisario Domínguez, **se repararon 12 perforaciones en banqueta por luminarias en desuso** en República de Chile esquina Donceles, **se repararon 3 tramos de banqueta con un total de 6.5 m<sup>2</sup>** en República de Argentina entre República de Colombia y Belisario Domínguez, **se repararon 2 escalones** en Plaza Lerdo de Tejada entre Donceles y Tacuba, **se repusieron 3 piezas de recinto y se retiró un tubo roto** en Plaza Tolsá entre Marconi y Tacuba, **se repararon 3 perforaciones en banqueta por luminarias en desuso** en Marconi entre Tacuba y Donceles, **se repararon 19 perforaciones en banqueta por luminarias en desuso** en Tacuba entre Callejón de la Condesa y Filomeno Mata, **se reparó registro** en Las Cruces esquina República de Uruguay, **se colocó un bolardo** en Marconi y Tacuba.



# Autoridad del Centro Histórico | obras menores



REPÚBLICA DE ARGENTINA

PLAZA TOLSA

PLAZA VIZCAÍNAS

## Autoridad del Centro Histórico | TRABAJOS DE PODA PARA LIBERACIÓN DE VISIÓN DE CÁMARAS DEL C-5

No.	ID	Ubicación	Colonia	Próximo reporte
1	474	Zaragoza y Mina	Buenavista	25 de junio
2	474	Zaragoza y Mina	Buenavista	25 de junio
4	2360	Mosqueta y Lerdo	Guerrero	25 de junio
5	9502	Pedro Moreno y Zaragoza	Buenavista	25 de junio
7	10455	Zaragoza y Moctezuma	Buenavista	25 de junio
8	2422	República de Argentina y República de Nicaragua	Centro	25 de junio
9	2475	San Camilito y Ecuador	Centro	25 de junio
10	2472	San Camilito y Ecuador	Centro	25 de junio
11	2485	Argentina y San Ildefonso	Centro	25 de junio
12	10482	República de Perú y Montero	Centro	25 de junio
13	10544	Libertad y Comonfort	Centro	25 de junio

# Autoridad del Centro Histórico | TRABAJOS DE PODA PARA LIBERACIÓN DE VISIÓN DE CÁMARAS DEL C-5



REPÚBLICA DE ARGENTINA Y  
SAN ILDEFONSO

REPÚBLICA DE ARGENTINA Y  
REPÚBLICA DE NICARAGUA

LIBERTAD Y COMONFORT

SAN CAMILITO

## Autoridad del Centro Histórico

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 28/05/2021	Quincena al 11/06/2021	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura con apoyo de Justicia Cívica	Número de atenciones en parques, plazas o áreas verdes del Perímetro del Centro Histórico	Quincenal	2	3	25 de junio

# Autoridad del Centro Histórico | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON APOYO DE INFRACTORES DE JUSTICIA CÍVICA



**Plaza de la Conchita con apoyo de 19 infractores**



**Plaza San Miguel con apoyo de 19 infractores**



**Plaza Pino Suárez con apoyo de 19 infractores**


## Alcaldía Cuauhtémoc

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena AI 14/05	Próximo reporte
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	12	25 de junio
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	6	25 de junio
Drenaje	Número de metros lineales de la red de drenaje desazolvados	Quincenal	21	25 de junio
Drenaje	Número de rejillas de piso desazolvadas	Quincenal	10	25 de junio
Drenaje	Número de coladeras de banquetta desazolvadas	Quincenal	4	25 de junio


# Alcaldía Cuauhtémoc



Se realizó desazolve en el Callejón de San Ignacio. Se limpian 3 registros y se sondean 8 mts de drenaje.



Se realizó desazolve en la calle República de Chile # 30. Se limpian 2 registros y se sondean 4 mts de drenaje

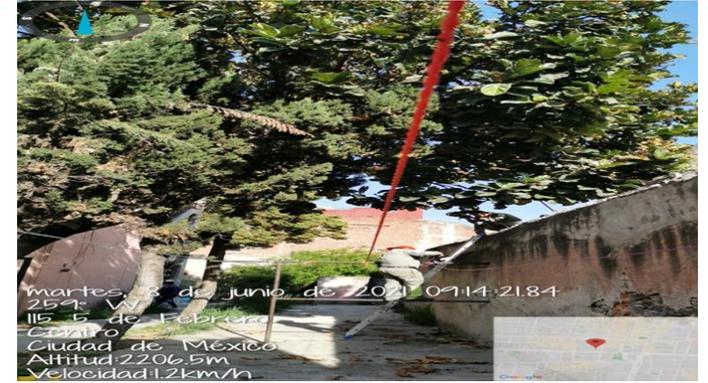

Se realizó poda en 5 de Febrero No. 115



Revisión de alumbrado en la escuela Atención Múltiple No. 103



Se realizó poda en la calle República de Perú, 2 árboles



Se reparan 1 circuito en Humboldt. Quedan funcionando 12 Luminarias.

## Alcaldía Venustiano Carranza


Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 28/05	Quincena al 11/06	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	93	83	25 de junio	se detalla la ubicación y causa en el anexo.
Tiraderos Clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base 26 tiraderos)	Quincenal	924	954.8	25 de junio	Se recolectaron 31 toneladas diariamente de Residuos Sólidos
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	44	0	25 de junio	La Coordinación Territorial Morelos no reporta trabajos de poda de sujetos forestales en el periodo.
Desazolve	Metros lineales de drenaje desazolvados	Quincenal	0	0	25 de junio	Se realizaron 0 metros lineales de desazolve

## Alcaldía Venustiano Carranza



### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
Miguel Domínguez	Penitenciaría	Penitenciaría	4	Revisión y reparación de luminarias
En toda la colonia		10 de mayo	79	Transformación de luminarias de aditivo cerámico a luminarias led
		<b>TOTAL</b>	<b>83</b>	

# Alcaldía Venustiano Carranza

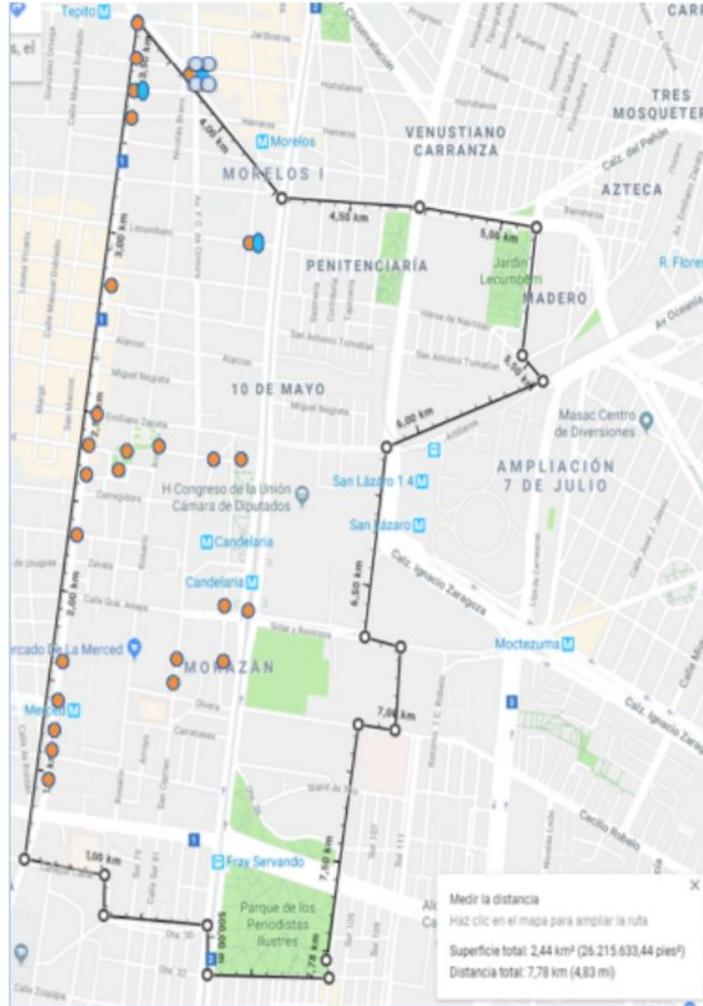

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA.	90% BASURA 10% CASCAJO	1.4	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACAZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.3	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.1	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.7	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.3	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	3.1	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.8	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.8	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.8	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.1	S-9
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.9	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.6	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.8	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.7	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.7	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.7	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.9	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.2	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.6	S-9

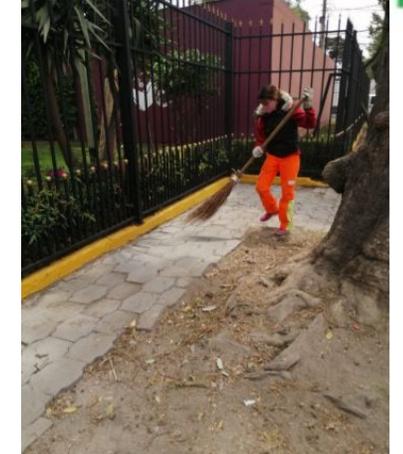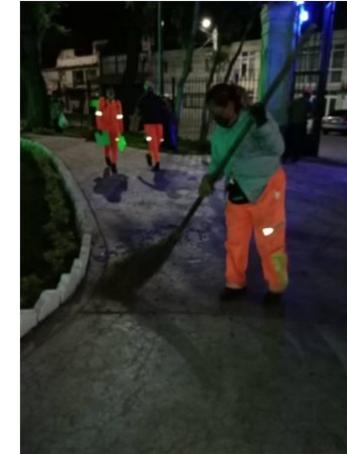

## Anexo




## Sistema de Aguas de la Ciudad de México | Detección de fallas y rehabilitación de drenaje

- 21,000** metros de atarjea
- 370** pozos de visita
- 150** rejillas de piso
- 160** coladeras pluviales
- 1,500** metros de albañal

# Sistema de Aguas de la Ciudad de México

**52 % DE AVANCE**

	PROGRAMADO	ANTERIOR	EJECUTADO	AVANCE
ATARJEA (METROS)	21,000	10,270	700	10,970
POZOS DE VISITA	370	184	13	197
REJILLAS DE PISO	150	96	9	105
COLADERA PLUVIAL	160	103	12	115
ALBAÑAL (METROS)	1,500	741	35	776



## Sistema de Aguas de la Ciudad de México | Detección de fallas y rehabilitación de drenaje



### **CALLE SANTO TOMAS** (ENTRE SAN PABLO Y REGINA)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 100 ML DE ATARJEA, 2 PV, 1 RP, 1 CP, 8 ML DE ALBAÑAL.

## Sistema de Aguas de la Ciudad de México | Detección de fallas y rehabilitación de drenaje



### CALLE SANTO TOMAS (ENTRE REGINA Y RAMÓN CORONA)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 120 ML DE ATARJEA, 3 PV, 2 RP, 1 CP, 12 ML DE ALBAÑAL.

## Sistema de Aguas de la Ciudad de México | Detección de fallas y rehabilitación de drenaje



### **CALLE 5 DE FEBRERO**

**(ENTRE REGINA Y FRAY SERVANDO TERESA DE MIER)**

*AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 400 ML DE ATARJEA, 8 PV, 6 RP, 10 CP, 15 ML DE ALBAÑAL.*

# Sistema de Aguas de la Ciudad de México | Dirección de Construcción

PERIODO DE EJECUCIÓN: mayo - julio

## REPÚBLICA DE CHILE

Avance físico real: 8 %    Monto de Inversión: \$ 15, 664 599.26

### AGUA POTABLE

### DRENAJE



**META:** 588.00 metros  
**INSTALADO:** 0.00 metros

**DIÁMETRO:** 12 pulgadas  
**MATERIAL:** Polietileno de Alta densidad  
**PROCESO CONSTRUCTIVO:** Cielo Abierto y Perforación Direccional

**META:** 591.17 metros  
**INSTALADO:** 294.00 metros

**DIÁMETRO:** 0.38 y 0.45 metros  
**MATERIAL:** Polietileno de Alta densidad Corrugado  
**PROCESO CONSTRUCTIVO:** Cielo Abierto

# Sistema de Aguas de la Ciudad de México | Dirección de Construcción

## POLÍGONO DE SAN HIPÓLITO

PERIODO DE EJECUCIÓN: mayo - julio

Avance físico real: 42 % Monto de Inversión: \$ 22, 969 562.08

### AGUA POTABLE



**META:** 2, 271.00 metros  
**INSTALADO:** 1, 022.70 metros

**DIÁMETRO:** 6 y 12 pulgadas  
**MATERIAL:** Polietileno de Alta densidad  
**PROCESO CONSTRUCTIVO:** Cielo Abierto y Perforación Direccional

### DRENAJE



**META:** 1, 856.95.00 metros  
**INSTALADO:** 589.00 metros

**DIÁMETRO:** 0.38 y 0.45 metros  
**MATERIAL:** Polietileno de Alta densidad Corrugado  
**PROCESO CONSTRUCTIVO:** Cielo Abierto

# Sistema de Aguas de la Ciudad de México | Dirección de Construcción

PERIODO DE EJECUCIÓN: mayo - agosto

## SUSTITUCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE DE LA CALZADA MÉXICO-TACUBA, TRAMO 3

Avance físico real: 6 % Monto de Inversión: \$ 16,084,344.58



### AGUA POTABLE

**META:** 1, 387.00 metros  
**INSTALADO:** 0.00 metros  
**DIÁMETRO:** 6 y 12 pulgadas  
**MATERIAL:** Polietileno de Alta densidad  
**PROCESO CONSTRUCTIVO:** Cielo Abierto, Introdoslizamiento y Perforación Direccional

### DRENAJE

**META:** 1, 563.00 metros  
**INSTALADO:** 129.00 metros  
**DIÁMETRO:** 0.30, 0.38 y 0.45 metros  
**MATERIAL:** Polietileno de Alta densidad Corrugado  
**PROCESO CONSTRUCTIVO:** Cielo Abierto

### AGUA TRATADA

**META:** 770.00 metros  
**INSTALADO:** 0.00 metros  
**DIÁMETRO:** 4 pulgadas  
**MATERIAL:** Polietileno de Alta densidad  
**PROCESO CONSTRUCTIVO:** Cielo Abierto

# Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Obras de Infraestructura Vial


## RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO

**INVERSIÓN 2020-2021**

**270 MDP**

**ÁREA A INTERVENIR**

**83,500 M<sup>2</sup>**



OBRA	PROGRAMADO	REAL	ACTIVIDADES
EJE CENTRAL	100.00%	100.00%	CONCLUIDO
REPÚBLICA DE BRASIL	100.00%	100.00%	CONCLUIDO
STA. MA. LA REDONDA	100.00%	91.38%	Demolición de guarniciones y banquetas, renivelación de registros, relleno de tepetate, suministro y colocación de ductería, bases y registros para alumbrado público, colado de guarniciones y colocación de adocreto en área de banquetas.
CALLE FCO. ZARCO	100.00%	90.28%	Demolición de guarniciones y banquetas, colocación de MR45, suministro y colocación de ductería, bases y registros para alumbrado público, colado de guarniciones, colocación de relleno fluido y colocación de adocreto en área de banquetas.
AV. BALDERAS	100.00%	44.66%	Demolición de guarniciones y banquetas, suministro y colocación de ductería, bases y registros para alumbrado público, bolardos, colado de guarniciones, colocación de relleno fluido y colocación de adocreto en área de banquetas.

# Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Obras de Infraestructura Vial


## RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRA CENTRO HISTORICO 2020-2021																																
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE	DICIEMBRE 2020					ENERO 2021				FEBRERO 2021				MARZO 2021					ABRIL 2021				MAYO 2021					JUNIO 2021			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4
																													14-jun-21			
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS	REAL	100.00%																														
REPUBLICA DE BRASIL	REAL	15/03/2021 100.00%																														
SANTA MARIA LA REDONDA NORTE	REAL	30/04/2021 100%																		91.38%												
CALLE FRANCISCO ZARCO	REAL	27/10/2020		20/04/2021 100%															90.28%													
AV. BALDERAS	REAL	10/12/2020										29/05/2021 100%														44.66%						







# Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

## CALLE FRANCISCO ZARCO (AV. HIDALGO – CALLE VIOLETA )

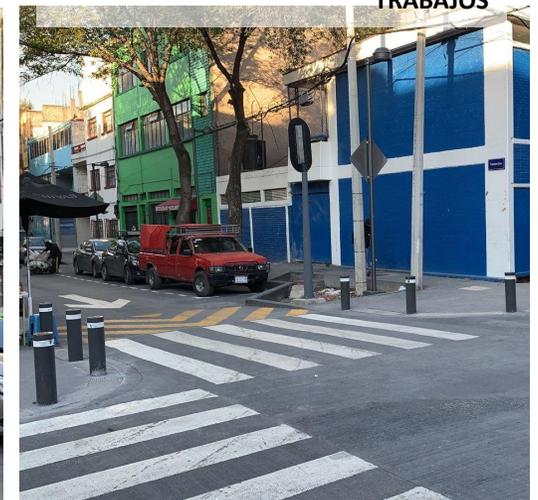

# Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

## AV. BALDERAS (ARCOS DE BELEN – AV. HIDALGO)

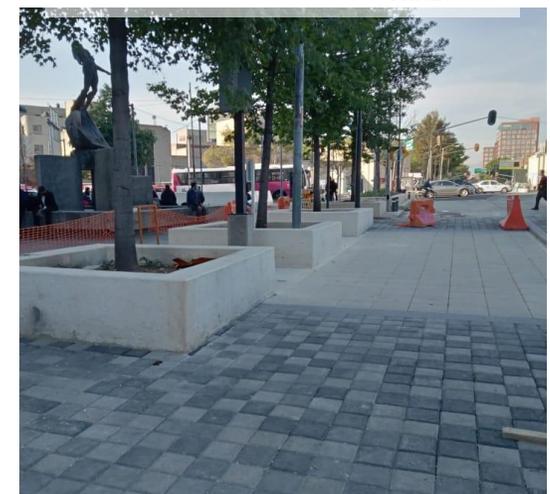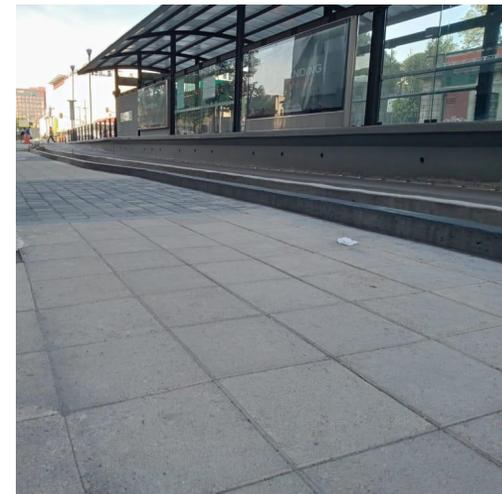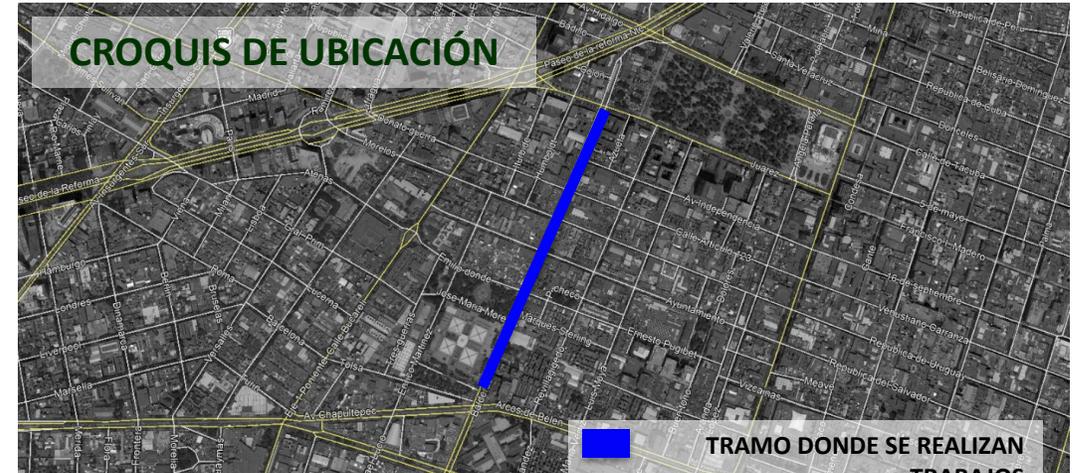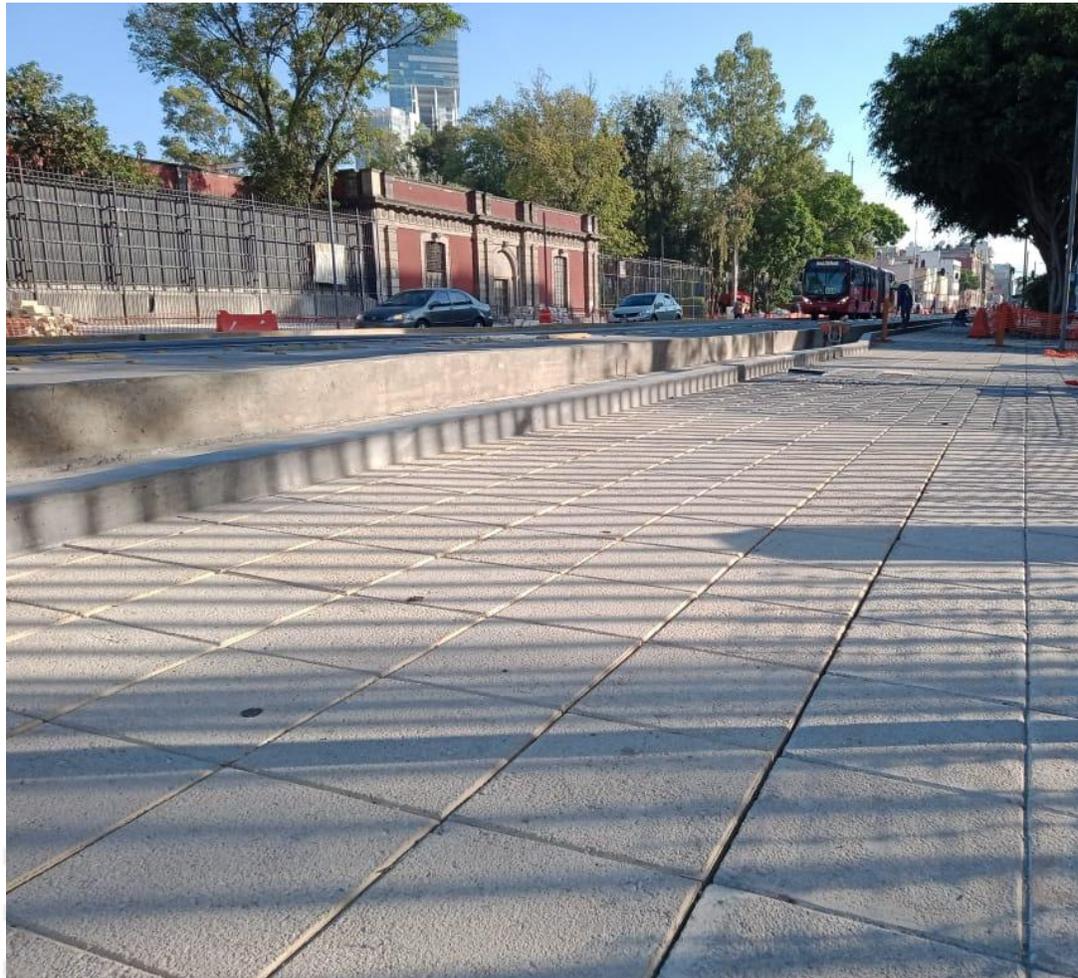

# Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Construcción de Obras Públicas



**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA PULGA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO**

**AL 13 DE JUNIO DE 2021**

## DATOS GENERALES CONTRATISTA

No. CONTRATO	DGCOP-LPN-L-1-275-20
CONTRATISTA	INOVACION Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	02/10/2020
FECHA DE TEMINACIÓN	29/01/2021
SUPERFICIE DEL TERRENO	3,076.31
AREA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL	2,214.00 M2
AREAS EXTERIORES	3,625.00 M2

## ESTADO FINANCIERO

IMPORTE DEL CONTRATO S/IVA	\$	16,055,790.56
IMPORTE ESTIMADO (PAGADO) S/IVA		\$6,200,458.57
IMPORTE POR ESTIMAR S/IVA	\$	9,855,331.99

## ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO		SIN ANTICIPO
ANTICIPO AMORTIZADO	\$	-
ANTICIPO POR AMORTIZAR	\$	-

**RESIDENTE:**

**ARQ. GRACIELA DUARTE CALIXTO**


**J.U.D. DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION C2**



**PERSPECTIVA DEL PROYECTO**

# Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Construcción de Obras Públicas

GRÁFICA DE AVANCES DE LA OBRA AL 13 DE JUNIO DE 2021  
CONTRATO DGCOP-LPN-L-1-275-20



# Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Construcción de Obras Públicas

## REPORTE FOTOGRAFICO



**ARMADO CON ACERO DE REFUERZO  
PARA MUROS Y ARCOS DEL PRIMER NIVEL (EJES 3-6/B-C)**

## Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Construcción de Obras Públicas

### REPORTE FOTOGRAFICO



**COLOCACION DE CIMBRA DE MADERA  
PARA MUROS Y ARCOS DEL PRIMER NIVEL (EJES 4-6/B-C)**

## Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Construcción de Obras Públicas

### REPORTE FOTOGRAFICO



**SEGURISTA “CASCO ROJO”  
DANDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE  
SEGURIDAD E HIGIENE**



**SUMINISTRO A OBRA DE ACERO DE REFUERZO  
EN DIFERENTES DIAMETROS PARA LA  
CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO**

# Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Construcción de Obras Públicas

## REPORTE FOTOGRAFICO



VISTA PANORAMICA NORESTE



VISTA PANORAMICA NOROESTE

# Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Construcción de Obras Públicas

## REPORTE FOTOGRAFICO




VISTA PANORAMICA SURESTE



VISTA PANORAMICA SUROESTE

# Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Construcción de Obras Públicas

## REPORTE FOTOGRAFICO

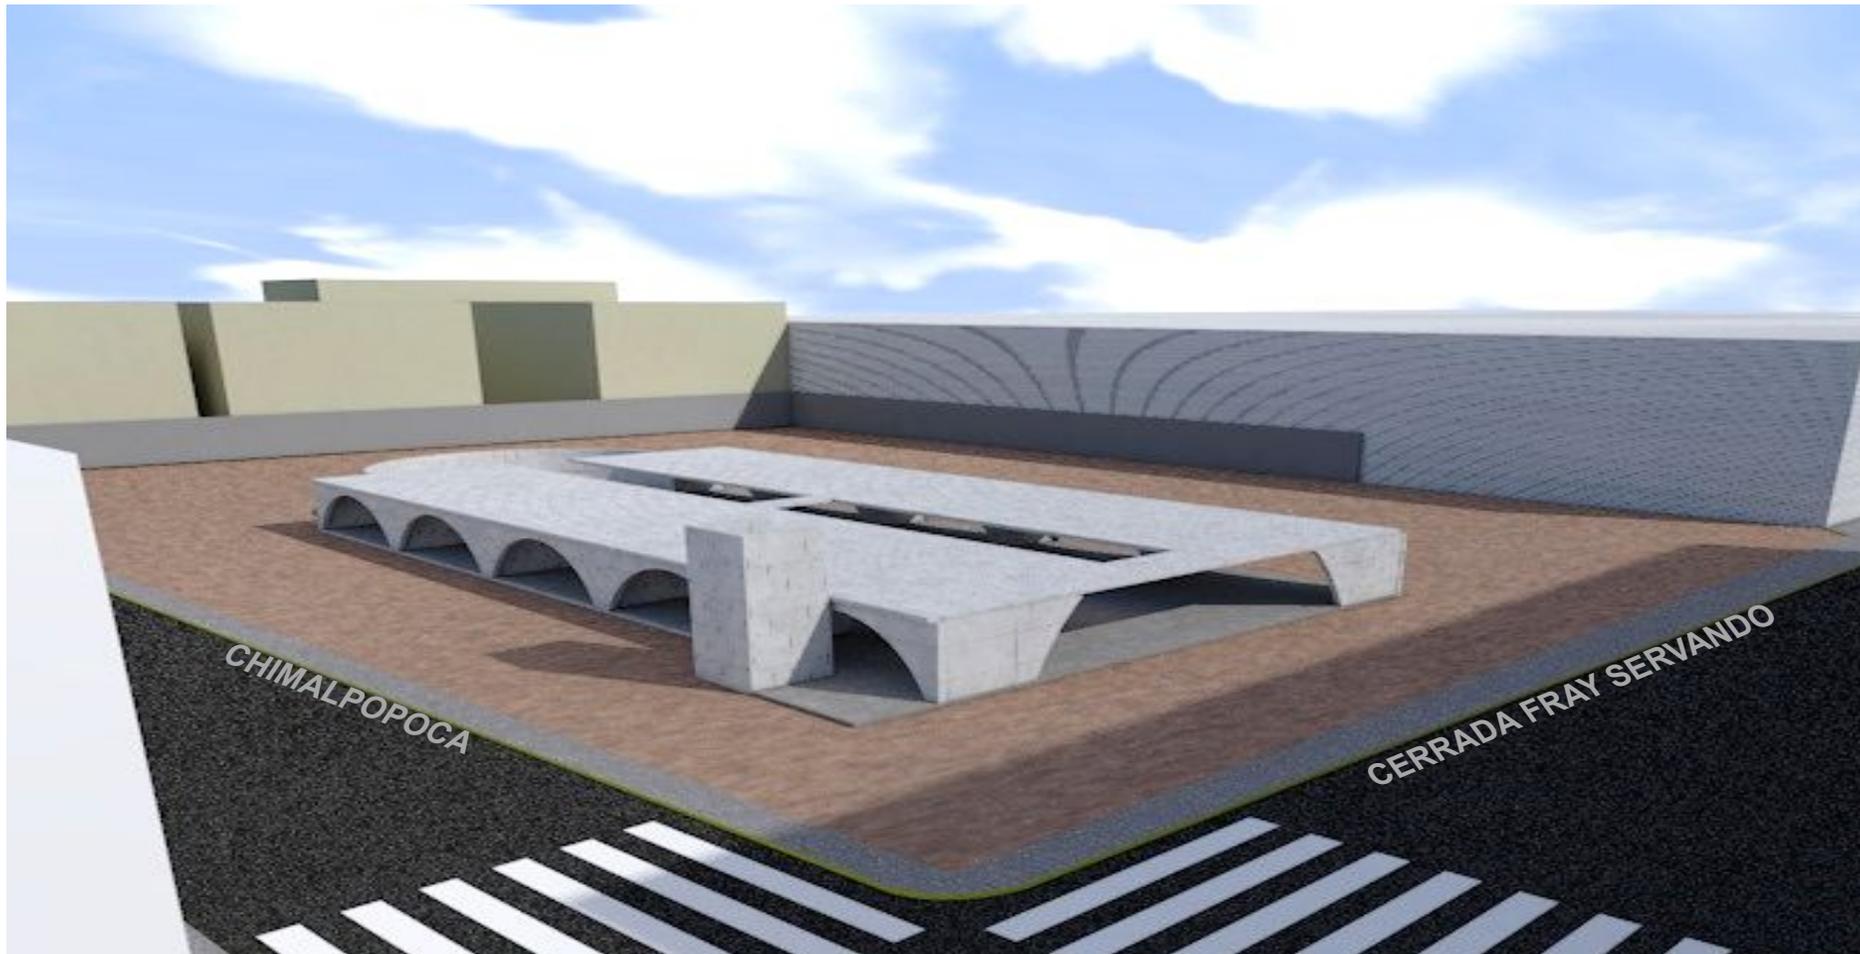

## Secretaría de Obras y Servicios | Alumbrado Público

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana 23 Al 4 de junio	Semana 24 Al 11 de junio	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias	Semanal	40	75	29 de junio
	reparadas en vías del PA del CH			Total 115	

# Secretaría de Obras y Servicios | Alumbrado Público

## Anexo 1. Semana 23

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Doctor Mora	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	2	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
Av. José María Izazaga	José Ma. Pino Suárez y 20 de Noviembre	CENTRO	7	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Av. José María Izazaga	José Ma. Pino Suárez y 5 de Febrero	CENTRO	7	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Av. Juarez	Dolores y Luis Moya	CENTRO	24	Reconexión de líneas	Circuitos apagados
		<b>Total</b>	<b>40</b>		

# Secretaría de Obras y Servicios | Alumbrado Público

## Anexo 2. Semana 24

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
Av. Juarez	Balderas y Jose Azueta	CENTRO	1	Lámpara apagada	Cambio de balastro
Plaza de la constitución	José Ma. Pino Suárez y Moneda	CENTRO	14	Circuito apagado	Reconexión en líneas de alimentación
Dr.Mora	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	13	Circuito apagado	Reconexión de líneas en registro subterráneo
Av. Juarez	Dolores y Luis Moya	CENTRO	24	Circuito apagado	Reconexión de líneas de alimentación en control
Av. Juarez	Dr. Mora y Eje Central Lazaro Cardenas	CENTRO	13	Circuito apagado	Reposición de cable subterráneo
Calle Dr. Mora	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	10	Circuito apagado	Reconexión de líneas de alimentación
<b>Total</b>			<b>75</b>		

## Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Tema	Indicador	Periodicidad	17 al 30/05	31/05 al 13/06	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros Barridos de guarnición en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	8,618.512 km	8,618.512 Km	29 de junio
Limpieza	Metros cuadrados Barridos de Banquetas en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	16,768,780 m2	16,768,780 m2	
Limpieza	Metros Cuadrados Barridos de Plazas y Corredores en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	8,474,312 m2	8,474,312 m2	

## Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Tema	Indicador	Periodicidad	17 al 30/05	31/05 al 13/06	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros de Barrido Mecánico en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	1,279.040 km	1,279.040 km	29 de junio
Limpieza	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos y recolección de residuos producto del barrido en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	6,741 m <sup>3</sup>	6,917 m <sup>3</sup>	
Recolección de tierra	Metros cúbicos de tierra recolectada en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	104.50 m <sup>3</sup>	103.00 m <sup>3</sup>	

## Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Tema	Indicador	Periodicidad	17 al 30/05	31/05 al 13/06	Próximo reporte
Lavado de papeleras	Piezas de papeleras lavadas en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	1,120 piezas	1,120 piezas	29 de junio
Lavado	Metros cuadrados lavados en Plazas, Calles, Corredores peatonales y semipeatonales en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	641,368 m2	634,990 m2	
Lavado de sitios críticos	Sitios críticos lavados en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	18 Sitios (254 Promedio en la quincena)	18 Sitios (256 Promedio en la quincena)	

## Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Tema	Indicador	Periodicidad	17 al 30/05	31/05 al 13/06	Próximo reporte
Recolección tiraderos clandestinos	Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos en el Perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	25 Tiraderos (350 Promedio en la quincena)	25 Tiradero (350 Promedio en la quincena)	29 de junio
Retiro de chicles	Piezas de Chicles retiradas en el Corredor Madero	Quincenal	13,044 piezas	5,740 piezas	
Eliminación de grafiti	Metros Cuadrados de grafiti eliminado en el Perímetro "A" el Centro Histórico	Quincenal	4,466 m2	1,776.50 m2	


## Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Tema	Indicador	Periodicidad	17 al 30/05	31/05 al 13/06	Próximo reporte
Desratización	Desratización en el Perímetro “A” y “B” del Centro Histórico	Quincenal	Colocación 1,776 Cebos Cereal B y 910 Cebos Racumín pasta en una superficie de 128,080 m2	Colocación 1,709 Cebos Cereal B en una superficie de 66,010 m2	29 de junio
Retiro de propaganda Comercial	Piezas retiradas de propaganda en el Perímetro “A” el Centro Histórico		740 piezas	810 piezas	
Retiro de propaganda Electoral	Piezas retiradas de propaganda en el Perímetro “A” el Centro Histórico		0	2,063 piezas	
Atención en Retiro de Plantones	Atención en Retiro de Plantones el Perímetro “A” del Centro Histórico		01 atención	02 atenciones	

## Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

### Acciones tomadas por la DGSUyS con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico en relación al COVID-19

- Se toma la temperatura todos los días en los tres turnos.
- Se les entrego caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.

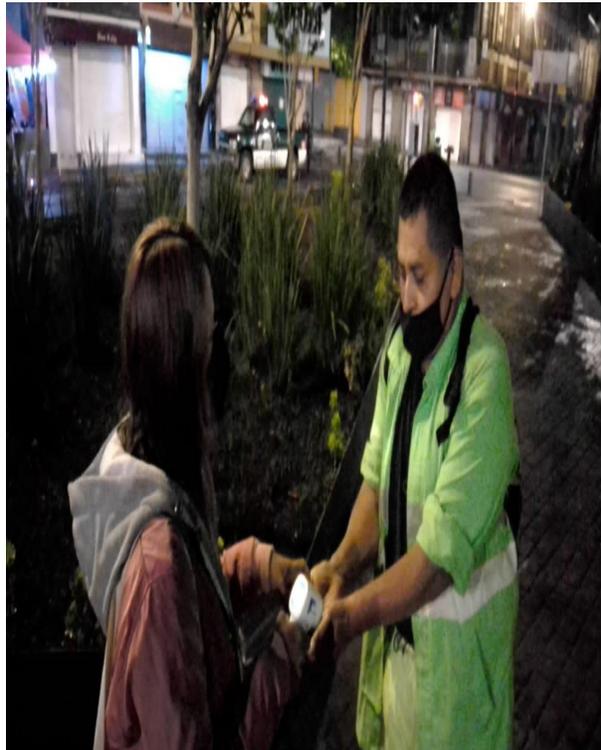

## Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

### Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

#### SE REALIZÓ LA ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN LAS SIGUENTES VIALIDADES:

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
REPÚBLICA DE CHILE DE ALLENDE A BELISARIO DOMÍNGUEZ	18	m2
SIMÓN BOLÍVAR DE REPÚBLICA DEL SALVADOR A REGINA	5	m2
ALDACO DE REPÚBLICA DEL SALVADOR A MEAVE	9	m2
DONCELES DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A PALMA	13	m2
ISABEL LA CATÓLICA DE MESONES A AV. 5 DE MAYO	9	m2
REGINA DE SIMÓN BOLÍVAR A AV. 20 DE NOVIEMBRE	18	m2
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN DE REPÚBLICA DE PERÚ A BELISARIO DOMÍNGUEZ	46	m2
SIMÓN BOLÍVAR DE DONCELES A AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA	12	m2
ISABEL LA CATÓLICA DE AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA A MADERO	23	m2
MESONES DE JESÚS MARÍA ALDACO	9	m2
VENUSTIANO CARRANZA DE EJE CENTRAL A AV. 20 DE NOVIEMBRE	17	m2
CORREO MAYOR DE MONEDA A SAN JERÓNIMO	14	m2
SAN JERÓNIMO DE AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ A SIMÓN BOLÍVAR	12	m2
CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN FRENTE A PALACIO NACIONAL (PROTESTA)	408	m2
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (PROTESTA)	88	m2

## Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

### Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS SE REALIZÓ LA ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN LAS SIGUIENTES VIALIDADES:

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
PLAZA SAN MIGUEL ARCANJEL AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ESQUINA SAN JERÓNIMO	13	m2
SIMÓN BOLÍVAR DE MADERO A SAN JERÓNIMO	22	m2
PLAZA VIZCAÍNAS EN SAN JERÓNIMO ESQUINA EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	32	m2
SAN JERÓNIMO DE CORREO MAYOR A SIMÓN BOLÍVAR	12.50	m2
MESONES DE JESÚS MARÍA A ALDACO	8	m2
REGINA DE SIMÓN BOLÍVAR A JESÚS MARÍA	24	m2
ISABEL LA CATÓLICA DE AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA A AV. 5 DE MAYO	9	m2
REPÚBLICA DE URUGUAY DE JESÚS MARÍA A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	17	m2
REPÚBLICA DE PERÚ DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A REPÚBLICA DE ARGENTINA	855	m2
AV. HIDALGO DE DR. MORA A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (PROTESTA)	37	m2
AV. 5 DE MAYO DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MONTE DE PIEDAD (PROTESTA)	42	m2
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN FRENTE A PALACIO NACIONAL (PROTESTA)	4	
<b>TOTAL</b>	<b>1,776.50</b>	<b>M2</b>

## Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

### Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS ELIMINACIÓN DE 579 M2 DE GRAFITI DE PROTESTA Y 1,197.50 M2 DE GRAFITI VANDÁLICO



# Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

## Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS



## Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

### Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS



# Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

## Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS



## Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

### Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

#### RETIRO DE 810 PIEZAS DE PROPAGANDA



## Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

### Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS **RETIRO DE 1,436 PIEZAS DE PROPAGANDA ELECTORAL SECTOR SUR**



## Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

### Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS RETIRO DE 627 PIEZAS DE PROPAGANDA ELECTORAL SECTOR NORTE



## Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

### Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS SE APOYO EN LA ATENCIÓN DE LIMPIEZA CON MOTIVO DEL RETIRO DEL PLANTON DE TRABAJADORES DE NOTIMEX, EN PUERTA 1 DE PALACIO NACIONAL



## Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

### Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS


**SE APOYO EN LA ATENCIÓN DE LIMPIEZA CON MOTIVO DEL RETIRO DEL PLANTON DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE TRABAJADORES EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA GOBIERNO**



## Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

### Atención a Fauna Nociva

SE REALIZO LA DESRATIZACIÓN POR MEDIO DE COLOCACIÓN DE 1,709 CEBOS CEREAL B EN UNA SUPERFICIE DE 66,010 M2 DE PLAZAS, CORREDORES Y VIALIDADES DEL CENTRO HISTÓRICO DEL PERIMETRO “A” Y “B”

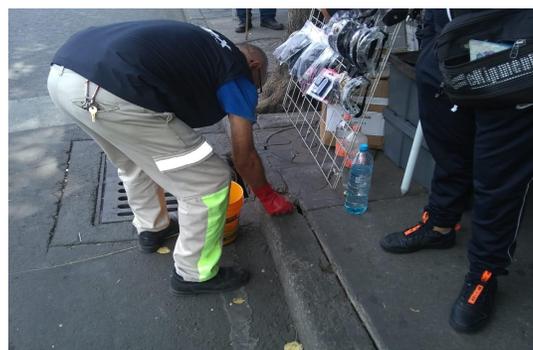

# Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

## Atención a Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 36 cebos cereal B, en 560 m2.
Vialidad General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprian Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 48 cebos cereal B, en 1,200 m2.
Vialidad San Ciprian	B	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier, Col Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 45 cebos cereal B, en 1,200 m2.
Exterior del Metro Candelaria	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprian y General Anaya , Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 75 cebos cereal B, en 1,140 m2.
Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Ote. Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 54 cebos cereal B, en 8,200 m2.
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	Eje 1 Norte a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 270 cebos cereal B, en 3,800 m2.
Plaza de la Solidaridad	A	Av. Juárez esquina Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 54 cebos cereal B, en 860 m2.
Plaza San Fernando	B	Eje 1 Poniente Guerrero, San Fernando, Puente de Alvarado, Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 36 cebos cereal B, en 2,500 m2.
Vialidad Puente de Alvarado	B	De Av. Paseo de la Reforma a callejón Sombrereros, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 30 cebos cereal B, en 750 m2.
Vialidad Eje 1 Poniente Rosales	B	De Puente de Alvarado a Av. Paseo de la Reforma, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 24 cebos cereal B, en 900 m2.

# Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad




## Atención a Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Balderas	B	De Av. Paseo de la Reforma a Av. Juárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 36 cebos cereal B, en 1,200 m2.
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 96 cebos cereal B, en 33,000 m2.
Vialidad San Pablo	A	De Eje 1 Oriente a Av. José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 206 cebos cereal B, en 2,100 m2.
Vialidad Av. José María Izazaga	A	De Isabel la Católica a Simón Bolívar, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 60 cebos cereal B, en 1,400 m2.
Vialidad Eje 1 Norte Mosqueta	A	De Eje 1 Poniente Guerrero a Av. Paseo de la Reforma, lado sur y norte, Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 159 cebos cereal B, en 800 m2.
Vialidad Roldan	B	De Fray Servando Teresa de Mier a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 114 cebos cereal B, en 450 m2.
Plaza Teatro Blanquita	B	Eje Central Lázaro Cárdenas, Pensador Mexicano y Mina, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 75 cebos cereal B, en 1,800 m2.
Vialidad Av. Morelos	B	Congreso de la Unión a calzada de la Viga, Col. Jamaica, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 51 cebos cereal B, en 850 m2.
Vialidad Congreso de la Unión	B	Emiliano Zapata a Herreros de Oriente a Poniente, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 114 cebos cereal B, en 800 m2.
Plaza Jardín Carlos Pacheco	B	Revillagigedo, Ernesto Pugibet, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 42 cebos cereal B, en 650 m2.

## Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

### Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS




#### RETIRO DE CHICLES

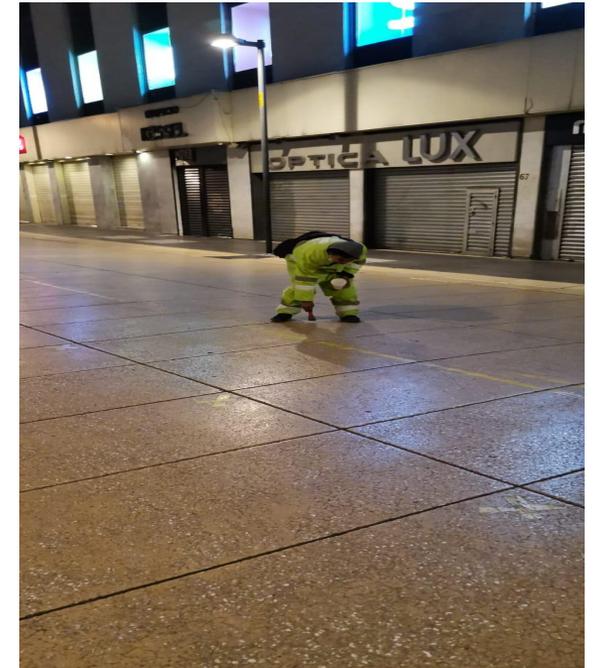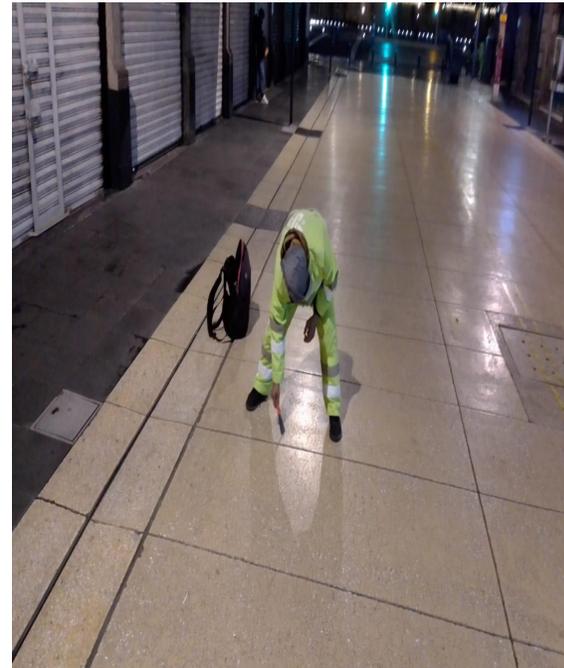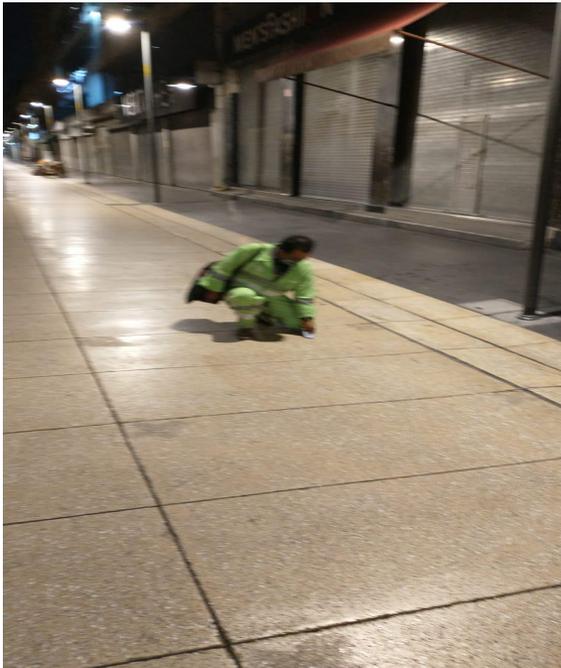

## Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

### Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS



#### LAVADO

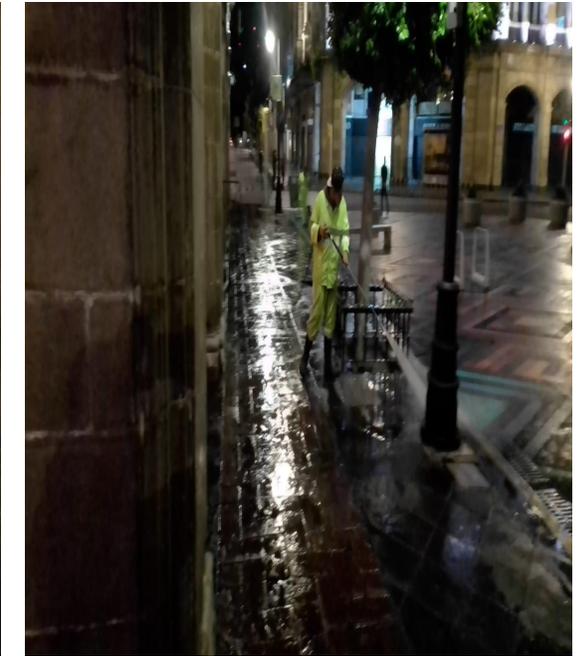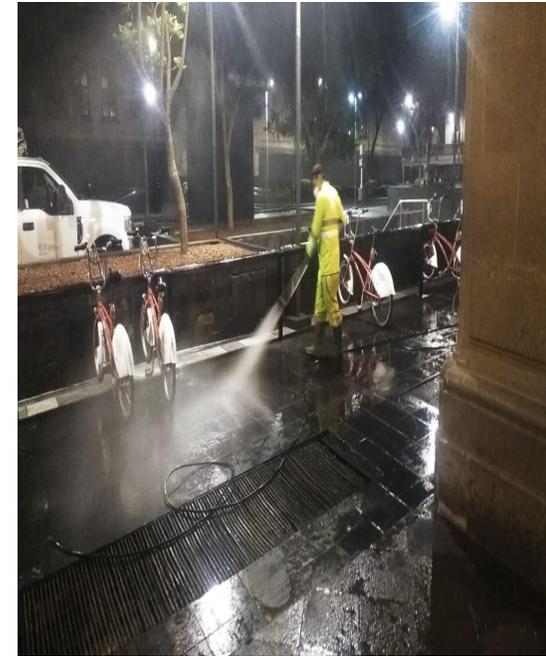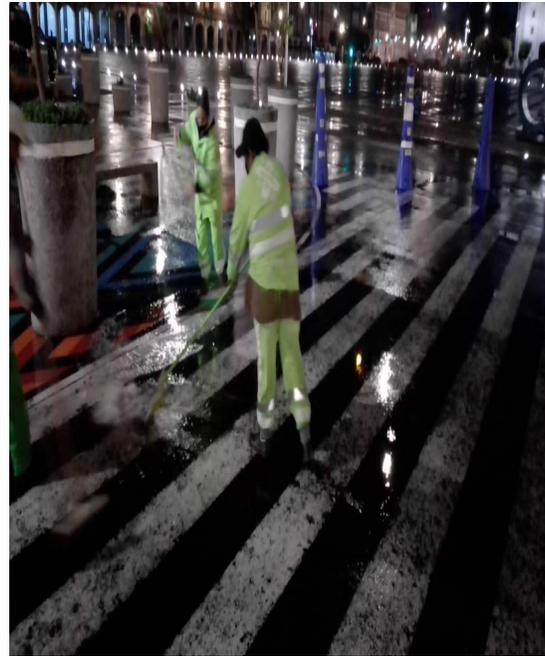

## Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

### Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS



#### BARRIDO MANUAL

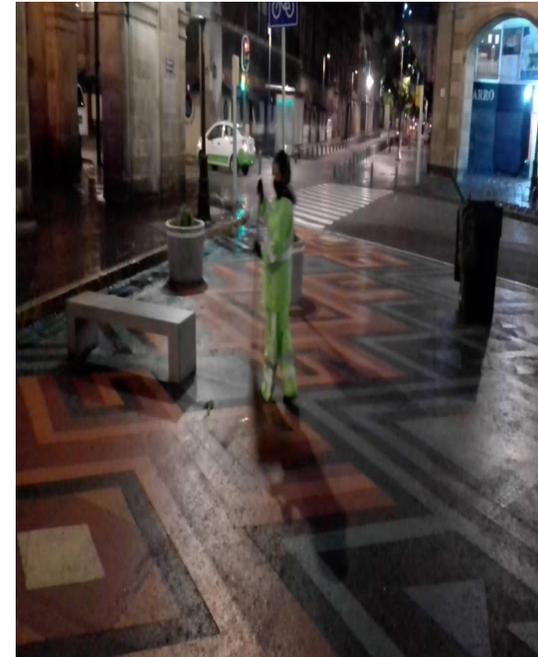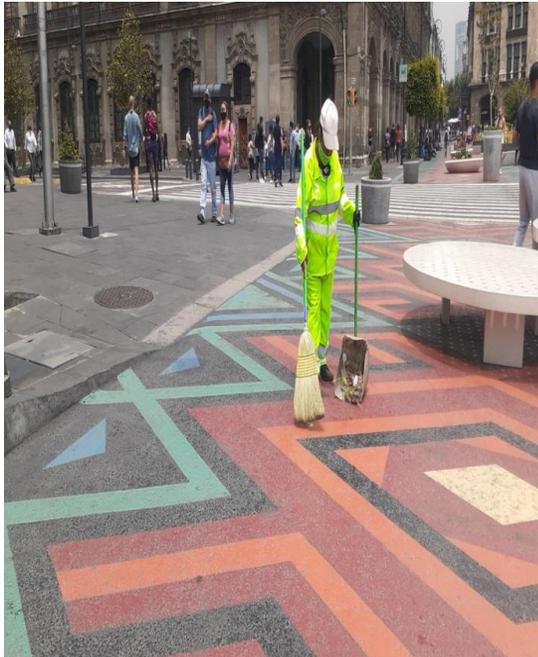

## Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

### Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS


#### RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

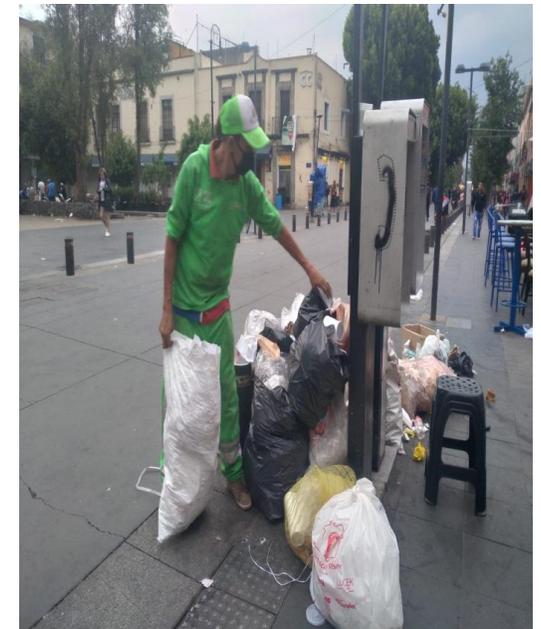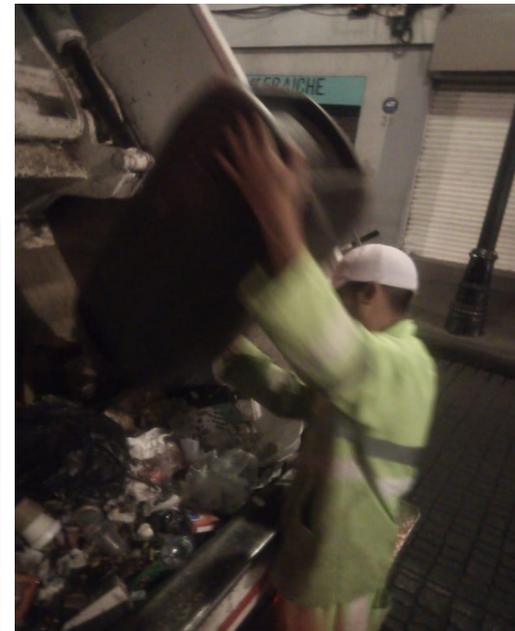

## Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

### Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS



#### RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS

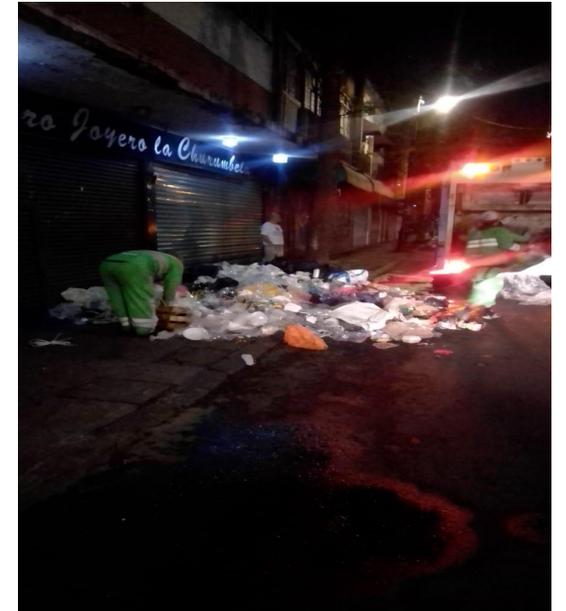

## Secretaría de Obras y Servicios | Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

### Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

#### LAVADO DE PAPELERAS

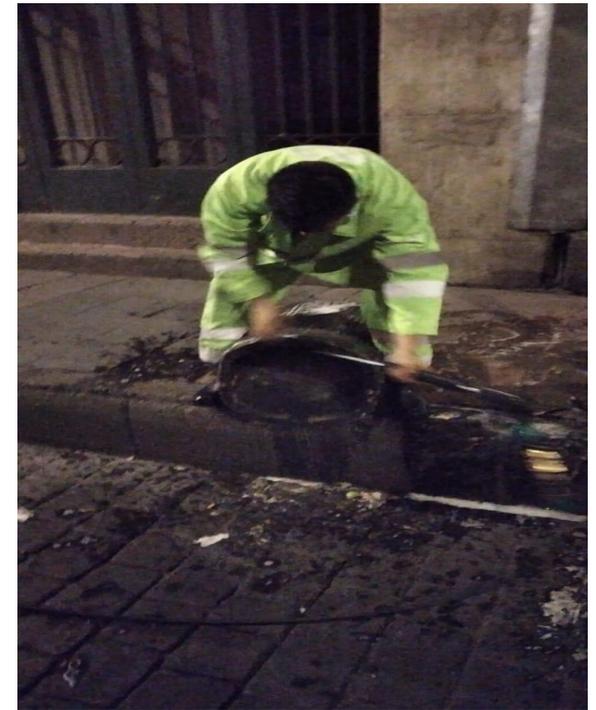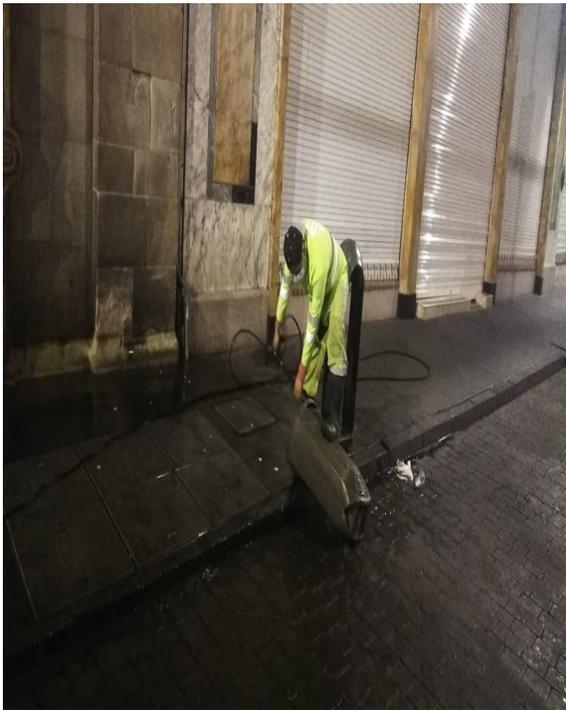

# STC | Metro

Indicador	Periodicidad	26/05 al 10/06	Próximo reporte
75 Escaleras eléctricas en las 29 estaciones del Centro Histórico	Quincenal	1 escalera detenida (en mantenimiento)	29 de junio
19 Elevadores en las 29 estaciones del Centro Histórico		1 elevador detenido	

## Comisión Federal de Electricidad | CFE

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena del 31 de mayo al 15 de junio de 2021	Próximo reporte
<b>Mantenimiento a infraestructura</b>	<b>Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura</b>	<b>Quincenal</b>	<b>3</b>	<b>30 de junio 2021</b>
	<b>Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe</b>	<b>Quincenal</b>	<b>28</b>	
	<b>Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica</b>	<b>Quincenal</b>	<b>9</b>	
	<b>Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas</b>	<b>Quincenal</b>	<b>3</b>	
	<b>Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública</b>	<b>Quincenal</b>	<b>10</b>	

## Comisión Federal de Electricidad | CFE

### Anexo 1. Detalle de ubicaciones Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
AV. JUÁREZ	ESQUINA	LUIS MOYA	SIN DATO	COL.CENTRO	3	TAPAS ROBADAS, SE REALIZA LA REPARACIÓN
				TOTAL	3	

## Comisión Federal de Electricidad | CFE

### Anexo 2. Detalle de ubicaciones Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
5 DE FEBRERO	VENUSTIANO CARRANZA	J. MARÍA IZAZAGA	SIN DATO	COL.CENTRO	4	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
MONEDA	SEMINARIO	CORREO MAYOR	SIN DATO	COL.CENTRO	3	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
VENUSTIANO CARRANZA	ISABEL LA CATÓLICA	EJE CENTRAL	SIN DATO	COL.CENTRO	7	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
16 DE SEPTIEMBRE	5 DE FEBRERO	EJE CENTRAL	SIN DATO	COL.CENTRO	9	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
CORREGIDORA	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	CORREO MAYOR	SIN DATO	COL.CENTRO	2	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	CORREGIDORA	MONEDA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
SEMINARIO	ESQUINA	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	SIN DATO	COL.CENTRO	2	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
				<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	

## Comisión Federal de Electricidad | CFE

### Anexo 3. Detalle de ubicaciones Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REP. DE ARGENTINA 40	REP. DE VENEZUELA	REP. DE COLOMBIA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE PERÚ	ALLENDE	EJE CENTRAL	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
SOLEDAD 48	MARGIL	JESÚS MARÍA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE URUGUAY	ESQUINA	CIRCUNVALACIÓN	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE BRASIL 48	REP. DE PERÚ	REP. DE VENEZUELA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE BRASIL 45	REP. DE PERÚ	REP. DE VENEZUELA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE CHILE 43	BELISARIO DOMÍNGUEZ	REP. DE PERÚ	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE BOLIVIA 32, 34	REP. DE ARGENTINA	DEL CARMEN	SIN DATO	COL.CENTRO	2	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	

## Comisión Federal de Electricidad | CFE

### Anexo 4. Detalle de ubicaciones Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
AV. JUÁREZ	ESQUINA	LUIS MOYA	SIN DATO	COL.CENTRO	3	REEMPLAZO DE TAPA POR DAÑO Y ROBO
				TOTAL	3	

# Comisión Federal de Electricidad | CFE

## Anexo 5. Detalle de ubicaciones

### Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REP. DE ARGENTINA 40	REP. DE VENEZUELA	REP. DE COLOMBIA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE PERÚ 30	ALLENDE	EJE CENTRAL	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
SOLEDAD 48	MARGIL	JESÚS MARÍA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE URUGUAY	ESQUINA	CIRCUNVALACIÓN	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE BRASIL 48	REP. DE PERÚ	REP. DE VENEZUELA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE BRASIL 45	REP. DE PERÚ	REP. DE VENEZUELA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE CHILE 43	BELISARIO DOMÍNGUEZ	REP. DE PERÚ	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE BOLIVIA 32, 34	REP. DE ARGENTINA	DEL CARMEN	SIN DATO	COL.CENTRO	2	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
AV. JUÁREZ	ESQUINA	LUIS MOYA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	REEMPLAZO DE TAPA POR DAÑO
				TOTAL	10	

# Instituto Nacional de Antropología e Historia | INAH

Tema	Indicador	Quincena del 01 al 14/05	Próximo reporte
Obras	Número de trámites de solicitud de autorización de obra en inmuebles	08	29 de junio
Obras	Número de autorizaciones de obras emitidas en inmuebles	17	



# Instituto Nacional de Antropología e Historia | INAH

## Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	Número	Alcaldía - Cuauhtémoc	Tipo de Obra
08/06/21	REGINA	40	CENTRO HISTÓRICO	JARDÍN REGINA, ACCIONES DE MEJORAMIENTO, CAMBIO DE JUEGOS INFANTILES, DE INSTALACIONES SANITARIAS, BEBEDEROS, MOBILIARIO, PASTO SINTÉTICO Y LIMPIEZA DE JARDINERAS. <b>(ATENDIDO)</b>
09/06/21	5 DE MAYO	34	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS A REALIZAR PINTURA EN FACHADA EXTERIOR
10/06/21	REGINA	17	CENTRO HISTÓRICO	COLOCACIÓN DE ENSERES EN VÍA PÚBLICA
10/06/21	MESONES	71	CENTRO HISTÓRICO	COLOCACIÓN DE ENSERES EN VÍA PÚBLICA
11/06/21	5 DE MAYO	49 LC102	CENTRO HISTÓRICO	COLOCACIÓN DE ENSERES EN VÍA PÚBLICA
11/06/21	AV. JUÁREZ	22	CENTRO HISTÓRICO	OBRA NUEVA EDIFICIO DE 16 NIVELES TORRE HABITACIONAL Y COMERCIAL
11/06/21	REVILLAGIGEDO	18	CENTRO HISTÓRICO	REMODELACIÓN, DESMANTELAMIENTO, LIMPIEZA DE PISOS Y PLAFON, INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS Y LUMINARIAS
11/06/21	VARIAS CALLES "PERÍMETRO B"	S/N	CENTRO HISTÓRICO	SEÑALÉTICA, COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA COMPLEMENTARIA, ESTELAS PEATONALES, NOMENCLATURAS EN CALLES

# Instituto Nacional de Antropología e Historia | INAH

## Autorizaciones de obra

AUTORIZACIÓN	DOMICILIO	MOTIVO
AUT. 141/21	DONCELES 60	COLOCACIÓN DE DOS CÁMARAS DE VIGILANCIA.
AUT. 142/21	REPÚBLICA DE URUGUAY 155	ADECUACIÓN DE LOCAL COMERCIAL.
AUT. 143/21	VARIAS UBICACIONES EN LAS COLONIAS CENTRO JUÁREZ DOCTORES Y ROMA NORTE	COLOCACIÓN DE CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA.
AUT. 144/21	MAGNOLIA 162-6	PRÓRROGA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
AUT. 145/21	MAGNOLIA 162-5	PRÓRROGA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
AUT. 146/21	REPÚBLICA DE ARGENTINA 94	REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS POR DESPLOME DE SISMO 2017.
AUT. 147/21	TLAXCOAQUE S/N	LIBERACIÓN DE PINTAS VÁNDALICAS Y MANTENIMIENTO A CÚPULAS Y BÓVEDAS.
AUT. 149/21	5 DE MAYO 54	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
AUT. 150/21	GUERRERO 39	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN.

# Instituto Nacional de Antropología e Historia | INAH

## Autorizaciones de obra

AUTORIZACIÓN	DOMICILIO	MOTIVO
AUT. 152/21	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA ESCALERA DEL RECINTO A JUÁREZ.
AUT. 153/21	VIZCAÍNAS 3	ADECUACIÓN DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS.
AUT. 154/21	DR. ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ 10	PRÓRROGA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
AUT. 155/21	EMILIANO ZAPATA 37	INTERVENCIÓN EN VENTANA DE MADERA.
AUT. 156/21	REPÚBLICA DE GUATEMALA 24	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE FACHADA.
AUT. 157/21	AV. PASEO DE LA REFORMA S/N	CAMBIO DE ILUMINACIÓN EN EL MONUMENTO A CUAUHTÉMOC.
AUT. 158/21	REVILLAGIGEDO 57	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
AUT. 159/21	DEL CARMEN 31	INTERVENCIÓN EN GRIETAS.

# CATEDRAL DE MÉXICO Y SAGRARIO METROPOLITANO

---

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN

Secretaría de Cultura



# Catedral de México y Sagrario Metropolitano

---

Mantenimiento al sistema de pilotes de control  
del conjunto catedralicio

Acciones pendientes por ejecutar

Erradicación de flora parásita y calafateo de grietas

Acciones pendientes por ejecutar

Rehabilitación de instalación eléctrica  
y sistema pararrayos

Acciones pendientes por ejecutar



**CULTURA**  
SECRETARÍA DE CULTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE SITIOS Y MONUMENTOS  
DEL PATRIMONIO CULTURAL



## **Programa de conservación del conjunto catedralicio** Acciones pendientes por ejecutar

---



## **Mantenimiento al sistema de pilotes de control del conjunto catedralicio**

Acción orientada para mantener la estabilidad estructural de los edificios ante los efectos de hundimientos diferenciales. A pesar de que los pilotes de control deben tener mantenimiento periódicamente, durante muchos años no se han llevado a cabo estos procesos.

Es importante señalar que la verificación técnica de los trabajos se efectúa también de forma colegiada entre representantes del Instituto de Ingeniería de la UNAM, la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH, y la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, en donde los problemas detectados se analizan y se indican las acciones necesarias para revertirlos.


---



## Mantenimiento al sistema de pilotes de control del conjunto catedralicio



Dirección General de  
Sitios y Monumentos del  
Patrimonio Cultural



### Cargas en los pilotes

#### SIMBOLOGÍA:

● < 25 t	35	} Total 111
● 26-50 t	21	
● 51-75 t	12	
● 76-100 t	13	
● > 100 t	30	
⊕ Perforación		
⊕ *Carga de + 150 t		
⊕ * N/A	4	

#### Pilotes existentes

- Pilotes cortos o de fricción
- △ Pilotes de punta
- \* Pilotes de fricción negativa
- ⊕ Pilotes de punta con funda deformable

\*Elaboró Julia Villa Montes, IIUNAM. A partir de registros de COPICOSA




**CULTURA**  
SECRETARÍA DE CULTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE SITIOS Y MONUMENTOS  
DEL PATRIMONIO CULTURAL



## Mantenimiento al sistema de pilotes de control del conjunto catedralicio

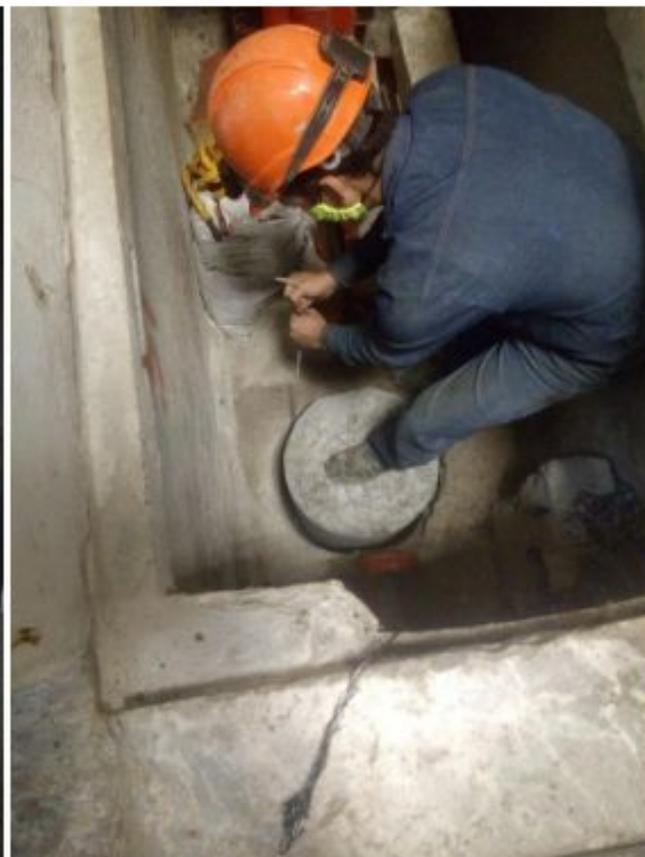




CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE SITIOS Y MONUMENTOS  
DEL PATRIMONIO CULTURAL



## Mantenimiento al sistema de pilotes de control del conjunto catedralicio



Avance físico: 75 %

### Acciones por ejecutar

- Liberación de junta entre banqueta de Guatemala y capilla de Ánimas
- Renivelación de capilla de Ánimas eje norte sur

Estado actual. Corte B-B'

\*Elaboró Felipe Martínez Vázquez, IIUNAM



## **Erradicación de flora parásita y calafateo de grietas**


Acciones dirigidas a retirar los arbustos que han crecido en las fisuras y juntas de la mampostería del edificio y vulneran la capacidad estructural de sus fábricas; y para evitar temporalmente la entrada de agua de lluvia y humedades a través de fisuras y grietas en cubiertas y muros que pueden dañar los valiosos bienes muebles que se resguardan en el interior.

Al igual que el proyecto anterior, la verificación técnica de los trabajos se efectúa de forma colegiada entre representantes de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, ambas del INAH, la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural y el Instituto de Ingeniería de la UNAM (se requirió el apoyo del IIUNAM debido a que se detectaron daños más severos a los previstos en la linternilla de la cúpula de la Catedral ocasionados por la flora parásita y que representaban un riesgo para la estabilidad estructural de algunas secciones)

---



## Erradicación de flora parásita y calafateo de grietas

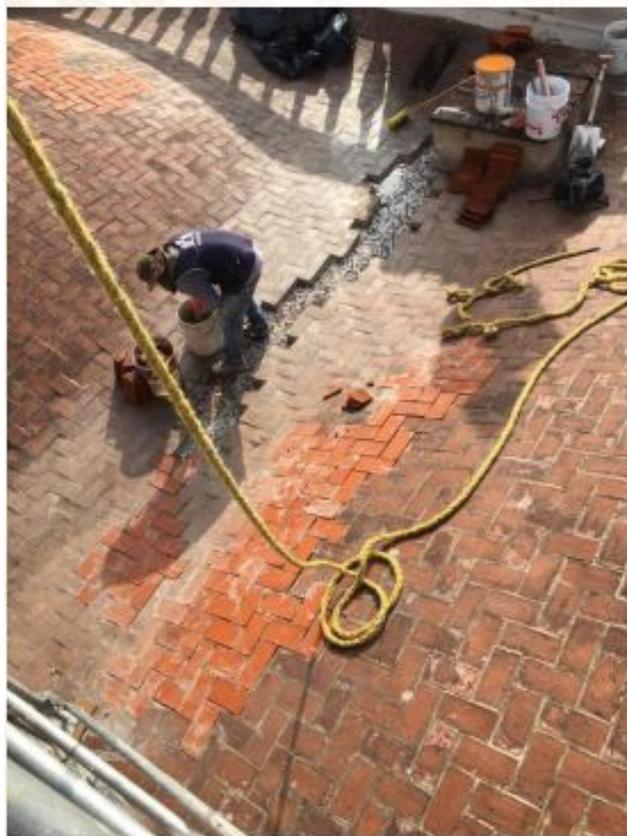



## Erradicación de flora parásita y calafateo de grietas

INICIO DE TRABAJOS  
RETIRO DE FLORA

CALAS, FLORA

INICIO DE LOS  
TRABAJOS DE  
REPARACIÓN DE  
GRIETAS. BOVEDA  
CENTRAL

RETIRO DE  
ENLADRILLADO

Avance físico: 55 %

Acciones por ejecutar

- Consolidación estructural linternilla
- Sustitución azulejo capulín
- Consolidación remates torres







## Rehabilitación de instalación eléctrica y sistema pararrayos

Acciones de rehabilitación de principales elementos vulnerables en el sistema eléctrico del conjunto para prevenir y minimizar el riesgo de conflagración de cortos circuitos e incendios en el interior de la Catedral; así como la reposición del sistema de pararrayos para la protección de pináculos, torres y cúpulas ante descargas en tormentas eléctricas.

---




## Rehabilitación de instalación eléctrica y sistema pararrayos





## Rehabilitación de instalación eléctrica y sistema pararrayos



**Avance físico: 95 %**

### Acciones por ejecutar

- Colocación puntas pararrayos
- Conexión sistema pararrayos
- Instalación planta de emergencia y puesta en operación
- Iluminación de linternilla de la cúpula

## FCH | Proyectos Fideicomiso Centro Histórico 2020-2021

	<b>INMUEBLE / ACCIÓN</b>	<b>STATUS</b>
<b>CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH - FCHCM</b>	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO <b>SAN JUAN DE DIOS</b>	EN PROCESO, AVANCE FÍSICO 42%, TÉRMINO SEPTIEMBRE 2021.
	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO DE <b>SANTA CATARINA</b>	EN PROCESO, AVANCE FÍSICO 35%, TÉRMINO DICIEMBRE 2021.
<b>CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM</b>	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL ' <b>JARDÍN REGINA</b> ' . REGINA No. 40, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	SE INICIÓ PROCESO, TÉRMINO 23 DE JULIO DEL 2021.
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL ' <b>CORREDOR SAN JERÓNIMO</b> '.	SE INICIÓ PROCESO, TÉRMINO 23 DE JULIO DEL 2021.
	<b>SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B.</b>	SE INICIÓ DE PROCESO, TÉRMINO ENERO 2022.



**OBRAS EN PROCESO:**  
CONVENIO COORDINACIÓN INAH-FCHCM.



Intervención en muro del Museo Franz Meyer.



Proceso de consolidación de grietas en interiores del templo.

**TEMPLO SAN JUAN DE DIOS.**

# FCH | Proyectos Fideicomiso Centro Histórico 2020-2021

## EN DESARROLLO DE PROYECTO INTEGRAL: CONVENIO COORDINACIÓN INAH-FCHCM.



Proceso de levantamiento y modelado.



Proceso de levantamiento y modelado.



Desmontaje y resguardo de bienes muebles.

**TEMPLO DE SANTA CATARINA.**



## FCH | Proyectos Fideicomiso Centro Histórico 2020-2021

### OBRA EN PROCESO:

CONVENIO COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN FIDEICOMISO F/54 y FCHCM.



Mantenimiento de jardineras y vegetación.



Proceso de reemplazo de piso de caucho para áreas de juegos infantiles.



Proceso de reemplazo de acabado cerámico en zonas de bebederos.

**MANTENIMIENTO AL JARDÍN REGINA.**



## FCH | Proyectos Fideicomiso Centro Histórico 2020-2021

### OBRA EN PROCESO:

CONVENIO COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN FIDEICOMISO F/54 y FCHCM.



REHABILITACIÓN CORREDOR SAN JERÓNIMO.



## Agencia Digital de Innovación Pública | ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte del 27/05	Reporte al 11/06	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones	Ducto Maestro Santa María la Redonda	Quincenal	92%	94%	29 de junio
Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones	Ducto Maestro Balderas	Mensual	67%	70%	29 de junio

# Agencia Digital de Innovación Pública | ADIP



## INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD

### META

TRAYECTORIA	ML
RED TRONCAL	12416
RED DISTRIBUCION	156
RADIALES Y ACOMETIDAS	5096

**94%** DE AVANCE

## Agencia Digital de innovación Pública | ADIP



### INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD

#### META

TRAYECTORIA	ML
RED TRONCAL	10.016
RED DISTRIBUCION	4176
RADIALES Y ACOMETIDAS	4250

**70 %** DE AVANCE

## Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano | C5

Indicador	Línea base	Periodicidad	28/05 al 14/06	Próximo reporte
No. cámaras con falla o intermitencia			<b>8 cámaras</b>	
		Quincenal		29 de junio
Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura			<b>01 cámara</b>	

*NOTA: Los datos proporcionados son extraídos de los **Reportes de mesa de ayuda de C5***

## SSC-SCT-DSOT | Tránsito

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	01 al 14/06	Próximo reporte
Semáforos	Número de semáforos con mantenimiento preventivo	Quincenal	19	29 de junio
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo		58	
Cámaras	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		0	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo		0	

# SSC-SCT-DSOT | Tránsito


## CORRECTIVO

ACOMETIDA	1
APAGADO	8
CABLE DE COMUNICACIÓN DAÑADO	2
CORTO	8
DESORIENTADO	4
FOCO FUNDIDO	4
FY-CINTILANTE	13
INSTALACION DE SEMAFORO	1
LIMPIEZA DE COMPONENTES	3
OBRA CIVIL	1
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	11
TAPA DAÑADA	2

## PREVENTIVO

LIMPIEZA DE COMPONENTES	19
TOTAL GENERAL	77

MANTENIMIENTO SEMAFORICO



Reportes

**Turnos e incidencias urbanas**

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

## Matriz de seguimiento a turnos| ACH

<i>ATIENDE</i>	Atendido	Pendiente	Proceso	Suma total
ACH	16			12
Al. Cuauhtémoc	3		1	4
C5	1			1
CFE	4			3
CONAVI	1			1
INBAL	1			1
SACMEX	6		1	7
SEDEMA	1			1
SEDUVI	2			2
SOS-AP		1		
SOS-DGCOP	2			2
SOS-DGOIV	8			8
SOS-DGSUS	3	1		3
<b>Suma total</b>	<b>48</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>52</b>

## Seguimiento a turnos| ACH

### Atendidos

CLAVE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-048	TRÁNSITO	Coordinar reunión con ADIP para la habilitación de la infraestructura de semáforos en República de Brasil.	ACH	Atendido	- Ing. Yniesta compartió de manera económica el proyecto de habilitación de la red de semáforos con la ADIP. - ADIP ya devolvió observaciones a Tránsito. <b>- Se formaliza ingreso ante ADIP</b>
TCH-050	Tránsito	Coordinar reunión con SOBSE para que informe sobre el inicio de obras en República de Chile.	ACH	Atendido	Tránsito envía a ACH (arq. Jaral) planos de infraestructura de semáforos para compartir con SOBSE

## Seguimiento a turnos| ACH

### Proceso

CLAVE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-001	ACH	Se realice la reparación de la atarjea rota de la calle de Roldán entre San Pablo y Ramón Corona	SACMEX	Proceso	Se programará en función de la disponibilidad del SACMEX
TCH-051	SACMEX	Apoyo con restitución de banquetas en Artículo 123 entre Balderas y Humboldt	Al. Cuauhtémoc	Proceso	Ya se llevaron el cascajo de Artículo 123 pero aún no reparan la banqueta

## Seguimiento a turnos| ACH

### Pendientes

CLAVE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-049	ACH	Se realice el retiro de lonas de medidas sanitarias en el Centro Histórico	SOS-DGSUS	Pendiente	Pendiente que Jesús Cruz reciba autorización para el retiro
TCH-052	UNAM	PUEC solicitá mayor iluminación	SOS-AP	Pendiente	Arq. Jaral gestionará la colocación de luminarias para peatón

## Matriz de seguimiento a Incidencias Urbanas | ACH

<i>Matriz de Incidencias</i>	<i>ESTATUS</i>			Suma total
	<b>Dependencia</b>	<b>Atendido</b>	<b>En proceso</b>	
ACH	47		6	53
Al. Cuauhtémoc	45		14	59
C5	3			3
CFE	117	2	32	151
SACMEX	60	7	22	89
SEDEMA			1	1
SGIRyPC	1		1	2
SOS-AP	43		2	45
SOS-DGOIV	22	2	9	33
SOS-DGSUS	35			35
STC-Metro	2			2
TELMEX	6		3	9
Tránsito	19	2	5	26
<b>Suma total</b>	<b>400</b>	<b>13</b>	<b>95</b>	<b>508</b>

## Atención VIPPSC | ACH

CLAVE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN
IUCH-445	VIPP 3. Santo Domingo	Basura en vía pública	República de Brasil	República de Honduras	República de Ecuador				SOS-DGSUS	Atendido	01/06/2021
IUCH-447	VIPP 8. San Pablo	Costales con escombros	Fray Servando	San Pablo		158			SOS-DGSUS	Atendido	01/06/2021
IUCH-448	VIPP 7. Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	Falta de tapa	Izazaga	Eje Central	Isabel la Católica	65			Sacmex	Atendido	03/06/2021
IUCH-449	VIPP 7. Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	Falta de tapa	Izazaga	Eje Central	Isabel la Católica	68			sacmex	Atendido	03/06/2021

## Atención VIPPSC | ACH

CLAVE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN
IUCH-450	VIPP 7. Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Falta de tapa	Izazaga	Eje Central	Isabel la Católica	93			sacmex	Atendido	01/06/2021
IUCH-451	VIPP 7. Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Falta de tapa	Izazaga	Eje Central	Isabel la Católica	a 100 metros del 93, altura del Claustro de Sor Juana			sacmex	Atendido	01/06/2021
IUCH-452	VIPP 3. Santo Domingo	Falta de tapa	Altuna	República de Perú					Al. Cuauhtémoc	Atendido	01/06/2021
IUCH-453	VIPP 6. Antigua Merced-Mixcalco	Falta de tapa	San Ildefonso	Del Carmen	Loreto				Al. Cuauhtémoc	Atendido	01/06/2021

## Atención VIPPSC | ACH

CLAVE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN
IUCH-454	VIPP 3. Santo Domingo	Falta de tapa	República de Perú	Leandro Valle					SOS-AP	Atendido	03/06/2021
IUCH-456	VIPP 8. San Pablo	Desazolve	Mesones			180, entre locales Cy D			Sacmex	Atendido	02/06/2021
IUCH-457	VIPP 4. Alameda - Sector Fianciero	Desazolve	Hidalgo			Acceso peatonal a metrobus Hidalgo			Sacmex	Atendido	02/06/2021
IUCH-458	VIPP 4. Alameda - Sector Fianciero	Desazolve	República de Uruguay			35			Sacmex	Atendido	02/06/2021

## Atención VIPPSC | ACH

CLAVE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN
IUCH-460	VIPP 3. Santo Domingo	Falla en alumbrado público	República de Colombia	República de Argentina	República de Brasil				SOS-AP	Atendido	02/06/2021
IUCH-462	VIPP 8. San Pablo	Falla en el suministro eléctrico	San Jerónimo	Pino Suárez			sin imagen	sin imagen	CFE	Atendido	02/06/2021
IUCH-464	VIPP 4. Alameda - Sector Financiero	Pepena de basura	Tacuba						SOS-DGSUS	Atendido	03/06/2021
IUCH-465	VIPP 7. Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Falta de tapas	Tlaxcoaque	Fray Servando Teresa de Mier	Pino Suárez	Junto al edificio Juana de Arco			Sacmex	Atendido	
IUCH-466	VIPP 7. Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Falta de tapas	Tlaxcoaque	Fray Servando Teresa de Mier	Pino Suárez	Junto al edificio Juana de Arco			Sacmex	Atendido	
IUCH-469	VIPP 8. San Pablo	Falla en suministro eléctrico	Plaza la aguilita	Misioneros	Ramón Corona				CFE	Atendido	

## Atención VIPPSC | ACH

CLAVE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-472	VIPP 6. Antigua Merced-Mixcalco	Alumbrado público no sirve	Emiliano Zapata	Jesús María			sin imagen		SOS-AP	Atendido
IUCH-474	VIPP 3. Santo Domingo	Obra de CFE	República de Argentina	República de Colombia	República de Venezuela	Altura del 42 y 44			CFE	Atendido
IUCH-475	VIPP 1. Santa María la Redonda	Árbol caído	Zarco	Violeta	Mina				Al. Cuauhtémoc	Atendido
IUCH-476	VIPP 6. Antigua Merced-Mixcalco	Falla en suministro eléctrico	Soledad			66	sin imagen		CFE	Atendido
IUCH-477	VIPP 6. Antigua Merced-Mixcalco	Falla en suministro eléctrico	Soledad			19	sin imagen		CFE	Atendido
IUCH-478	VIPP 6. Antigua Merced-Mixcalco	Falla en suministro eléctrico	Emiliano Zapata			69	sin imagen		CFE	Atendido
IUCH-482	VIPP 3. Santo Domingo	Falla en alumbrado público	Republica de Perú	República de Brasil	República de Argentina				SOS-Ap	Atendido

## Atención VIPPSC | ACH

CLAVE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
IUCH-483	VIPP 4. Alameda - Sector Financiero	Falta de tapa	Callejon de Condesa	5 de mayo	Tacuba				SOS-AP	Atendido	09/06/2021	
IUCH-485	VIPP 6. Antigua Merced-Mixcalco	Falla en suministro eléctrico	Soledad			45			CFE	Atendido		
IUCH-487	VIPP 4. Alameda - Sector Financiero	Falla en alumbrado público	Gante	16 de septiembre	Venustiano Carranza				SOS-Ap	Atendido	08/06/2021	se encontraron conexiones irregulares que utilizan los ambulantes
IUCH-488	VIPP 1. Santa María la Redonda	Acumulación de basura	Mercado 2 de abril			Junto a estacionamiento			SOS-DGSUS	Atendido	08/06/2021	
IUCH-491	VIPP 1. Santa María la Redonda	Drenaje tapado	Galeana			33			Sacmex	Atendido	08/06/2021	se informa que el problema era interior, se trabajó el primer registro y el albañal domiciliario, la atarjea se encuentra con niveles bajos., así mismo se limpiaron dos canaletas pluviales que se encuentran a un costado del predio

## Atención VIPPSC | ACH

CLAVE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
IUCH-491	VIPP 1. Santa María la Redonda	Drenaje tapado	Galeana			33			Sacmex	Atendido	08/06/2021	se informa que el problema era interior, se trabajó el primer registro y el albañal domiciliario, la atarjea se encuentra con niveles bajos.. así mismo se limpiaron dos canaletas pluviales que se encuentran a un costado del predio
IUCH-492	VIPP 6. Antigua Merced-Mixcalco	Falta de tapa	Correo Mayor	República del Salvador					Telmex	Atendido	08/06/2021	
IUCH-496	VIPP 4. Alameda - Sector Financiero	Desazolve	Filomeno Mata	Tacuba	5 de Mayo				Sacmex	Atendido		
IUCH-497	VIPP 1. Santa María la Redonda	Basura en vía pública	Mercado 2 de abril						SOS-DGSUS	Atendido	09/06/2021	

## Atención VIPPSC | ACH

CLAVE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
IUCH-461	VIPP 8. San Pablo	Desazolve	Santo Tomás	Regina					Sacmex	En proceso		<p>En atención a los trabajos realizados en la calle Santo Tomás informó la existencia de varios puntos donde la manguera no avanza, en el PV 6 la manguera avanza 8 ML hacia el sur, mientras que en el PV 4 la manguera llega hasta los 9 ML hacia el norte, el PV 5 no se pudo trabajar debido a que un vehículo estaba sobre el, se requiere continuar con los trabajos de desazolve. También se hace mención que todos los PV presentan una gran cantidad de grasa, basura y escombros.</p> <p>03/06/2021 Grasa que sigue saliendo de santo Tomás. Tanco de basura</p>
IUCH-474	VIPP 3. Santo Domingo	Obra de CFE	República de Argentina	República de Colombia	República de Venezuela	Altura del 42 y 44			Sacmex	En proceso		
IUCH-489	VIPP 3. Santo Domingo	Sin energía eléctrica	República de Chile			43			CFE	En proceso		<p>CFE: M2133293267 Los locales siguen sin luz, platicaron con los de la obra mencionando que seguramente rompieron algo</p>
IUCH-501	VIPP 5. Zócalo	Coladera tapada	Isabel la Católica	5 de Mayo		15			Sacmex	En proceso		<p>Se informa que personal técnico y operativo acudieron al lugar donde se realizó limpieza y desazolve de los accesorios pluviales, sin embargo no se logró destapar el tubo de descarga ya que la manguera de sondeo avanza 7m y no pasa.. se sugiere intentar con herramienta manual y en su caso, realizar la reconstrucción correspondiente</p>

## Atención VIPPSC | ACH

CLAVE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
IUCH-446	VIPP 3. Santo Domingo	Daño en banqueta	República de Bolivia	República de Brasil	República de Argentina	Frente a no. 13	sin imagen		CFE	Pendiente		
IUCH-446	VIPP 3. Santo Domingo	Daño en banqueta	República de Bolivia	República de Brasil	República de Argentina	Frente a no. 2			CFE	Pendiente		
IUCH-455	VIPP 8. San Pablo	Desazolve	Jesús María	San Pablo	Venustiano Carranza				Sacmex	Pendiente		
IUCH-459	VIPP 1. Santa María la Redonda	Cables expuestos	Pensador Mexicano			47			Telmex	Pendiente		
IUCH-463	VIPP 3. Santo Domingo	Reparación inconclusa en banqueta	República de Perú	República de Brasil	República de Argentina				CFE	Pendiente	03/06/2021	Estan rompiendo banqueta CFE desde ayer pusieron luz por la noche . Hubo otro corto y no hay luz en toda la cuadra.


## Atención VIPPSC | ACH

CLAVE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
IUCH-467	VIPP 7. Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Falta de tapas	Tlaxcoaque	Fray Servando Teresa de Mier	Pino Suárez	Junto al edificio Juana de Arco			Al. Cuauhtémoc	Pendiente		Nuevo reporte: 08/06/2021 - Fer Arcos
IUCH-468	VIPP 7. Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Falta de tapas	Tlaxcoaque	Fray Servando Teresa de Mier	Pino Suárez	Junto al edificio Juana de Arco			Al. Cuauhtémoc	Pendiente		
IUCH-470	VIPP 8. San Pablo	Falta de tapa	Fray Servando	Jesús María					Al. Cuauhtémoc	Pendiente		
IUCH-471	VIPP 4. Alameda - Sector Financiero	Incidencia con Tapa	Donceles	Eje Central					CFE	Pendiente		
IUCH-473	VIPP 6. Antigua Merced-Mixcalco	Falta de Tapa	Manuel Doblado	Joaquín Herrera	Lecumberri				Al. Cuauhtémoc	Pendiente		Nuevo reporte 08/06/2021

## Atención VIPPSC | ACH

CLAVE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
IUCH-480	VIPP 6. Antigua Merced-Mixcalco	Cables expuestos	Mixcalco	Leona ViCario					CFE	Pendiente		
IUCH-481	VIPP 3. Santo Domingo	Falta tapa de coladera	República de Argentina	República de Costa Rica					Sacmex	Pendiente		
IUCH-490	VIPP 3. Santo Domingo	Sin energía eléctrica	República de Chile			53A			CFE	Pendiente		la vecindad están adentro los medidores los que la invadieron no te dejan entrar
IUCH-493	VIPP 6. Antigua Merced-Mixcalco	Tapa en mal estado	República de Venezuela	Leona Vicario					CFE	Pendiente		
IUCH-494	VIPP 7. Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Falla en suministro eléctrico	20 de Noviembre			200			CFE	Pendiente		uno de las fases no está funcionando y que parte del edificio no tiene energía eléctrica, ya hicieron su reporte es el M2133295519

## Atención VIPPSC | ACH

CLAVE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
IUCH-495	VIPP 8. San Pablo	Cables colgando	Misioneros	Roldan					Telmex	Pendiente		
IUCH-498	VIPP 8. San Pablo	Falla en semáforo	República de Uruguay	cruces					Tránsito	Pendiente		Nuevo reporte 14/06
IUCH-499	VIPP 8. San Pablo	Falla en semáforo	Circunvalación	República del Salvador					Tránsito	Pendiente		
IUCH-500	VIPP 6. Antigua Merced-Mixcalco	Falla en suministro eléctrico	Margil			30			CFE	Pendiente		
IUCH-502	VIPP 8. San Pablo	Falla de semáforo	Venustiano Carranza	Jesús María					Tránsito	Pendiente		
IUCH-503	VIPP 7. Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Desazolve	5 de Febrero			40			Sacmex	Pendiente		

## Atención VIPPSC | ACH

CLAVE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
IUCH-504	VIPP 6. Antigua Merced-Mixcalco	Bombeo de Carcamo	Santísima						Sacmex	Pendiente		
IUCH-504	VIPP 6. Antigua Merced-Mixcalco	Bombeo de Carcamo, variación en la corriente eléctrica	Emiliano Zapata			60			CFE	Pendiente		
IUCH-505	VIPP 2. Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Desazolve	Allende	Belizario Dominguez	República de Cuba				Al. Cuauhtémoc	Pendiente		
IUCH-506	VIPP 2. Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Desazolve	Maria del Toro de Lazarín	Allende	República de Chile				Sacmex	Pendiente		Se debe realizar con herramienta manual

## Atención VIPPSC | ACH

CLAVE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
IUCH-507	VIPP 3. Santo Domingo	Falla en suministro eléctrico	Honduras			59 y 59 B			CFE	Pendiente		De tres fases que llegan al predio sólo una tiene luz Número de reporte CFE M2133296655
IUCH-508	VIPP 8. San Pablo	Falla de semáforo	San Pablo	Roldán					Tránsito	Pendiente		
IUCH-509	VIPP 6. Antigua Merced-Mixcalco	Fuga de agua	Soledad	Margil		56			Sacmex	Pendiente		
IUCH-510	VIPP 1. Santa María la Redonda	Falla en alumbrado público	Santa Veracruz	Eje Central		Lado izquierdo			SOS-AP	Pendiente		

# Matriz de seguimiento a Barrio Adentro | ACH

**62 %  
avance**

<i>DEPENDENCIA</i>	Atendido	Pendiente	Suma total
ACH	25	2	27
Alcaldía Cuauhtémoc	20	13	33
C5	1		1
CFE	4	12	16
SACMEX	2	3	5
SOS-DGOIV		2	2
Telmex		1	1
<b>Suma total</b>	<b>52</b>	<b>32</b>	<b>84</b>

# Incidencias pendientes

## Atención Barrio Adentro| ACH

CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-002	SMR-Guerrero	Reposición de tapas de dren pluvial en las calles de Riva Palacio y Violeta	SOS-DGOIV		Pendiente ▾
TBA-003	SMR-Guerrero	Reposición de tapas de registro en mal estado en la calle de Santa Veracruz	CFE		Pendiente ▾
TBA-006	SMR-Guerrero	Atención de reposición de concreto en rampa de acceso en Santa Veracruz casi esq. 2 de abril	ACH		Pendiente ▾
TBA-008	SMR-Guerrero	Colocación de bancas en el Jardín del Obispo	SOS-DGOIV		Pendiente ▾

## Incidencias pendientes

### Atención Barrio Adentro| ACH

CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-013	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Magnolia entre Lerdo y Soto	CFE		Pendiente
TBA-014	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Magnolia entre Lerdo y Soto	CFE		Pendiente
TBA-017	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Degollado entre Galeana y Camelia	CFE		Pendiente

## Incidencias pendientes

### Atención Barrio Adentro| ACH

CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
-------	----------	-----------	---------	-------	---------

TBA-024	SMR-Guerrero	Renivelación de caja de válvulas en Moreno entre Soto y Zarco	SACMEX		<b>Pendiente</b>
TBA-025	SMR-Guerrero	Renivelación de asfalto en Moreno entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc		<b>Pendiente</b>

## Incidencias pendientes

### Atención Barrio Adentro| ACH

CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-026	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Lerdo entre Mosqueta y Moctezuma	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-027	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Lerdo entre Reforma y Moctezuma	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente

## Incidencias pendientes

### Atención Barrio Adentro| ACH

CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-030	SMR-Guerrero	Bacheo en arroyo vehicular en Violeta entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-032	SMR-Guerrero	Bache en arroyo vehicular en Violeta entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-034	SMR-Guerrero	Reparación de banqueteta en Calle Soto entre Reforma y Mina	ACH		Pendiente

## Incidencias pendientes

### Atención Barrio Adentro| ACH

CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-035	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Zarco entre Eje 1 Norte y Degollado	CFE		Pendiente
TBA-036	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Zarco entre Moctezuma y Eje 1 Guerrero	CFE		Pendiente
TBA-037	SMR-Guerrero	Reparación de banquetta en Zarco entre Moctezuma y Eje 1 Guerrero	ACH		Pendiente

## Atención Barrio Adentro| ACH

CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-039	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Zarco entre Moreno y Magnolia	CFE		Pendiente
TBA-041	Centro I	Renivelación de tapa de registro en Belisario Domínguez entre Brasil y Palma	CFE		Pendiente
TBA-043	Centro I	Reparación de arroyo vehicular estampado en Belisario Domínguez entre Palma e Isabel la Católica	ACH		Pendiente
TBA-044	Centro I	Renivelación de registro en Belisario Domínguez entre Palma e Isabel la Católica	CFE		Pendiente

## Incidencias pendientes

### Atención Barrio Adentro| ACH

CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-047	Centro I	Reparación de arroyo vehicular estampado en Belisario Domínguez entre Bolívar y el Callejón del 57	CFE		Pendiente
TBA-049	Centro I	Renivelación de caja de válvulas en República de Honduras entre Allende y República de Chile	SACMEX		Pendiente
TBA-052	Centro I	Reparación de bache en arroyo vehicular con asfalto en República de Honduras entre Brasil y Argentina	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-063	Centro I	Bacheo en arroyo vehicular en República de Ecuador y Argentina	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente

# Incidencias pendientes

## Atención Barrio Adentro| ACH

CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-064	Centro I	Reparación de banqueta en República de Ecuador entre Callejón de Ecuador y Brasil	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-068	Centro I	Bacheo en arroyo vehicular en República de Ecuador entre Palma Norte y Comonfort	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-069	Centro I	Bacheo en arroyo vehicular en República de Ecuador entre Comonfort y Allende	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-073	Centro I	Reparación de tapa de registro en República de Ecuador entre San Camilito y Eje Central	CFE		Pendiente

## Incidencias pendientes

### Atención Barrio Adentro| ACH

CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-074	Centro I	Reparación de arroyo vehicular con asfalto en calle Órgano esquina Eje Central	Alcaldía Cuauhtémoc		<b>Pendiente</b>
TBA-075	Centro I	Reparación de banqueta en calle Libertad entre Eje Central y Allende	Alcaldía Cuauhtémoc		<b>Pendiente</b>
TBA-076	Centro I	Reparación de arroyo vehicular con asfalto en calle Libertad entre Eje Central y Allende	Alcaldía Cuauhtémoc		<b>Pendiente</b>
TBA-078	Centro I	Reparación de banqueta en calle Libertad entre Eje Central y Allende	Alcaldía Cuauhtémoc		<b>Pendiente</b>

## Atención Barrio Adentro| ACH

CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-079	Centro I	Renivelación de tapa de registro en calle Libertad esquina Allende	Telmex		Pendiente
TBA-080	Centro I	Renivelación de caja de válvulas en calle Libertad esquina Comonfort	SACMEX		Pendiente
TBA-082	Centro I	Reparación de banqueteta en calle Libertad entre Palma Norte y Peralvillo	ACH		Pendiente

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

**Asuntos generales**

Acuerdos

Asistencia

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

**Acuerdos**

**Asistencia**

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

**Acuerdos**

**Asistencia**

## Turnos nuevos

Fecha	Solicitante	Solicitud	Atiende
16/06/21	ACH	Identificar puntos de reincidencia de grafiti en monumentos catalogados por el INAH para solicitar a SSC reforzar vigilancia.	DGSUS
16/06/21	Secretaría de Cultura Federal	Desazolve de colector en Enrico Martínez en la zona de la Ciudadela.	SACMEX
16/06/21	Secretaría de Cultura Federal	Campaña de sensibilización de Manejo integral de grasas, aceites y residuos sólidos en la zona de la Ciudadela	ACH

## Acuerdos de la sesión

- Las dependencias deberán reportar el robo de elementos de infraestructura para dar seguimiento y complementar con las denuncias correspondientes.
