



UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Mesa de Infraestructura y Obras

5a. Sesión

Evaluación Febrero

Inicio de la transmisión en vivo
09 de marzo 2021



UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo



UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes de indicadores

Transmisión en vivo



ACH

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 22/02/2021	Quincena al 08/03/2021	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Quincenal	170	21	22 de marzo
Eliminación de grafiti	Número de metros cuadrados de grafiti vandálico retirado en el Perímetro de la ACH	Quincenal	0	123	22 de marzo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO

ACH | obras menores


Se realizaron trabajos en:

Pino Suárez
16 de Septiembre
Regina
Belisario
Domínguez
2° Callejón de
San Juan de Dios
Av. Hidalgo
3er Callejón de
San Juan de Dios
Miguel Alemán
Pensador
Mexicano
20 de Noviembre
San Jerónimo

Los trabajos realizados consistieron en **reparar dos registros** en Pino Suárez entre Regina y San Jerónimo, **se colocó un bolardo** en 16 de Septiembre e Isabel la Católica, **se colocó un bolardo quitapón** en Regina entre 20 de Noviembre y 5 de Febrero, **se cambió rejilla dañada** en Belisario Domínguez entre República de Chile y República de Brasil, **se repararon dos registros** en Segundo Callejón de San Juan de Dios entre Santa Veracruz y Pensador Mexicano, **se reparó un registro** en Av. Hidalgo entre Paseo de la Reforma y Valerio Trujano, **se reparó un registro** en Tercer Callejón de San Juan de Dios entre Mina y Pensador Mexicano, **se reparó un registro** en Miguel Alemán entre Leona Vicario y Manuel Doblado, **se colocó y pinto una reja y se colocó una acometida eléctrica para modem** en Pensador Mexicano No. 11, **se colocaron 6 piezas de recinto y se reparó un registro** en 20 de Noviembre entre Diagonal 20 de Noviembre y Nezahualcoyotl, **se reparó un registro** en San Jerónimo entre Correo Mayor y Pino Suárez, **se reparó un registro** en Correo mayor entre Soledad y Moneda.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

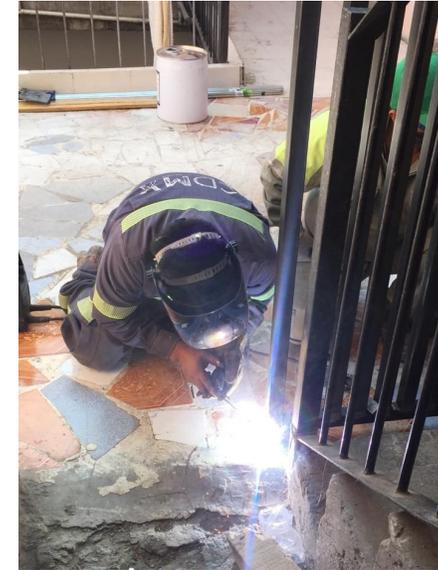



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO
CENTRO HISTÓRICO

ACH | obras menores



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO

ACH | obras menores




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Incidencias atendidas

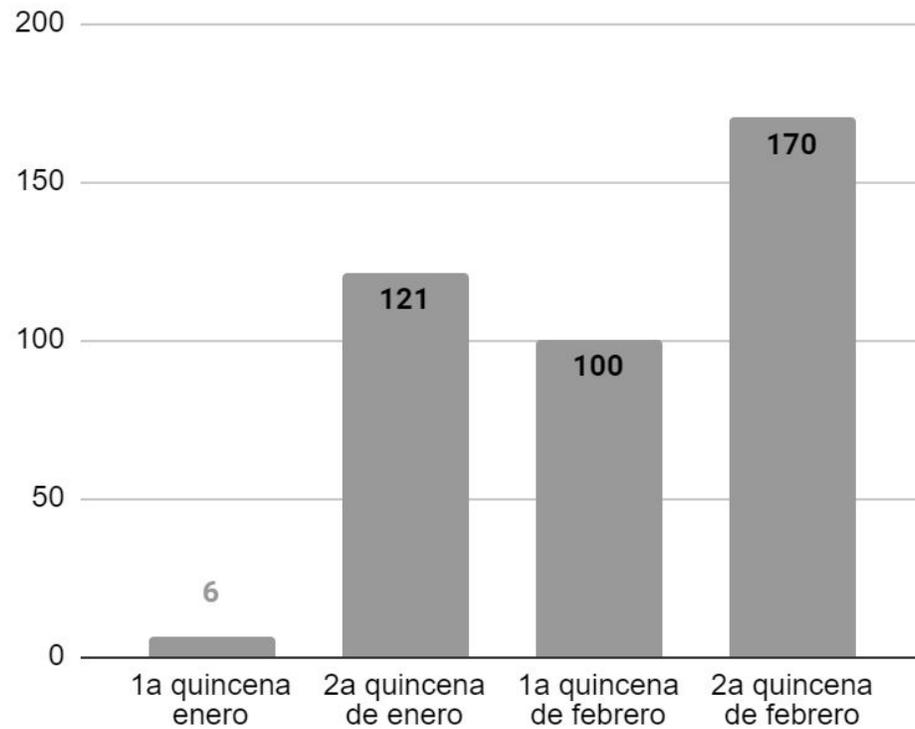

Grafiti retirado en m2

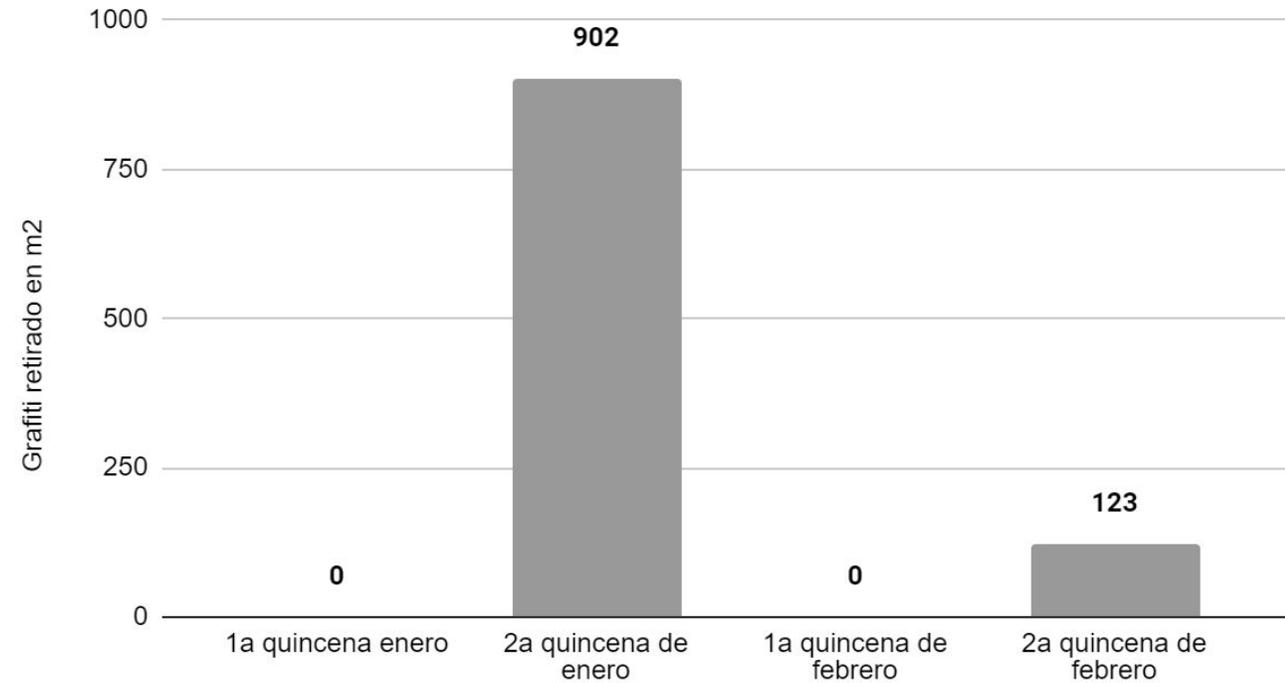

ALC. CUAUHTÉMOC

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena AI 05/03	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	60	19 de marzo	
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	24	19 de marzo	6 de las 24 acciones de poda corresponden a la liberación de cámaras C2
Drenaje	Número de metros lineales de la red de drenaje desazolvados	Quincenal	20	19 de marzo	
Drenaje	Número de rejillas de piso desazolvadas	Quincenal	2	19 de marzo	
Drenaje	Número de coladeras de banqueteta desazolvadas	Quincenal	2	19 de marzo	

ALC. CUAUHTÉMOC

Poda para liberar cámaras C2

UBICACIÓN	ID.	TIPO DE CÁMARA 9M Y 360
16 DE SEPTIEMBRE, BOLÍVAR Y FILOMENO MATA	2507	9M
16 DE SEPTIEMBRE, ISABEL LA CATOLICA Y BOLIVAR	2508	9M
CJON. DEL HORMIGUERO, ESCUELA MEDICO MILITAR	6639	9M
REPÚBLICA DEL SALVADOR, ROLDAN	9282	9M
ISABEL LA CATÓLICA, REPÚBLICA DE URUGUAY	2203	9M
AV. EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS, REPÚBLICA DE PERÚ	2286	9M



Isabel la Católica (Uruguay)



16 de septiembre (I. Católica y Bolívar)



16 de septiembre (Bolívar y Filomeno Mata)



República del Salvador (Roldán)



Cjón. del Hormiguero (Escuela Médico Militar)



Eje Central Lázaro Cárdenas

ALC. CUAUHTÉMOC

Antes



Reparación de banqueta en Luis Moya frente al # 90 aproximadamente 12 m2

Después



Reparación de banqueta en Luis Moya 114 aproximadamente 14 m2

ALC. CUAUHTÉMOC




Pendiente

CFE ubicado en República de Ecuador
acera Norte frente al no. 26, entre
Allende y San Camilito

ALC. CUAUHTÉMOC


204

Luminarias reparadas en vías secundarias
Enero - Febrero

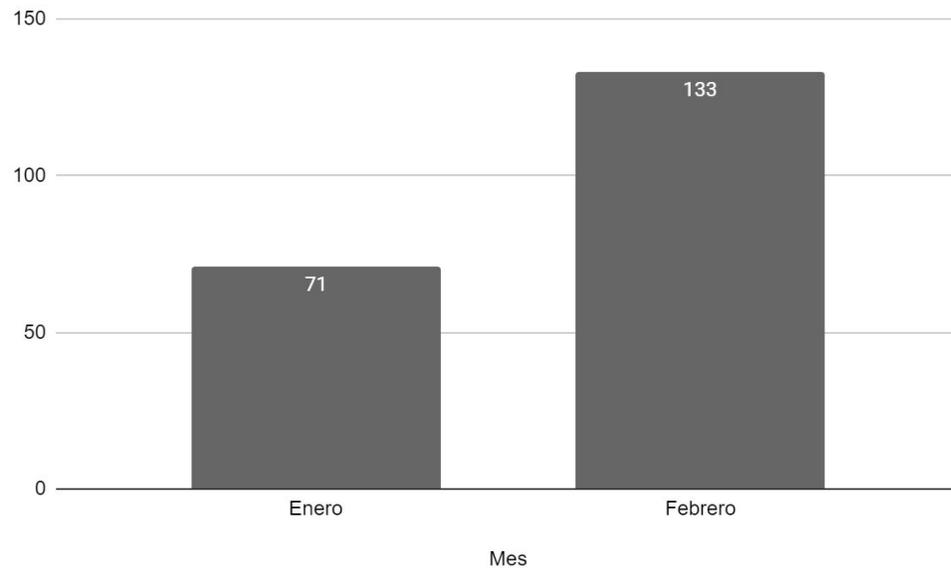

81


Sujetos forestales podados
Enero - Febrero

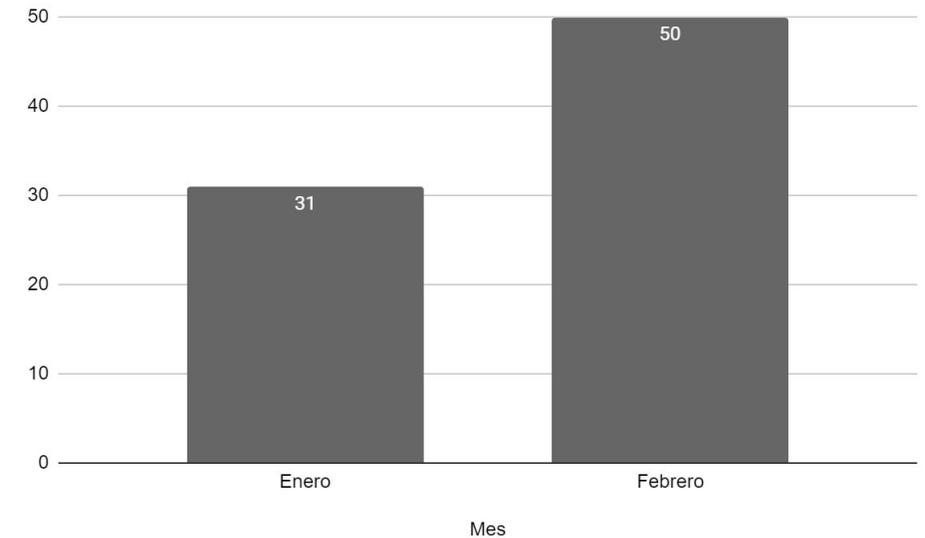

ALC. CUAUHTÉMOC


348

Metros lineales de la red de drenaje desazolvados
Enero - Febrero



20


Rejillas de piso desazolvadas

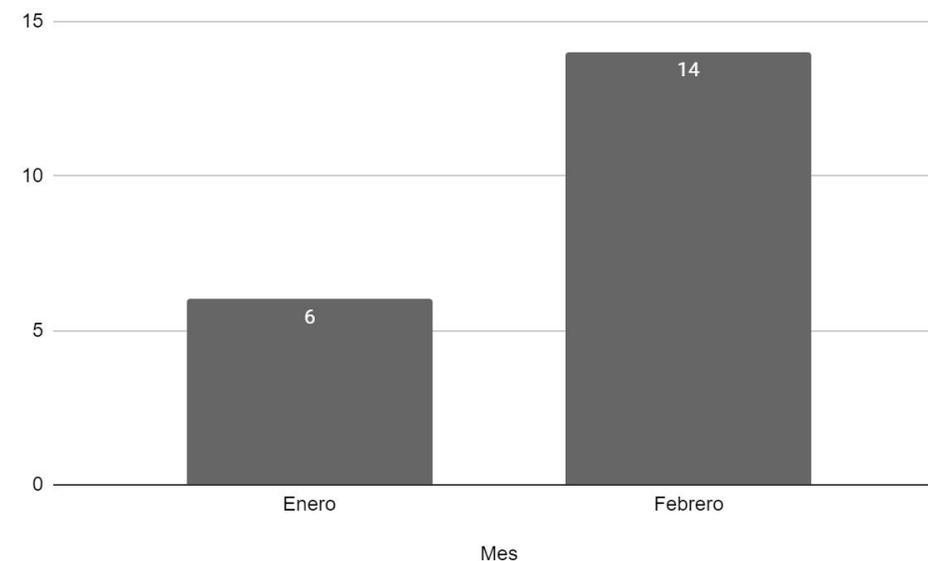

ALC. CUAUHTÉMOC

28

Coladeras de banquetta desazolvadas
Enero - Febrero

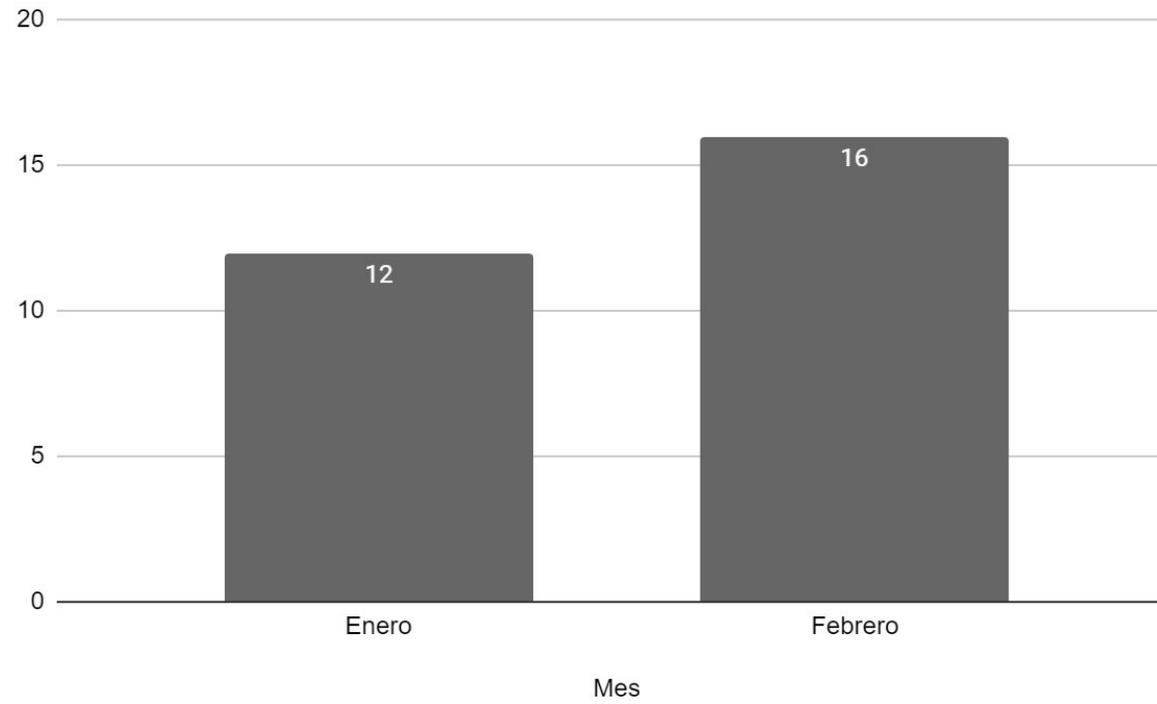

ALC. VENUSTIANO CARRANZA

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena AI 05/02	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	35	19 de febrero	Se detalla la ubicación y causa en el Anexo
Tiraderos Clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base 26 tiraderos)	Quincenal	954	19 de Febrero	Se recolectaron 30.5 toneladas diariamente de Residuos Sólidos
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	0	19 de febrero	
Drenaje	Número de metros lineales de la red de drenaje desazolvados	Quincenal	0	19 de marzo	


ALC. VENUSTIANO CARRANZA

Luminarias reparadas

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA				
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
PARQUES OAXACA Y AGUASCALIENTES	ALBAÑILES Y HEROE DE NACUZARI	PENITENCIARIA	8	REPARACION DE LUMINARIAS
ANFORA	HEROE DE NACUZARIA Y ALBAÑILES	7 DE JULIO	2	REPARACION DE LUMINARIAS
EMILIANO ZAPATA	CIRUNVALACION Y F.F.C.C. DE CINTURA	CENTRO II	3	REPARACION DE LUMINARIAS
AV. DEL PEÑON	HERREROS Y GRAN CANAL	VENUTIANO CARRANZA	6	RECONEXION DE LINEAS
CDA, DE CARRETONES		CENTRO II	1	RETIRO DE POSTE DERRIBADO
GRAL ANAYA	CONGRESO DE LA UNION	CENTRO II	12	REPARACION DE CIRCUITO
U.H. MIGUEL DOMINGUEZ 46		AMPL. PENITENCIARIA	2	REPARACION DE LUMINARIA
U.H. MIGUEL DOMINGUEZ 35		AMPL. PENITENCIARIA	1	REPARACION DE LUMINARIA
		TOTAL	35	

Anexo

ALC. VENUSTIANO CARRANZA

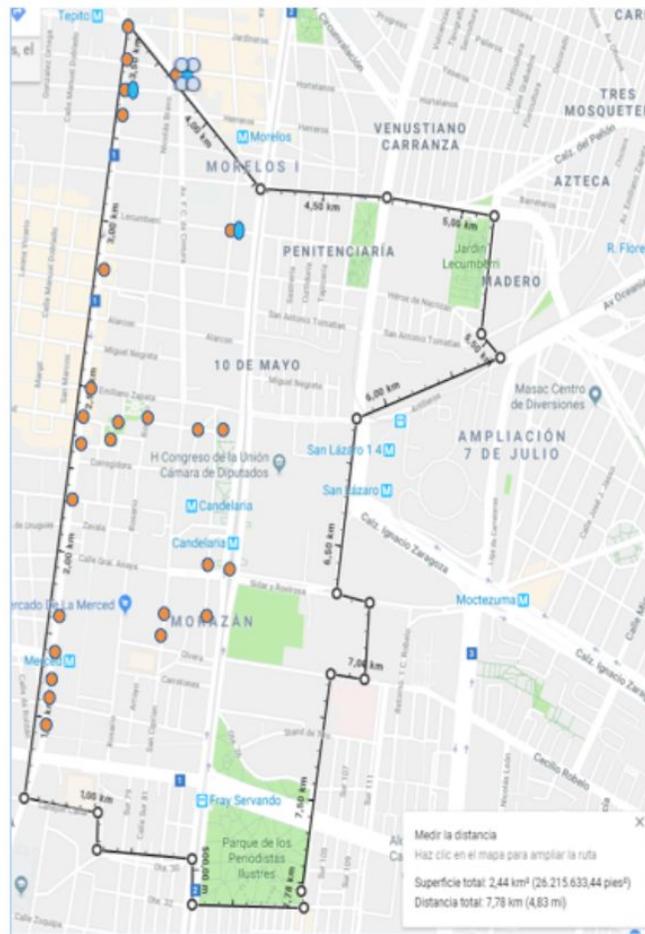

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1,75	5-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	1,4	5-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACCOZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1,15	5-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1,2	5-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0,4	5-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1,3	5-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0,9	5-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	2,75	5-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1,6	5-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1,25	5-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0,5	5-9
12	JUAN DE LA GRANIA Y CORREGIDORA (LAS CÁNCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0,5	5-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0,8	5-9
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1,05	5-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1,75	5-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1,9	5-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0,65	5-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0,5	5-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANIA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0,6	5-9
20	JUAN DE LA GRANIA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2,55	5-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0,6	5-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1	5-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1,5	5-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1,6	5-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1,1	5-9
26	JUAN DE LA GRANIA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0,7	5-9

Anexo

Montón Tradicional




Recolección de cascajo



ALC. VENUSTIANO CARRANZA


183

Luminarias reparadas
Enero- Febrero

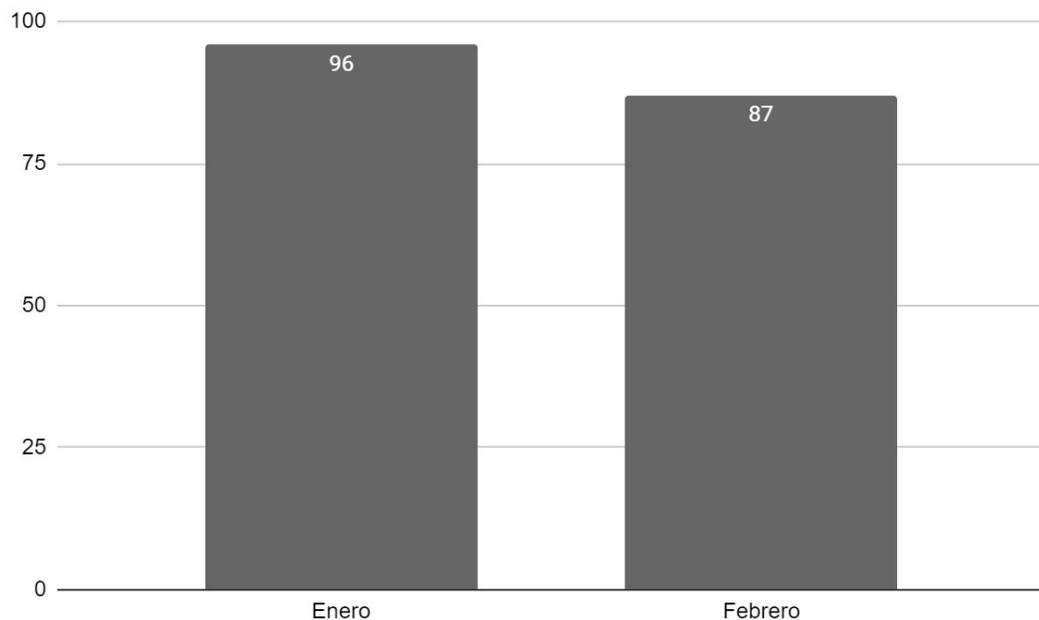

4,757


Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC
Enero- Febrero

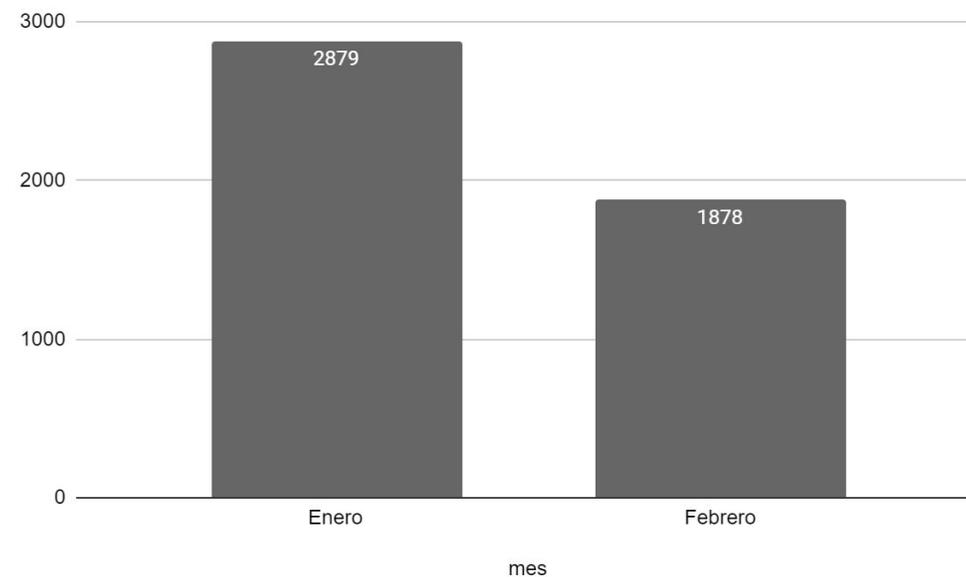

ALC. VENUSTIANO CARRANZA


18

Sujetos forestales podados
Enero- Febrero

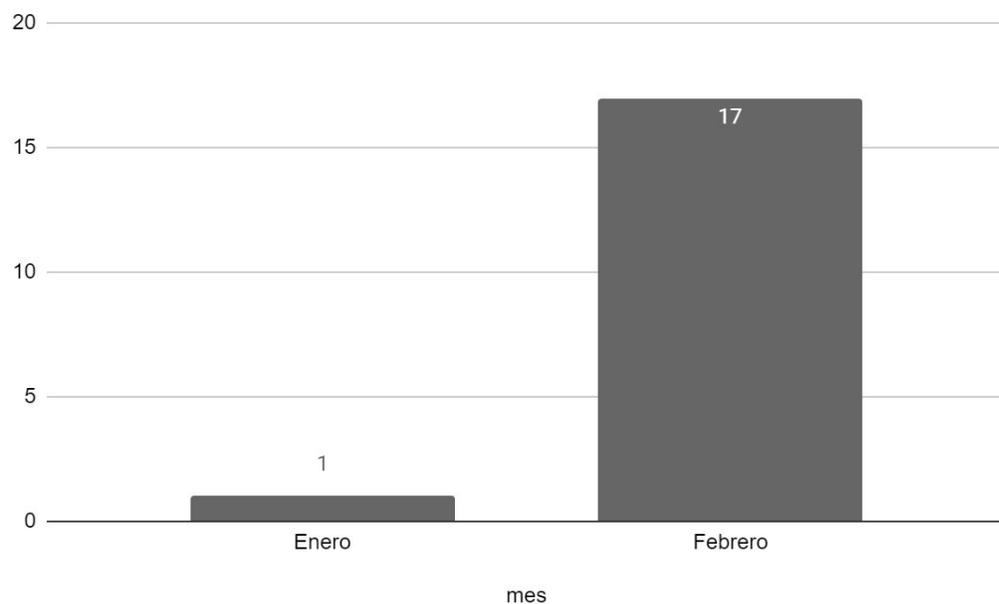



148

Metros lineales de la red de drenaje desazolvados
Enero- Febrero



ALC. VENUSTIANO CARRANZA

ACCIONES REALIZADAS PARA PREVENIR EL CONTAGIO POR COVID 19



ACCIONES REALIZADAS PARA PREVENIR EL CONTAGIO POR COVID 19

- La Alcaldía Venustiano Carranza ha implementado las siguientes medidas para prevenir el contagio por COVID 19.
- Los trabajadores de Adscritos a la Dirección General de Servicios Urbanos reciben gel antibacterial al ingreso de sus respectivos campamentos y se les monitorea su temperatura. Aunado a lo anterior, se les proporciona diariamente un tapabocas, guantes y una careta de plástico como medida precautoria ante la emergencia sanitaria.
- El servicio de recolección de residuos

DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS DEL CENTRO HISTÓRICO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



METAS DEL PROGRAMA

12,000 metros de atarjea

250 pozos de visita

100 rejillas de piso


100 coladeras pluviales

900 metros de albañal

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

100 % DE AVANCE

Se concluyó la 2da etapa de desazolve del CH, excediendo en un 6% la meta de acuerdo a lo programado



	PROGRAMADO	AVANCE
ATARJEA (METROS)	12,000	12,600
POZOS DE VISITA	250	275
REJILLAS DE PISO	100	130
COLADERAS PLUVIALES	100	117
ALBAÑAL (METROS)	900	960





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

REPORTE FOTOGRÁFICO

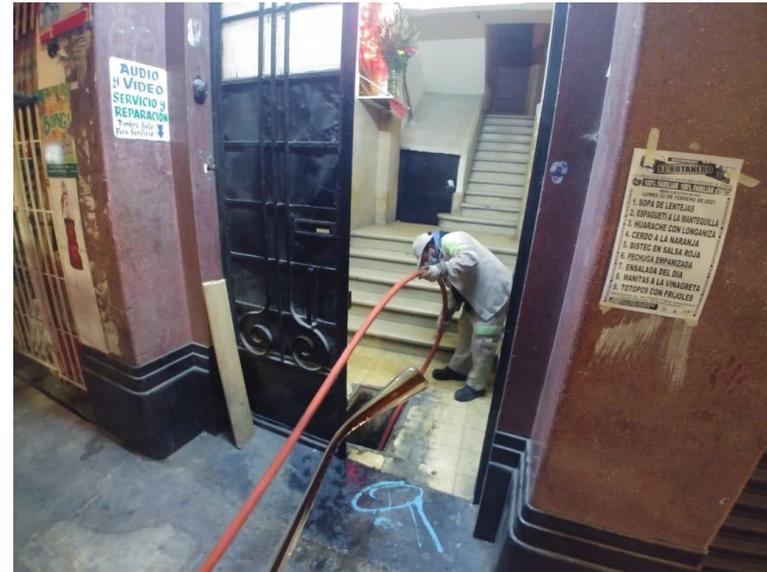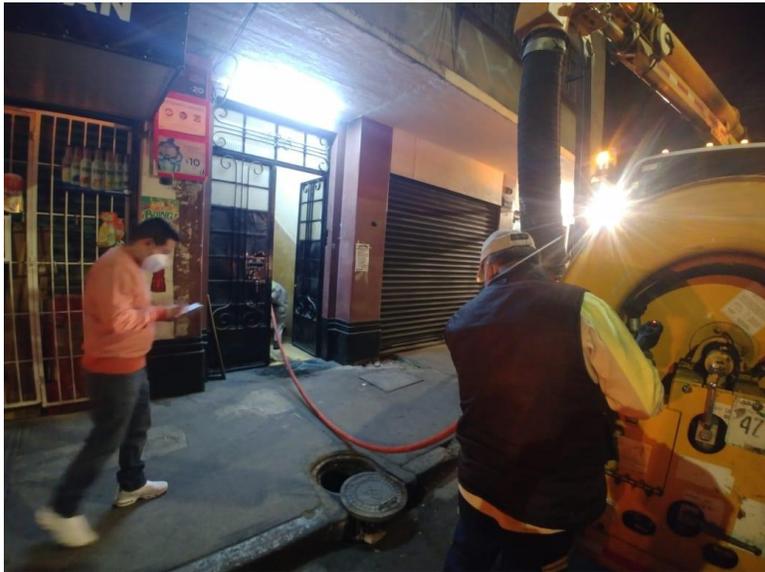


BOLIVAR NO. 125
ENTRE MESONES Y SAN JERONIMO

REPORTE FOTOGRÁFICO



CALLE ARANDA NO. 71 Y NO. 73
ENTRE ARCOS DE BELEN Y DELICIAS

REPORTE FOTOGRÁFICO

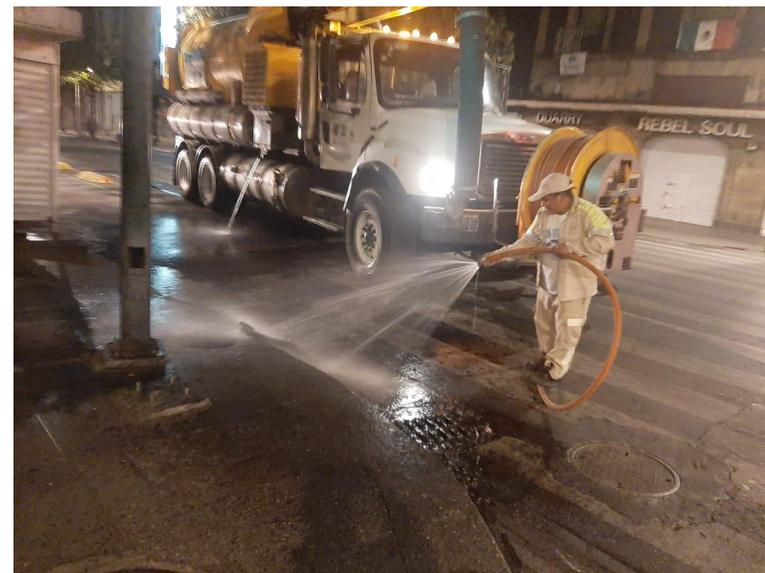

PINO SUÁREZ
ENTRE MESONES E IZAZAGA

REPORTE FOTOGRÁFICO



DOLORES
ENTRE AYUNTAMIENTO Y DOLORES

REPORTE FOTOGRÁFICO



**AYUNTAMIENTO
ENTRE MARROQUÍ Y VICTORIA**

REPORTE FOTOGRÁFICO



VICTORIA
ENTRE MARROQUÍ Y DOLORES

REPORTE FOTOGRÁFICO




Recorrido con personal de **SEDEMA, ACH y SACMEX** a los establecimientos “**Pollos Ray**” y taquería “**Los Paisas**” sobre Jesús María entre San Pablo y Regina.

Se les entrega información sobre el correcto manejo de residuos y se les invitó a no arrojar aceites o grasas a la red de drenaje.

SACMEX


**DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE
Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS DEL
CENTRO HISTÓRICO
2da. Etapa Concluida**





Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO



INVERSIÓN 2020-2021
270 MDP

ÁREA A INTERVENIR
83,500 M²

OBRA	PROGRAMADO	REAL	ACTIVIDADES
EJE CENTRAL	100.00%	100.00%	CONCLUIDO
REPÚBLICA DE BRASIL	100.00%	97.00%	<ul style="list-style-type: none"> NORTE: Término de arriates (piezas multiperforadas), balizamiento, instalación eléctrica. SUR: Colocación de recinto en banquetas, término de arriates (piezas multiperforadas), balizamiento, colado de guarniciones, demolición de banqueta, detalles de acabados, instalación de dren, instalación eléctrica, luminarias, reparación de MR45.
STA. MA. LA REDONDA	100.00%	37.73%	Trazo y nivelación, demolición de guarniciones y banquetas, registros y bases de luminarias, relleno de tepetate compactado con pisón capas de 10 cm, suministro y colocación de tubería para luminarias.
CALLE FCO. ZARCO	100.00%	38.29%	Trazo y nivelación, demolición de guarniciones y banquetas, demolición de pavimento asfáltico para colocación de MR45, ductería, bases y registros para alumbrado público.
AV. BALDERAS	77.52%	33.88%	Demolición de guarnición y banqueta, ductería, bases y registros para alumbrado público, bolardos, término de trabajos de ducto maestro.

RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO


PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRA CENTRO HISTORICO 2020-2021																							
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE	DICIEMBRE 2020					ENERO 2021				FEBRERO 2021				MARZO 2021					ABRIL 2021			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4
																08-mar-21							
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS	PROGRAMADO	22/12/2020		100.00%																			
	REAL	100.00%																					
REPUBLICA DE BRASIL	PROGRAMADO	30/12/2020													100.00%								
	REAL	97.00%										100%		04/04/2021									
SANTA MARIA LA REDONDA NORTE	PROGRAMADO	09/10/2020								04/03/2021		100.00%											
	REAL	37.73%										100%		04/04/2021									
CALLE FRANCISCO ZARCO	PROGRAMADO	05/10/2020								28/02/2021		100.00%											
	REAL	27/10/2020			38.29%										100%		04/04/2021						
AV. BALDERAS	PROGRAMADO	04/12/2020													77.52%		100%		11/04/2021				
	REAL	04/12/2020			33.88%										100%		11/04/2021						




REPÚBLICA DE BRASIL (REP. DE PERÚ – EJE 1 NORTE)



REPÚBLICA DE BRASIL (CALLE DE TACUBA - REP. DE PERÚ)

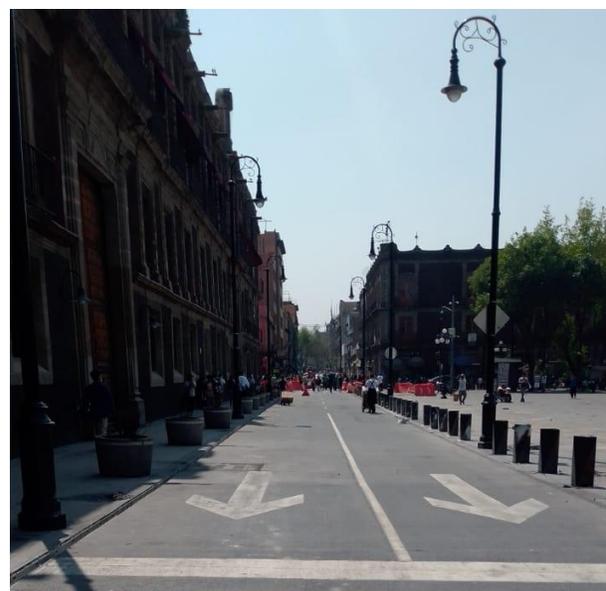


AV. BALDERAS (ARCOS DE BELEM – AV. HIDALGO)

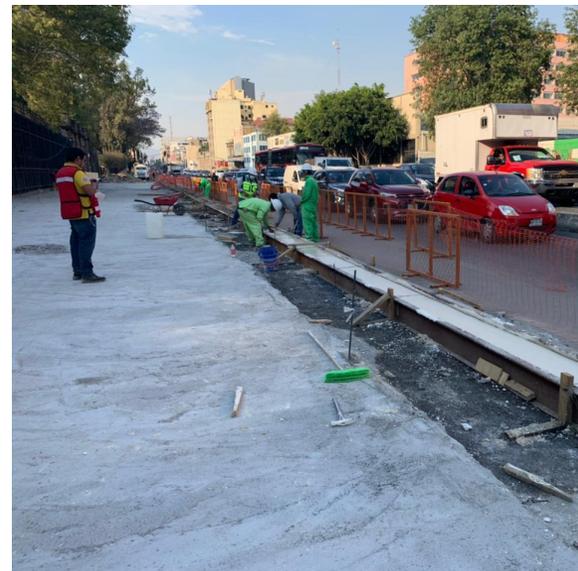

CALLE FRANCISCO ZARCO (AV. HIDALGO – CALLE VIOLETA)





SANTA MARÍA LA REDONDA (REFORMA - EJE CENTRAL - PEDRO MORENO)

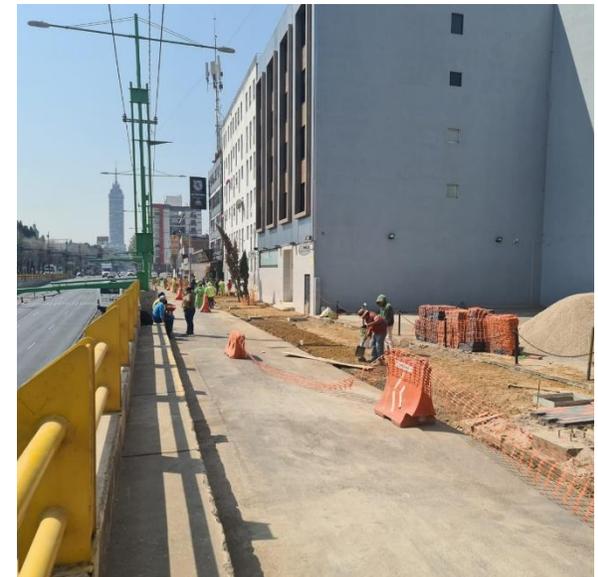

EJE CENTRAL – CENTRO HISTÓRICO




CROQUIS DE UBICACIÓN

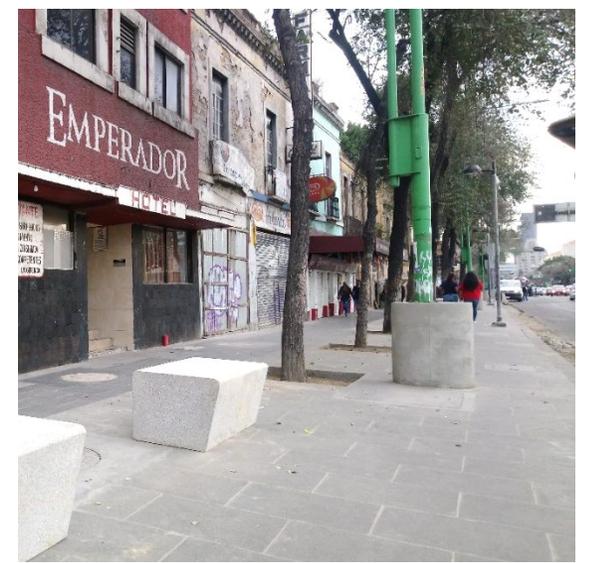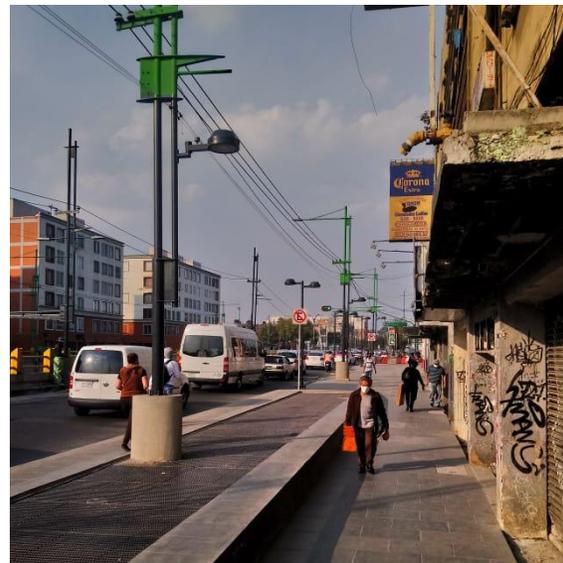

SOS-DGOIV

Porcentaje de avance de obra 4 frentes

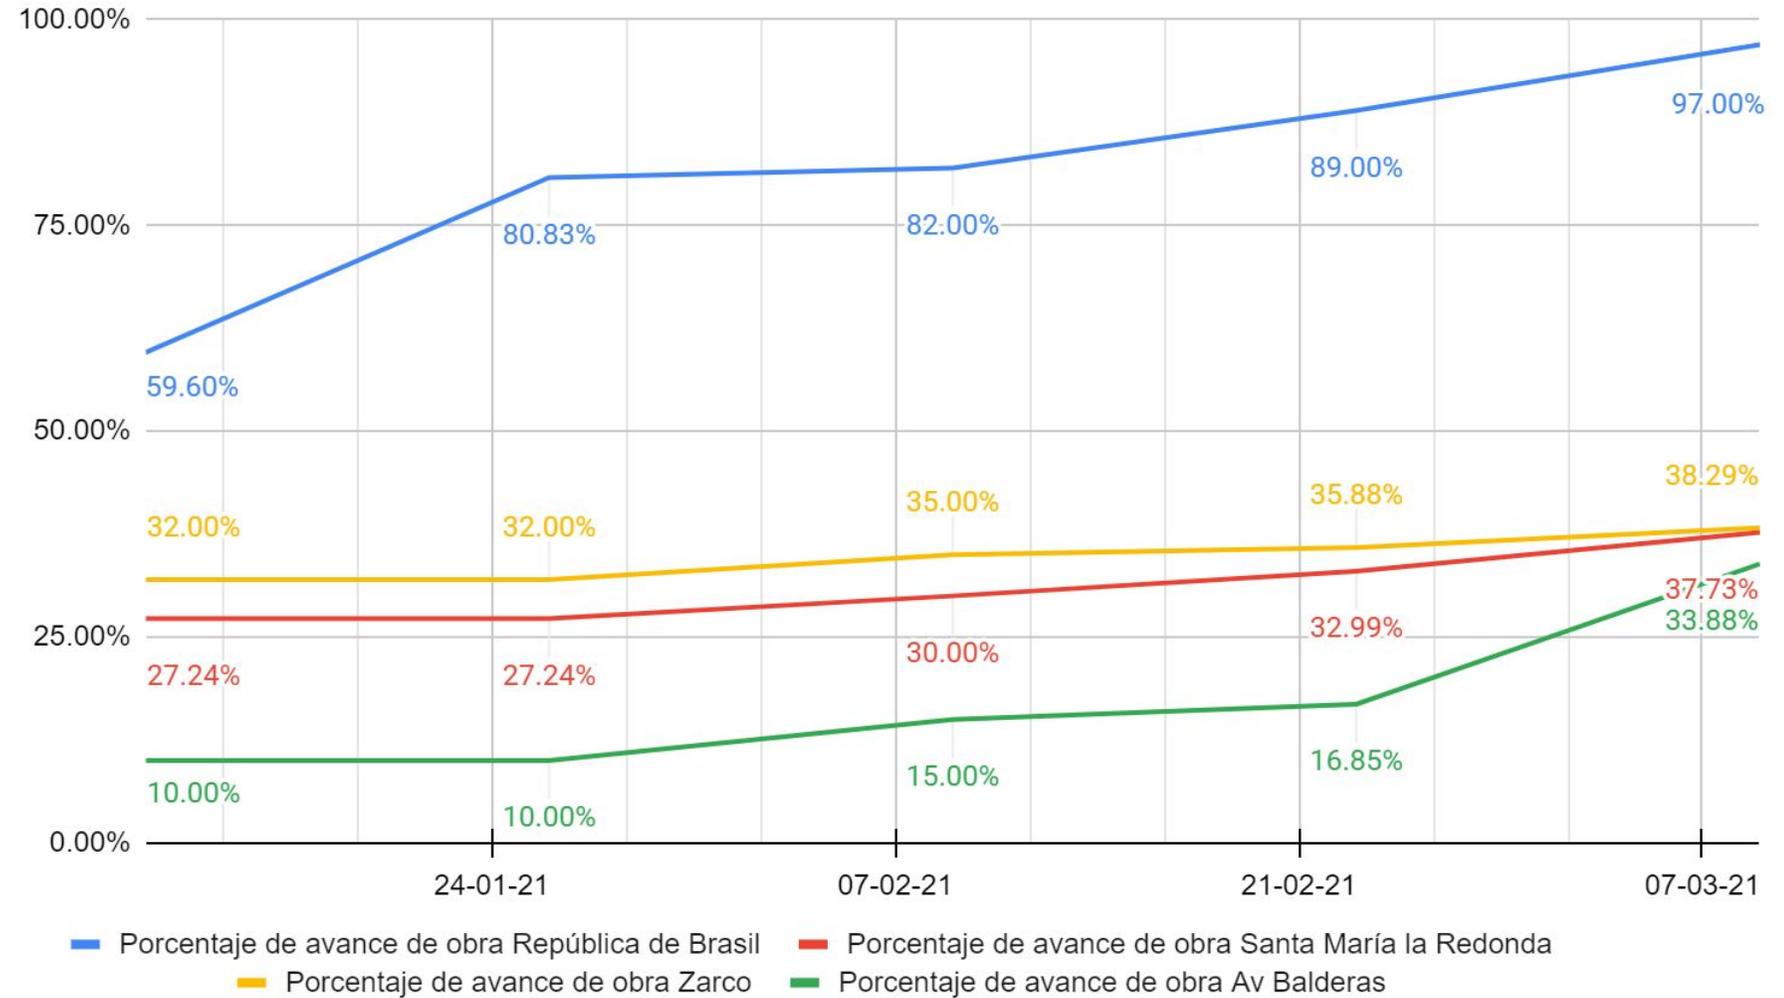



KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

AL 07 DE MARZO DE 2021

DATOS GENERALES CONTRATISTA

No. CONTRATO	DGCOP-LPN-L-1-275-20
CONTRATISTA	INOVACION Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	02/10/2020
FECHA DE TEMINACIÓN	29/01/2021
SUPERFICIE DEL TERRENO	3,456.77 M2
AREA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL	2,214.00 M2
AREAS EXTERIORES	3,625.00 M2

ESTADO FINANCIERO

IMPORTE DEL CONTRATO	\$	16,055,790.56
IMPORTE ESTIMADO (PAGADO)		\$171,182.31
IMPORTE POR ESTIMAR	\$	15,884,608.25


ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO		SIN ANTICIPO
ANTICIPO AMORTIZADO	\$	-
ANTICIPO POR AMORTIZAR	\$	-

RESIDENTE:

ARQ. GRACIELA DUARTE CALIXTO

J.U.D. DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION C2

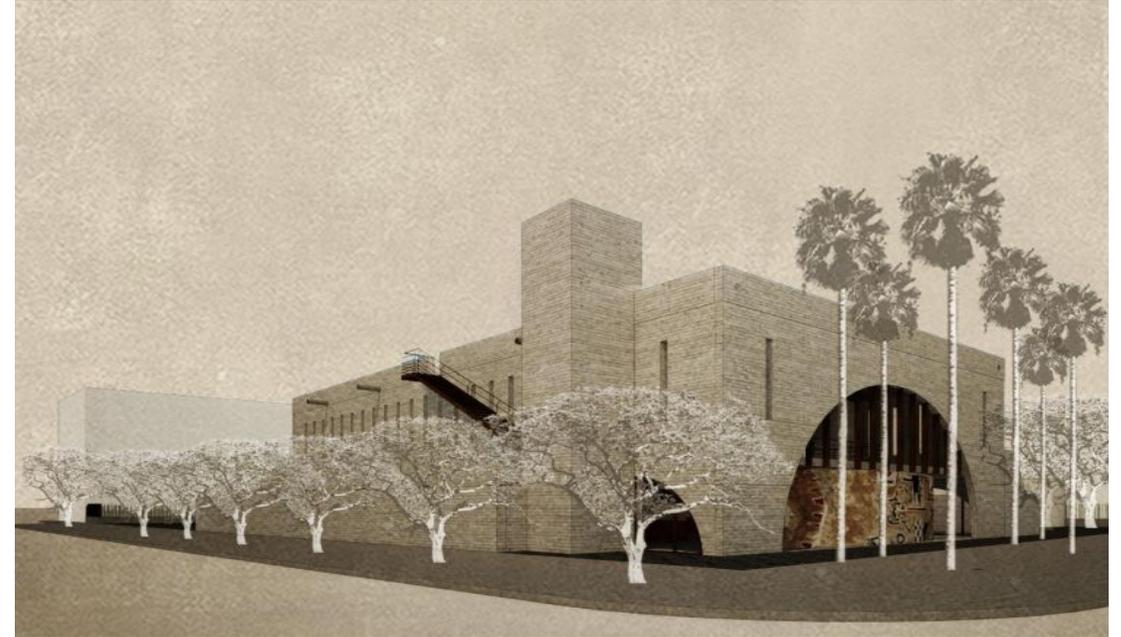


PERSPECTIVA DEL PROYECTO



KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

**GRÁFICA DE AVANCES DE LA OBRA AL 07 DE MARZO DE 2021
CONTRATO DGCOP-LPN-L-1-275-20**

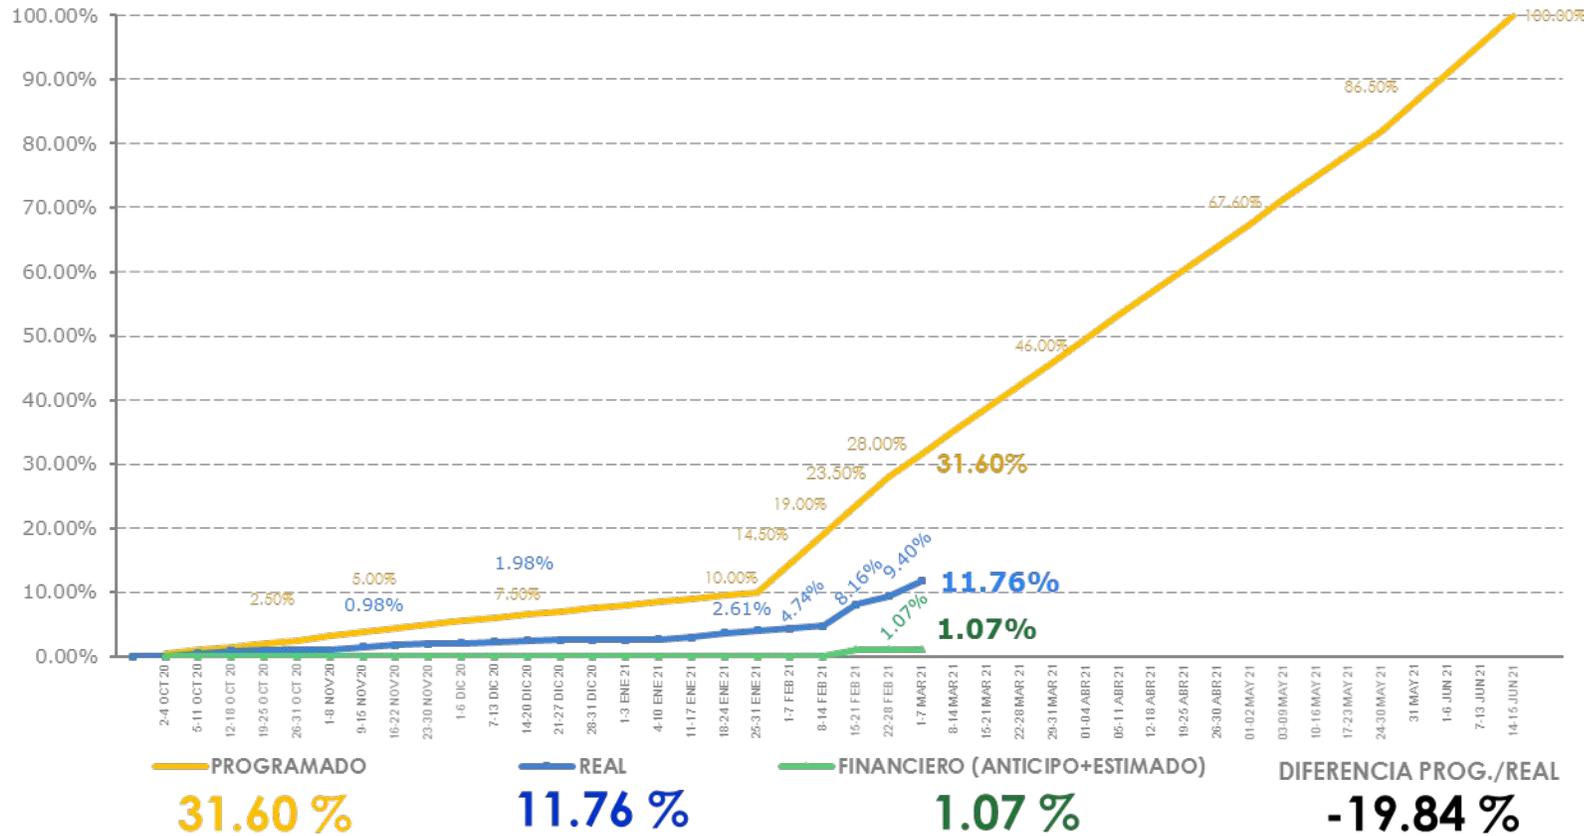

NOTA: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRAMITE ANTE LA DGCYOP, UN CONVENIO EN AMPLIACION DE PLAZO AL CONTRATO DGCOP-LPN-L-1-275-20 DE LA EMPRESA CONTRATISTA INOVACION Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., DEBIDO A LOS TRABAJOS DE ARQUEOLOGIA QUE REALIZA EN EL PREDIO EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA.



KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

ACTIVIDADES

PRELIMINARES

- LA EMPRESA CONTRATISTA INOVACION Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS DE PAVIMENTOS DE ASFALTO Y FIRMES, GUARNICIONES, BANQUETAS, CIMENTACIONES Y MUROS DE CONCRETO EXISTENTES, LO ANTERIOR EN EL TODA EL AREA DEL PROYECTO Y DEPENDIENDO DE LOS FRENTES DE TRABAJO.
- EL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DIVERSAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES SE ESTA TRANSLADANDO AL TIRO OFICIAL AUTORIZADO “EL ARENAL”, CON DOMICILIO EN PROLONGACION PRIMAVERA No. 5, SAN MATEO HUTZLIZINGO, CHALCO, ESTADO DE MEXICO.

EDIFICIO PRINCIPAL

- SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE ARMADO CON ACERO DE REFUERZO PARA LOSA Y MUROS MC-1/MC-2 DE CIMENTACION (EJES 1-6/B-C).
- SE CONTINUAN LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS CARCAMOS DE LAS CISTERNAS DE AGUA PLUVIAL Y AGUA POTABLE (EJES 1-4/B-C), REALIZANDOSE TRABAJOS DE COLADO DE PLANTILLA DE CONCRETO F’C=100 KG/CM2 Y ARMADO CON ACERO DE REFUERZO SEGÚN PROYECTO.
- CON LA FINALIDAD DE IMPEDIR LA DESIDRATACION DEL SUELO EXCAVADO, SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE PROTECCION CONTRA INTEMPERISMO EN LAS PAREDES DE LA EXCAVACION POR MEDIO DE UN REPELLADO SIMPLE REFORZADO CON TELA DE GALLINERO.
- SE INFORMA QUE EN EL AREA DE LA EXCAVACION SE ENCONTRARON ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO (CIMENTACIONES), LOS CUALES INTERFERIAN CON LA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y SE PROCEDIO A REALIZAR LA DEMOLICION DE ESTOS.
- LA TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRAZOS DEL PROYECTO.
- SE CONTINUA EN OBRA CON EL HABILITADO DE TABLEROS DE CIMBRA DE MADERA PARA CIMENTACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL.
- A LA FECHA, SE HA SUMINISTRADO A OBRA 42.24 TONELADAS DE ACERO DE REFUERZO PARA EL ARMADO DE LA CIMENTACION (8.36 TON. No 3, 23.84 TON. No 4, 2.59 TON. No 6 Y 7.45 TON. No 8).



KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

ACTIVIDADES

FUERZA DE TRABAJO EMPRESA CONTRATISTA “INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.”

- 2 OFICIAL ALBAÑIL.
- 6 OFICIAL FIERRERO.
- 2 OFICIAL CARPINTERO.
- 4 AYUDANTES EN GENERAL.
- 1 CABO.
- 15 TOTAL

SEGURIDAD E HIGIENE.

- LA CONTRATISTA CUMPLE CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE, COMO SON LOS UTENSILIOS DE PROTECCION PERSONAL Y SUS SANITARIOS PORTATILES, ADEMAS CUENTA CON UN SEGURISTA “CASCO ROJO” PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO.
- SE REALIZAN PRUEBAS COVID AL PERSONAL OBRERO DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

SALVAMENTO ARQUEOLOGICO (INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA).

- SE INFORMA QUE UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE “EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS”, LAS ARQUEOLOGAS SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN EL PREDIO ACTIVIDADES DE “ANALISIS DE MATERIALES”, COMO SON LA CUANTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS MATERIALES OBTENIDOS DE LAS EXCAVACIONES (CERÁMICA, LÍTICA, HUESO ANIMAL, VIDRIO, MADERA, ETC.), LA TABULACIÓN DIGITAL DE LOS MISMOS POR CAPA/PROFUNDIDAD Y UNIDAD; Y LA ELABORACIÓN DE SU INFORME.
- DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA, SE LLEVA A CABO DE MANERA PERMANENTE LABORES DE VIGILANCIA ARQUEOLOGICA, POR PARTE LAS ARQUEOLOGAS ADSCRITAS POR EL INSTITUTO.



KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

ASPECTOS RELEVANTES

EMPRESA CONTRATISTA “INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.”

- SE INFORMA QUE LA EMPRESA CONTRATISTA “INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.”, CUENTA CON LOS SIGUIENTES PENDIENTES ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA:

* ELABORACIÓN DE ESTIMACIONES DE LOS PERIODOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020 A LA FECHA, DEBIDAMENTE SOPORTADAS PARA SU REVISIÓN POR ESTA SUPERVISIÓN EXTERNA Y SU TRÁMITE ANTE LA DGCOP.

- EL 09 DE FEBRERO DEL 2021, FUE INGRESADO A LA DGCOP EL PRESUPUESTO 1 INTEGRADO POR 12 CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA, LO ANTERIOR PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE.

- EL 15 DE FEBRERO DEL 2021, FUE INGRESADO A LA DGCOP EL PRESUPUESTO 1 INTEGRADO POR 1 CONCEPTO DE TRABAJOS EXCEDENTES REALIZADO POR LA EMPRESA CONTRATISTA, LO ANTERIOR PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE.

- EN FECHA 02 DE MARZO DEL 2021, LA CONTRATISTA HACE ENTREGA A LA SUPERVISIÓN EXTERNA Y A LA DGCOP DE UN PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR PARA SU REVISIÓN.

SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO I.N.A.H.

- RESPECTO A LOS RECURSOS PARA LOS TRABAJOS DE SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

* LAS 3 ARQUEÓLOGAS, SUS SUELDOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA ESTÁN SIENDO PAGADOS POR LA SUPERVISIÓN EXTERNA KBL, PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. EN CUMPLIMIENTO A LOS ALCANCES CONTRACTUALES DE LA EMPRESA.

- SE INFORMA QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL PREDIO EL DÍA 23 DE ENERO DEL 2021.



KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

ASPECTOS RELEVANTES

- EN FECHA 25 DE ENERO DEL 2021 A LAS 15:00 HRS. LA ARQUEOLOGA JIMENA RIVERA ESCAMILLA, RESPONSABLE EN CAMPO DE LOS TRABAJOS DE ARQUEOLOGIA POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, Y UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE “EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS” DE ACUERDO AL “PROYECTO DE SALVAMENTO ARQUEOLOGICO EN EL PREDIO LA PULGA”, INFORMA A LA DGCOP QUE SE PUEDEN INICIAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DEL “PILAR LA PULGA” EN TODO EL PREDIO, POR LO QUE EL I.N.A.H. EMITIRA EL DICTAMEN DE LIBERACION DEL PREDIO CORRESPONDIENTE. POR LO ANTERIOR DESCRITO, SE LE INSTRUYO A LA EMPRESA CONTRATISTA A INICIAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES PARA LA CONSTRUCCION DEL PILAR LA PULGA DE ACUERDO A SUS ALCANCES CONTACTUALES.

- MEDIANTE ESCRITO NÚMERO 401.3S.17.2-2021/0100 DE FECHA 28 DE ENERO DEL 2021 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, DIRIGIDO Y ENTREGADO A LA EMPRESA DE SUPERVISION EXTERNA KBL, PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. EN FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2021, EMITE EL “DICTAMEN PARCIAL” REFERENTE A LAS EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS REALIZADAS EN EL PREDIO LA PULGA, LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES LEGALES CORRESPONDIENTES Y EN CUMPLIMIENTO LOS ALCANCES DE LA SUPERVISION EXTERNA.

PROYECTO.

- EL 19 DE FEBRERO DEL 2021 LA PROYECTISTA ACTUALIZO LAS AREAS QUE COMPRENDE EL PROYECTO DEL “PILAR LA PULGA”, SIENDO ESTOS: CAJÓN DE CIMENTACION 617M2, PLANTA BAJA 617M2, TAPANCO 405M2, ESCALERAS 21M2, PERGOLA 188M2, MODULOS DE SERVICIO 40M2, BARDAS PERIMETRAL 266M2, MURO BAJO PARQUE 60M2, PATIOS 313M2, PLAZA PUBLICA 1090M2, PARQUE 1070M2, AZOTEA 462M2 Y BANQUETAS 690M2.

- EL 25 DE FEBRERO DEL 2021, LA PROYECTISTA HIZO ENTREGA EN OBRA DE LA NOTA TECNICA No. 2 REFERENTE A LAS “CARACTERÍSTICAS DEL RELLENO PERIMETRAL Y CUIDADOS RESPECTO AL NIVEL DE AGUA DETECTADO DURANTE LA EXCAVACIÓN”, EL CUAL INDICA LO SIGUIENTE:

- * RECOMENDACIONES PARA LA CONSTRUCCION DE LA LOSA DE CIMENTACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL, DEBIDO AL NIVEL FREATICO OBSERVADO EN EL NIVEL -2.75 M.
- * RELLENOS EN LATERALES DE EXCAVACION UNA VEZ CONSTRUIDO EL EDIFICIO.

- EL 04 DE MARZO DEL 2021, LA PROYECTISTA HACE ENTREGA DEL BOLETIN REFERENTE AL INCREMENTO DE ALTURA DEL CAJON DE CIMENTACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL (0.25 MTS.).



KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

ASPECTOS RELEVANTES

- EN FECHA 02 DE MARZO DEL 2021, EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA HIZO ENTREGA A LA EMPRESA CONTRATISTA DEL PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL FIRMADO POR EL Y LOS CORRESPONSABLES POR ESPECIALIDAD, LO ANTERIOR PARA SU DIGITALIZACION Y ENVIO A LA DGCOP PARA SU RESGUARDO.
- EN FECHA 02 DE MARZO DEL 2021, EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA HACE ENTREGA DE FICHA TECNICA DE UN PRODUCTO SIKA PARA SU APLICACIÓN EN LAS AREAS DE CISTERNAS EN CASO DE SER NECESARIO Y BRINDAR MAYOR SEGURIDAD (SIKA IMPERMURO).



KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

REPORTE FOTOGRAFICO



**ARMADO CON ACERO DE REFUERZO PARA LOSA DE CIMENTACION
DEL EDIFICIO PRINCIPAL (EJES 1-6/B-C)**



KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

REPORTE FOTOGRAFICO



**ARMADO CON ACERO DE REFUERZO PARA MUROS MC-1/MC-2
DE LA CIMENTACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL (EJES 1-6/B-C)**



KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

REPORTE FOTOGRAFICO



**ARMADO CON ACERO DE REFUERZO PARA CARCAMOS DE LAS CISTERNAS
DEL EDIFICIO PRINCIPAL
(EJES 1-4/B-C)**



**COLOCACION DE PROTECCION CONTRA INTEMPERISMO EN PAREDES DE
EXCAVACION
DEL EDIFICIO PRINCIPAL**



KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

REPORTE FOTOGRAFICO



VISITA A LA OBRA DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA



KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

REPORTE FOTOGRAFICO



**SEGURISTA “CASCO ROJO”
DANDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD E HIGIENE**

REPORTE FOTOGRÁFICO - PRUEBAS COVID - 19					
N°	NOMBRE	CATEGORIA	PRUEBA REALIZADA AL TRABAJADOR	RESULTADO DE LA PRUEBA	FECHA DE APLICACIÓN
1	RIGOBERTO ORTEGA VALENCIA	MAESTRO DE OBRA			
2	JAIME MONTAÑEZ RAMIREZ	OFICIAL CARPINTERO			
3	JOSE LUIS ESPINOZA HERNANDEZ	OFICIAL FERRERO			
4	MARCO CESAR TREJO RIVAS	OFICIAL FERRERO			
5	ALONZO CASTAÑEDA MERIDA	OFICIAL FERRERO			
6	JORGE ALBERTO GUTIERRES JIMENEZ	OFICIAL CARPINTERO			
7	MARIANO JUAREZ CRUZ	OFICIAL FERRERO			
8	ANTONIO ORTEGA ZAENZ	OFICIAL ALBAÑIL			
9	JESUS AVALOS ORTEGA	AYUDANTE			
10	ARMANDO TORRES LICAGUA	AYUDANTE	COVID-19	NEGATIVO	03/03/2021
11	JOSE MANUEL DE JESUS ORTEGA	AYUDANTE			
12	FRANCISCO ALBERTO TORRES VALLEJO	AYUDANTE			
13	OSCAR ROJAS ORTEGA	AYUDANTE			
14	APOLINAR LINARES MORALES	AYUDANTE			
15	MIGUEL ANGEL ORTEGA SURIGA	AYUDANTE			
16	ROMUALDO JUAREZ ORTIZ	AYUDANTE			
17	PABLO MARTINEZ FLORES	AYUDANTE			



SE REALIZAN PRUEBAS COVID AL PERSONAL EN OBRA




KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

REPORTE FOTOGRAFICO



VISTA PANORAMICA NORESTE

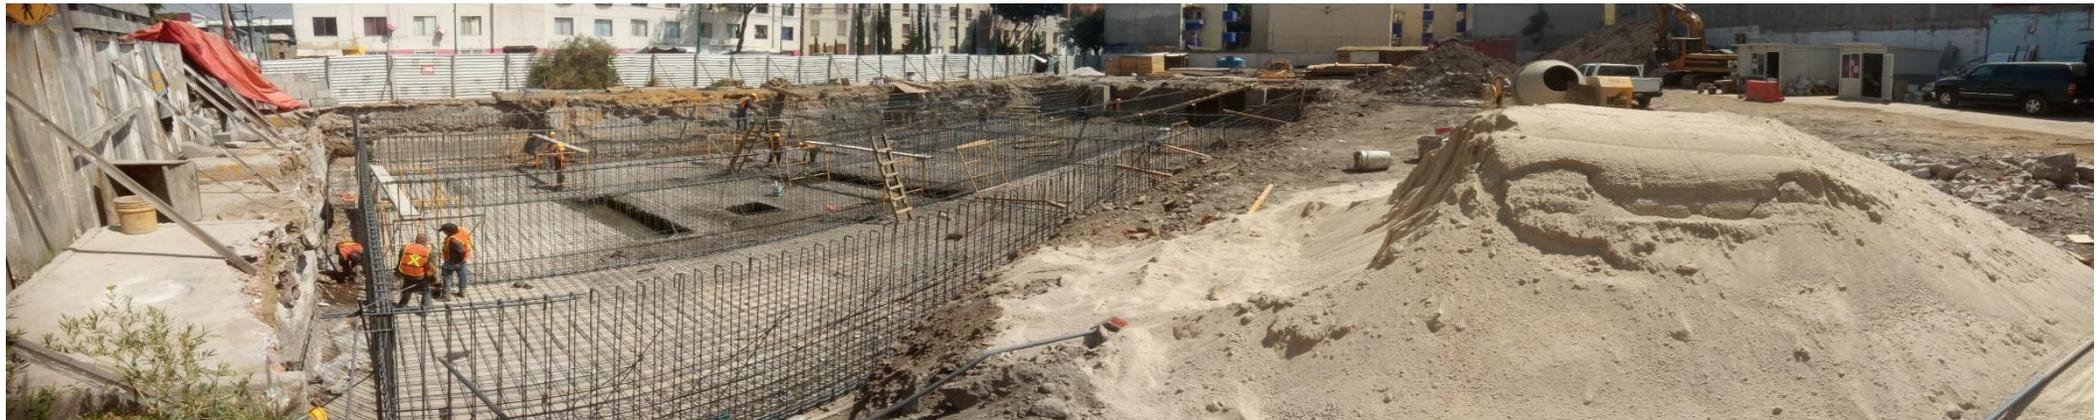

VISTA PANORAMICA NOROESTE



KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

REPORTE FOTOGRAFICO



VISTA PANORAMICA SURESTE




VISTA PANORAMICA SUROESTE

SOS- DCOP

PILARES LA PULGA Porcentaje de avance

Se tiene programado el
término de la obra para el
mes de Julio





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SOS – Alumbrado Público

Semana 10

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana 09 Al 26/02	Semana 10 Al 05/03	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias	Semanal	50	267	23 de marzo
	reparadas en vías del				
	PA del CH		Total	317	



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Semana 09

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Dr. Mora	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	2	Instalación de Lámpara y reconexión de líneas	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	Plaza de la Constitución	CENTRO	22	Se restablece Control	Circuito apagado
Francisco I. Madero	Lázaro Cárdenas y Monte de piedad	CENTRO	20	Reconexión de Líneas y cambio de control	Circuito apagado
Av. Juárez	Revillagigedo y Luis Moya	CENTRO	1	Reconexión de Líneas	Luminaria apagada
Isabel la Católica	Isabel la Católica y 2do. Cjón	CENTRO	1	Reconexión de Líneas	Luminaria apagada
Av. José Ma. Izazaga	Bolívar y Eje Central Lázaro	CENTRO	2	Reconexión de Líneas	Luminaria apagada
Dr. Mora	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Instalación de Balastro	Luminaria apagada
Av. Arcos de Belén	Dr. Valenzuela y Dr. Andrade	CENTRO	1	Reconexión de Líneas	Luminaria apagada
		TOTAL	50		



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Semana 10

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Corregidora	Corregidora y Soledad	CENTRO	1	fijación correcta de luminaria	Luminaria con riesgo de caer
Av. José Ma. Izazaga	Esq. Eje Central Lázaro Cárdenas	CENTRO	3	Fijación de luminaria, cambio de balastro y fotocelda	Luminarias apagadas
Av. José Ma. Izazaga	5 de Febrero e Isabel la Católica	CENTRO	21	Reconexión de Control	Circuito apagado
Av. José Ma. Izazaga	Eje Central Lázaro Cárdenas y Bolívar	CENTRO	2	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Av. Arcos de Belén	Buen Tono y Luis Moya	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Alameda Central	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Av. José María Izazaga	5 de Febrero e Isabel la Católica	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Francisco I. Madero	Motolinía e Isabel la Católica	CENTRO	10	Reprogramación de reloj	Circuito 24 hrs
Palma	Isabel la Católica y Palma	CENTRO	1	Cambio balastro	Luminaria apagada
Francisco I. Madero	Isabel la Católica y Palma	CENTRO	10	Cambio de control	Circuito apagado



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Semana 10

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Angela Peralta	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Alameda Central	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Av. José Ma. Izazaga	20 de Noviembre y 5 de Febrero	CENTRO	1	Retiro y reposición de poste derribado	Poste impactado
Av. José Ma. Izazaga	20 de Noviembre y 5 de Febrero	CENTRO	4	Se realiza reconexión	Luminaria apagada
Av. José Ma. Izazaga	20 de Noviembre y 5 de Febrero	CENTRO	2	Instalación de luminaria	Luminaria faltante
Francisco I. Madero	Bolívar y Eje Central Lázaro Cárdenas	CENTRO	10	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Francisco I. Madero		CENTRO	20	Se realiza reconexión	Circuito apagado
Francisco I. Madero	Fray Pedro de Gante y Eje Central	CENTRO	45	Se restablece por cancelación de apagado por evento	Circuito apagado
Francisco I. Madero		CENTRO	132	Programación de apagado	Filmación de película
		TOTAL	267		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SOS – Alumbrado Público

Luminarias reparadas en el perímetro “A” del Centro Histórico



Total
580
reparaciones
a luminarias



Tema	Indicador	Periodicidad	08 al 21/02	22/02 al 07/03	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros Barridos de guarnición en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	8,618.512 km.	8,618.512 Km.	23 de marzo
Limpieza	Metros cuadrados Barridos de Banquetas en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	16,768,780 m2	16,768,780 m2	
Limpieza	Metros Cuadrados Barridos de Plazas y Corredores en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	8,474,312 m2.	8,474,312 m2	



Tema	Indicador	Periodicidad	08 al 21/02	22/02 al 07/03	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros de Barrido Mecánico en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	1,279.040 km	1,279.040 km	
Limpieza	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestino y recolección de residuos del producto de barrido en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	6,227 m3	6,249 m3	
Recolección de tierra	Metros cúbicos de tierra recolectada en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	117.25 m3	123.50 m3	



Tema	Indicador	Periodicidad	08 al 21/02	22/02 al 07/03	Próximo reporte
Lavado de papeleras	Piezas de papeleras lavadas en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	1,120 piezas	1,120 piezas	23 de marzo
Lavado	Metros cuadrados lavados en Plazas, Calles, Corredores peatonales y semipeatonales en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	874,076 m2	873,058 m2	
Lavado de equipamiento urbano	Metros cuadrados de lavado de equipamiento urbano en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	37,770 m2	38,196 m2	
Lavado de sitios críticos	Sitios críticos lavados en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	18 sitios (257 sitios Promedio en la quincena)	18 sitios (254 sitios Promedio en la quincena)	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DGSUyS



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Tema	Indicador	Periodicidad	08 al 21/02	22/02 al 07/03	Próximo reporte
Recolección tiraderos clandestinos	Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos en el Perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	25 Tiraderos (350 en promedio en la quincena)	25 Tiraderos (350 en promedio en la quincena)	23 de marzo
Retiro de chicles	Piezas de Chicles retiradas en el Corredor Madero	Quincenal	3,700 piezas	3,955 piezas	
Eliminación de grafiti	Metros Cuadrados de grafiti eliminado en el Perimetro "A" el Centro Histórico	Quincenal	1,314.50 m2	786 m2	






Tema	Indicador	Periodicidad	08 al 21/02	22/02 al 07/03	Próximo reporte
Atención de limpieza por retiro de plantones	Plantones retirados dentro del perímetro "A" del Centro Histórico de la Ciudad de México		04 Atenciones	01 atención	23 de marzo
Retiro de propaganda	Piezas retiradas de propaganda de protesta pegada en el perímetro "A" del Centro Histórico de la Ciudad de México		26 piezas	0	
Desratización	Desratización en el Perímetro "A" y "B" del Centro Histórico		Colocación 1,474 cebos cereal B, en una superficie de 129,980 m2	Colocación 1,458 cebos cereal B, en una superficie de 130,080 m2	



Acciones tomadas por la DGSUyS con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico en relación al COVID-19

- Se toma la temperatura todos los días en los tres turnos.
- Se les entregó caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.

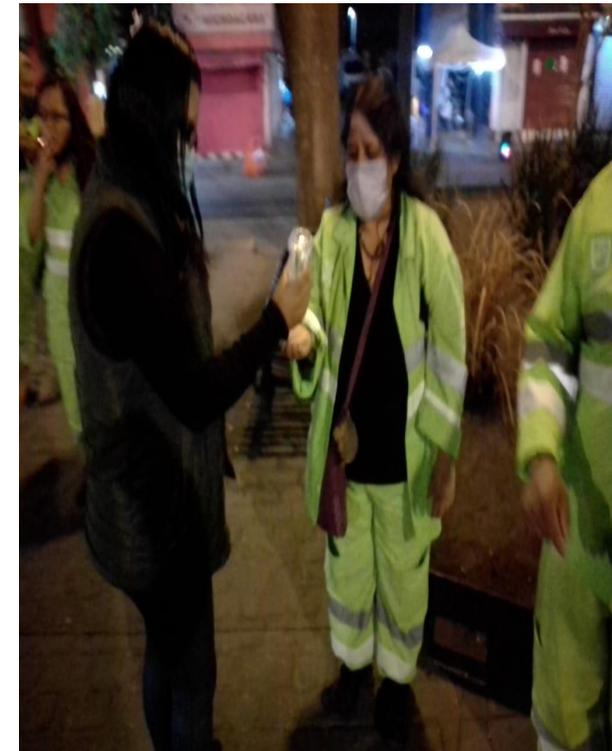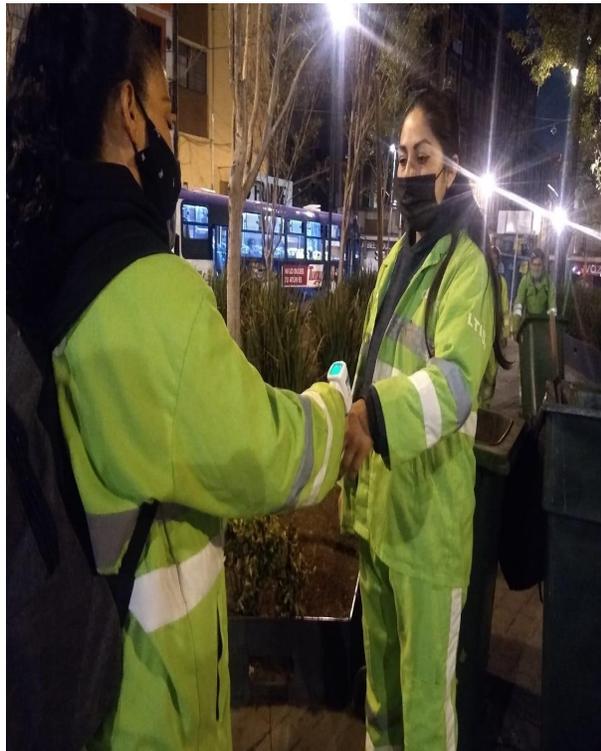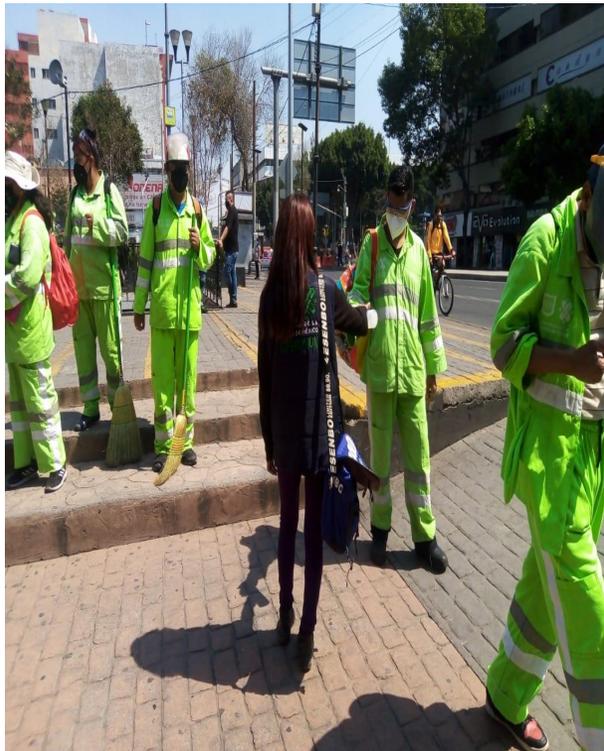



Acciones tomadas por la DGSUyS con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico en relación al COVID-19

Se realiza lavado en forma programada en 45 puntos de las plazas corredores y sitios donde la gente se sienta regularmente, los que se atienden diario son;

- Parque de Bolsillo
- Accesos del Metro Zócalo
- Banqueta de Palacio Nacional
- Banqueta y escaleras de edificio de Gobierno
- Escaleras de la Suprema Corte de Justicia

Las demás bancas y arriates se lavan tres veces por semana

- Se realiza un lavado programado en todas las calles, plazas, corredores peatonales y semipeatonales del Perímetro "A" del Centro Histórico.







GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

RETIRO DE 3,955 PIEZAS DE CHICLES DEL CORREDOR MADERO

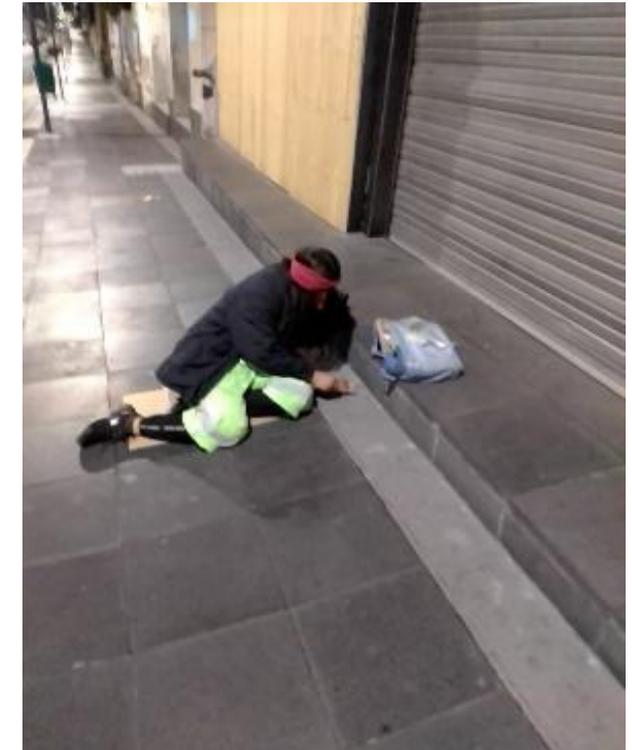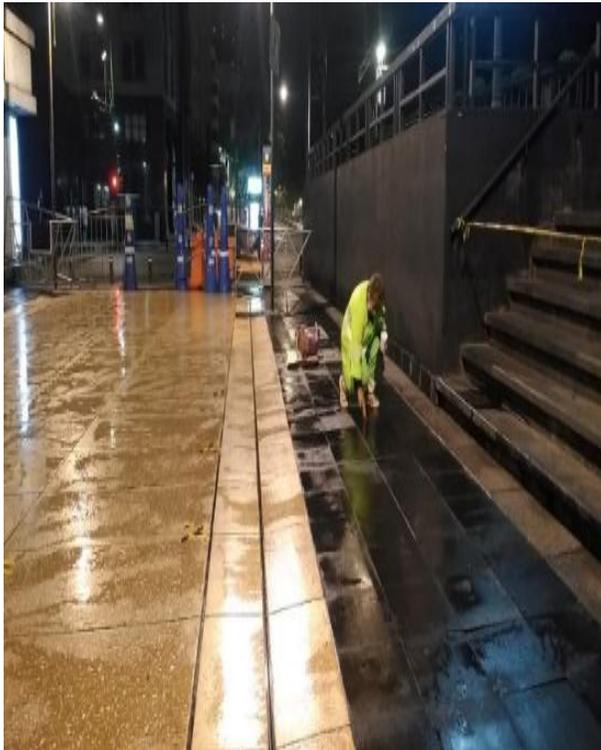



Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

SE REALIZO LA ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN LAS SIGUENTES VIALIDADES:

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
VOLUMETRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PROTESTA)	133	m2
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (PROTESTA)	291	m2
AV. 20 DE NOVIEMBRE DE URUGUAY A VENUSTIANO CARRANZA (PROTESTA)	13	m2
AV. JUÁREZ DE BALDERAS A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	32	m2
SAN JERÓNIMO DE SIMÓN BOLIVAR A CORREO MAYOR	19	m2
REGINA DE SIMÓN BOLIVAR A AV. 20 NOVIEMBRE	21	m2
ISABEL LA CATÓLICA DE AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA A AV. 5 DE MAYO	27	m2
MESONES DE AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ A ALDACO	24	m2
SIMÓN BOLIVAR DE TACUBA A AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA	12	m2
CALLEJÓN DE SN IGNACIO D ELAS VIZCAINAS A VIZCINAS	06	m2
BELISARIO DOMÍNGUEZ DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	14	m2
TACUBA DE MONTE DE PIEDAD A EJE CNETRAL LÁZARO CÁRDENAS	25	m2
REPÚBLICA DEL SALVADOR DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A CORREO MAYOR	14	m2
REPÚBLICA DE CUBA DE ALLENDE A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	9	m2
PLAZA VIZCAINAS	26	m2
REPÚBLICA DEL URUGUAY DE JESÚA MARÍA A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	27	m2
AV. 5 DE MAYO DE EJE CNETRAL A MONTE DE PIEDAD	11	m2



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

ELIMINACIÓN DE 437 M2 DE GRAFITI DE PROTESTA Y 349 M2 DE GRAFITI VANDALICO






GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

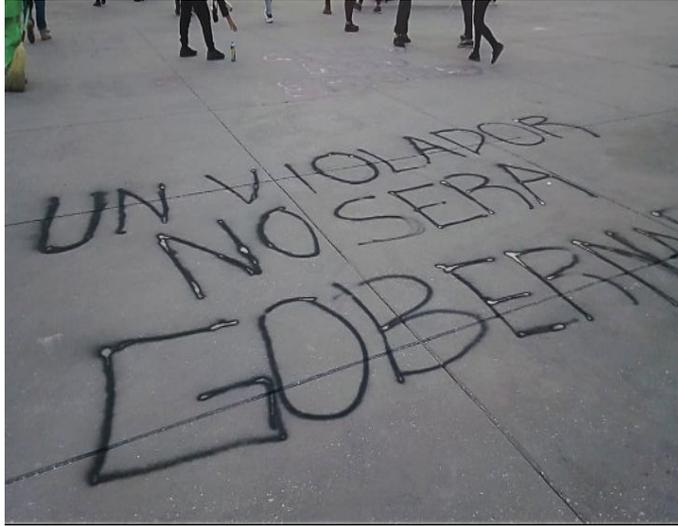




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

RETIRO DE PLANTON DE INDIGENAS ARTESANOS TRIQUIS EN AV. JUÁREZ Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS

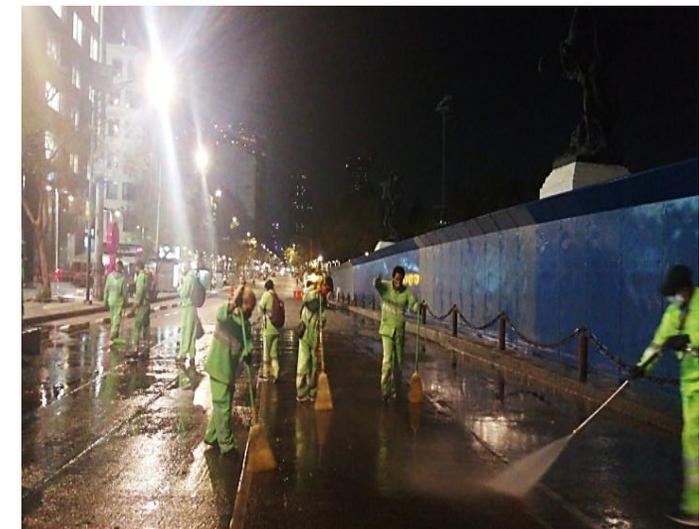



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

DGSUyS|Atención Fauna Nociva

SE REALIZO LA DESRATIZACIÓN POR MEDIO DE COLOCACIÓN DE 1,458 CEBOS CEREAL B, EN UNA SUPERFICIE DE 130,080 M2 DE PLAZAS, CORREDORES Y VIALIDADES DEL CENTRO HISTÓRICO DEL PERIMETRO "A" Y "B"





DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 32 cebos cereal B, en 560 m2.
Vialidad General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprian col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 21 cebos cereal B, en 1,200 m2.
Vialidad San Ciprian	B	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier Col Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 12 cebos cereal B, en 1,200 m2.
Exterior del Mercado Candelaria	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprian y General Anaya , Col. Merced Balbuena Venustiano Carranza	Desratización 15 cebos cereal B, en 1,140 m2.
Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Ote. Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 31 cebos cereal B, en 8,200 m2.
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	Eje 1 Norte a San Pablo Col. Morelos, Venustiano Carranza	Desratización 42 cebos cereal B, en 3,800 m2.
Plaza de la Solidaridad	A	Av. Juárez esquina Balderas Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 12 cebos cereal B, en 860 m2.
Plaza San Fernando	B	Eje 1 Poniente Guerrero, San Fernando, Puente de Alvarado col. Guerrero, Cuauhtémoc	Desratización 11 cebos cereal B, en 2,500 m2.
Vialidad Puente de Alvarado	B	De Av. Paseo de la Reforma a callejón Sombrereros col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 08 cebos cereal B, en 750 m2.
Vialidad Eje 1 Poniente Rosales	B	De Puente de Alvarado a Av. Paseo de la Reforma col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 08 cebos cereal B, en 900 m2.



DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Balderas	B	De Av. Paseo de la Reforma a Av. Juárez Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 15 cebos cereal B, en 1,200 m2.
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 28 cebos cereal B, en 33,000 m2.
Vialidad San Pablo	A	De Eje 1 Oriente a Av. José María Pino Suárez, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 91 cebos cereal B, en un área de 2,100 m2.
Vialidad Av. José María Izazaga	A	De Isabel la Católica a Simón Bolívar, col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 18 cebos cereal B, en un área de 1,400 m2.
Vialidad Eje 1 Norte Mosqueta	A	De Eje 1 Poniente Guerrero a Av. Paseo de la Reforma, lado sur y norte col. Guerrero Cuauhtémoc	Desratización 50 cebos cereal B, en un área de 800 m2.
Vialidad Roldan	B	De Fray Servando Teresa de Mier a Puente de Santo Tomás col. Centro, Cuauhtémoc	Desratización 73 cebos cereal B, en un área de 450 m2.
Plaza Teatro Blanquita	B	Eje Central Lázaro Cárdenas, Pensador Mexicano y Mina, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 24 cebos cereal B, en un área de 1,800 m2.
Vialidad Av. Morelos	B	Congreso de la Unión a calzada de la Viga, col. Jamaica, Venustiano Carranza	Desratización 47 cebos cereal B, en un área de 850 m2.
Vialidad Congreso de la Unión	B	Emiliano Zapata a Herreros de Oriente a Poniente col. Morelos, Venustiano Carranza	Desratización 76 cebos cereal B, en un área de 800 m2.
Vialidad Congreso de la Unión	B	Entre Roa Bárcenas Agiabampo y Melchor Ocampo , pueblo colonia Magdalena Mixiuca, Venustiano Carranza	Desratización 26 cebos cereal B, en un área de 650 m2.



DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Fray Servando a Sidar y Rovirosa, col. Merced Balbuena, Venustiano Carranza	Desratización 63 cebos cereal B, en un área de 1,200 m2.
Exterior del mercado de Jamaica	B	Congreso de la Unión lado Oriente, calzada Mixhuca y Melchor Ocampo, col. Magdalena Mixhuca, Venustiano Carranza	Desratización 25 cebos cereal B, en un área de 650 m2.
Vialidad Av. Del Trabajo	B	De Gorostiza a Panaderos col. Morelos, Venustiano Carranza	Desratización 64 cebos cereal B en 680 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Canal del Norte a Aluminio, col. Felipe Ángeles Venustiano Carranza	Desratización 24 cebos cereal B en 380 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Circunvalación a Eje 2 Norte col. Michoacana, Venustiano Carranza	Desratización 100 cebos cereal B En 350 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Herreros a Hortelanos (Tiradero Clandestino) col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 27 cebos cereal B En 100 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	Esquina Hortelanos (Tiradero Clandestino) Col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 22 cebos cereal B En 100 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Plomeros a Eje 2 Oriente (Canal del Norte) col. Michoacana Venustiano Carranza	Desratización 18 cebos cereal B en 1,750 m2
Canal del Norte	B	De Bonanza a Eje 2 Oriente Congreso de la Unión, Col. Ampliación Michoacana Venustiano Carranza	Desratización 49 cebos cereal B en 350 m2



DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Congreso de la Unión Camellón	B	De Aluminio a Estaño, col. Felipe Ángeles Venustiano Carranza	Desratización 26 cebos cereal B en 380 m ²
Vialidad Aluminio	B	De Congreso de la Unión a Pabellón col. Felipe Ángeles Venustiano Carranza	Desratización 25 cebos cereal B en 760 m ²
Exterior del Mercado del Rastro	B	Ing. Eduardo Molina Aluminio, Sorpresa y Estaño, Exterior del Mercado el Rastro col. Felipe Ángeles	Desratización 26 cebos cereal B en 2,150 m ²
Vialidad Av. Del Trabajo	B	De Panaderos a Mecánicos, col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 67 cebos cereal B en 850 m ²
Vialidad	B	Calzada de Guadalupe, lado Poniente de Acero a Cobre, Col. Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 18 cebos cereal B, en 350 m ²
Parque s/n	A	Caridad, Manuel Doblado y Obreros, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 35 cebos cereal B, en 220 m ²
Eje 2 Norte	B	Esq. Eje Central Lázaro Cárdenas, Col. Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 22 cebos cereal B, en 350 m ²
Tiradero Clandestino No. 62	B	Eje 1 Oriente, Esq. Constancia, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 10 cebos cereal B, en 100 m ²
Vialidad	B	Eje 1 Oriente, Esq. Caridad, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 08 cebos cereal B, en 250 m ²
Tiradero Clandestino No. 64	B	Eje 1 Oriente, Manuel Doblado, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 26 cebos cereal B, en 100 m ²
Plaza de la Constitución Zócalo	A	20 de Noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 08 cebos cereal B, en 46,800 m ²



DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 25 cebos cereal B, en 1,600 m ²
Anillo de Circunvalación	B	De San Pablo a Fray Servando, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 45 cebos cereal B, en 800 m ²
Eje 1 Oriente - Circunvalación	B	De República de Guatemala, a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 42 cebos cereal B, en 2,200 m ²
Ext. Del Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar, Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 08 cebos cereal B, en 1,800 m ²
Área Verde	A	Tolsa, Balderas, Enrico Martínez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 10 cebos cereal B, en 800 m ²
Vialidad	B	Plaza de la Ciudadela, Balderas, Enrico Martínez y José María Morelos, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 25 cebos cereal B, en 850 m ²





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

LAVADO

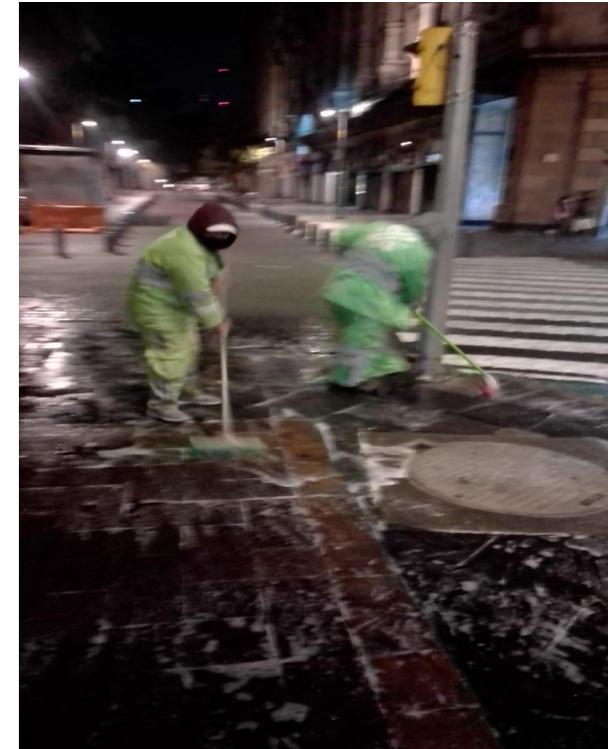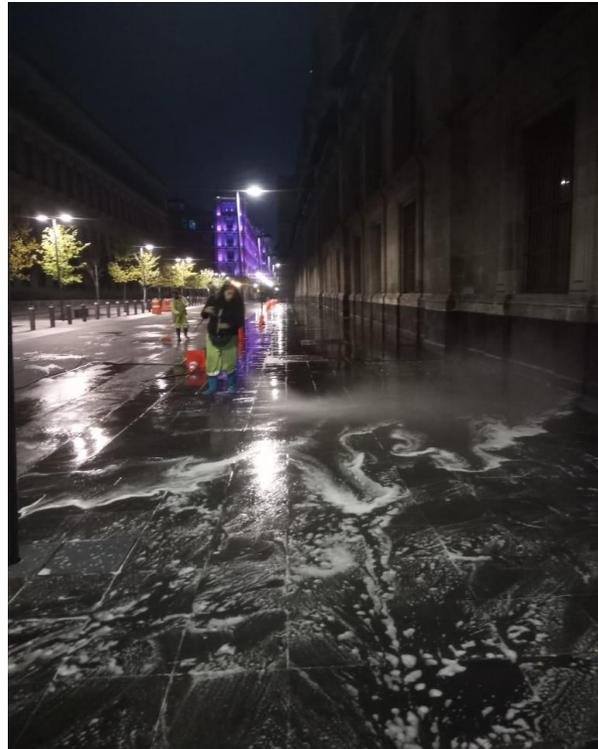




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

BARRIDO MANUAL

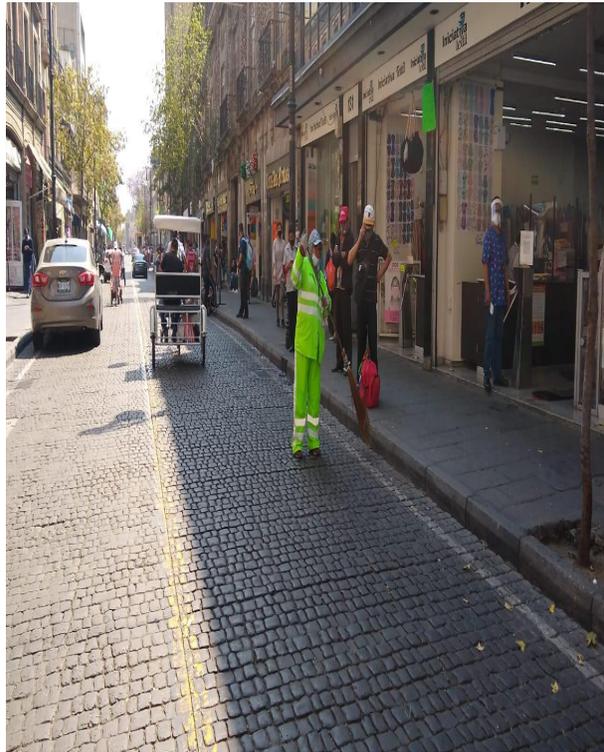




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

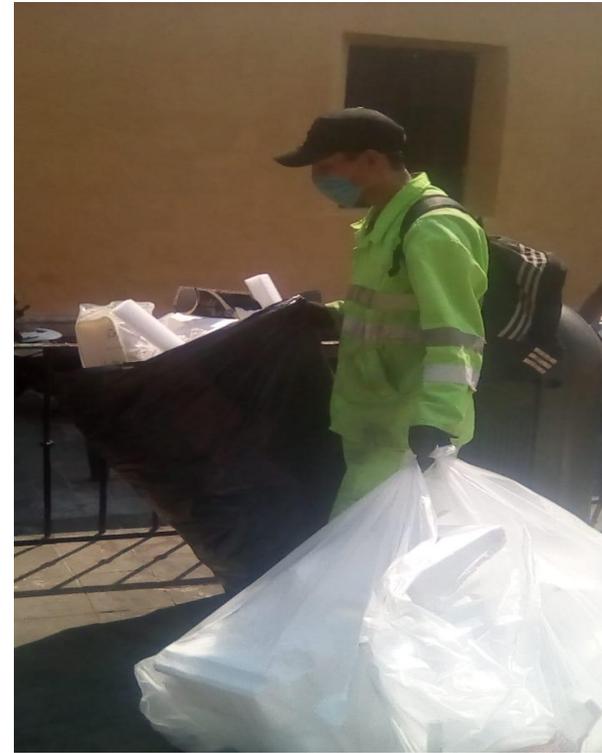





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS

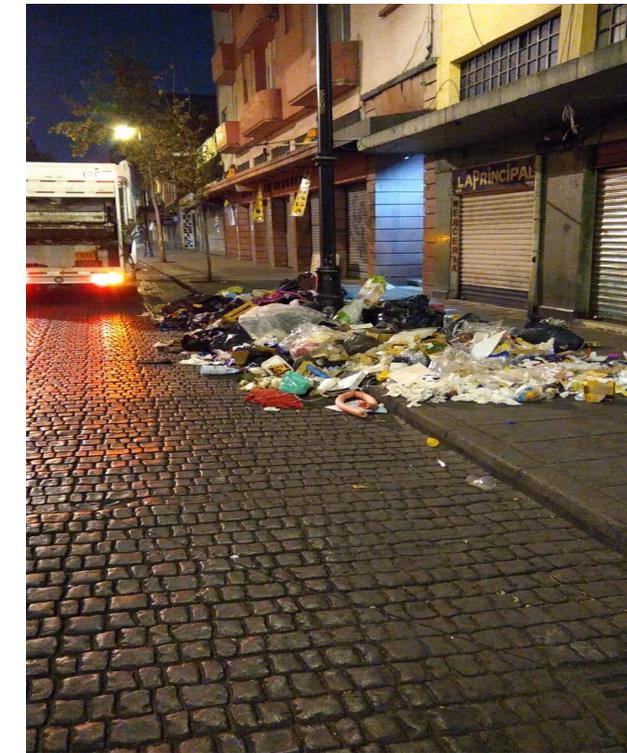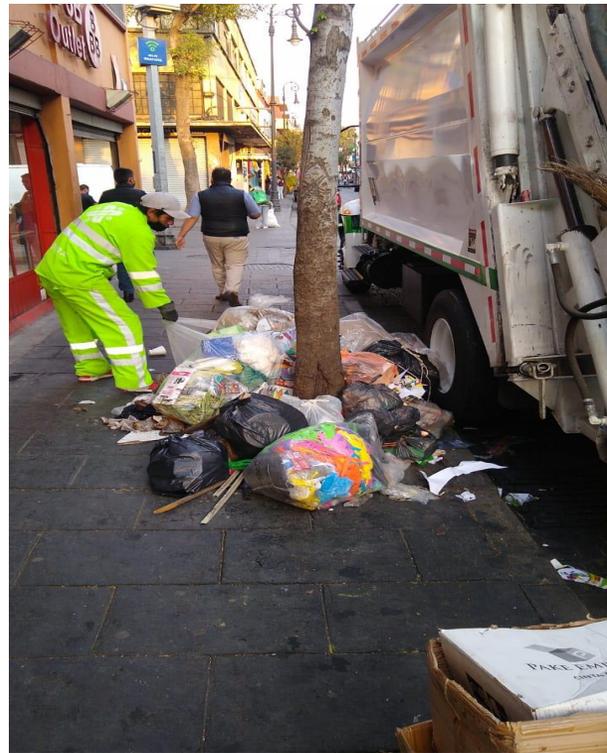





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS


Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

LAVADO DE PAPELERAS

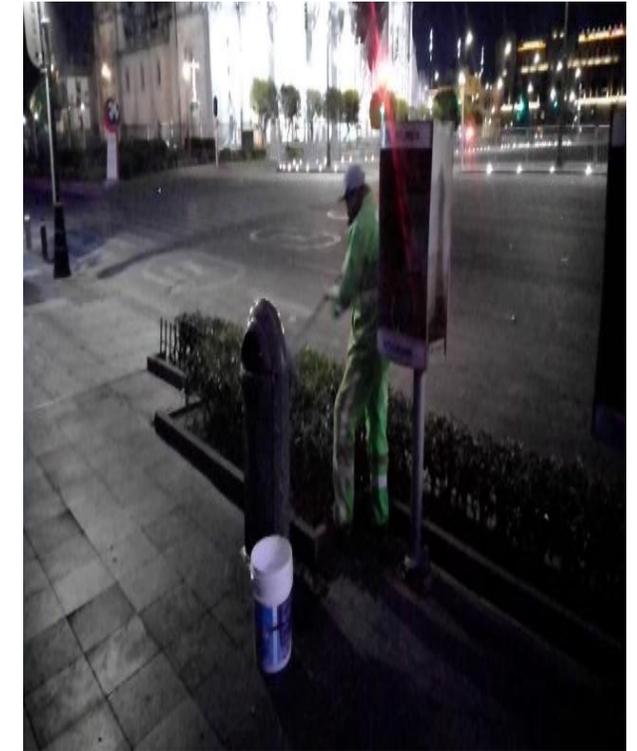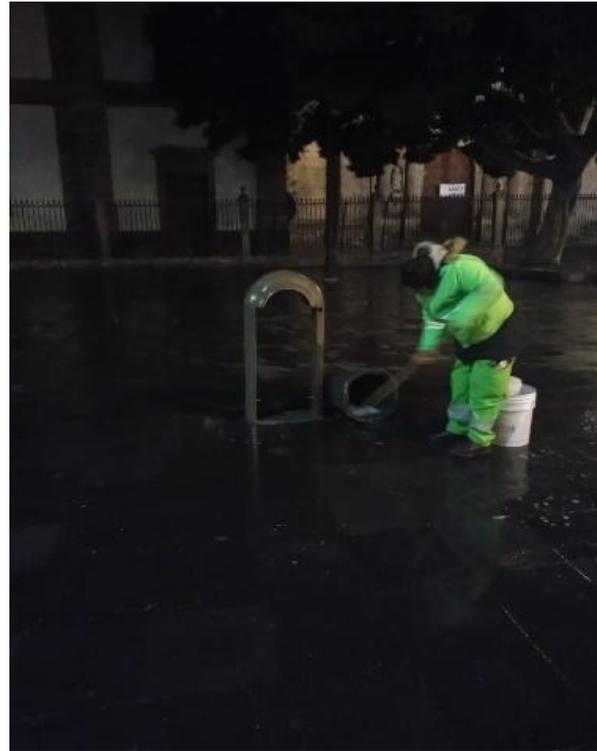




Metros cúbicos de basura recolectada en tiraderos clandestinos y producto del Barrido en el Perímetro "A" del Centro Histórico






4803.5 m² de eliminación de grafiti de enero a la fecha

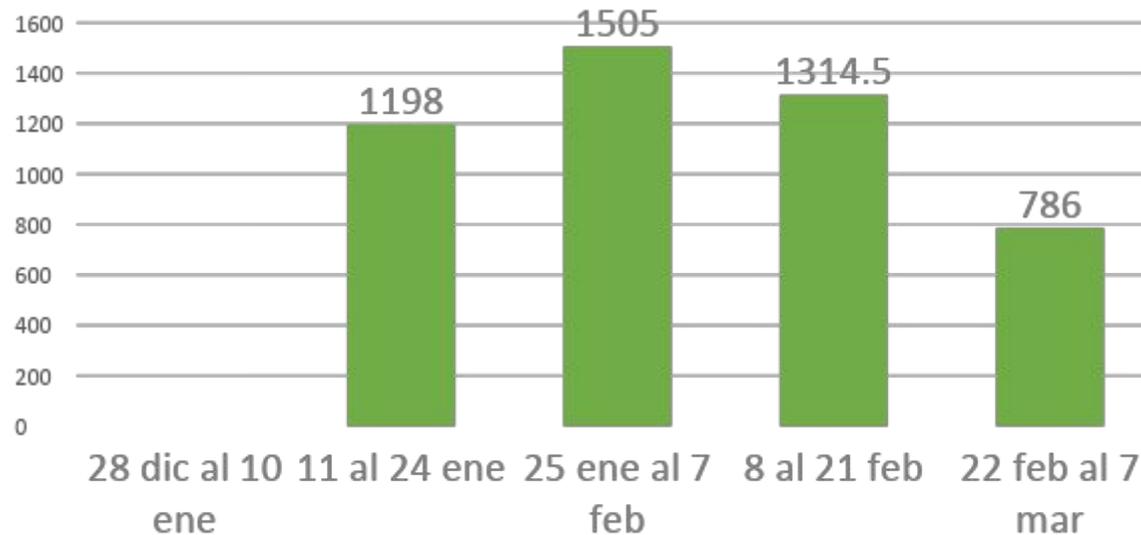



Desratización: Colocación de **6,425** cebos cubriendo vialidades y Plazas del Perímetros A y B del Centro Histórico

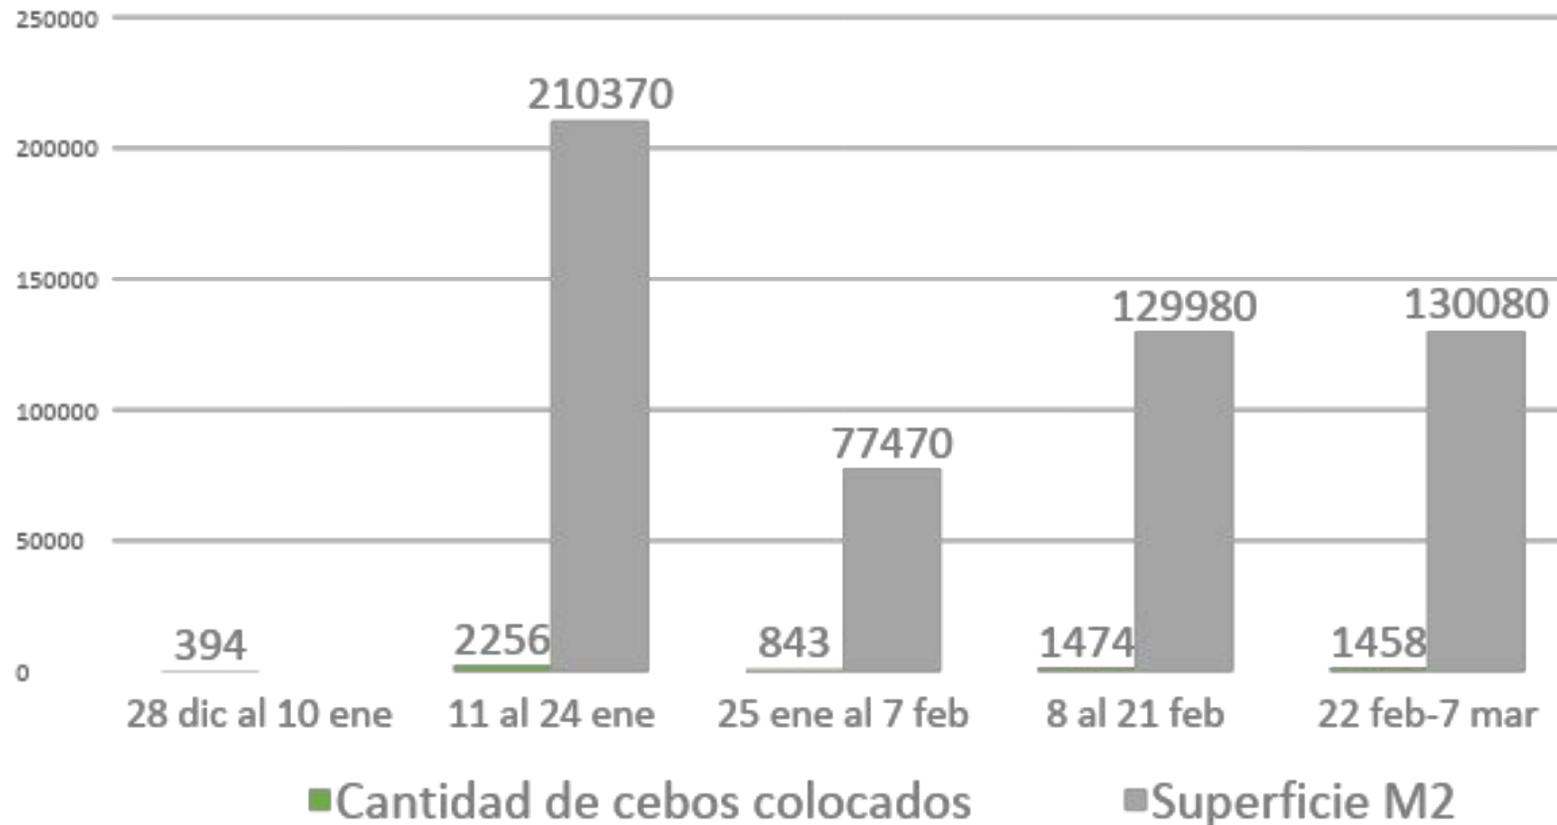



STC-METRO

Escaleras Mecánicas:

Estaciones en el Centro Histórico	29
Equipos Instalados	75
Equipos detenidos durante esta quincena	01
Equipos funcionando a la fecha	74

Elevadores:


Estaciones en el Centro Histórico	29
Equipos Instalados	19
Equipos detenidos durante esta quincena	00
Equipos funcionando a la fecha	19



STC-METRO

Porcentaje de funcionamiento de escaleras y elevadores en las 29 estaciones del STC-Metro en el CH

Informe de las 29 estaciones del STC en el Centro Histórico



CFE

Tema	Indicador	Periodicidad	del 22 de febrero al 05 de marzo 2021	Próximo reporte
	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	0	
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	22	
Mantenimiento a infraestructura	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	4	22 de MARZO 2021
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	1	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	4	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CFE

Anexo 1. Detalle de ubicaciones

Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
	NO SE CUENTA CON SINIESTROS REGISTRADOS AL 22 DE FEBRERO DE 2021.				
			TOTAL		



CFE

Anexo 2. Detalle de ubicaciones

Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
BELISARIO DOMÍNGUEZ EJE CENTRAL	BRASIL	SIN DATO	COL.CENTRO	7	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
BELISARIO DOMÍNGUEZ BRASIL	ARGENTINA	SIN DATO	COL.CENTRO	7	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
V CARRANZA EJE CENTRAL	ISABEL LA CATÓLICA	SIN DATO	COL.CENTRO	8	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
TOTAL				22	



CFE

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
SAN IDELFONSO	JESUS MARIA	MIXCALCO	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
CIRCUNVALACION	CORREGIDORA	SOLEDAD	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
ALLENDE	HONDURAS	COMONFORT	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REGINA	JESUS MARIA	ROLDAN	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
			TOTAL		4	



CFE

Anexo 4. Detalle de ubicaciones

Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	DESCRIPCIÓN
16 DE SEPTIEMBRE	ISABEL LA CATOLICA	SIN DATO	CENTRO	SE REALIZA REPARACIÓN DE LA TAPA
	PALMA		TOTAL	1



CFE

Anexo 5. Detalle de ubicaciones


Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCION	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
SAN ILDEFONSO	JESUS MARIA	MIXCALCO	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
JESUS MARÍA	CORREO MAYOR	SOLEDAD	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
BRASIL	PARAGUAY	HONDURAS	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REGINA	JESUS MARIA	ROLDAN	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA




CFE


Bovedas atendidas con desague

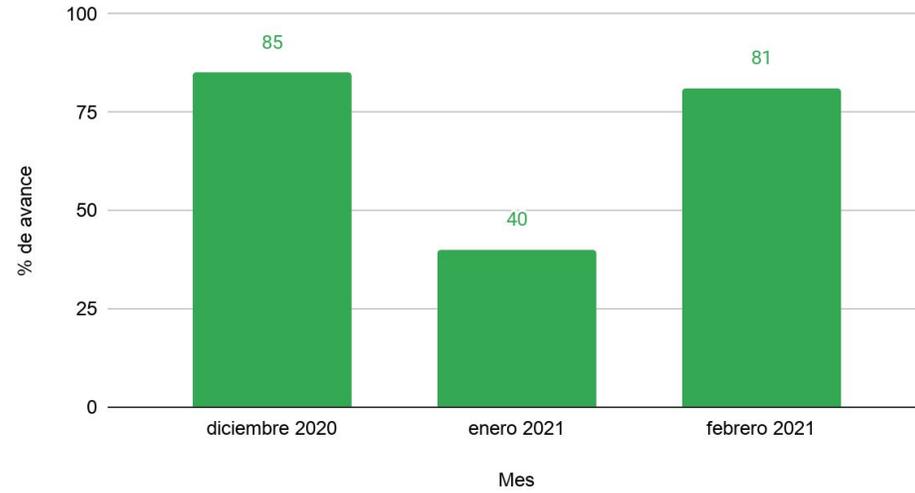


Atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

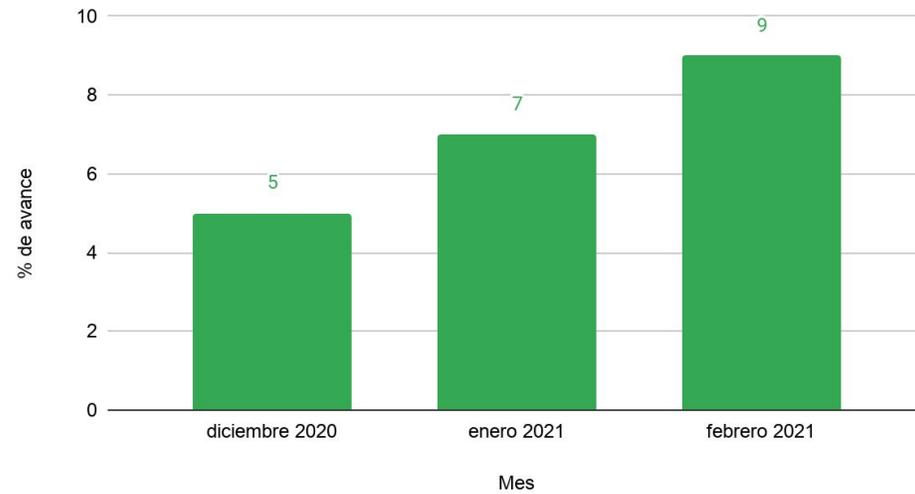

Tapas reparadas

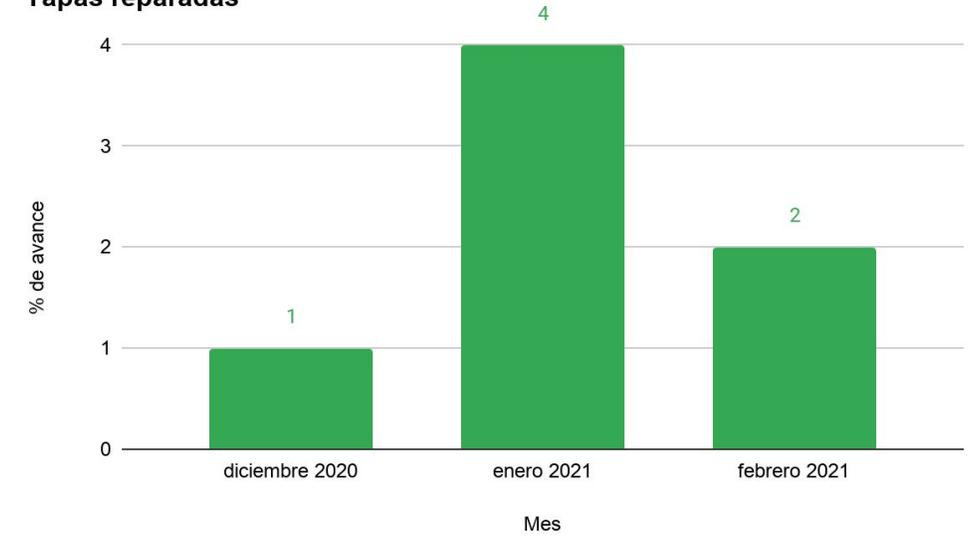

Obras en vía pública

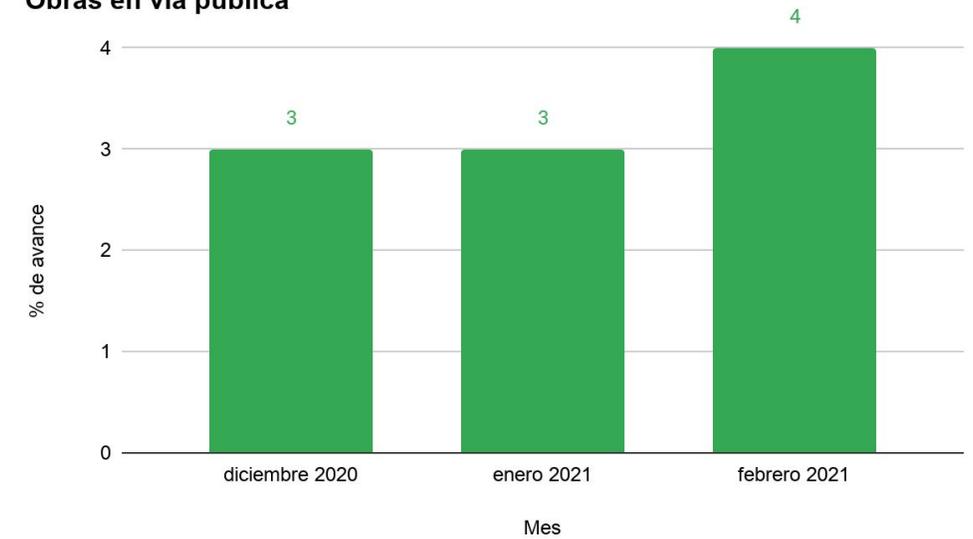



UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

TELMEX

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena del 22 de FEBRERO al 05 de marzo 2021	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	36	22 de MARZO 2021



TELMEX

Anexo 1. Detalle de ubicaciones

Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
FRAY SERVANDO	XOCONGO	CLAVIJERO	273	TRANSITO	2	CORTE DE 2 CABLES. SE ROBARON EN TOTAL 10 M
ALARCON Y NICOLAS BRAVO				CENTRO	7	CORTE DE 7 MUFAS . 8 M CADA UNO
SAN MARCOS Y EMILIANO ZAPATA	CIRCUNVALACION	MARGIL		CENTRO	1	CORTE DE 1 CABLE 5 M
CONGRESO DE LA UNION Y EMILIANO ZAPATA				CENTRO	3	CORTE DE 3 CABLES, 15 M C/U
CIRCUNVALACION	GUATEMALA	ZAPATA	228	CENTRO	3	CORTE DE 3 CABLES
JESUS MARIA	GUATEMALA	MONEDA	16	CENTRO	2	CORTE DE 2 CABLES.
				TOTAL	18	



TELMEX

Anexo 2. Detalle de ubicaciones
Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CORREO MAYOR Y SAN JERONIMO.			CENTRO	3	CORTE DE 2 CABLES
URUGUAY		25	CENTRO	5	CORTE DE MUFAS.
GRAL. ANAYA Y JUAN DE LA GRANJA			CENTRO	2	CORTE DE 2 CABLE
CJON . DEL HORMIGUERO Y CORREO MAYOR			CENTRO	1	CORTE DE 1 CABLE
REGINA Y CORREO MAYOR			CENTRO	4	CORTE DE MUFAS
IZAZAGA		155	CENTRO	3	CORTE DE 3 CABLES.
TOTAL				18	

INAH

Tema	Indicador	Quincena al 05/03	Próximo reporte
Obras	Número de trámites de solicitud de autorización de obra en inmuebles	6	19 de marzo
Obras	Número de autorizaciones de obras emitidas en inmuebles	7	

INAH

Solicitudes de autorización de obra

FECHA DE INGRESO	UBICACIÓN	N°	TIPO DE OBRA	DICTAMEN
23/02/2021	DONCELES	85	ADECUACIÓN DE UN LOCAL COMERCIAL YA CONSTRUIDO, SE CAMBIAN PISOS, CANCELES, SE PINTARAN MUROS, SE CAMBIARÁN LOS BAÑOS, SE PINTAN FACHADAS DE COLOR RASTA J4-03 Y SE CHECARÁN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	
01/03/2021	JUÁREZ	38	TRABAJOS DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN EN LOCAL COMERCIAL PARA RESTAURANTE CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RESANE Y PINTURA EN PAREDES INTERIORES, CAMBIO DE PISOS, CAMBIO DE INSTALACIONES SANITARIAS (MUEBLES DE LAVABO Y W.C.), ASÍ COMO DE TUBERÍA DE CONEXIÓN QUE NO AFECTA ESTRUCTURA, CAMBIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (LÁMPARAS Y CONECTORES), COLOCACIÓN DE BARRA, EXTRACTORES Y EQUIPO DE RESTAURANTE.	
03/03/2021	CALLE DE JESÚS MARÍA	164	INTERVENCIÓN Y REMODELACIÓN EN FACHADA PRINCIPAL	
03/03/2021	SAN ILDEFONSO	28	INTEGRACIÓN DE CIRCULACIONES VERTICALES, REESTRUCTURACIÓN DE ÁREA DEL AUDITORIO, MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, APERTURA DE VANOS, CONSOLIDACIÓN DE ELEMENTOS ORIGINALES, LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS PARA COMPLETAR LA NUEVA BIBLIOTECA Y LA COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE FIJACIÓN DE LA VELARIA, EN PATIO PRINCIPAL.	
03/03/2021	REPÚBLICA DE CUBA	92	PRÓRROGA DE AUTORIZACIÓN 110/20 PARA LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL ELEVADOR Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VESTIBULARES.	
03/03/2021	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	38	EL PROYECTO PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 8 NIVELES, ADEMÁS DE 1 SÓTANO, PARA VIVIENDA, ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS	

INAH


Autorizaciones de obra

AUTORIZACIÓN	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA
053/21	ECUADOR 39-JUAN ALVAREZ 6-8	MANTENIMIENTO EN FACHADAS.
055/21	REPÚBLICA DE CUBA 92	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DOMO DE PATIO PRINCIPAL
056/21	REPÚBLICA DE URUGUAY 74	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TANQUES DE GAS.
060/21	REPÚBLICA DEL SALVADOR 50	MANTENIMIENTO EN LA FACHADA.
061/21	ISABEL LA CATÓLICA 24	RETIRO Y CONSOLIDACIÓN DE PIEZAS DE MÁRMOL
062/21	EMILIO DONDÉ 68	PRÓRROGA.
064/21	FRANCISCO I. MADERO 21	TRABAJOS DE REMODELACIÓN INTERIOR

INAH


21

Solicitudes de obra
Enero- Febrero

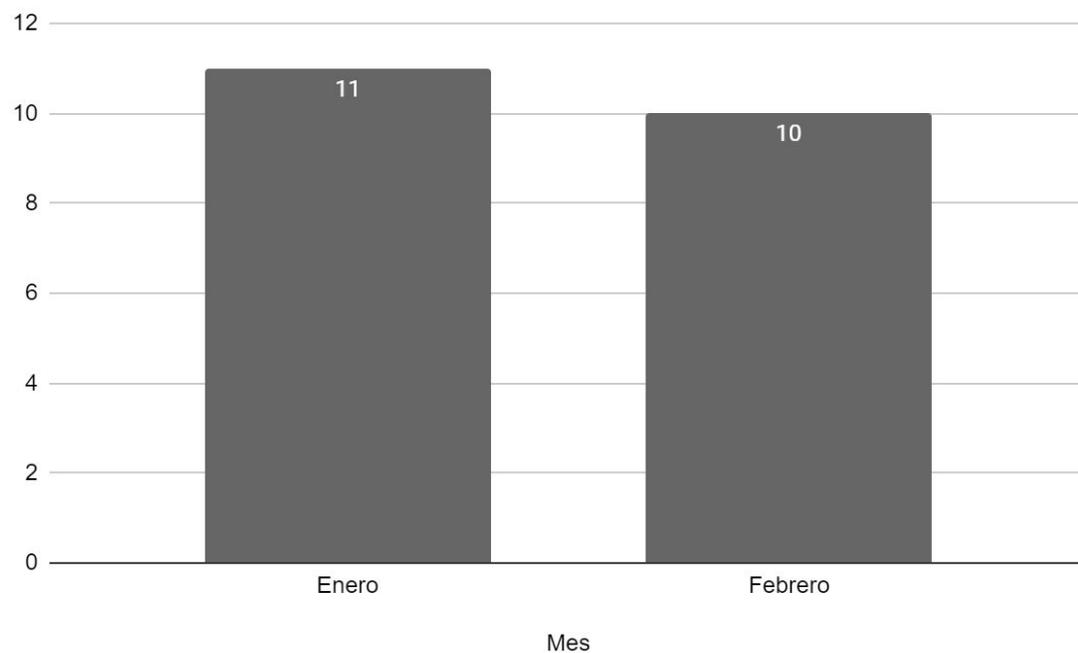

45

Autorizaciones de obra
Enero- Febrero

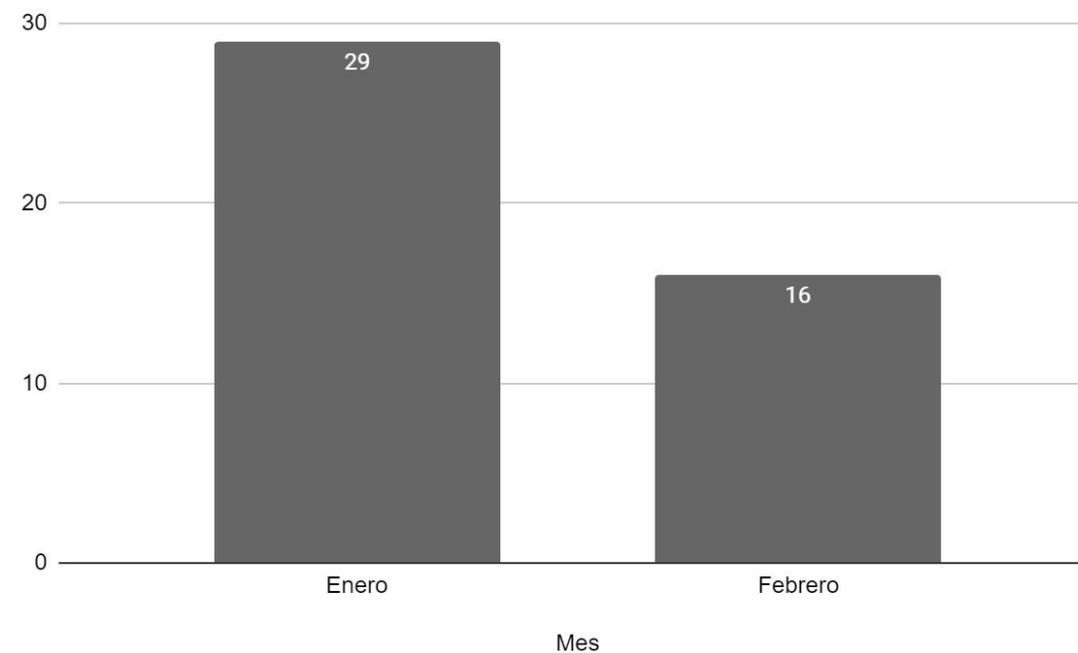

INBAL

Tema	Indicador	Quincena al 05/03	Próximo reporte	Observaciones
Obras	Consulta de calidad artística	5	19 de marzo	<ul style="list-style-type: none"> ● 3 no incluidos ● 1 incluido ● 1 colindante
Obras	Número de autorizaciones de obras	4	19 de marzo	<ul style="list-style-type: none"> ● 3 obras menores ● 1 obra mayor

INBAL

Consulta de calidad artística

UBICACIÓN	CATÁLOGO
-----------	----------

REPÚBLICA DE URUGUAY 69

NO INCLUIDO

DR. RÍO DE LA LOZA 45

NO INCLUIDO

DR. ANDRADE 22

NO INCLUIDO

REPÚBLICA DE ARGENTINA 94

INCLUIDO

AV. JUÁREZ 38

COLINDANTE



República de Uruguay 69



Dr. Río de la Loza 45



Dr. Andrade 22



República de Argentina 94



Av. Juárez 38

INBAL

Obras autorizadas

UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	DESCRIPCIÓN
AYUNTAMIENTO 161	MAYOR	ADECUACIÓN AL INTERIOR Y AMPLIACIÓN
ISABEL LA CATÓLICA 44	MENOR	REPARACIÓN DE CORNISAS
5 DE MAYO 2, 6 Y 18	MENOR	COLOCACIÓN DE RAMPA Y TRABAJOS EN VÍA PÚBLICA
TACUBA 5	MENOR	LIMPIEZA DE GRAFFITI Y CONSOLIDACIÓN DE FACHADAS



Isabel la Católica 44



Ayuntamiento 161



5 de Mayo 2, 6 y 18




Tacuba 5

INBAL


8

Consultas de calidad artística
Enero - Febrero

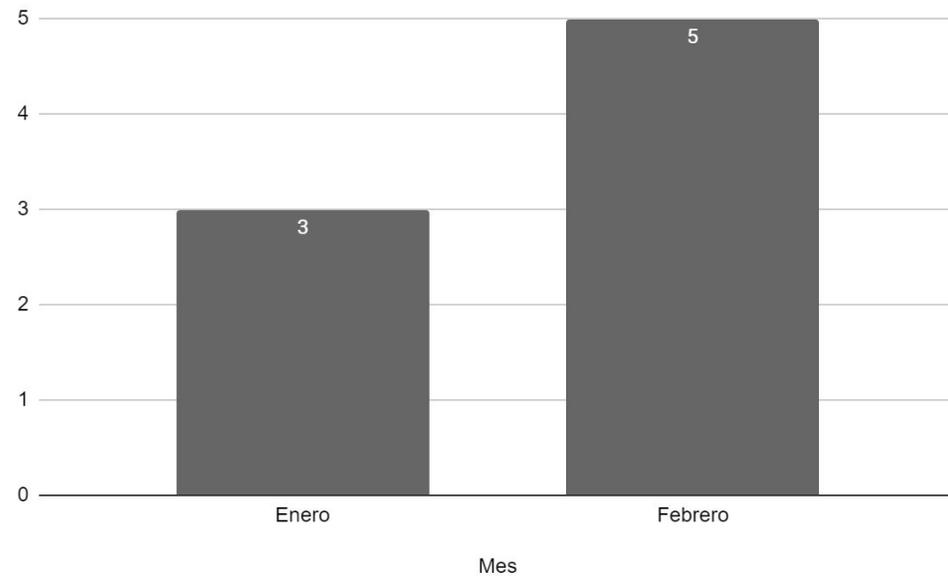

7

Obras autorizadas
Enero - Febrero

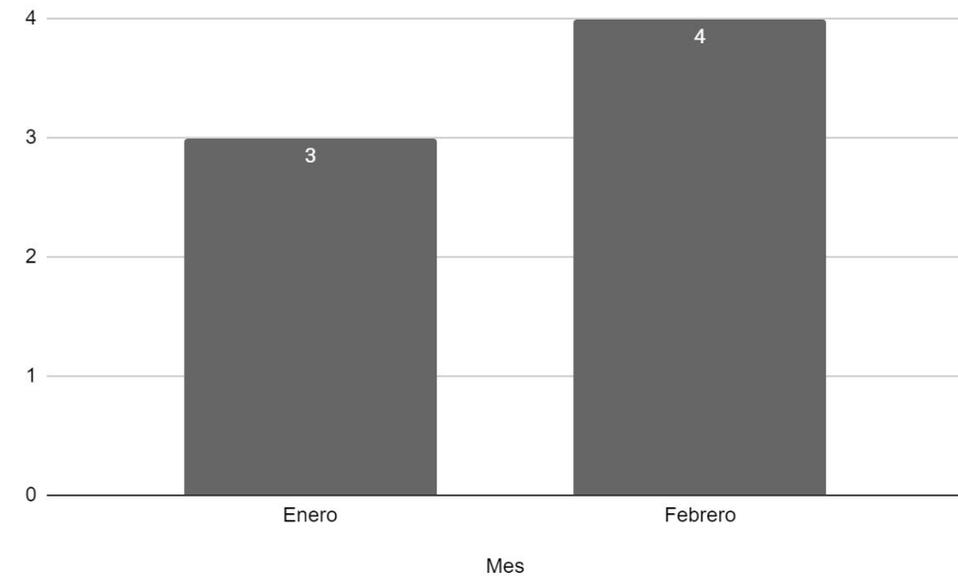

CONAVI



INMUEBLE	No. DE ACCIONES	MONTO	AUTORIZACIÓN INAH	AUTORIZACIÓN INBAL	AUTORIZACIÓN SEDUVI	FECHA DE INICIO	% AVANCE
SEMINARIO No. 12	1	\$300,000.00	SI	NA	SI	Marzo	0%
MAGNOLIA No. 162	3	\$4,000,000.00	SI	SI	SI	22-02-21	5%
PENSADOR MEXICANO No. 15	3	\$1,881,400.00	SI	NA	SI	17-02-21	5%
MANZANARES No. 21	5	\$3,500,000.00	SI	NA	SI	02-02-21	15%
FRANCISCO J. MINA No. 42	1	\$900,000.00	SI	SI	SI	22-02-21	10%
FRANCISCO J. MINA No. 106	9	\$1,799,865.00	SI	SI	SI	Marzo	0%
SOLEDAD No. 45	17	\$4,200,000.00	SI	NA	SI	Marzo	0%
REPÚBLICA DE VENEZUELA No. 93	3	\$500,000.00	SI	NA	SI	Marzo	0%
	44	\$25,303,455.17					

NOTAS

- Ya se ingresaron oficios por inmueble a la Alcaldía Cuauhtémoc **dando aviso** de los trabajos de obra y de las autorizaciones correspondientes. Haciendo referencia al Art.62 para quedar exentos de la manifestación de construcción.
- Subsecretario de SEDATU en espera de respuesta del **Lic. César Cravioto** sobre el posible apoyo a rentas para las 12 familias en Soledad 45, mientras duren los trabajos de obra





MAGNOLIA # 162, INICIO DE TRABAJOS 22/02/2021



SE INICIA CON EL RETIRO LOS APLANADOS EN MUROS DE LA VIVIENDA 4, IDENTIFICANDO EL GRADO DE DAÑO (A SIMPLE VISTA NO SE APRECIABAN LAS GRITAS Y FISURAS LOCALIZADAS).

PENSADOR MEXICANO # 15 COMENZANDO EL 17/02/2021



SE COLOCA TAPIAL PARA ASEGURAR LA ZONA DE TRABAJO Y DELIMITAR EL ACCESO A LOS HABITANTES DEL INMUEBLE PARA MITIGAR LOS RIESGOS EN OBRA, SE INICIAN LOS TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO EN CORREDORES.



MANZANARES # 21 INICIO DE TRABAJOS 2/02/2021



FACHADA



APUNTALAMIENTO Y RETIRO DE APLANADOS DE MUROS PARA DETERMINAR LOS DAÑOS.



RETIRO DE ENTREPISO, LIMPIEZA DE VIGAS IDENTIFICANDO EL GRADO DE DETERIORO PRODUCIDO POR LOS INSECTOS XILOFAGOS



LIMPIEZA DE MURO Y VIGAS PARA DETERMINAR EL TRATAMIENTO DE LA MADERA Y TRABAJOS A SEGUIR.



MINA # 42, INICIO DE TRABAJOS EL 22/02/2021




RETIRO DE APLANADOS EN MUROS EN MAL ESTADO DERIVADO DEL EXCESO DE HUMEDAD, SE INICIA LA LIMPIEZA DE VIGAS IDENTIFICANDO EL GRADO DE DETERIORO PRODUCIDO POR LOS INSECTOS XILOFAGOS



CONAVI

Porcentaje de avance de obra 4 frentes

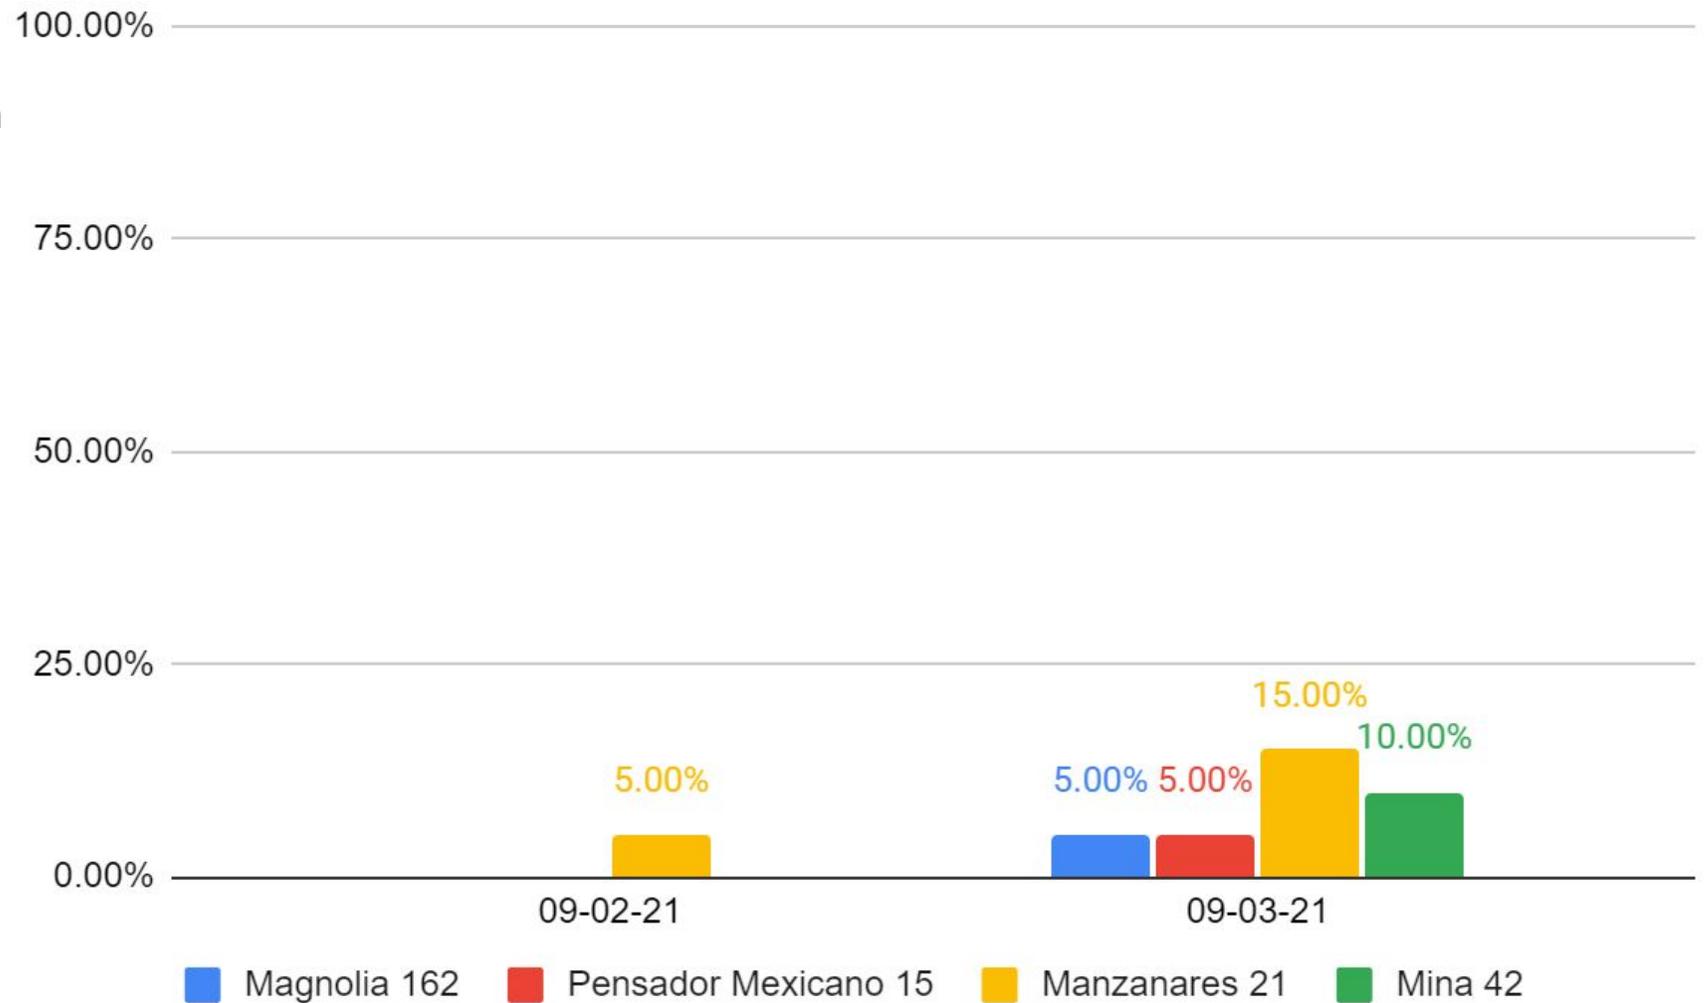

PROYECTOS FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO 2020-2021



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



fideicomiso
CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Fideicomiso Centro Histórico

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN	
INMUEBLE	STATUS MULTIANUALIDAD
CASA TALAVERA	EN PROCESO, AVANCE FÍSICO 95%, TÉRMINO MARZO 2021
CASA DEL CONDE DE REGLA	EN PROCESO, AVANCE FÍSICO 80%, TÉRMINO MARZO 2021
SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA	EN PROCESO, AVANCE FÍSICO 70%, TÉRMINO MARZO 2021
CAPILLA DE LA EXPIRACIÓN	EN PROCESO, AVANCE FÍSICO 80%, TÉRMINO MARZO 2021
CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH-FHCM	
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN ... TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS	EN DESARROLLO LA ETAPA DE PROYECTO DE INTERVENCIÓN
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN ... TEMPLO DE SANTA CATARINA	EN DESARROLLO LA ETAPA DE PROYECTO DE INTERVENCIÓN
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCIÓN ... TEMPLO DE LA SANTÍSIMA T.	EN DESARROLLO PROYECTO DE INTERVENCIÓN


Fideicomiso Centro Histórico




Fideicomiso Centro Histórico



Casa
Talavera

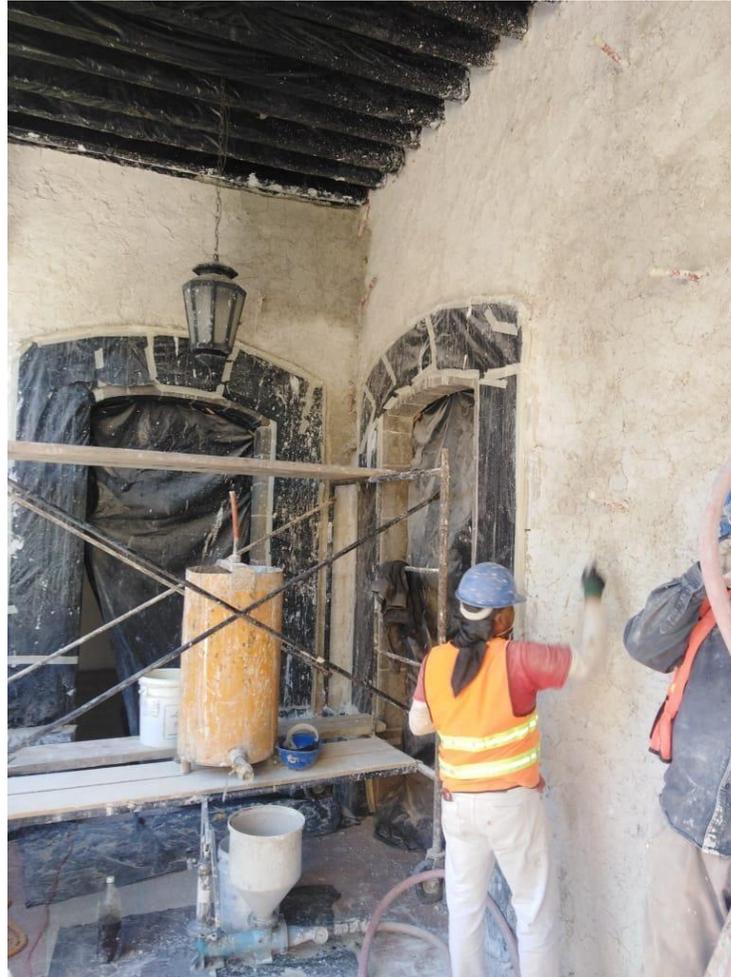


Fideicomiso Centro Histórico

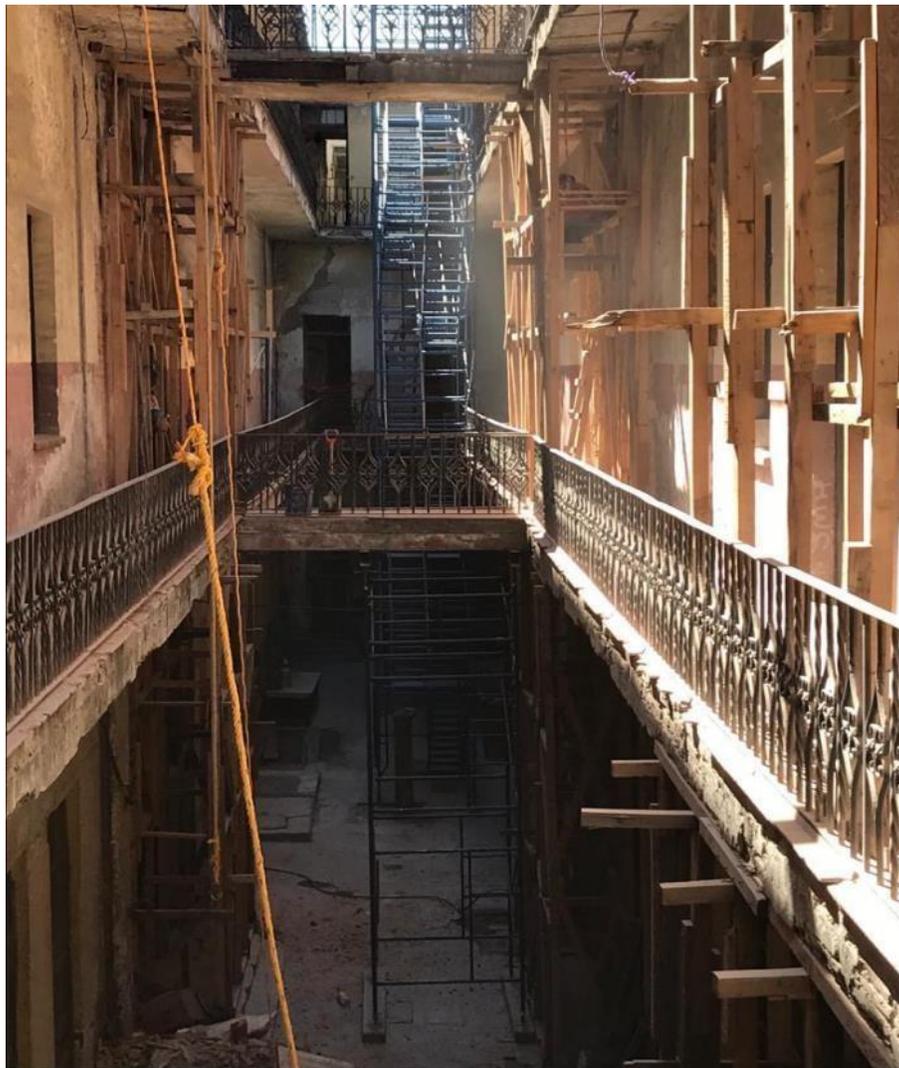

Casa del Conde de Regla

Fideicomiso Centro Histórico

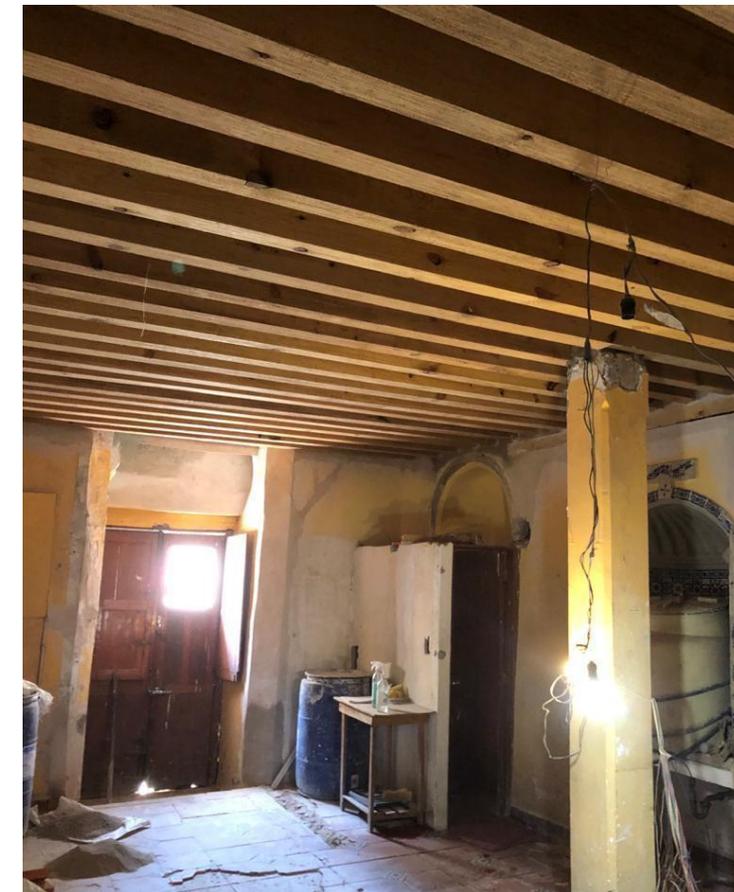


REINTEGRACIÓN DE VIGUERÍA DE MADERA EN SACRISTÍA DE LA CAPILLA

Capilla de la Expiración

Fideicomiso Centro Histórico

Programa Nacional de Reconstrucción





INVI

PREDIO	COLONIA	ACCIONES	ESTATUS DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE
2 DE ABRIL No. 42	GUERRERO	11	OBRA EN PROCESO	42.20%
ACADEMIA No.33	CENTRO	20	OBRA EN PROCESO	85.41%
ARCOS DE BELÉN No. 49	CENTRO	24	OBRA EN PROCESO	100.00%
EJE 1 PONIENTE GUERRERO No. 164	GUERRERO	58	OBRA EN PROCESO	86.90%
EJE 1 PONIENTE GUERRERO No. 110	BUENAVISTA	37	OBRA EN PROCESO	100.00%
MAGNOLIA No. 12 (ANTES No. 12 Y 16)	GUERRERO	19	OBRA EN PROCESO	90.10%
REPÚBLICA DE ARGENTINA No. 58	CENTRO	16	POR INICIAR	0.00%
REPÚBLICA DE ARGENTINA No. 87	CENTRO	25	OBRA EN PROCESO	99.80%
REPÚBLICA DE PERÚ No. 40	CENTRO	33	OBRA EN PROCESO	93.61%



INVI

PREDIO	COLONIA	ACCIONES	ESTATUS DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE
ALLENDE No. 46	CENTRO	32	OBRA EN PROCESO	100.00%
LERDO No. 12	GUERRERO	53	POR INICIAR	0.00%
PEDRO MORENO No. 154	GUERRERO	18	POR INICIAR	0.00%
TALAVERA No. 24	CENTRO	63	POR INICIAR	0.00%
VIOLETA No. 15	GUERRERO	26	POR INICIAR	0.00%
PEDRO MORENO No. 156	GUERRERO	18	POR INICIAR	0.00%
LECUMBERRI No. 66	ZONA CENTRO	54	OBRA EN PROCESO	100.00%
BELISARIO DOMINGUEZ No. 78	CENTRO	23	OBRA EN PROCESO	96.84%
NACIONAL No. 57	MORELOS	42	OBRA EN PROCESO	85.11%



UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

INVI

**Porcentaje de avance general
18 inmuebles**

**Ya se han concluido 4
inmuebles con 147 acciones de
vivienda**

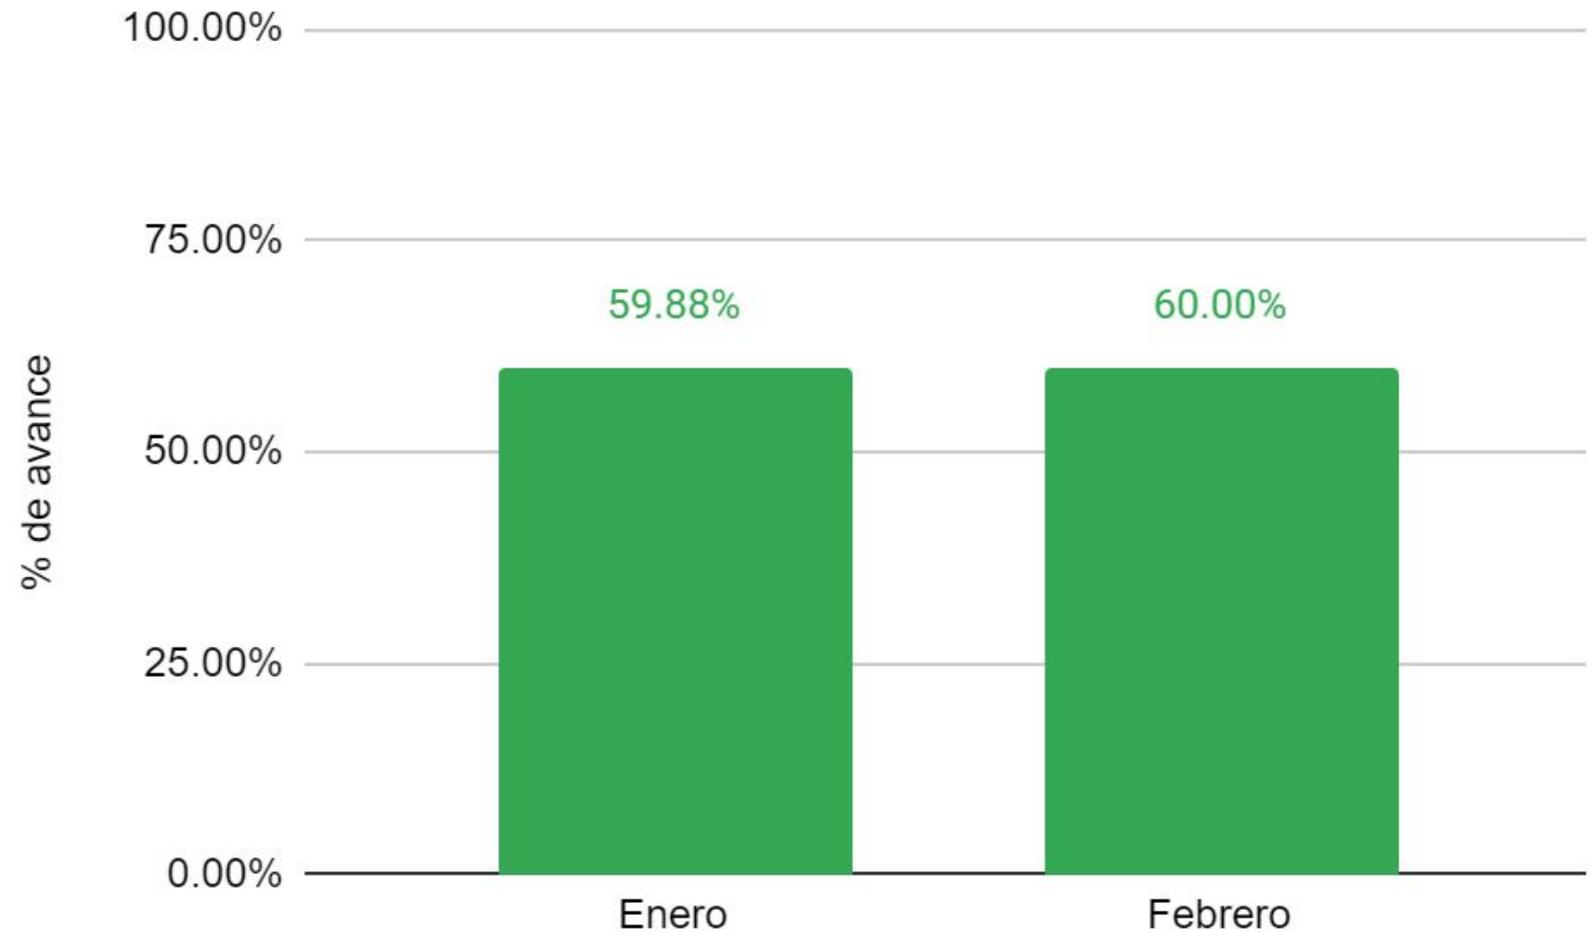



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

RESCATE INNOVADOR Y PARTICIPATIVO EN UNIDADES
HABITACIONALES 2020

EVALUACIÓN MARZO 2021



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

RIPUH EJERCICIO 2020

LISTADO PARCIAL DE UNIDADES HABITACIONALES
BENEFICIADAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

LISTADO PARCIAL PRELIMINAR DE UNIDADES HABITACIONALES A SER BENEFICIADAS RIPUH 2020

ALCALDIA	No DE UNIDADES
CUAUHTEMOC	26
VENUSTIANO CARRANZA	17
TOTAL	43




UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PROSOC TOTAL DE OBRAS EJERCICIO 2020

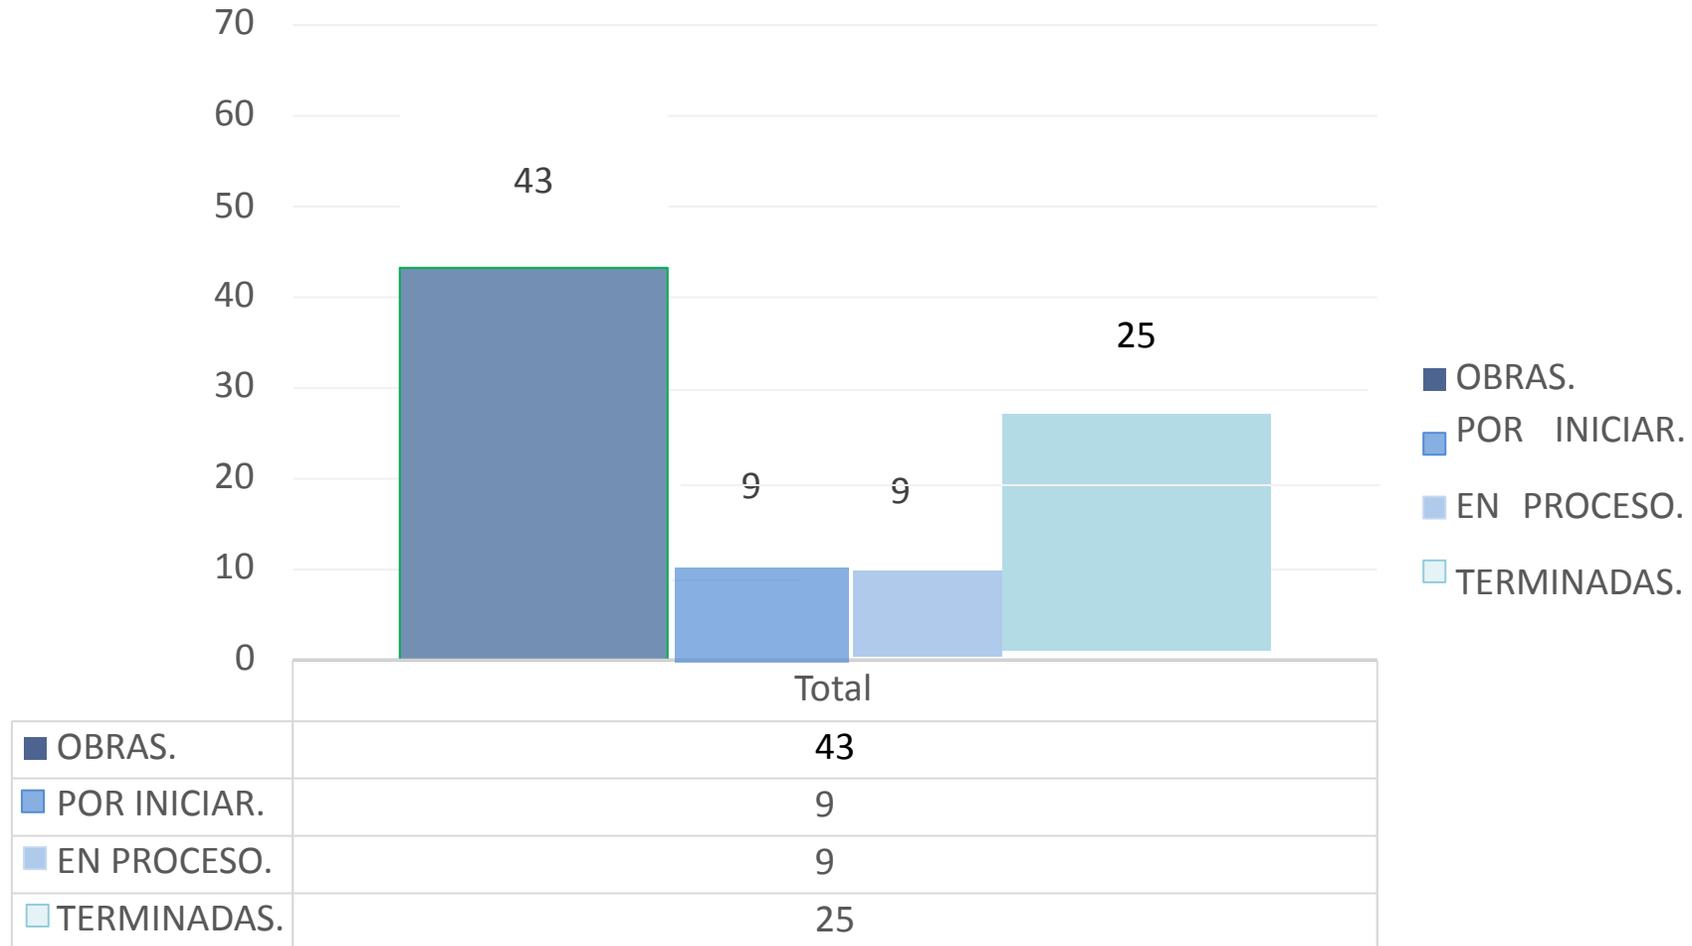




PROSOC OBRAS CUAUHTEMOC EJERCICIO 2020

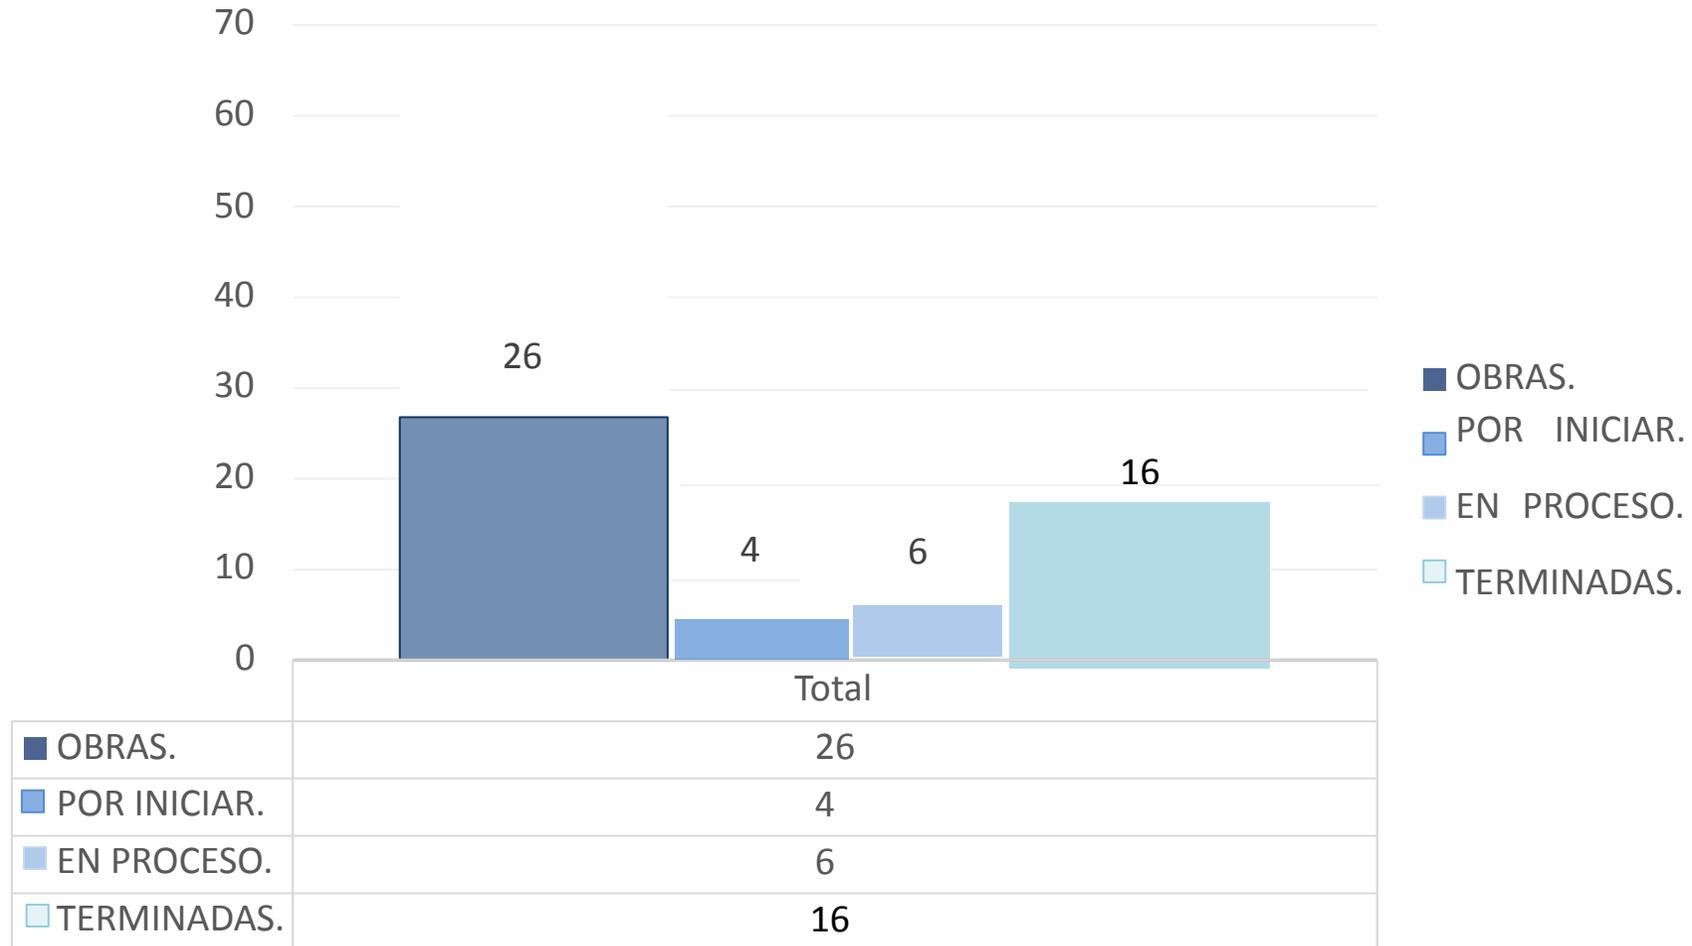

PROSOC OBRAS VENUSTIANO CARRANZA EJERCICIO 2020

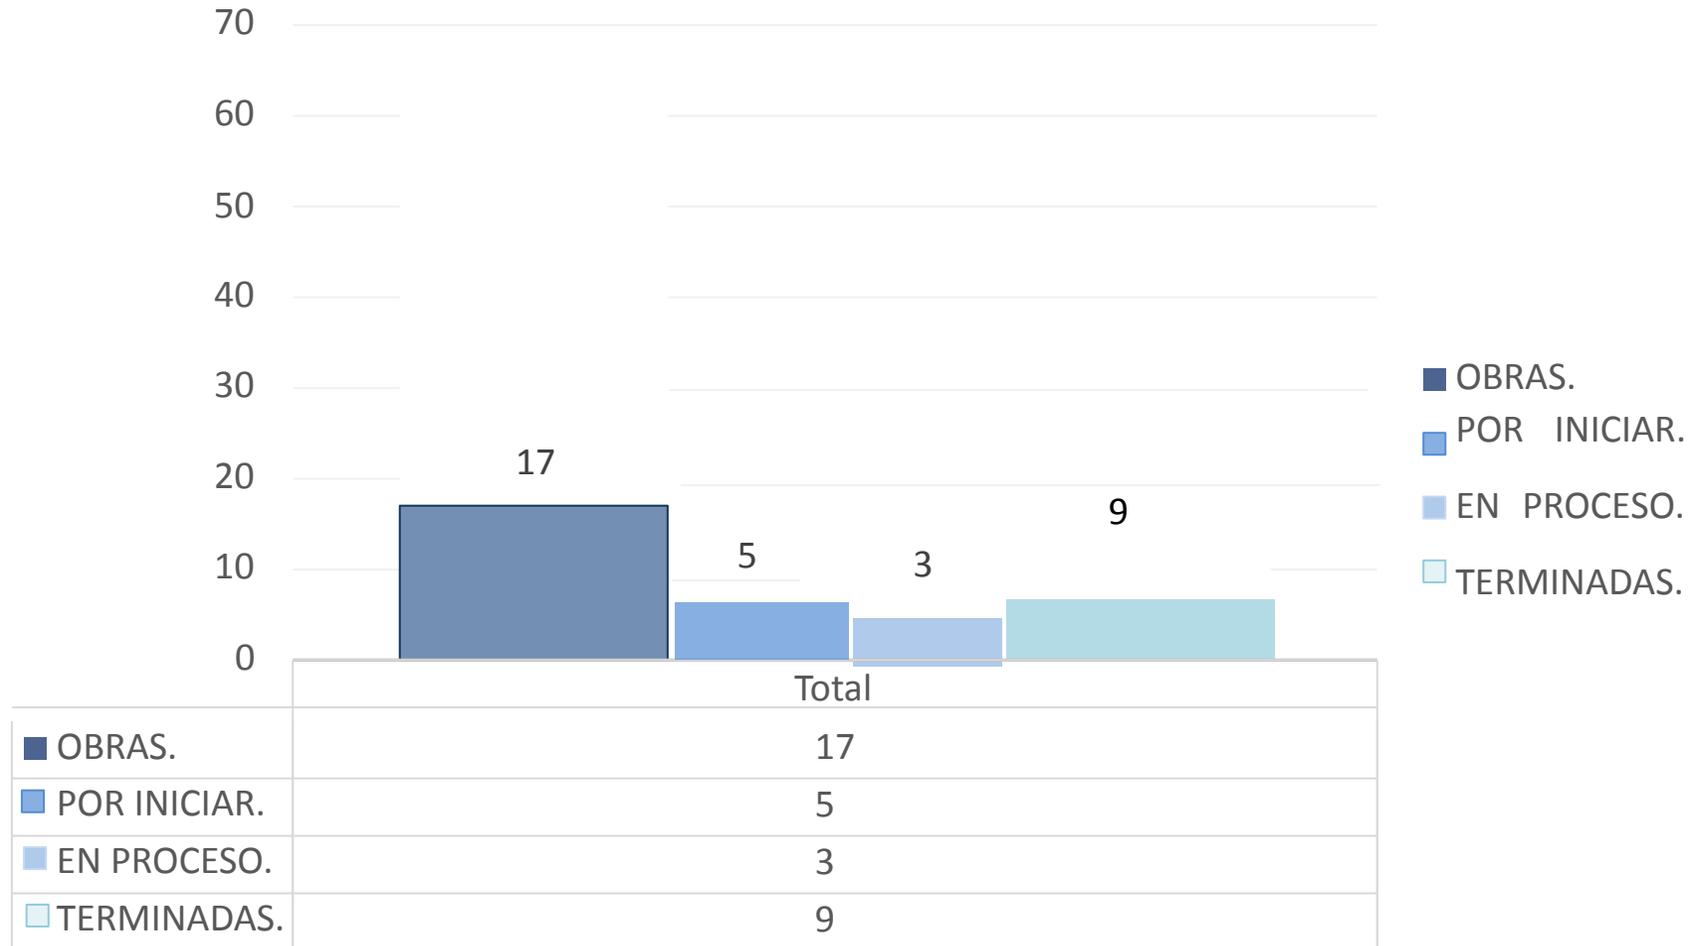



UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

RIPUH- CUAUHEMOC

LISTA PARCIAL PRELIMINAR 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	BOLIVAR 158	OBRERA	CUAUHEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA		0%	B	NO CATALOGADA
2	DR. JIMENEZ 41	DOCTORES	CUAUHEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA		0%	B	NO CATALOGADA
3	CALZADA DE LA VIGA 18	ESPERANZA	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
4	CALZADA DE LA VIGA 16	ESPERANZA	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
5	LIBERTAD 21 C3	MORELOS	CUAUHEMOC	ESCALERAS	EN PROCESO	55%	B	NO CATALOGADA
6	3ra CERRADA DE LIBERTAD 6	MORELOS	CUAUHEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	
7	VIOLETA 58	GUERRERO	CUAUHEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMJNADA	100%	B	NO CATALOGADA



UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

RIPUH- CUAUHEMOC

LISTA PARCIAL PRELIMINAR 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
8	GALEANA 36		CUAUHEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		0%	B	NO CATALOGADA
		GUERRERO						
9	MAGNOLIA 90	GUERRERO	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
10	JOSE JOAQUIN HERRERA 10-12	CENTRO	CUAUHEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	PROCESO	50%	B	NO CATALOGADA
11	JOSE JOAQUIN HERRERA 28-32	CENTRO	CUAUHEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
12	FLORIDA 57	CENTRO	CUAUHEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	A	CATALOGADA
13	CALLEJON MONTERO 7	CENTRO	CUAUHEMOC	CALLES Y ANDADORES	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
14	MANUEL TOLSA 56	CENTRO	CUAUHEMOC	ESTRUCTURA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA



UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

RIPUH- CUAUHEMOC

LISTA PARCIAL PRELIMINAR 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
15	REPUBLICA DE CHILE 49	CENTRO	CUAUHEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	PROCESO	60%	A	CATALOGADA
16	BUCARELI 66	CENTRO	CUAUHEMOC	CUBOS DE AREA COMUN	PROCESO	90%	B	CATALOGADA
17	SAN IDELFONSO 65	CENTRO	CUAUHEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	A	
18	REPUBLICA DE VENEZUELA 77	CENTRO	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	
19	SAN CAMILITO 25	CENTRO	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100 %	B	NO CATALOGADO
20	MESONES 138	CENTRO	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	
21	REPUBLICA DE PERU 32	CENTRO	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	CATALOGADA



RIPUH- CUAUHEMOC

LISTA PARCIAL PRELIMINAR 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
22	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS 17	CENTRO	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
23	NEZAHUALCOYOTL 136	CENTRO	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
24	JOSE JOAQUIN HERRERA 6	CENTRO	CUAUHEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		0%	B	NO CATALOGADA
25	REPUBLICA DE CHILE 47	CENTRO	CUAUHEMOC	ESCALERAS	PROCESO	20%	A	NO CATALOGADA
26	REPUBLICA DE PARAGUAY 62	CENTRO	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION	PROCESO	5%	A	NO CATALOGADA



UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

RIPUH- VENUSTIANO CARRANZA

LISTA PARCIAL PRELIMINAR 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	ROSARIO 32	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
2	CORREGIDORA 148	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
3	CORREGIDORA 140	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
4	ANILLO DE CIRCUNVALACION 40	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA		0%	B	NO CATALOGADA
5	CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA 4	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	CALLES Y ANDADORES	PROCESO	100%	B	NO CATALOGADA
6	JOAQUIN HERRERA 64	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	PROCESO	95%	B	NO CATALOGADA



UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

RIPUH- VENUSTIANO CARRANZA

LISTA PARCIAL PRELIMINAR 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
7	ANILLO DE CIRCUNVACION 20	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESTRUCTURAS		0%	A	NO CATALOGADA
8	LECUMBERRI 59	CENTRO	VENUSTANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
9	UNIDAD HABITACIONAL CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA I	MORELOS	VENUSTANO CARRANZA	HERRERIA	PROCESO	70%	B	NO CATALOGADA
10	UNIDAD HABITACIONAL CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA II	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	PROCESO	90%	B	NO CATALOGADA
.11	UNIDAD HABITACIONAL CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA III	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
12	CIRCUNVALACION 48	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	PINTURA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA



UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

RIPUH- VENUSTIANO CARRANZA

LISTA PARCIAL PRELIMINAR 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
13	4TA LECUMBERRI 60	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA SANITARIA		0%	B	NO CATALOGADA
14	NACIONAL 44	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	ESTRUCTURAS		0%	B	NO CATALOGADA
15	NACIONAL 32	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (TINACOS)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
16	NACIONAL 52	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
17	VANEGAS ARROYO 30	MERCED	VENUSTIANO CARRANZA	IMPERMEABILIZACION	PROCESO	0%	B	NO CATALOGADA



UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTORICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

LECUMBERI 59- INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

ANTES



DESPUES





UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTORICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

NEZAHUALCOYOTL 136- IMPERMEABILIZACION

ANTES



DESPUES




PROSOC

Porcentaje de avance general

A la fecha se han concluido obras en 25 unidades habitacionales de la Alcaldía Cuauhtémoc, de un total de 43 por intervenir

Mientras que en la Alcaldía Venustiano Carranza se han concluido obras en 16 unidades habitacionales, de un total de 26 por intervenir

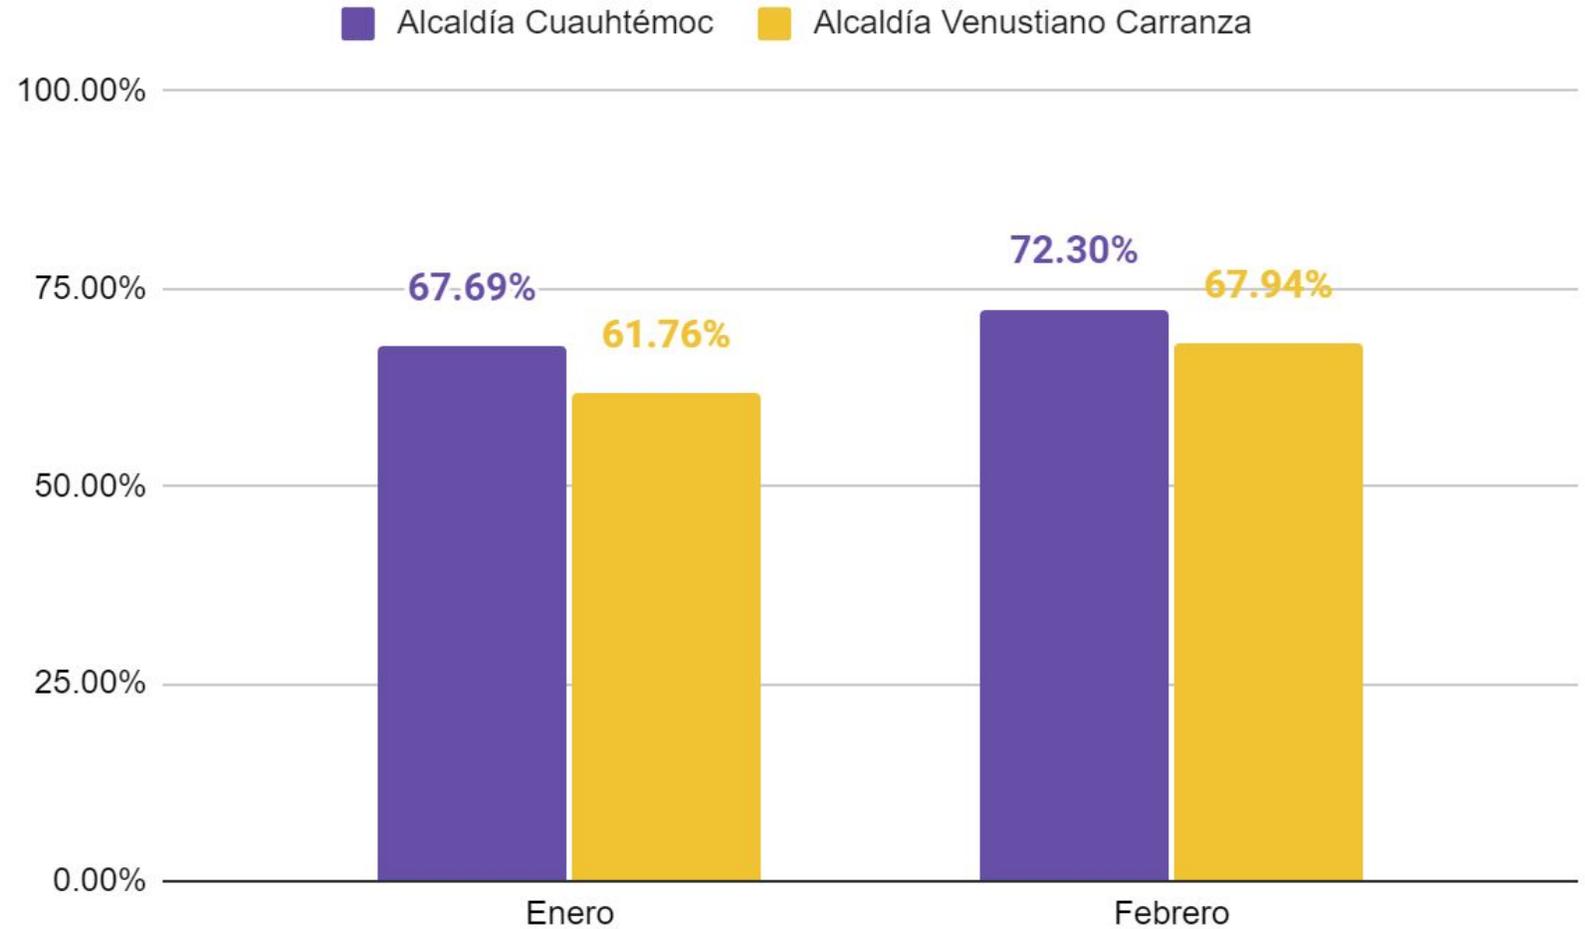



ILIFE Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa

INMUEBLES ESCOLARES CENTRO HISTÓRICO

FEBRERO 2021

No.	PLANTEL	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
1	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO "ROSARIO CASTELLANOS "CAMPUS JUSTO SIERRA"	50.81%	
2	ESCUELA SECUNDARIA ADRIANA GARCÍA CORRAL (SEGUNDA ETAPA)	32.00%	
3	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	100.00%	SE TERMINARON TRABAJOS ENERO 2021




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

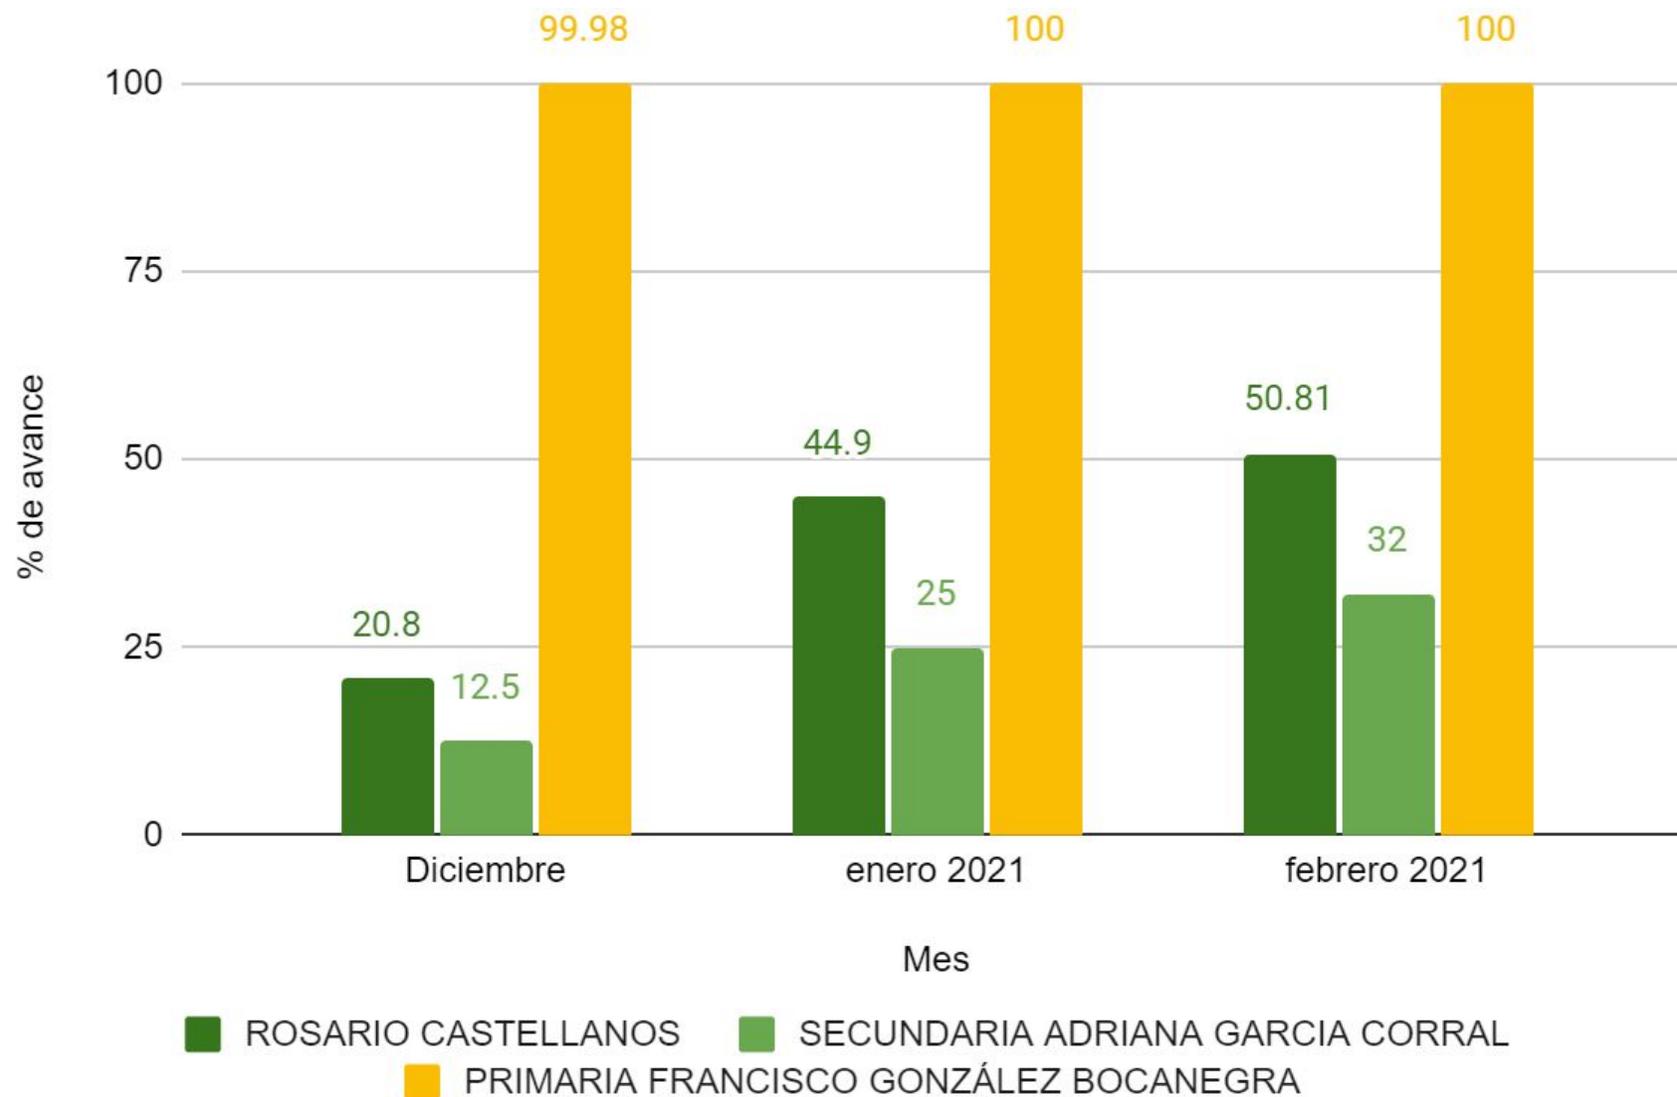



SEDECO

Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México. 2020.

Ciudad de México a 5 de marzo 2021

No.	Mercado público	Monto Sedeco	Monto Alcaldía	Total	Avance de la Obra %	3ra. Visita de SEDECO conjuntamente con Alcaldía
1	La Merced Mixcalco	\$10,000,000.00	\$8,356,048.80	\$18,356,048.80	99%	25-feb-21
2	Tepito, ropa y telas (Granaditas)	\$9,648,922.80	\$6,432,615.05	\$16,081,537.85	99%	25-feb-21
3	Lagunilla Zona	\$5,000,000.00	\$5,596,196.89	\$10,596,196.89	100%	25-feb-21
6	Lagunilla San Camilito	\$1,238,437.20	\$825,624.80	\$2,064,062.00	100%	24-feb-21
Total		\$25,887,360.00	\$21,210,485.54	\$47,097,845.54		



SEDECO

Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México. 2020.

Mercado Merced Mixcalco :

24/sept/2020

Instalaciones existentes al inicio de la obra

Estatus al 25/feb/2021. Avance del 99%

Instalación eléctrica (cuarto eléctrico, transformador, tablero principal)





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SEDECO

Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México. 2020.

Mercado Merced Mixcalco :

24/sept/2020

Instalaciones existentes al inicio de la obra:

Estatus al 25/feb/2021. Avance del 99%

Tableros de distribución, centros de carga en locales, luminarias en locales y pasillos:





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SEDECO

Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México. 2020.

Mercado Merced Mixcalco :

24/sept/2020

Desmantelamientos de la Red eléctrica Existente

Estatus al 25/feb/2021. Avance del 99%

Luminarias exteriores y reflectores en carga y descarga





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CENTRO
HISTÓRICO

SEDECO

Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México. 2020.

Mercado Merced Mixcalco :



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Estatus al 25/feb/2021. Avance del 99%

Área de lavabos y conexión de drenaje





SEDECO

Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México. 2020.

Tepito Ropa y Telas (Granaditas): 18/sept/2020

Instalaciones Existentes y Reubicación Temporal de Tableros

Estatus al 25/feb/2021. Avance del 99%

Mantenimiento de tablero principal y construcción de tierras físicas





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIÓN

CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SEDECO

Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México. 2020.

Tepito Ropa y Telas (Granaditas)

Estatus al 25/feb/2021. Avance del 99%

Puertas de herrería





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SEDECO

Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México. 2020.

Tepito Ropa y Telas (Granaditas):

Estatus al 25/feb/2021. Avance del 99%

Instalación eléctrica (soportería, ductería, centros de carga en locales, luminarias)





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DEL CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS


SEDECO

Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México. 2020.


Tepito Ropa y Telas (Granaditas):

Estatus al 25/feb/2021. Avance del 99%

Pintura perimetral y luminarias exteriores



Red hidráulica

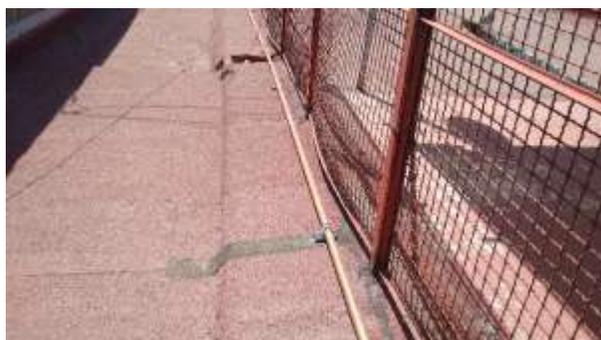



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CENTRO HISTÓRICO

SEDECO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México. 2020.

Mercado Lagunilla Zona : 24/sept/2020

Instalación eléctrica existente.

Estatus al 25/feb/2021. Avance del 100%

Acometida





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



SEDECO

Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México. 2020.

Mercado Lagunilla Zona : 24/sept/2020


Instalación de Ductería y soportaría Eléctrica



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Estatus al 25/feb/2021. Avance del 100%

Instalación Eléctrica (Transformador, interruptor principal, tableros principales)

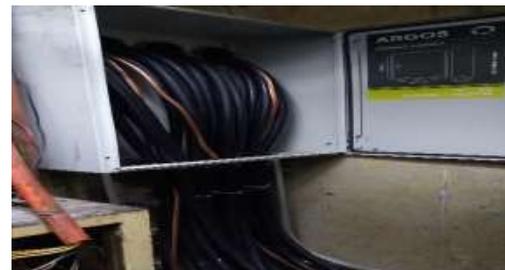



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SEDECO

Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México. 2020.

Mercado Lagunilla Zona :

Estatus al 25/feb/2021. Avance del 100%

Tableros secundarios, instalación de Ducteria y Soportaría Eléctrica centros de carga





SEDECO

Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México. 2020.

Lagunilla San Camilito:

Estatus al 24/feb/2021. Avance del 100%

Instalación eléctrica (Transformador, Interruptor principal, tablero principal, tablero secundario, nicho de medición y base)

Instalaciones existentes al 26/oct/2020





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SEDECO

Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México. 2020.

Lagunilla San Camilito:

Estatus al 24/feb/2021. Avance del 100%

Acometida al 26/oct/2020

Instalación eléctrica (Transformador, Interruptor principal, tablero principal, tablero secundario, nicho de medición y base)





SEDECO

En febrero se concluyó al 100% la rehabilitación

Lagunilla
San Camilito

Lagunilla
Zona

del Programa de Fomento y
Mejoramiento a Mercados Públicos 2020
de la Ciudad de México.

Notas:

1. Mercado San Juan Curiosidades, fue afectado por el sismo del 19 de septiembre de 2017.
2. Fecha reportada por la Alcaldía Cuauhtémoc mediante oficio



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte del 22/02	Reporte al 8/03	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones	Ducto Maestro República de Brasil	Quincenal	95 %	95 %	23/03/2021



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD

META

TRAYECTORIA	ML
RED TRONCAL	18009.09
RED DISTRIBUCIÓN	5082.12
RADIALES Y ACOMETIDAS	4103.8

95 % DE AVANCE



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y
PATRIMONIO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte del 22/02	Reporte al 8/31	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones	Ducto Maestro Av. Chapultepec	Mensual	72 %	80 %	23/03/2021



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD

META

TRAYECTORIA	ML
RED TRONCAL	26418
RED DISTRIBUCIÓN	8632
RADIALES Y ACOMETIDAS	10736




80 % DE AVANCE



ADIP


Porcentaje de avance Ducto Maestro República de Brasil





ADIP


Porcentaje de avance Ducto Maestro Av. Chapultepec



Indicador	Periodicidad	Semana del 19/02 al 05/03	Próximo reporte
No. cámaras con falla o intermitencia	Quincenal	15 cámaras	23 de marzo
Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura		02 cámaras en 02 sitios	

*NOTA: Los datos proporcionados son extraídos de los **Reportes de mesa de ayuda de C5***

Acumulado enero a la fecha

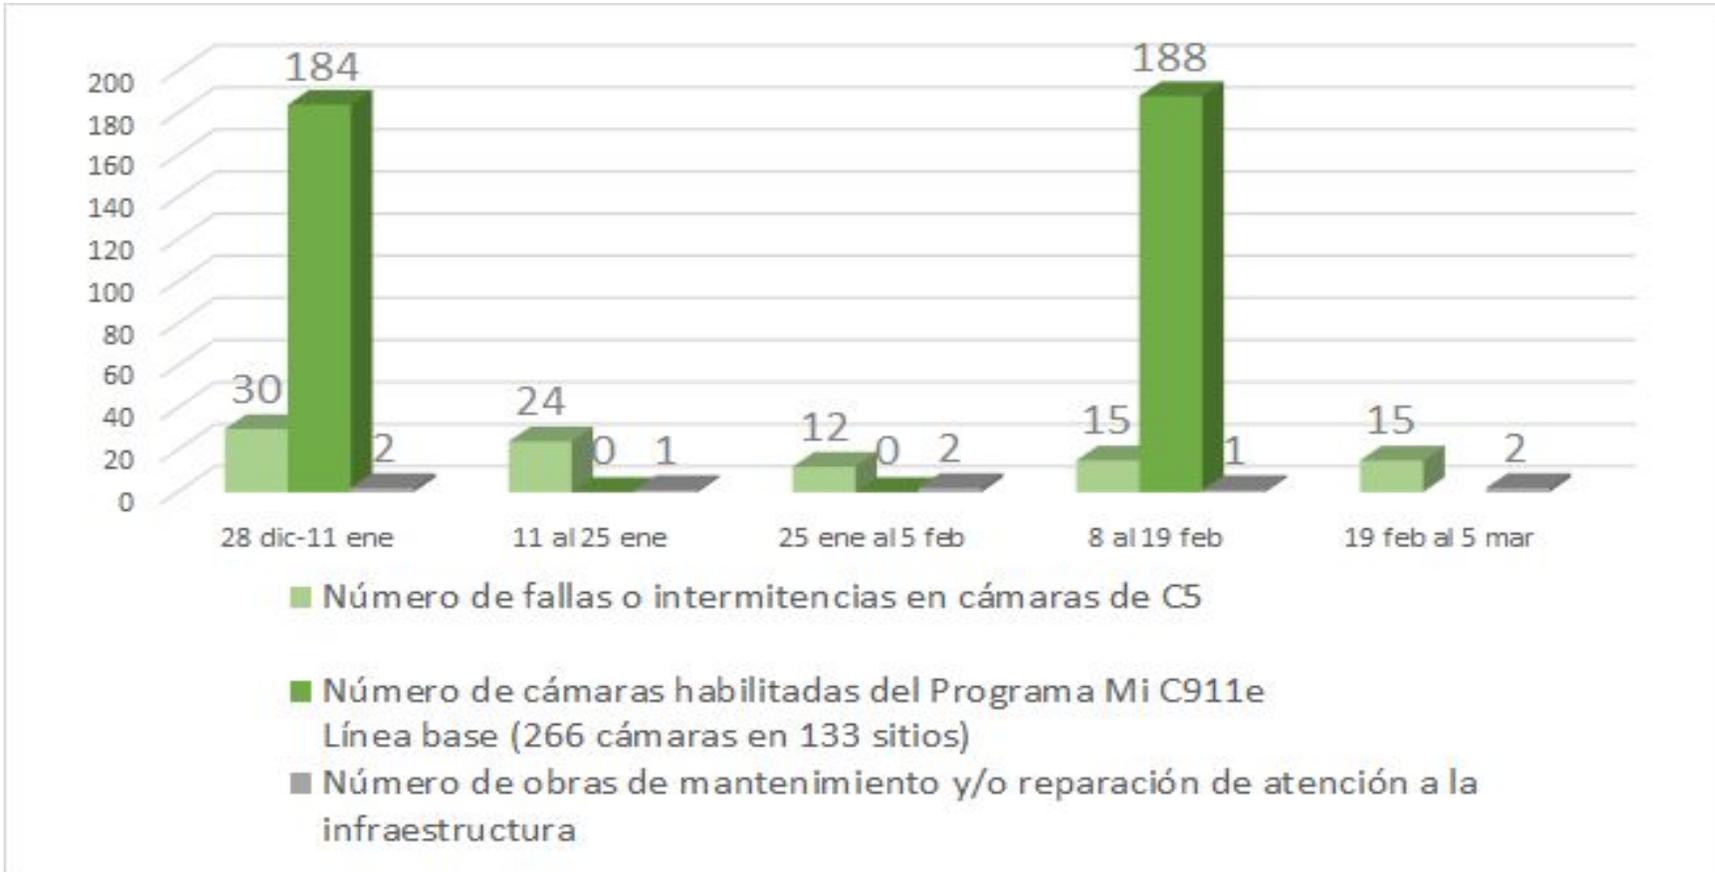

En febrero se concluyó con las instalaciones de

188

cámaras del programa

Mi C911e

SSC-TRÁNSITO

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	19/02 al 08/03	Próximo reporte
Semáforos	Número de semáforos con mantenimiento preventivo		1	
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo	Quincenal	68	23 de marzo
Cámaras	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		0	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo		0	



SSC-SCT-DSOT


CORRECTIVO

ACOMETIDA	1
AISLADA	2
APAGADO	6
CABLE DE COMUNICACIÓN DAÑADO	2
CANALIZACIÓN	2
CORTO	1
DESINSTALACIÓN	2
DESORIENTADO	6
FOCO FUNDIDO	3
FY-CINTILANTE	15
IMPACTADO	6
LIMPIEZA DE COMPONENTES	1
MEMORIA DAÑADA	1
OBRA CIVIL	1
PEATÓN APAGADO	1
PUERTA ABIERTA	1
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	17

PREVENTIVO


FY-CINTILANTE	1
TOTAL GENERAL	69

MANTENIMIENTO CORRECTIVO



SSC-TRÁNSITO

Mantenimiento a semáforos





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y PATRIMONIO
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Corte de Transmisión



Matriz de seguimiento a turnos



Dependencia	Estatus			Total
	Atendido	Proceso	Pendiente	
ACH	5			5
Alcaldía Cuauhtémoc	2			2
CFE			1	1
INBAL	1			1
SACMEX	3		1	4
SEDUVI	2			2
SOS-DCOP	1			1
SOS-DGOIV			2	2
SOS-DGSUS	1			1
Total general	15		4	19



SEGUIMIENTO A TURNOS

Derivados de la 4ta. Mesa del 23-02-2021

Atendidos



CLAVE	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
TCH-021	23/2/2021	TELMEX	Gestionar con las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las consignas de C5, para que se refuerce vigilancia en los puntos donde han tenido vandalismo a su infraestructura, en el polígono comprendido en la zona de La Merced, Eje 1, Circunvalación e Izazaga.	ACH	Atendido	9/3/2021	Comentado en Mesa de Reordenamiento



CLAVE	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-001	29/12/2020	ACH	Se realice la reparación de la atarjea rota de la calle de Roldán entre San Pablo y Ramón Corona	SACMEX	Pendiente	<p>Como primer avance de trabajo se realizó el sondeo y limpieza de 60 ML de atarjea de diámetro 0.38M, 2 Pozos de Visita, extracción de 0.25 m3 de azolve.</p> <p>Queda pendiente reparación de atarjea que se identificó rota 12 de enero. Se confirma que la atarjea presenta un colapso entre el PV 1 y PV 2.</p> <p>Se elimina un taponamiento localizado entre el PV 6 y PV 7, este es ocasionado por la acumulación de grasa al interior de la atarjea, se reduce el 75% de la carga que presentaba la atarjea, sin embargo, se requiere continuar con la extracción de azolve, ya sea con el apoyo de un equipo mecánico de tipo "malacate" o Hidroneumático.</p> <p>Se programará en función de la disponibilidad del SACMEX</p>
TCH-005	12/1/2021	Metrobús	Apoyo con el balizamiento de la Línea 4 del Metrobús	SOS-DGOIV	Pendiente	Se envió solicitud vía oficio ACH/DEPPMCCCH/004/2021 dirigido al Ing. Víctor Manuel Bautista para apoyo
TCH-006	12/1/2021	Metrobús	Se atiendan reparaciones de daños ocasionados por la obra en Av. Balderas a la infraestructura de Metrobús	SOS-DGOIV	Pendiente	Se envió solicitud vía oficio ACH/DEPPMCCCH/005/2021 dirigido al Ing. Víctor Manuel Bautista para apoyo
TCH-014	26/1/2021	Al. Cuauhtémoc	Se repare el registro de República de Ecuador, acera norte, frente al número 26.	CFE	Pendiente	



Matriz de seguimiento a Incidencias Urbanas



Matriz IUCH	Estatus		
Dependencia	Atendido	Pendiente	Total general
ACH	36	3	39
Al. Cuauhtémoc	55	4	59
CFE	193	22	215
CIS	10		10
SACMEX	135	5	140
SOS-AP	79	1	80
SOS-DGOIV	29	5	34
SOS-DGSUS	7		7
STC-METRO	1		1
TELMEX	31	1	32
Tránsito	32		32
Total general	612	41	653



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



Atención VIPPSC

Del 23 de febrero al 08 de marzo

Incidencias Atendidas



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falla en el alumbrado público	Plaza Loreto	San Ildefonso	Justo Sierra				Al. Cuauhtémoc	Atendido
VIPP 8 San Pablo	Falla en el suministro de energía eléctrica	Mesones	Las Cruces	Jesús María	No. 177	sin imagen	sin imagen	CFE	Atendido
VIPP 8 San Pablo	Falla en el suministro de energía eléctrica	Ramón Corona			No. 25	sin imagen	sin imagen	CFE	Atendido
VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falla en el suministro de energía eléctrica	Soledad	Alhóndiga	Callejón de Lecheras	en el No. 31 local A.			CFE	Atendido
VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falla en el suministro de energía eléctrica	Corregidora	Jesús María	Alhóndiga	No.59			CFE	Atendido
VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falta tapa de registro	Manzanares	3er Callejón de Manzanares	Circunvalación				CFE	Atendido
VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falla en el suministro de energía eléctrica	San Ildefonso	Del Carmen	Loreto	No.55			CFE	Atendido
VIPP 3 Santo Domingo	Falla en el suministro de energía eléctrica	Leandro Valle	Belisario Domínguez	República de Perú	No. 14			CFE	Atendido
VIPP 8 San Pablo	Registro con tapa dañada	Mesones	Correo Mayor	Pino Suárez				CFE	Atendido



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



Atención VIPPSC

Del 23 de febrero al 08 de marzo

Incidencias Atendidas



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 4 Alameda - Sector Financiero	Falta tapa de coladera	Allende	Donceles	Tacuba				SACMEX	Atendido
VIPP 4 Alameda - Sector Financiero	Falla en el alumbrado público	Madero	Isabel La Católica	Bolívar				SOS-AP	Atendido
VIPP 4 Alameda - Sector Financiero	Luminarias cubiertas	Motolinía	5 de mayo	Madero				SOS-AP	Atendido



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO

Atención VIPPSC

Del 23 de febrero al 08 de marzo

Incidencias Atendidas



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 7 Vizcaínas - Corredor Cultural Regina	Falla en el alumbrado público	Regina	5 de febrero	20 de noviembre				SOS-AP	Atendido



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



Atención VIPPSC

Del 23 de febrero al 08 de marzo

Incidencias pendientes



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 8 San Pablo	Loseta levantada	San Pablo	Roldán				ACH	Pendiente
VIPP 8 San Pablo	Banqueta dañada	San Pablo	Las Cruces	Correo Mayor	frente al No. 10		ACH	Pendiente



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD
CENTRO HISTÓRICO

Atención VIPPSC

Del 23 de febrero al 08 de marzo

Incidencias pendientes



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 8 San Pablo	Banqueta dañada, levantada por raíz de árbol	San Pablo	Las Cruces	Jesús María			ACH	Pendiente
VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Falla en el alumbrado público	República de Perú	Allende	República de Chile			Al. Cuauhtémoc	Pendiente




Atención VIPPSC

Del 23 de febrero al 08 de marzo

Incidencias pendientes



VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 7 Vizcaínas - Corredor Cultural Regina	Tapa levantada de registro	Mesones	Pino Suárez	20 de noviembre			CFE	Pendiente
VIPP 3 Santo Domingo	Tapa de bóveda en mal estado	República de Honduras	República de Chile		Esquina		CFE	Pendiente



Atención VIPPSC

Del 23 de febrero al 08 de marzo

Incidencias pendientes



VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falta tapa de registro	3er Callejón de Manzanares	Santo Tomás	República de Uruguay			SACMEX	Pendiente
VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falta tapa de rejilla	Emiliano Zapata	Santísima	Jesús María			SACMEX	Pendiente



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




Atención VIPPSC

Del 23 de febrero al 08 de marzo

Incidencias pendientes



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 1 Santa María la Redonda	Tapa de registro en mal estado	Av. Hidalgo	Valerio Trujano	Paseo de la Reforma	Frente al SAT		SOS-DGOIV	Pendiente
VIPP 1 Santa María la Redonda	Caja de válvulas en mal estado	Av. Hidalgo	2 de abril	Valerio Trujano			SOS-DGOIV	Pendiente
VIPP 1 Santa María la Redonda	Falla en el alumbrado público	2do. Callejón de San Juan de Dios	Santa Veracruz	Pensador Mexicano			SOS-DGOIV	Pendiente



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



Atención VIPPSC

Del 23 de febrero al 08 de marzo

Incidencias pendientes



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 7 Vizcaínas - Corredor Cultural Regina	Falla en luminaria de alumbrado público	San Jerónimo	Isabel La Católica	Bolívar			SOS-AP	Pendiente
VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Reparación de banqueta en mal estado por excavaciones	Emiliano Zapata	San Marcos	Circunvalación			TELMEX	Pendiente



BARRIO ADENTRO

Matriz de seguimiento



Se han atendido 30 incidencias de un total de 84; lo que representa un avance del 36%

Dependencia	Estatus			Total
	Atendido	Proceso	Pendiente	
Autoridad del Centro Histórico	18		15	33
Alcaldía Cuauhtémoc	7		1	8
CFE	4		12	16
C5	1			1
SACMEX			5	5
SOS-DGOIV			20	20
TELMEX			1	1
Total general	30		54	84



BARRIO ADENTRO

Estado de luminarias



Tramos sin luz

1	Tramo 1: Rep. de Brasil entre Tacuba y Rep. de Cuba
2	Tramo 2: Rep. de Perú entre Allende y Rep. de Chile
3	Tramo 3: Rep. de Chile entre Rep. de Perú y Rep. de Honduras
4	Tramo 4: Comonfort entre Rep. de Honduras y Rep. de Paraguaya
5	Tramo 5: Rep. de Ecuador entre San Camilito y Allende
6	Tramo 6: Rep. de Brasil y Palma Norte
7	Tramo 7: Moctezuma entre Eje Central y Reforma
8	Tramo 8: Riva Placio entre Magnolia y Obraje (Obras)
9	Tramo 9: Zarco entre San Fernando y Av. Hidalgo
10	Tramo 10: Degollado entre Zarco y Eje Guerrero

Luminarias sin luz

1	Esquina de Rep. de Chile y Comonfort
2	Plaza Sta. Catarina
3	Esquina Rep. de Paraguay y Rep. de Argentina
4	Órgano y Eje Central Lázaro Cárdenas
5	Pedro Moreno y Reforma
6	Esquina de Lerdo y Reforma
7	San Fernando entre Héroes y Av. Hidalgo
8	Soto entre Mosqueta y Degollado

Semáforo sin funcionar

1	Rep. de Brasil Esquina Rep. de Honduras
---	---



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




BARRIO ADENTRO

Incidencias atendidas

Del 23 al 08 de marzo



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CLAVE	FECHA DE REPORTE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	DESPUÉS	ESTATUS
TBA-042	8/12/2020	Centro I	Reparación de banqueta con loseta tipo recinto en Belisario Domínguez entre Palma e Isabel la Católica	ACH			Atendido
TBA-045	8/12/2020	Centro I	Reparación de arroyo vehicular estampado en Belisario Domínguez entre Bolívar e Isabel la Católica	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido
TBA-046	8/12/2020	Centro I	Reparación de rejilla tipo Irving en Belisario Domínguez entre Bolívar e Isabel la Católica	ACH			Atendido
TBA-057	8/12/2020	Centro I	Reparación de banqueta en Juan Álvarez entre Allende y Callejón de la Vaquita	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	FECHA DE REPORTE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-002	30/11/2020	SMR-Guerrero	Reposición de tapas de dren pluvial en las calles de Riva Palacio y Violeta	SOS-DGOIV		Pendiente
TBA-003	30/11/2020	SMR-Guerrero	Reposición de tapas de registro en mal estado en la calle de Santa Veracruz	CFE		Pendiente
TBA-006	30/11/2020	SMR-Guerrero	Atención de reposición de concreto en rampa de acceso en Santa Veracruz casi esq. 2 de abril	ACH		Pendiente
TBA-008	30/11/2020	SMR-Guerrero	Colocación de bancas en el Jardín del Obispo	SOS-DGOIV		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	FECHA DE REPORTE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-010	10/12/2020	SMR-Guerrero	Reparación de banquetta estampada en Degollado entre Reforma y Luis Ogazón	ACH		Pendiente
TBA-011	10/12/2020	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Degollado entre Reforma y Luis Ogazón	ACH		Pendiente
TBA-012	10/12/2020	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Magnolia entre Lerdo y Soto	CFE		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	FECHA DE REPORTE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-013	10/12/2020	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Magnolia entre Lerdo y Soto	CFE		Pendiente
TBA-014	10/12/2020	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Magnolia entre Lerdo y Soto	CFE		Pendiente
TBA-015	10/12/2020	SMR-Guerrero	Registro de tocón en Magnolia entre Lerdo y Soto	ACH		Pendiente
TBA-016	10/12/2020	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Degollado entre Galeana y Camelia	ACH		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	FECHA DE REPORTE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-017	10/12/2020	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Degollado entre Galeana y Camelia	CFE		Pendiente
TBA-018	10/12/2020	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Degollado entre Galeana y Camelia	ACH		Pendiente
TBA-019	10/12/2020	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Degollado entre Galeana y Camelia	ACH		Pendiente
TBA-020	10/12/2020	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Magnolia entre Soto y Zarco	ACH		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	FECHA DE REPORTE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-021	10/12/2020	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Galeana entre Soto y Zarco	SOS-DGOIV		Pendiente
TBA-022	10/12/2020	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Moctezuma entre Zarco y Soto	SOS-DGOIV		Pendiente
TBA-023	10/12/2020	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Moctezuma entre Zarco y Soto	SOS-DGOIV		Pendiente
TBA-024	10/12/2020	SMR-Guerrero	Renivelación de caja de válvulas en Moreno entre Soto y Zarco	SACMEX		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	FECHA DE REPORTE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-025	10/12/2020	SMR-Guerrero	Renivelación de asfalto en Moreno entre Soto y Zarco	SOS-DGOIV		Pendiente
TBA-026	10/12/2020	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Lerdo entre Mosqueta y Moctezuma	SOS-DGOIV		Pendiente
TBA-027	10/12/2020	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Lerdo entre Reforma y Moctezuma	SOS-DGOIV		Pendiente
TBA-028	10/12/2020	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Moctezuma entre Soto y Lerdo	ACH		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	FECHA DE REPORTE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-029	10/12/2020	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Moctezuma entre Lerdo y Galeana	SOS-DGOIV		Pendiente
TBA-030	10/12/2020	SMR-Guerrero	Bacheo en arroyo vehicular en Violeta entre Soto y Zarco	SOS-DGOIV		Pendiente
TBA-031	10/12/2020	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Violeta entre Soto y Zarco	ACH		Pendiente
TBA-032	10/12/2020	SMR-Guerrero	Bache en arroyo vehicular en Violeta entre Soto y Zarco	SOS-DGOIV		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	FECHA DE REPORTE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-033	10/12/2020	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta y registro en Violeta entre Soto y Zarco	ACH		Pendiente
TBA-034	10/12/2020	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Calle Soto entre Reforma y Mina	ACH		Pendiente
TBA-035	10/12/2020	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Zarco entre Eje 1 Norte y Degollado	CFE		Pendiente
TBA-036	10/12/2020	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Zarco entre Moctezuma y Eje 1 Guerrero	CFE		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	FECHA DE REPORTE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-037	10/12/2020	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Zarco entre Moctezuma y Eje 1 Guerrero	ACH		Pendiente
TBA-038	10/12/2020	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Zarco entre Moreno y Magnolia	ACH		Pendiente
TBA-039	10/12/2020	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Zarco entre Moreno y Magnolia	CFE		Pendiente
TBA-041	8/12/2020	Centro I	Renivelación de tapa de registro en Belisario Domínguez entre Brasil y Palma	CFE		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	FECHA DE REPORTE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-043	8/12/2020	Centro I	Reparación de arroyo vehicular estampado en Belisario Domínguez entre Palma e Isabel la Católica	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-044	8/12/2020	Centro I	Renivelación de registro en Belisario Domínguez entre Palma e Isabel la Católica	CFE		Pendiente
TBA-047	8/12/2020	Centro I	Reparación de arroyo vehicular estampado en Belisario Domínguez entre Bolívar y el Callejón del 57	CFE		Pendiente
TBA-049	8/12/2020	Centro I	Renivelación de caja de válvulas en República de Honduras entre Allende y República de Chile	SACMEX		Pendiente
TBA-052	8/12/2020	Centro I	Reparación de bache en arroyo vehicular con asfalto en República de Honduras entre Brasil y Argentina	SOS-DGOIV		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	FECHA DE REPORTE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-063	8/12/2020	Centro I	Bacheo en arroyo vehicular en República de Ecuador y Argentina	SOS-DGOIV		Pendiente
TBA-064	8/12/2020	Centro I	Reparación de banqueta en República de Ecuador entre Callejón de Ecuador y Brasil	SOS-DGOIV		Pendiente
TBA-068	8/12/2020	Centro I	Bacheo en arroyo vehicular en República de Ecuador entre Palma Norte y Comonfort	SOS-DGOIV		Pendiente
TBA-069	8/12/2020	Centro I	Bacheo en arroyo vehicular en República de Ecuador entre Comonfort y Allende	SOS-DGOIV		Pendiente
TBA-072	8/12/2020	Centro I	Renivelación de caja de válvulas en República de Ecuador entre Allende y San Camilito	SACMEX		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	FECHA DE REPORTE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-073	8/12/2020	Centro I	Reparación de tapa de registro en República de Ecuador entre San Camilito y Eje Central	CFE		Pendiente
TBA-074	8/12/2020	Centro I	Reparación de arroyo vehicular con asfalto en calle Órgano esquina Eje Central	SOS-DGOIV		Pendiente
TBA-075	8/12/2020	Centro I	Reparación de banquetas en calle Libertad entre Eje Central y Allende	SOS-DGOIV		Pendiente
TBA-076	8/12/2020	Centro I	Reparación de arroyo vehicular con asfalto en calle Libertad entre Eje Central y Allende	SOS-DGOIV		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	FECHA DE REPORTE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-077	8/12/2020	Centro I	Reparación de tapa de coladera en calle Libertad entre Eje Central y Allende	SACMEX		Pendiente
TBA-078	8/12/2020	Centro I	Reparación de banqueteta en calle Libertad entre Eje Central y Allende	SOS-DGOIV		Pendiente
TBA-079	8/12/2020	Centro I	Renivelación de tapa de registro en calle Libertad esquina Allende	Telmex		Pendiente
TBA-080	8/12/2020	Centro I	Renivelación de caja de válvulas en calle Libertad esquina Comonfort	SACMEX		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	FECHA DE REPORTE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-082	8/12/2020	Centro I	Reparación de banquetas en calle Libertad entre Palma Norte y Peralvillo	ACH		Pendiente



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y PATRIMONIO
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Corte de Transmisión



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y PATRIMONIO
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

***Se reanuda transmisión
en vivo***

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”
