



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

I SESIÓN - Enero

10 de enero de 2023



Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales



Reportes Institucionales



Autoridad del Centro Histórico

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

| Estrategia | Indicador | Reporte al 6 de enero de 2023 | U. Medida | Periodicidad | Próximo reporte |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Atención de incidencias | 01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH | 62 | cantidad | quincenal | 20 de enero de 2023 |
| Justicia Cívica | 02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de justicia cívica | 1 | cantidad | | |
| Eliminación de grafiti | 03) Eliminación de grafiti en CH | 0 | metros cuadrados | | |
| Riego de áreas verdes | 04) Riego áreas verdes - ACH | 3 | jornadas | | |

Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

Belisario
 Domínguez
 República de
 Argentina
 Plaza de la
 Conchita
 Plaza del
 Empedradillo
 16 de
 Septiembre

Los trabajos realizados consistieron en **Retiro de 2 bases sin uso** en Belisario Domínguez entre República de Venezuela y El Carmen, **reposición de 1 tapa de registro** en República de Argentina entre República de Venezuela y República de Colombia, **reposición de 1 tapa de registro** en Plaza de la Conchita, **colocación de 5 piezas de dren** en Plaza del Empedradillo, **reparación de 1 tapa de registro, repellido de 12 m² de muro, demolición, compactación y colado de 9 m² de piso de concreto** en República de Argentina No. 91, **colocación de 30 ml. de cinta tipo cebra** en 16 de Septiembre casi esquina Palma, **reposición de 1 tapa de registro** en República de Argentina esquina República de Venezuela,



Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura



Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes



Se realizó riego de jardineras de Av. Bucareli , en calle Turín, jardineras de Regina y jardineras de Eje 1 Norte casi esquina con Paseo de la Reforma, 2 de enero de 2023.



Se realizó riego de jardineras de Galeana entre Violeta y Pedro Moreno y se realizó el lavado del toldo del Grand Soport de Secretaría de Cultura ubicado en el Zócalo, 4 de enero de 2023.



Se realizó riego de jardineras de Jardín Allende y Jardín del Obispo. 6 de enero de 2023


Autoridad del Centro Histórico | Atención con infractores de Justicia Cívica



Se realizó jornada de trabajo comunitario con 8 infractores a la Ley de Cultura Cívica, se realizó riego de jardineras de Jardín Allende, y se colocaron rejillas pluviales, 95 en Violeta entre Paseo de la Reforma y Eje Central, 95 piezas, Galeana entre Violeta y Pedro Moreno, 55 piezas, 3 de enero de 2023



Alcaldía Cuauhtémoc





Al. Cuauhtémoc | Indicadores

| Estrategia | Indicador | Reporte al 6 de enero de 2023 | U. Medida | Periodicidad | Próximo reporte |
|--------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Drenaje | Reparación de fuga de agua | 1 | fuga | quincenal | 20 de enero de 2023 |
| | Desazolve de tubería | 12 | metros lineales | | |
| | Cambio de brocal | 2 | piezas | | |
| | Desazolve de atarjea | 250 | metros lineales | | |
| Parques y Jardines | Riego | 4,700 | metros cuadrados | | |
| | Poda de pasto | 5,200 | metros cuadrados | | |
| | Cultivo | 1,391 | metros cuadrados | | |
| | Poda de seto | 1,928 | metros lineales | | |

Al. Cuauhtémoc | Indicadores

| Estrategia | Indicador | Reporte al 6 de enero de 2023 | U. Medida | Periodicidad | Próximo reporte |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|---------------------|
| Limpieza y recolección | Barrido diario | 283 | Kilómetros | quincenal | 20 de enero de 2023 |
| | Recolección orgánica domiciliaria | 991.53 | Toneladas | | |
| | Recolección inorgánica domiciliaria | 1,814.51 | Toneladas | | |
| | Recolección en tiraderos clandestinos | 882.96 | Toneladas | | |
| Alumbrado | Luminarias | 3 | piezas | | |
| | Cambio de lámparas | 1 | piezas | | |
| | Reconexión de circuitos | 2 | piezas | | |
| Arbolado urbano | Derribo de árbol | 2 | piezas | | |

Al. Cuauhtémoc | Anexos

| N° | UBICACIÓN | ACTIVIDAD REALIZADA | CANTIDAD | U.M. | FECHA DE REALIZACIÓN |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-------|----------------------|
| 1 | 1ER CALLEJÓN DE NEZAHUALCOYOTL ESQ. AV. NEZAHUALCOYOTL | SE CAMBIÓ BROCAL COMPLETO A POZO DE VISITA | 1.00 | PIEZA | 29/12/2022 |
| 2 | FRAY SERVANDO ESQUINA SAN MIGUEL | SE CAMBIÓ BROCAL COMPLETO A POZO DE VISITA | 1.00 | PIEZA | 30/12/2022 |
| 3 | ARANDA No. 71 ENTRE ARCOS DE BELÉN Y DELICIAS | DESAZOLVE DE ATARJEA | 250.00 | ML | 03/01/2023 |
| 4 | ARANDA No. 71 ENTRE ARCOS DE BELÉN Y DELICIAS | ALBAÑAL PLUVIAL | 12.00 | ML | 03/01/2023 |
| 5 | PEÑA Y PEÑA No. 10 CASI ESQUINA EL CARMEN | DESAZOLVE DE TUBERÍA | 1.00 | FUGA | 29/12/2022 |

Al. Cuauhtémoc | Gráficas




Barrido en Garibaldi



Reparación de luminaria en calle Chimalpopoca



Derribo de árbol en calle Juan Álvarez

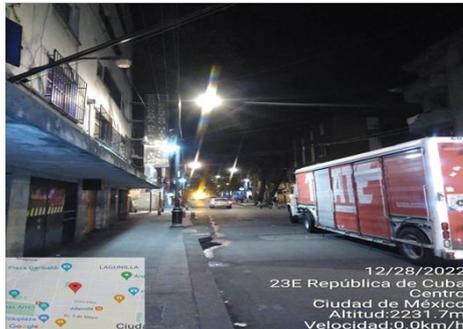

Reparación de luminarias en calle de República de Cuba




Barrido en calle República de Honduras



Derribo de árbol en calle Mixcalco



Sistema de Aguas de la Ciudad de México Operación área de Drenaje.





AVANCE DE TRABAJO

| | ANTERIOR | AVANCE | ACUMULADO |
|------------------|----------|--------|-----------|
| ATARJEA (METROS) | 15,650 | 400 | 16,050 |
| POZOS DE VISITA | 302 | 9 | 311 |
| REJILLAS DE PISO | 305 | 6 | 311 |
| COLADERA PLUVIAL | 387 | 8 | 395 |
| ALBAÑAL (METROS) | 957 | 32 | 989 |

REPORTE FOTOGRÁFICO



AV. JUÁREZ
(ENTRE EJE HUMBOLDT Y BALDERAS)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 120 ML DE ATARJEA, 3 PV, 4 CP, 4 RP, 16 ML DE ALBAÑAL.

REPORTE FOTOGRAFICO



JOSÉ MARÍA IZAZAGA
(ENTRE PINO SUÁREZ Y SAN MIGUEL)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 280ML DE ATARJEA, 6 PV, 4 CP, 2 RP, 16 ML DE ALBAÑAL.



Sistema de Aguas de la Ciudad de México Sectorización Alcaldía Cuauhtémoc .

SACMEX | Indicadores

SECTOR 5-C



1. Visita al sitio con personal de vialidad de la Secretaría de Gobierno, para el inicio de los trabajos.

SACMEX |



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECTOR 9-A



1. Líneas de CFE existentes, fuera de servicio



2. Líneas de agua potable con registros de 1881 retiradas.



3. Continuidad en los trabajos de excavación por medios manuales.



4. Acercamiento con la Dirección General de Servicios Urbanos, de la Alcaldía Cuauhtémoc, para identificación de cableado existente, no reconocido por CFE, ni por compañías de comunicación.



SACMEX |



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




SACMEX

SECTOR 9-B



1. Ubicación de la obra civil para la telemetría definida.
2. Conciliación y programación de los trabajos con INAH.

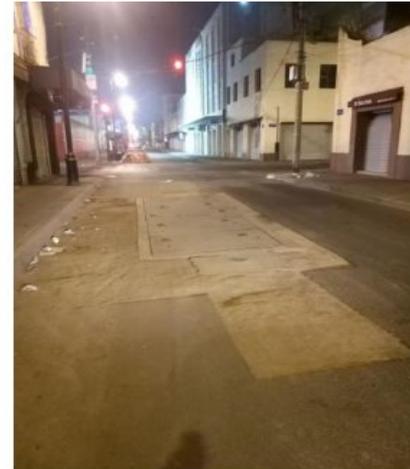

SACMEX |



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECTOR 9-C



1. Área utilizada actualmente.



2. Ya se cuenta con el trazo físico en sitio para la ampliación del tapial y del área a utilizar para la construcción de la caja de válvulas.

SACMEX |



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX



1. Se continuó con los trabajos de excavación a cielo abierto y ya han sido retiradas las canalizaciones de CFE que se encontraban fuera de servicio.



2. Se continúan trabajos de excavación por medios manuales para llegar al desplante del inicio de construcción de la caja de válvulas.

SECTOR 9-D



3. Área de trabajo en condiciones actuales.



SACMEX |



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX





AVANCE POR SECTOR

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Sector 5-C --- 00.00 % --- | Dr. Mora y Av. Hidalgo |
| 2. Sector 9-A --- 65.00 % --- | Isabel la Católica y 5 de Mayo |
| 3. Sector 9-B --- 80.00 % --- | Mixcalco y Manuel Doblado |
| 4. Sector 9-C --- 15.00 % --- | Moneda y Correo Mayor |
| 5. Sector 9-D --- 70.00 % --- | Isabel la Católica y 5 de Mayo |



Avance Sectorización - Centro Histórico

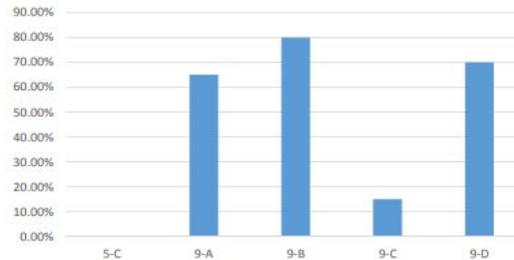




Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Alumbrado Público



SOS-DGSUS-AP | Indicadores

| Estrategia | Indicador | Reporte anterior al 6/01 | U. Medida | Periodicidad | Próximo reporte |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Alumbrado público | 01) Luminarias reparadas en PA del CH | 416 | cantidad | quincenal | 24 de enero |

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 30 DE DICIEMBRE

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA | MOTIVO |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| 5 de Mayo | Isabel la Católica y Palma | CENTRO | 1 | Cambio de balastro y lámpara | Luminaria apagada |
| | 5 de Febrero y Palma Norte | CENTRO | 1 | Cambio de balastro y lámpara | Luminaria apagada |
| | Bolívar y Gante | CENTRO | 2 | Cambio de balastos y lámparas | Luminarias apagadas |
| 20 de Noviembre | Fray Servando y Nezahualcóyotl | CENTRO | 1 | Cambio de balastro y lámpara | Luminaria apagada |
| Bolívar | República de El Salvador y Mesones | CENTRO | 2 | Instalación de luminaria vial y luminaria peatonal | Falta de luminarias |
| Callejón del 57 | República de Cuba y Donceles | CENTRO | 3 | Cambio de balastos y lámparas | Luminarias apagadas |
| Callejón Mixcalco | Miguel Alemán Valdés y Lecumberri | CENTRO | 1 | Cambio de balastro y lámpara | Luminaria apagada |
| Comonfort | Esquina República de Paraguay | CENTRO | 2 | Cambio de fotocelda | Luminarias encendidas de día |
| | | SUBTOTAL | 13 | | |

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 30 DE DICIEMBRE

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA | MOTIVO |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Correo Mayor | República de Guatemala y La Academia | CENTRO | 1 | Cambio de balastro y lámpara | Luminaria apagada |
| Donceles | República de Chile y República de Brasil | CENTRO | 2 | Cambio de balastro y lámpara | Luminaria apagada |
| | Eje Central y Callejón Héroes del 57 | CENTRO | 20 | Cableado y reconexión de líneas | Circuito apagado |
| Emiliano Zapata | Jesús María y La Santísima | CENTRO | 1 | Cambio de lámpara | Luminaria apagada |
| Francisco I. Madero | Bolívar y Palma | CENTRO | 28 | Reconexión de líneas | Circuito apagado |
| Gante | Francisco I. Madero y Venustiano Carranza | CENTRO | 2 | Cambio de balastos, lámparas y socket | Luminarias apagadas |
| Ignacio Allende | Belisario Domínguez y República de Cuba 5 de Mayo y Tacuba | CENTRO | 10 | Restablecimiento de interruptor termomagnético | Circuito apagado |
| Isabel la Católica | | CENTRO | 11 | Instalación de luminaria y restablecimiento de interruptor termomagnético | Circuito apagado y falta de luminaria |
| | | SUBTOTAL | 75 | | |

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 30 DE DICIEMBRE

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA | MOTIVO |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------|
| José María Pino Suárez | Venustiano Carranza y Corregidora | CENTRO | 1 | Cambio de balastro y lámpara | Luminaria apagada |
| La Santísima | República de Guatemala y Emiliano Zapata | CENTRO | 1 | Cambio de lámpara | Luminaria apagada |
| Leona Vicario | Miguel Alemán Valdés y San Antonio Tomatlán Jesús María y Roldán | CENTRO | 1 | Reconexión de líneas | Luminaria apagada |
| Manzanares | 5 de Mayo y Francisco I. Madero | CENTRO | 17 | Reconexión de líneas y cambio de lámpara | Circuito apagado |
| Palma | República de Colombia y República de Venezuela | CENTRO | 1 | Cambio de lámpara y socket | Luminaria apagada |
| República de Argentina | República de Colombia y República de Paraguay | CENTRO | 1 | Cambio de balastro | Luminaria apagada |
| República de Brasil | República de Argentina y Del Carmen | CENTRO | 42 | Cambio de fotoceldas y reconexión de líneas | Circuito apagado |
| República de Colombia | | CENTRO | 1 | Cambio de lámpara | Luminaria apagada |
| | | SUBTOTAL | 65 | | |

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 30 DE DICIEMBRE

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA | MOTIVO |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------|--------------------|
| República de Cuba | Ignacio Allende y Eje Central | CENTRO | 32 | Cableado y reconexión de líneas | Circuito apagado |
| República de Ecuador | Esquina con República de Brasil | CENTRO | 1 | Instalación de luminaria | Falta de luminaria |
| República de El Salvador | José María Pino Suárez y Correo Mayor | CENTRO | 1 | Cambio de balastro | Luminaria apagada |
| | 20 de Noviembre y 5 de Febrero | CENTRO | 1 | Cambio de balastro y lámpara | Luminaria apagada |
| República de Guatemala | Jesús María y Margil | CENTRO | 25 | Restablecimiento de interruptor termomagnético | Circuito apagado |
| República de Perú | República de Chile y Altuna | CENTRO | 1 | Cambio de balastro | Luminaria apagada |
| República de Uruguay | 5 de Febrero e Isabel la Católica | CENTRO | 1 | Cambio de lámpara | Luminaria apagada |
| República de Venezuela | Eje 1 Oriente y Callejón Mixcalco | CENTRO | 1 | Cambio de lámpara | Luminaria apagada |
| | | SUBTOTAL | 63 | | |

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 30 DE DICIEMBRE

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA | MOTIVO |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------|-------------------|
| San Jerónimo | José María Pino Suárez y Correo Mayor | CENTRO | 1 | Reconexión de líneas | Luminaria apagada |
| Venustiano Carranza | Eje Central y Gante | CENTRO | 1 | Cambio de balastro y lámpara | Luminaria apagada |
| Vizcaínas | Aldaco y Eje Central | CENTRO | 1 | Cambio de balastro y lámpara | Luminaria apagada |
| | | SUBTOTAL | 3 | | |
| | | TOTAL | 219 | | |

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 6 DE ENERO

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA | MOTIVO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|
| 1er Callejón de Corregidora | Esquina con Corregidora | CENTRO | 1 | Cambio de socket y lámpara | Luminaria apagada |
| 2° Callejón de Manzanares | Manzanares y Corregidora | CENTRO | 1 | Cambio de balastro y lámpara | Luminaria apagada |
| 20 de Noviembre | Regina y Mesones | CENTRO | 1 | Cambio de luminaria | Luminarias dañada |
| | República de El Salvador y República de Uruguay | CENTRO | 12 | Cambio de fotocelda | Circuito encendido de día |
| Bolívar | República de El Salvador y Mesones | CENTRO | 1 | Cambio de lámpara | Luminaria apagada |
| Callejón del 57 | Donceles y República de Cuba | CENTRO | 1 | Cambio de balastro | Luminaria apagada |
| Corregidora | Cerrada Corregidora y Eje 1 Oriente | CENTRO | 2 | Reconexión de líneas | Luminarias apagadas |
| | La Academia y Alhóndiga | CENTRO | 2 | Cambio de balastos y lámparas | Luminarias apagadas |
| | | SUBTOTAL | 21 | | |

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 6 DE ENERO

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA | MOTIVO |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Corregidora | José María Pino Suárez y La Academia | CENTRO | 21 | Cambio de balastro y activación de interruptor termomagnético | Circuito apagado |
| Correo Mayor | Moneda y Soledad | CENTRO | 3 | Reconexión de líneas | Luminarias apagadas |
| Donceles | Ignacio Allende y República de Chile | CENTRO | 32 | Activación de interruptor termomagnético | Circuito apagado |
| Ignacio Allende | Belisario Domínguez y República de Cuba | CENTRO | 6 | Cableado y reconexión de líneas | Circuito apagado |
| La Academia | Soledad y Corregidora | CENTRO | 1 | Cambio de balastro | Luminaria apagada |
| Las Cruces | Mesones y Regina | CENTRO | 1 | Cambio de balastro y lámpara | Luminaria apagada |
| Loreto | Justo Sierra y San Ildefonso | CENTRO | 38 | Activación de interruptor termomagnético | Circuito apagado |
| Manuel de la Peña y Peña | Del Carmen y Callejón Girón | CENTRO | 1 | Cambio de balastro | Luminaria apagada |
| SUBTOTAL | | | 103 | | |

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 6 DE ENERO

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA | MOTIVO |
|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|
| Monte de Piedad | 5 de Mayo y Francisco I. Madero | CENTRO | 2 | Reconexión de líneas | Luminarias apagadas |
| Plaza de la Constitución | José María Pino Suárez y 5 de Febrero | CENTRO | 14 | Cambio de contactor y fotocelda | Circuito apagado |
| Plaza de las Vizcaínas | Callejón San Ignacio y Aldaco | CENTRO | 2 | Cambio de balastos y lámparas | Luminarias apagadas |
| República de Argentina | República de Ecuador y República de Haití | CENTRO | 1 | Cambio de balastro | Luminaria apagada |
| República de Chile | Belisario Domínguez y República de Perú | CENTRO | 4 | Reconexión de líneas | Circuito con luz intermitente |
| República de El Salvador | José María Pino Suárez y Roldán | CENTRO | 1 | Cambio de balastro y lámpara | Luminaria apagada |
| Rodríguez Puebla | Esquina San Antonio Tomatlán | CENTRO | 1 | Cambio de lámpara | Luminaria apagada |
| | Lecumberri y República de Venezuela | CENTRO | 12 | Reconexión de líneas | Circuito apagado |
| | | SUBTOTAL | 37 | | |

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 6 DE ENERO

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA | MOTIVO |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------|-------------------|
| Roldán | República de El Salvador y San Pablo | CENTRO | 14 | Reconexión de líneas | Circuito apagado |
| Tacuba | Motolinía e Ignacio Allende | CENTRO | 20 | Activación de interruptor termomagnético | Circuito apagado |
| Venustiano Carranza | José María Pino Suárez y Tabaqueros | CENTRO | 1 | Cambio de balastro | Luminaria apagada |
| Vizcaínas | Aldaco y Eje Central | CENTRO | 1 | Cambio de balastro, lámpara y socket | Luminaria apagada |
| | | SUBTOTAL | 36 | | |
| | | TOTAL | 197 | | |

SOS-DGSUS-AP | Anexos

MANZANARES



**RECONEXIÓN DE LÍNEAS Y CAMBIO
DE LÁMPARA**

FRANCISCO I. MADERO



RECONEXIÓN DE LÍNEAS

SOS-DGSUS-AP | Anexos

LEONA VICARIO



RECONEXIÓN DE LÍNEAS

GANTE



CAMBIO DE BALASTROS, LÁMPARAS Y SOCKET

CORREO MAYOR



CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPÚBLICA DE BRASIL



CAMBIO DE FOTOCELDAS Y
RECONEXIÓN DE LÍNEAS

CALLEJÓN DEL 57



CAMBIO DE BALASTROS Y
LÁMPARAS

SOS-DGSUS-AP | Anexos

VIZCAINAS



**CAMBIO DE BALASTRO,
LÁMPARA Y SOCKET**

ROLDÁN



RECONEXIÓN DE LÍNEAS

SOS-DGSUS-AP | Anexos

RODRÍGUEZ PUEBLA



CAMBIO DE LÁMPARA

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



CAMBIO DE CONTACTOR Y FOTOCELDA

SOS-DGSUS-AP | Anexos

MONTE DE PIEDAD



RECONEXIÓN DE LÍNEAS

MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA



CAMBIO DE BALASTRO

SOS-DGSUS-AP | Anexos

LA ACADEMIA



CAMBIO DE BALASTRO

DONCELES



ACTIVACIÓN DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO

SOS-DGSUS-AP | Anexos

CORREGIDORA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS

REPÚBLICA DE BOLIVIA



CAMBIO DE LÁMPARA



Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad



SOS-DGSUS | Indicadores



| Estrategia | Indicador | Reporte al 08/01 | U. Medida | Periodicidad | Próximo reporte |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| Limpieza | 01) Barrido de guarnición en PA del CH | 12312.16 | kilómetros | quincenal | 24 de enero |
| | 02) Barrido mecánico en PA del CH | 1279.04 | kilómetros | | |
| Recolección | 03) Residuos sólidos y recolección producto de barrido | 10539 | metros cúbicos | | |
| | 04) Tierra recolectada en PA del CH | 131.50 | metros cúbicos | | |
| Lavado | 05) Lavado de papeleras | 1120 | cantidad | | |
| | 06) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH | 649,701 | metros cuadrados | | |

SOS-DGSUS | Indicadores

| Estrategia | Indicador | Reporte al 08/01 | U. Medida | Periodicidad | Próximo reporte |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| Lavado | 07) Sitio críticos lavados en PA de CH | 254 | cantidad | quincenal | 24 de enero |
| Recolección | 08) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos) | 350 | metros cúbicos | | |
| Limpieza | 09) Limpieza de chicles en corredor Madero, Plaza la Constitución y Motolinía | 4719 | cantidad | | |
| Eliminación de grafiti | 10) Eliminación de grafiti en PA de CH | 227.50 | metros cuadrados | | |
| Limpieza | 11) Retiro de propaganda en PA de CH | 2808 | cantidad | | |
| Eliminación de plagas | 12) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de Racumín/cereal | 1005 | cantidad | | |
| | 13) Desratización en PA y PB de CH - Fumigación | 950 | metros cuadrados | | |

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas - Acciones preventivas con el personal por COVID-19

- Toma de temperatura todos los días en los tres turnos.
- Entrega de caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.

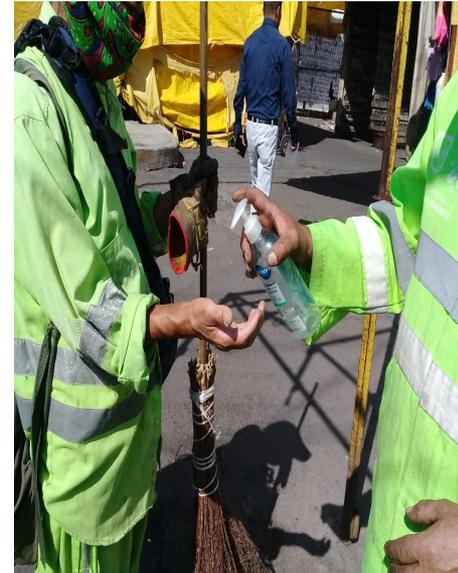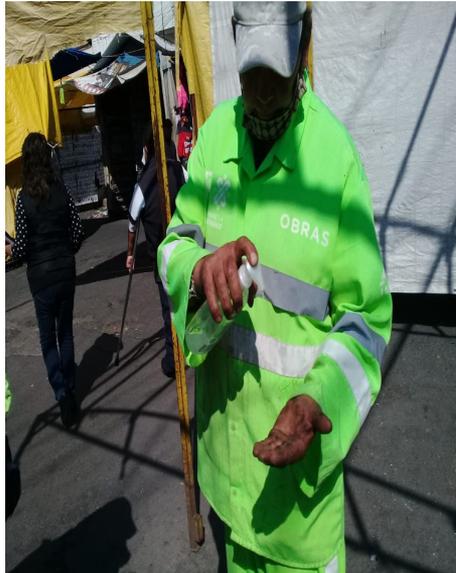



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITI

| VIALIDAD | Cantidad | U.M. |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| REPÚBLICA DE PERÚ, DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A REPÚBLICA DE BRASIL | 221 | m2 |
| LEANDRO VALLE DE REPÚBLICA DE PERÚ A PLAZA 23 DE MAYO | 6.50 | m2 |
| T O T A L: | 227.50 | m2 |

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI VANDÁLICO 227.50 M2



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLANTÓN DE INTEGRANTES DE LA RESISTENCIA CIVIL PACÍFICA FRENTE A PALACIO NACIONAL



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLANTÓN DE INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA CÍVICA NACIONAL, FRENTE A PALACIO NACIONAL




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

RETIRO DEL PLANTÓN DE INTEGRANTES DE LA RESISTENCIA CIVIL PACÍFICA



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

RETIRO DEL PLANTÓN DE INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA CÍVICA NACIONAL

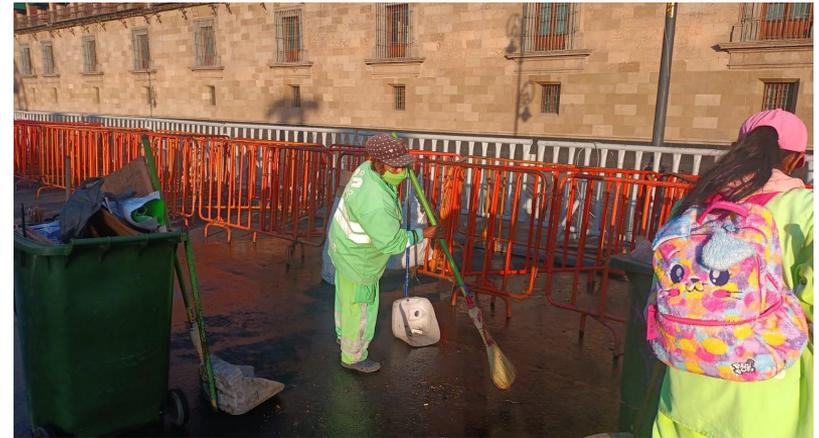

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

LAVADO EN PLAZA SANTA CATARINA, CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, CON MOTIVO DE LA “VERBENA NAVIDEÑA”



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

OPERATIVO DE LIMPIEZA CON MOTIVO DEL “DÍA DE REYES”




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores





SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

BARRIDO MANUAL

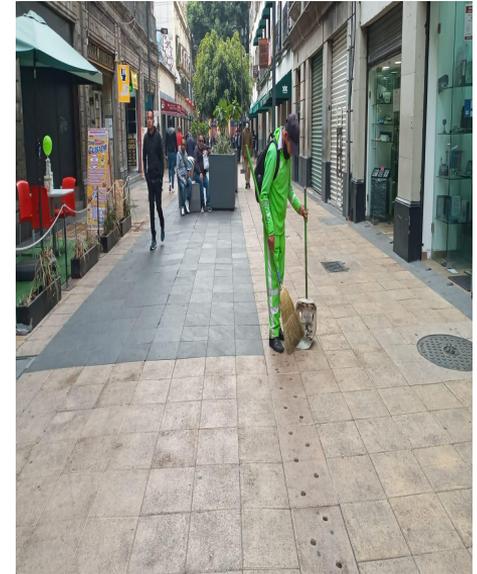


SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

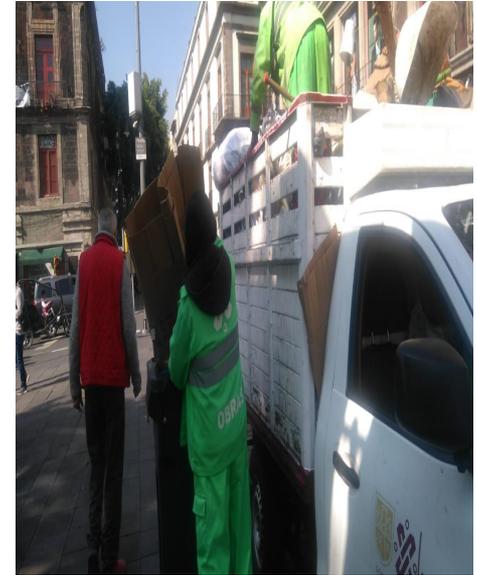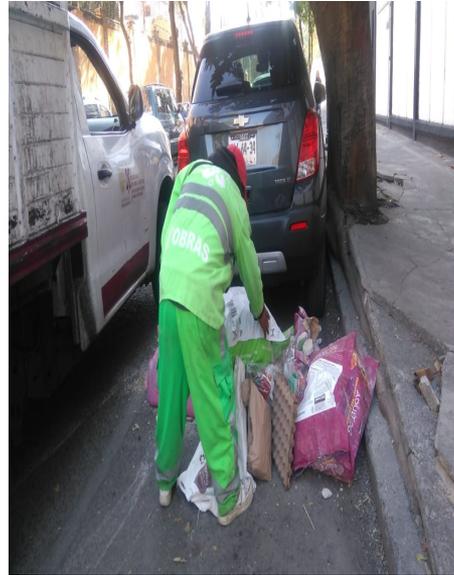


SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS

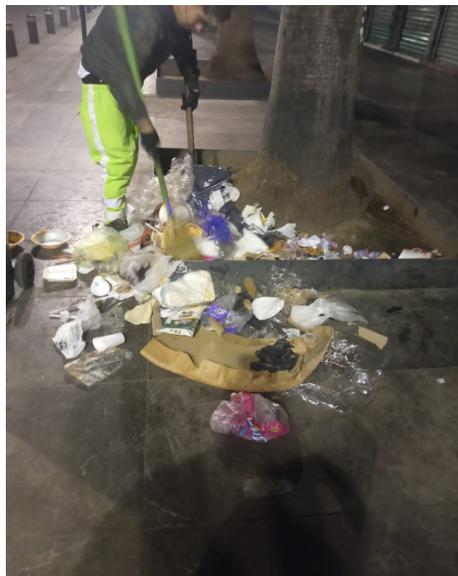

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

LAVADO

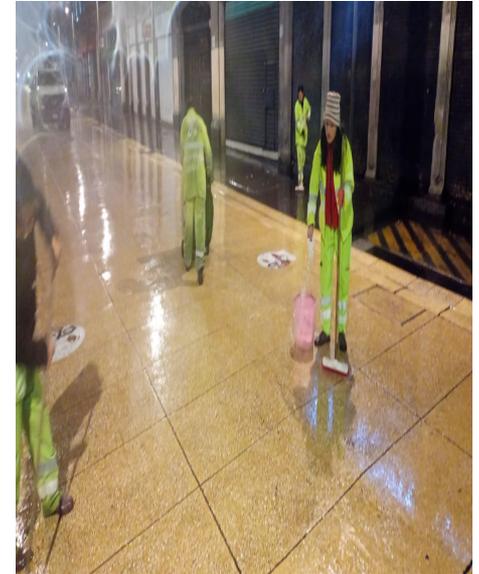

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores



LAVADO DE PAPELERAS



RETIRO DE PROPAGANDA



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

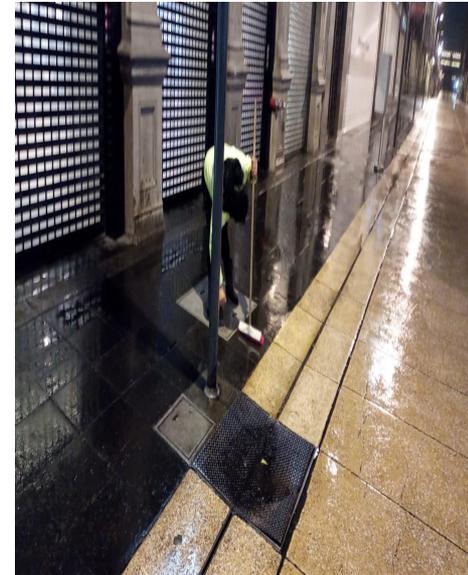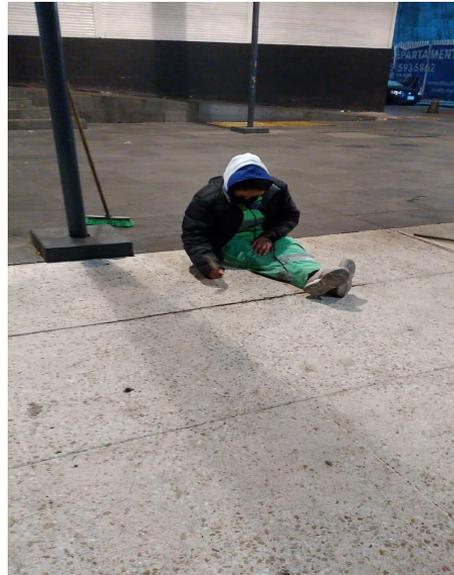



Sistema de Transporte Colectivo - Metro



STC-Metro | Indicadores

| Estrategia | Indicador | Reporte al 03/01 | U. Medida | Periodicidad | Próximo reporte |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Atención de incidencias | 01) Atención a escaleras eléctricas en estaciones del CH | 9 | cantidad | quincenal | 24 de enero |
| Atención de incidencias | 02) Atención a elevadores en estaciones del CH | 0 | cantidad | | |

| ESCALERAS | | | |
|--------------|---------|---------------|---------|
| Perímetro A | | Perímetro B | |
| Allende | Línea 2 | Balderas | Línea 1 |
| Hidalgo | Línea 3 | Morelos | Línea 4 |
| Bellas Artes | Línea 8 | Fray Servando | Línea 4 |
| Bellas Artes | Línea 8 | Guerrero | Línea B |
| | | Garibaldi | Línea 8 |



Instituto Nacional de Antropología e Historia



INAH | Indicadores

| Estrategia | Indicador | Reporte al 08/01/23 | U. Medida | Periodicidad | Próximo reporte |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Solicitud | 01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH | 16 | cantidad | quincenal | 23/01/23 |
| | 02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre | - | cantidad | | |
| Autorización | 03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH | | cantidad | | |
| | 04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre | | cantidad | | |



INAH | Anexos

Solicitudes de autorización de obra

| Fecha de Ingreso | Ubicación | No. | Alcaldía - Cuauhtémoc | Obra | Tipo |
|------------------|------------------------------|-----|-----------------------|----------------------------------------|------------|
| - | FRAY SERVANDO TERESA DE MIER | 278 | CENTRO | INSTALACIÓN DE ANUNCIO | OBRA MENOR |
| - | PALMA | 43 | CENTRO | INSTALACIÓN DE ANUNCIO | OBRA MENOR |
| - | PALMA | 43 | CENTRO | INSTALACIÓN DE ANUNCIO | OBRA MENOR |
| - | PALMA | 43 | CENTRO | INSTALACIÓN DE ANUNCIO | OBRA MENOR |
| - | PALMA | 43 | CENTRO | INSTALACIÓN DE ANUNCIO | OBRA MENOR |
| - | GENERAL PRIM | 1 | CENTRO | REMODELACIÓN | OBRA MAYOR |
| - | FRANCISCO I MADERO | 23 | CENTRO | CAMBIO DE CABINA DE ELEVADOR EXISTENTE | OBRA MENOR |
| - | VENUSTIANO CARRANZA | 89 | CENTRO | CAMBIO DE PISOS, PINTURA | OBRA MENOR |
| - | DONCELES | 66 | CENTRO | RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN | OBRA MAYOR |

INAH | Anexos

Solicitudes de autorización de obra

| Fecha de Ingreso | Ubicación | No. | Alcaldía - Cuauhtémoc | Obra | Tipo |
|------------------|--------------------------------------------------|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - | REPÚBLICA DE URUGUAY | 126 | CENTRO | CAMBIO DE PIEZA Y ARREGLO DE MARQUESINA EN FACHADA | OBRA MENOR |
| - | PASEO DE LA REFORMA | 64 | CENTRO | LOSETA, TABLAROCA Y FACHALETA RUSTICA | OBRA MENOR |
| - | EMILIANO ZAPATA "ANTIGUA ACADEMIA DE SAN CARLOS" | 37 | CENTRO | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN CANTERAS EN PATIO PRINCIPAL | OBRA MENOR |
| - | SAN ILDEFONSO | 40 | CENTRO | LIBERACIÓN PISO CERÁMICO, IMPERMEABILIZANTE, CONSOLIDACIÓN DE MUROS Y REINTEGRACIÓN DE APLANADOS | OBRA MAYOR |
| - | CALLEJÓN XICOTENCATL | 5 | CENTRO | CONSOLIDACIÓN DE MUROS Y PISOS | OBRA MAYOR |
| - | 16 DE SEPTIEMBRE | 56 | CENTRO | INSTALACIÓN DE ANUNCIO | OBRA MENOR |
| - | APARTADO | 30 | CENTRO | MODIFICACIÓN | OBRA MAYOR |



Fideicomiso del Centro Histórico



FCH | Indicadores

| Estrategia | Indicador | Reporte al | U. Medida | Periodicidad | Próximo reporte |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------|-----------------|
| Rehabilitación | 01) INAH-FCH - Templo San Juan de Dios | | porcentaje de avance | quincenal | |
| | 02) INAH-FCH - Templo Santa Catarina | | porcentaje de avance | | |
| | 03) F/54-FCH - Regina 40 "Jardín Regina" | | porcentaje de avance | | |
| | 04) F/54-FCH - Señalética CH en PB | | porcentaje de avance | | |
| Construcción | 05) ACH-FCH - Reja perimetral en Templo Mayor | | porcentaje de avance | | |
| Fachadas | 06) Arreglo Bloque A: Rep. de Brasil 29 y 46, Rep. de Paraguay 44 | | porcentaje de avance | | |



FCH | Indicadores

| Estrategia | Indicador | Reporte al | U. Medida | Periodicidad | Próximo reporte |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------|-----------------|
| Fachadas | 07) Arreglo Bloque B: Rep de Brasil 44, 43, 62, 63 y 64, Rep. de Ecuador 95 | | porcentaje de avance | quincenal | |
| Rehabilitación | 08) Cultura-FCH - Rehab. "Casa Conde de Regla" | | porcentaje de avance | | |
| Rehabilitación | 09) Cultura-FCH - Rehab. "Casa Talavera" 3ra. etapa | | porcentaje de avance | | |
| Reconstrucción | 10) Cultura-FCH - Recons. "Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística" 2da. etapa | | porcentaje de avance | | |
| Rehabilitación | 11) Cultura-FCH - Rehab. "Capilla de la Expiración" 2da. etapa | | porcentaje de avance | | |
| Rehabilitación | 12) Cultura-FCH - Rehab. Parroquia "San Pablo Apostol" (el nuevo) | | porcentaje de avance | | |



FCH | Gráficas de obras en proceso

EJERCICIO 2020 – 2021. CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM

| NO. DE CONTRATO | CONCEPTO | AVANCE FISICO ANTERIOR (%) | AVANCE FÍSICO ACTUAL (%) | TERMINACIÓN PROGRAMADA |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| --- | SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. RECURSO LOCAL. | 100 | 100 | CONCLUIDO |
| F-54/007/2021 | SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. RECURSO F/54. | 75 | 75 | 2022 |
| F-54/008/2021 | REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL 'JARDÍN REGINA' . REGINA No. 40, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. | 95 | 100 | 2022 |
| F-54/021/2021 | ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE A (BUCARELI No. 145, 152, 154,157,174, BARCELONA 4, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO) | 83 | 85 | 2022 |
| F-54/022/2021 | ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE B (BUCARELI No. 40, 53,66,69,73,118,120,123, LUCERNA 1, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO) | 91 | 93 | 2022 |
| F-54/023/2021 | REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PORTAL DE ESCRIBANOS (SANTO DOMINGO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO). | 90 | 90 | 2022 |
| F-54/025/2021 | MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO CULTURAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (PERÚ No. 88) | 74 | 74 | 2022 |
| F-54/026/2021 | ARREGLO DE FACHADAS CALLE REPUBLICA DE BRASIL. (REPUBLICA DE BRASIL No. 04, 22,42,47,54,60,61,65,67,68,92,94, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO) | 98 | 100 | 2022 |
| F-54/001/2022 | ARREGLO DE FACHADAS PUNTUALES BLOQUE C (CALLEJON DE ECUADOR No. 06, 08-12, LEONA VICARIO No. 5, 7,8,10 Y SEMINARIO No. 14. CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO) | 99 | 100 | 2022 76 |

FCH | Obras en proceso



Barcelona No. 4: Aplicación de pintura vinílica.



Bucareli No. 145: Retiro de placas de cantera en mal estado.

BUCARELI BLOQUE A.

FCH | Obras en proceso



Bucareli No. 66: Aplicación de pátina para integración de cromática de las pilastras.

BUCARELI BLOQUE B.

FCH | Gráficas de obras en proceso

EJERCICIO 2020 – 2021.

| CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH - FCHCM | AVANCE FISICO ANTERIOR (%) | AVANCE FÍSICO ACTUAL (%) | TERMINACIÓN PROGRAMADA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO SAN JUAN DE DIOS | 98 | 99 | -- |
| PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO DE SANTA CATARINA | 98 | 100 | En proceso de finiquito |



FCH | Gráficas de obras en proceso

PNR 2022. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL SC/DGSMPC/COLAB/01835/22

| NO. DE CONTRATO | CONCEPTO | AVANCE FISICO ANTERIOR (%) | AVANCE FÍSICO ACTUAL (%) | TERMINACIÓN PROGRAMADA |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| FCH/CDI/INV/003/2022 | REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS”. | 5 | 5 | Febrero 2023 |
| FCH/CDI/AD/001/2022 | REHABILITACIÓN DE LA “CAPILLA DE LA EXPIRACIÓN”, 3ª ETAPA. | 95 | 100 | Terminado |
| FCH/CDI/AD/002/2022 | RECONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE “SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA”, TERCERA ETAPA. | 60 | 65 | Diciembre 2022 |
| FCH/CDI/AD/003/2022 | REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA “PARROQUIA DE SAN PABLO APOSTOL (EL NUEVO)”, SEGUNDA ETAPA. | 1 | 10 | INICIADO |
| FCH/CDI/AD/004/2022 | REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE “CASA DEL CONDE DE REGLA”, 4ª ETAPA | 20 | 50 | Diciembre 2022 |
| FCH/CDI/AD/005/2022 | REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR” | 8 | 17 | Marzo 2023 |
| FCH/CDI/AD/006/2022 | REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD” | 1 | 18 | Marzo 2023 80 |

FCH | Obras en proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2022



Trabajos Terminados.

**REHABILITACIÓN DE LA “CAPILLA DE LA EXPIRACIÓN”,
TERCERA ETAPA.**

FCH | Obras en proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2022



Liberación de piso de duela deteriorado. Reintegración de aplanados de cal-arena.

RECONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE “SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA”, TERCERA ETAPA.


FCH | Obras en proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2022



Consolidación de muro testero y retiro de empastes de cemento en tambor de cúpula.

REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA “PARROQUIA DE SAN PABLO APOSTOL (EL NUEVO)”,
SEGUNDA ETAPA

FCH | Obras en proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2022



Consolidación de muros, consolidación de mechinales y habilitación de vigas metálicas en pasillo central.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE “CASA DEL CONDE DE REGLA”,
CUARTA ETAPA**

FCH | Obras en proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2022



Demolición de losa de sacristía, retiro de vigas metálicas de losa de sacristía, calas estratigráficas en muros de capilla, consolidación de muros de mampostería.

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL "TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR"

FCH | Obras en proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2022



Aplicación de herbicida y retiros de flora parásita, acopio de residuos y materiales deteriorados; acarreo hasta punto de acopio en obra.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL
“TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD”**



Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)

C5 | Indicadores

| Estrategia | Indicador | Reporte al 6/01/2023 | U. Medida | Periodicidad | Próximo reporte |
|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------|--------------------|
| Vigilancia | 01) Cámaras con falla o intermitencia | 2 | cantidad | quincenal | 24 de enero |
| Vigilancia | 02) Mantenimiento y/o reparación de infraestructura de cámaras | 2 | cantidad | | |



Turnos e incidencias urbanas



ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero 2023

44%
atención

| <i>Matriz de Incidencias</i> Dependencia | <i>Estado</i> | | |
|----------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | Atendido | Pendiente | Suma total |
| Al. Cuauhtémoc | | 2 | 2 |
| CFE | 4 | 4 | 8 |
| SACMEX | 1 | 2 | 3 |
| SOS-DGSUS | 1 | | 1 |
| TELMEX | 4 | 4 | 8 |
| Tránsito | | 1 | 1 |
| Suma total | 10 | 13 | 23 |

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 09 de enero 2023

| FOLIO | FECHA DE REPORTE | REPORTA | SOLICITUD | CALLE | ENTRE CALLE 1 | ENTRE CALLE 2 | REFERENCIA | ATIENDE | FOTOGRAFÍA ANTES | FOTOGRAFÍA DESPUÉS | Estado |
|----------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| IUCH-368 | 5/01/2023 | V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina | Limpieza | Nezahualcoyotl | 20 de noviembre | | Monumento a Ho Chi Min | SOS-DGSUS |  |  | Atendido |
| IUCH-369 | 5/01/2023 | V5 - Zócalo | Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados | Mesones | Isabel La Católica | | Esquina | TELMEX |  |  | Atendido |
| IUCH-370 | 5/01/2023 | V4 - Alameda-Sector Financiero | Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados | República de Uruguay | Isabel La Católica | | Esquina | TELMEX |  |  | Atendido |
| IUCH-374 | 8/01/2023 | V4 - Alameda-Sector Financiero | Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados | Isabel La Católica | República de El Salvador | | Esquina | TELMEX |  |  | Atendido |
| IUCH-377 | 9/01/2023 | V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción | Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados | Tacuba | República de Chile | | Esquina | CFE |  |  | Atendido |
| IUCH-378 | 9/01/2023 | V4 - Alameda-Sector Financiero | Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados | Isabel La Católica | República de Uruguay | | Frente al Sanborns | TELMEX |  |  | Atendido |



Atención VIPPSC | Incidencias **ATENIDAS** - del 01 al 09 de enero 2023

| FOLIO | FECHA DE REPORTE | REPORTA | SOLICITUD | CALLE | ENTRE CALLE 1 | ENTRE CALLE 2 | REFERENCIA | ATIENDE | FOTOGRAFÍA ANTES | FOTOGRAFÍA DESPUÉS | Estado |
|----------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------------|---------|------------------|--------------------|----------|
| IUCH-339 | 12/12/2022 | V6 - Antigua Merced-Mixcalco | Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados | Jesús María | Emiliano Zapata | | | CFE | | | Atendido |
| IUCH-353 | 22/12/2022 | V4 - Alameda-Sector Financiero | TAPAS, REGISTROS O COLADERAS FALTANTES O DAÑADOS | INDEPENDENCIA | SQUINA LOPE | | | TELMEX | | | Atendido |
| IUCH-357 | 1/01/2023 | V4 - Alameda-Sector Financiero | Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados | República de Uruguay | Eje Central | | Esquina | CFE | | | Atendido |
| IUCH-358 | 2/01/2023 | V4 - Alameda-Sector Financiero | Fallas en el sistema de drenaje y desazolve | 5 de febrero | 16 de septiembre | | Frente al Nuevo Mundo | SACMEX | | | Atendido |
| IUCH-360 | 3/01/2023 | V3 - Santo Domingo | Falta de luz al interior de los inmuebles | República de Brasil | | | Frente al #64 | CFE | | | Atendido |
| IUCH-365 | 4/01/2023 | V5 - Zócalo | Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados | República de Uruguay | 20 de noviembre | 5 de febrero | Frente al #90 | CFE | | | Atendido |



Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 01 al 09 de enero 2023

| FOLIO | FECHA DE REPORTE | REPORTA | SOLICITUD | CALLE | ENTRE CALLE 1 | ENTRE CALLE 2 | REFERENCIA | ATIENDE | FOTOGRAFÍA ANTES | FOTOGRAFÍA DESPUÉS | Estado |
|----------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|--------------------|-----------|
| IUCH-367 | 4/01/2023 | V4 - Alameda-Sector Financiero | Falla en semáforo | Francisco I. Madero | Palma | | Esquina | Tránsito | | | Pendiente |
| IUCH-371 | 6/01/2023 | V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción | Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados | República de Brasil | República de Honduras | | Esquina | CFE | | | Pendiente |
| IUCH-372 | 6/01/2023 | V4 - Alameda-Sector Financiero | Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados | 5 de mayo | Isabel La Católica | | Esquina | TELMEX | | | Pendiente |
| IUCH-373 | 6/01/2023 | V5 - Zócalo | Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados | Mesones | | | Frente al #70 | TELMEX | | | Pendiente |
| IUCH-375 | 9/01/2023 | V4 - Alameda-Sector Financiero | Baches | Ignacio Allende | Tacuba | | Esquina | Al. Cuauhtémoc | | | Pendiente |
| IUCH-376 | 9/01/2023 | V4 - Alameda-Sector Financiero | Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados | Isabel La Católica | Tacuba | | Esquina | CFE | | | Pendiente |

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 01 al 09 de enero 2023

| FOLIO | FECHA DE REPORTE | REPORTA | SOLICITUD | CALLE | ENTRE CALLE 1 | ENTRE CALLE 2 | REFERENCIA | ATIENDE | FOTOGRAFÍA ANTES | FOTOGRAFÍA DESPUÉS | Estado |
|----------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| IUCH-359 | 2/01/2023 | V3 - Santo Domingo | Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados | Mixcalco | | | Frente al #26 | SACMEX |  | | Pendiente |
| IUCH-361 | 3/01/2023 | V7 - Vizcafnas-Corredor Cultural Regina | Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados | San Antonio Abad | | | Entre Xocongo | SACMEX |  | | Pendiente |
| IUCH-362 | 3/01/2023 | V3 - Santo Domingo | Mal estado de cables o equipamiento | Palma | | | Frente al #27 | TELMEX |  | | Pendiente |
| IUCH-363 | 4/01/2023 | V4 - Alameda-Sector Financiero | Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados | 16 de septiembre | Isabel La Católica | | Esquina | CFE |  | | Pendiente |
| IUCH-364 | 4/01/2023 | V3 - Santo Domingo | Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados | República de Venezuela | Del Carmen | | Esquina | CFE |  | | Pendiente |
| IUCH-366 | 4/01/2023 | V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción | Mal estado de cables o equipamiento | República de Chile | | | Frente al #44 y #49 | TELMEX |  | | Pendiente |



Asuntos generales

