



# MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

## XXIV SESIÓN. Evaluación noviembre

30 de noviembre de 2021

## Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia



# Reportes Institucionales



# Autoridad del Centro Histórico

## Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 26/11/2021	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Quincenal	83	10 de diciembre
Mantenimiento a infraestructura con apoyo de Justicia Cívica	Número de atenciones en parques, plazas o áreas verdes del Perímetro del Centro Histórico	Quincenal	4	10 de diciembre
Mantenimiento a la carpeta vial con bacheo de asfalto	Número de atenciones por parte de la Dirección General de Obras e Infraestructura Vial de la Secretaría de Obras	Quincenal	86	10 de diciembre

## Autoridad del Centro Histórico | Obras menores

Talavera  
Peralvillo  
Roldán  
Allende  
Xicotencatl  
República de Venezuela  
Paseo de la Reforma  
República de Argentina  
Tacuba  
Madero  
Motolinia

Los trabajos realizados consistieron en **retiro de vegetación invasiva y retiro de marquesina a punto de caer** en Talavera 11, **se retiraron 20 ml. de malla ciclón dañada de 3 mts. de altura, se colocaron 24 ml. de malla ciclón nueva, 60 ml. de alambre de púas y 20 ml. de concertina** en el predio de Peralvillo 9 entre Libertad y Jaime Nuno, **se repararon 7.5 m2 de banqueteta** en Roldán esquina República del Salvador, **se reparó 1 m2 de banqueteta** enfrente de Roldán 45 entre República del Salvador y República de Uruguay, **se reparó 1 m2 de banqueteta** en Allende entre República de Honduras y República de Perú, **se repusieron 3 piezas de recinto** en Xicotencatl entre Tacuba y Donceles, **se repararon 2.2 m2 de banqueteta** en en Leona Vicario entre San Antonio Tomatlan y Mixcalco, **se reparó 1 tapa de registro** en República de Venezuela esquina Del Carmen, **se colocaron 11 piezas de ejercitadores** en Paseo de la Reforma entre Pedro Moreno y Lerdo, **se renivelo una tapa de registro** en República de Argentina entre Donceles y República de Argentina, **se repusieron 7 piezas de recinto** en Tacuba esquina Eje Central, **se repuso 1 tapa de registro** en Madero esquina Motolinia, **se repuso 1 tapa de registro** en Motolinia entre Madero y 5 de Mayo.



**Autoridad del Centro Histórico | Gráficos de obras menores**



**Motolinia**

**Tacuba**

**Paseo de la Reforma**

**Autoridad del Centro Histórico | Mantenimiento con apoyo de infractores de justicia cívica**



**Violeta de Reforma a Eje Central con apoyo de 15 infractores**



**San Jerónimo Andador de Bolívar a Isabel la Católica con apoyo de 12 infractores**



**República de Argentina entre Justo Sierra y González Obregón con apoyo de 11 infractores**



**República de Nicaragua casi esquina República de Brasil con apoyo de 15 infractores**

## ACH | Matriz de seguimiento a bacheo - noviembre 2021

VIPPSC	Atendido	En Proceso	Pendiente	
V1 - Santa María la Redonda			6	6
V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción			28	28
V3 - Santo Domingo	11		62	73
V4 - Alameda-Sector Financiero			17	17
V5 - Zócalo			6	6
V6 - Antigua Merced-Mixcalco	5	1	31	37
V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	32		21	53
V8 - San Pablo	38		4	42
<b>Suma total</b>	<b>86</b>	<b>1</b>	<b>175</b>	<b>262</b>


**34%**  
atención

## Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores

**2,924**

Incidencias atendidas  
enero - noviembre


Atención a incidencias de daño en infraestructura del perímetro de la ACH

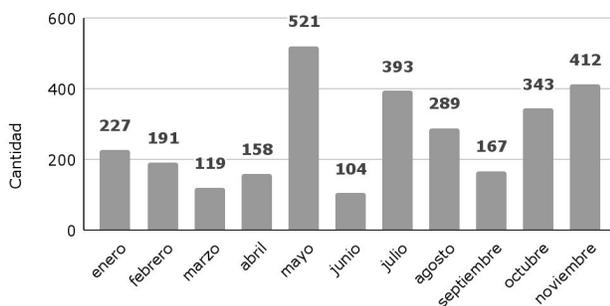

**2,584 m<sup>2</sup>**

Graffitis eliminados  
enero - noviembre

Eliminación de grafiti (m2)

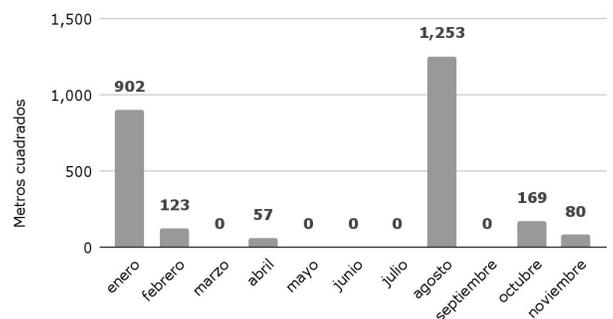

# Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores

**12**

Riegos por vecinos  
abril - noviembre

**13**

Riegos por ACH  
abril - noviembre


**07**

Riegos por ACH - DGSUS  
abril - noviembre

**12**

Riegos por SEDEMA  
abril - noviembre

Riegos de áreas verdes Centro Histórico

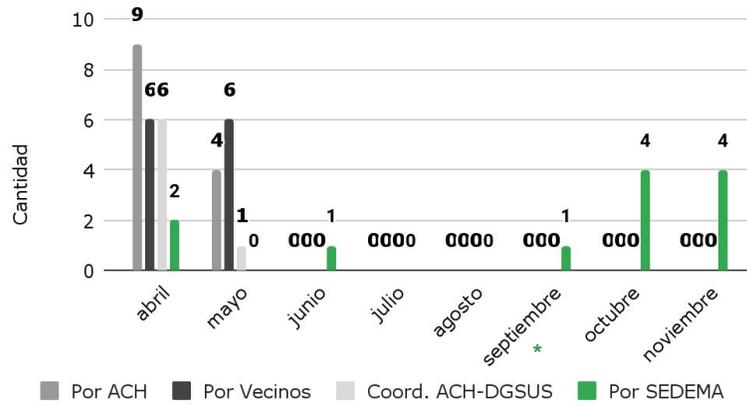

# Alcaldía Cuauhtémoc

## Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 26/11	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	11	14 de diciembre
Alumbrado Público	Número de fotoceldas cambiadas	Quincenal	3	14 de diciembre
Drenaje	Número de metros lineales de desazolve de atarjea	Quincenal	840	14 de diciembre
Vialidades	Número de metros lineales de balizamiento de guarnición	Quincenal	3,894	14 de diciembre
Arbolado Urbano	Número de árboles podados	Quincenal	22	14 de diciembre

## Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 15/11	Próximo reporte
Parque y Jardines	Número de metros cuadrados de riego	Quincenal	450	14 de diciembre
Residuos	Número de toneladas de recolección orgánica domiciliar y barrido	Quincenal	304.70	14 de diciembre
Residuos	Número de toneladas de recolección inorgánica domiciliar y barrido	Quincenal	799.80	14 de diciembre
Residuos	Número de toneladas de recolección en tiraderos clandestinos	Quincenal	464.30	14 de diciembre
Residuos	Número de kilómetros de barrido diario	Quincenal	283	14 de diciembre

## Alcaldía Cuauhtémoc | Gráficas



Reparación de luminarias en la calle de República de Perú



Barrido en calle Luis Moya



Recolección de residuos en Eje 1 norte



Balizamiento de guarnición sobre la calle de López

## Alcaldía Cuauhtémoc | Pendientes


Clave	Solicitud	Estatus
TCH-109	Problemas de inundaciones en la calle por falta de funcionamiento de la atarjea que esta dañada	En proceso
TCH-110	Falta de alumbrado público	Atendido
TCH-111	Baches sobre arroyo vehicular	En proceso
IUCH-1269	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Atendido

## Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores

# 1,286

reparaciones de luminarias  
enero - noviembre


Reparaciones de luminarias en vías secundarias

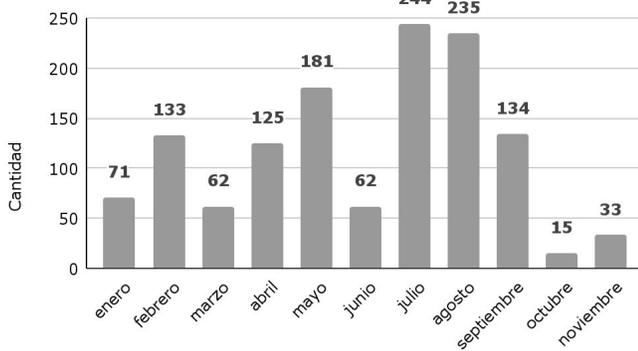

# 516

sujetos forestales podados  
enero - noviembre

Sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas

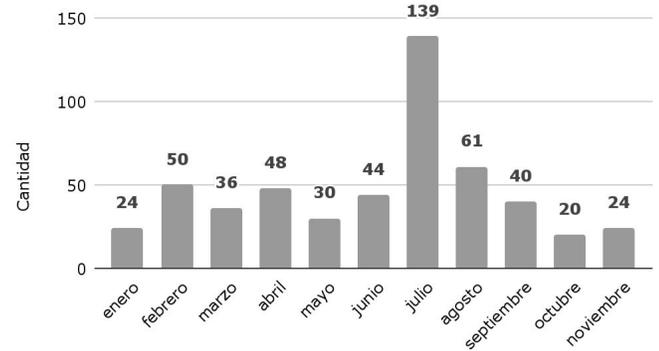


## Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores

# 2,989 m

de desazolve en red de drenaje  
enero - noviembre

Desazolve de la red de drenaje




# 201

rejillas de piso  
desazolvadas  
enero - noviembre

# 344

coladeras desazolvadas  
enero - noviembre

Desazolve de accesorios



■ Rejillas de piso ■ Coladeras en banqueta

# Alcaldía Venustiano Carranza



## Alcaldía Venustiano Carranza | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 26/11	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	0	10 de diciembre	La Coordinación Territorial Morelos no reporta trabajos de alumbrado público en el periodo.
Tiraderos Clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base 26 tiraderos)	Quincenal	585	10 de diciembre	Se recolectaron 39 toneladas diariamente de Residuos Sólidos
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	0	10 de diciembre	La Coordinación Territorial Morelos no reporta trabajos de poda de sujetos forestales en el periodo.
Desazolve	Metros lineales de drenaje desazolvados	Quincenal	96	10 de diciembre	La Coordinación Territorial Morelos reportó 96 metros lineales de desazolve en el periodo.

## Alcaldía Venustiano Carranza | Anexo de indicadores

### METROS LINEALES DE LA RED DE DRENAJE DESAZOLVADOS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
J. J. HERRERA 75	ESQUINA	BRAVO	MORELOS I	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
VENEGAS ARROYO 3	CARRETONES	ADOLFO GURRIÓN	CENTRO II	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
ROSARIO 100	ESQUINA	ZAVALA	CENTRO II	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
CTE. DE LA SOLEDAD 5	ROSARIO	SANTA ESCUELA	CENTRO I	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
GRAL. E. ZAPATA 143	SAN CIPRIAN	ROSARIO	CENTRO I	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
GRAL. E. ZAPATA 105	SANTA ESCUELA	ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN	CENTRO I	36	ALBAÑAL DOMICILIARIO
<b>TOTAL</b>				<b>96</b>	

## Alcaldía Venustiano Carranza | Croquis




## Alcaldía Venustiano Carranza | Seguimiento de indicadores

# 855

reparaciones de luminarias  
enero - noviembre


Reparaciones de luminarias en vías secundarias de CH

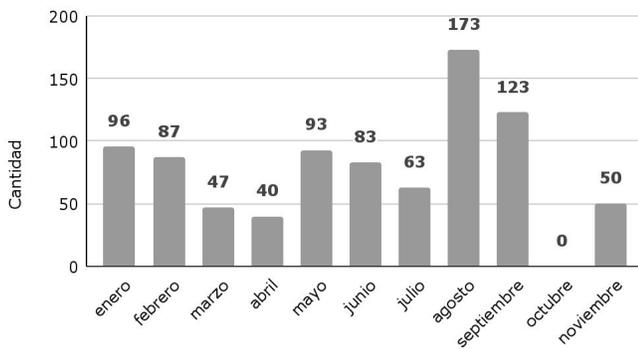

# 17,722.3 ton.

de residuos sólidos recolectados  
enero - noviembre

Residuos sólidos recolectados en tiraderos clandestinos

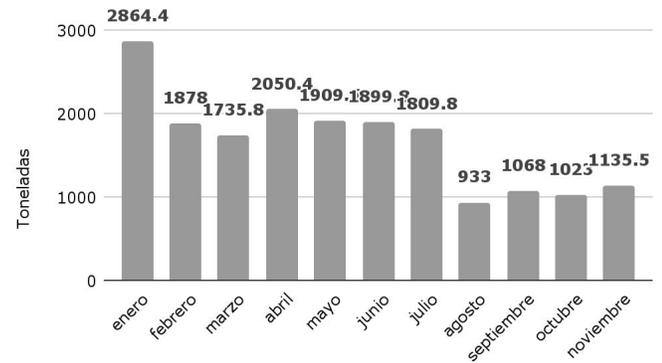


## Alcaldía Venustiano Carranza | Seguimiento de indicadores

# 132

sujetos forestales podados  
enero - noviembre


Sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas

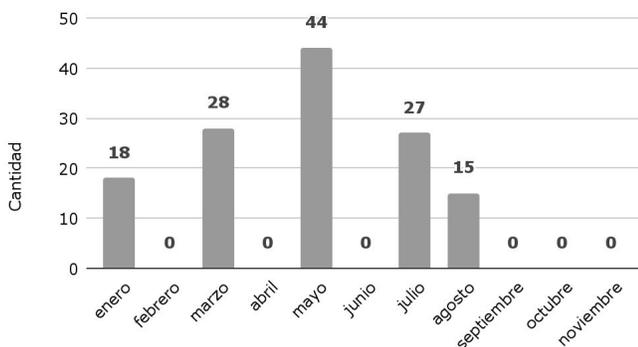

# 4,198 m

de desazolve en red de drenaje  
enero - noviembre

Desazolve de la red de drenaje



# SACMEX

Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje




## SACMEX Drenaje | Ejecución del programa


Desazolve de la red de drenaje y accesorios hidráulicos

**100 %**  
DE AVANCE

	PROGRAMADO	ANTERIOR	EJECUTADO	AVANCE
ATARJEJA (METROS)	21,000	19,400	840	20,240
POZOS DE VISITA	370	339	16	355
REJILLAS DE PISO	150	214	223	223
COLADERA PLUVIAL	160	257	14	271
ALBAÑAL (METROS)	1500	1671	70	1741



## SACMEX Drenaje | Seguimiento de indicadores



**100 %**  
avance acumulado  
septiembre - noviembre

**20.24** km en atarjea  
**355** pozos de visita  
**223** rejillas de piso  
**271** coladeras pluviales  
**1,741** m de albañal

# Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

## SOS-DGOIV | Indicadores - Fechas de terminación de obra 2021

OBRA	ALCALDÍA	AVANCE FÍSICO	FECHA DE TERMINO REAL	COMENTARIOS
TACUBA	CUAUHTÉMOC	100.00 %	18/10/2021	Concluida
5 DE MAYO	CUAUHTÉMOC	100.00 %	04/10/2021	Concluida
PLAZA EMPEDRADILLO	CUAUHTÉMOC	34.61 %	30/12/2021	En ejecución
PLAZA SOLIDARIDAD	CUAUHTÉMOC	77.06 %	15/12/2021	En ejecución
PLAZA MARTÍ	CUAUHTÉMOC	98.00 %	30/11/2021	En ejecución
SAN HIPÓLITO (MINA-SOTO-HÉROES-VIOLETA-SAN FERNANDO Y AV. HIDALGO)	CUAUHTÉMOC	46.10 %	30/12/2021	En ejecución
REPÚBLICA DE CHILE	CUAUHTÉMOC	54.03 %	30/12/2021	En ejecución
SAN ILDEFONSO Y JUSTO SIERRA	CUAUHTÉMOC	26.68 %	30/12/2021	En ejecución
REFORMA, DE AV. HIDALGO A GLORIETA VIOLETA	CUAUHTÉMOC	37.00 %	30/12/2021	En ejecución
URBANISMO TÁCTICO EN BALDERAS – PLAZA SOLIDARIDAD	CUAUHTÉMOC	00.00 %	30/12/2021	En solicitud de pintura
URBANISMO TÁCTICO EN BALDERAS – CIUDADELA Y EMILIO DONDÉ	CUAUHTÉMOC	70.00 %	15/12/2021	Se concluye durante la presente semana, se proporcionó plano de la plaza a la ACH para planificar distribución de comercio ambulante
PROYECTO LAGUNILLA	CUAUHTÉMOC	35.00 %	31/12/2021	En ejecución proyecto

Obra Inaugurados
  Obra concluida sin inaugurar

## SOS-DGOIV | Tacuba

Concluida



Alcaldía

Periodo

Avance

Fecha de conclusión

Inauguración o visita

Cuauhtémoc

Junio - Octubre

100 %

Concluida-Oct 2021

Por programar

## SOS-DGOIV | 5 de mayo

Concluida. En Av. 20 de noviembre se espera proyecto para adecuar lanzadera.



Alcaldía	Periodo	Avance	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	Junio - Octubre	100.00 %	Concluida-Oct 2021	Por programar

## SOS-DGOIV | Plaza Empedradillo - Obra nueva - Mantenimiento


Culminan trabajos en REVO, se colocan pisos en zona ampliada de plaza como área peatonal, se realizan preparaciones para instalaciones y mantenimiento en área actual



Alcaldía	Presupuesto	Periodo	Avance General	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	9.98 mdp	Octubre - Diciembre	34.61 %	Diciembre 2021	Por programar

## SOS-DGOIV | Plaza Solidaridad


Se realizan trabajos de colocación de acabados, ajustes en colocación de materiales en guarniciones, jardineras, preparaciones para instalaciones y vegetación



Alcaldía	Presupuesto	Periodo	Avance General	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	5.16 mdp	Agosto - Octubre	77.06 %	Diciembre 2021	Por programar

## SOS-DGOIV | Plaza Martí

Se realizan cambios de piezas de mármol en pasillos de la plaza.



Alcaldía	Presupuesto	Periodo	Avance General	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	3.45 mdp	Agosto - Octubre	98.00 %	Diciembre 2021	Por programar


## SOS-DGOIV | República de Chile

Continúan acciones de obra inducida, colocación de Mr-45 en arroyo vehicular. Se colocan acabados y tapas de accesorios en zonas de mayor avance



Alcaldía	Presupuesto	Periodo	Avance	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	22.84 mdp	Agosto - Diciembre	54.03 %	Diciembre 2021	Por programar

## SOS-DGOIV | Polígono de San Hipólito

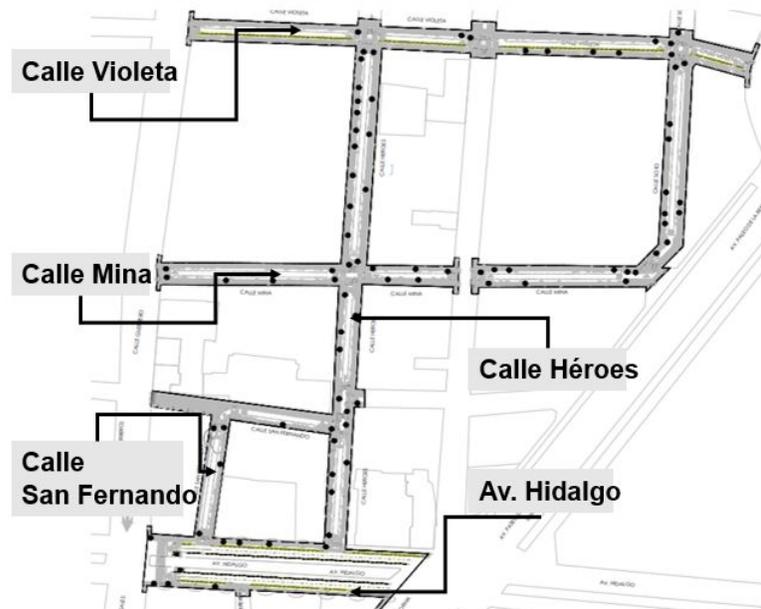

Alcaldía	Presupuesto	Periodo	Avance General	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	62.99 mdp	Agosto - Diciembre	46.10 %	Diciembre 2021	Por programar


## SOS-DGOIV | Polígono de San Hipólito - Violeta

Se realizan trabajos de levantamiento topográfico, trazo y nivelación, demoliciones, y trabajos en colado de guarniciones, colocación de acabados en banquetas, carga y retiro de escombros.



## SOS-DGOIV | Polígono de San Hipólito - Héroes

Se realiza levantamiento topográfico, trazo y nivelación, se colocan acabados. Se abre otro frente de trabajo para colocar instalación y recibir acabados, se realizan limpiezas en frentes con acabados y detallando para recibir tapas de registros



## SOS-DGOIV | Polígono de San Hipólito - Mina

Se realiza levantamiento topográfico, trazo y nivelación, inician trabajos de demolición de guarniciones, banquetas y colado de guarniciones y superficie de banqueta para colocación de acabados



## SOS-DGOIV | Polígono de San Hipólito - San Fernando

Se realizan trabajos de levantamiento topográfico, trazo y nivelación, instalaciones e inician trabajos de colocación de acabados. Se realizó acuerdo con el INAH para criterios para restitución de piso original sobre banqueta de portales colindantes al Panteón. Continúan trabajos de salvamento arqueológico




## SOS-DGOIV | Polígono de San Hipólito - Av. Hidalgo

Se realiza levantamiento topográfico, trazo y nivelación, se colocan instalaciones derivado de la obra inducida, se ejecutan acabados en banqueta y guarniciones.



## SOS-DGOIV | San Ildefonso y Justo Sierra

Se realizan trabajos de levantamiento topográfico, demolición de guarniciones y banquetas, colado de guarniciones y colocación de relleno fluido en área de banqueta, colocación de acabados y preparación de instalaciones



Alcaldía

Presupuesto

Periodo

Avance General

Fecha de conclusión

Inauguración o visita

Cuauhtémoc

6.04 mdp

Septiembre - Noviembre

26.68 %

Noviembre 2021

Por programar

## SOS-DGOIV | Reforma (Av. Hidalgo a Glorieta Violeta)

Se realiza levantamiento topográfico, trazo y nivelación, inician trabajos de demolición de guarniciones y banquetas, carga y retiro de escombros, colocación de señalamiento preventivo. Se realizan acciones de demolición en laterales y camellón central, colocación de acabados.



Alcaldía	Presupuesto	Periodo	Avance	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	56.43 mdp	Septiembre-Diciembre	37.00 %	Diciembre 2021	Iniciando

## SOS-DGOIV | Av. Balderas - Urbanismo Táctico - Solidaridad



Alcaldía	Presupuesto	Periodo	Avance	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	1.2 mdp	Noviembre-Diciembre	Por iniciar	Diciembre 2021	Por programar

# SOS-DGOIV | Av. Balderas - Urbanismo Táctico - Ciudadela



Alcaldía	Presupuesto	Periodo	Avance	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	0.90 mdp	Noviembre-Diciembre	70.00 %	Diciembre 2021	Por programar

# SOS-DGOIV | Av. Balderas - Urbanismo Táctico - Ciudadela



## SOS-DGOIV | Proyecto Lagunilla


Se lleva a cabo diagnóstico del polígono completo, se evalúan posibilidades de adecuaciones geométricas para proponer trazo que será mostrado a las autoridades a revisión y opiniones en materia normativa para ejecutar planos por especialidades



Alcaldía	Presupuesto	Periodo	Avance	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	1.90 mdp	Noviembre-Diciembre	35.00 %	Diciembre 2021	Para revisión

## SOS-DGOIV | Seguimiento de indicadores

Frentes de obra - Revitalización Integral Centro Histórico 2021

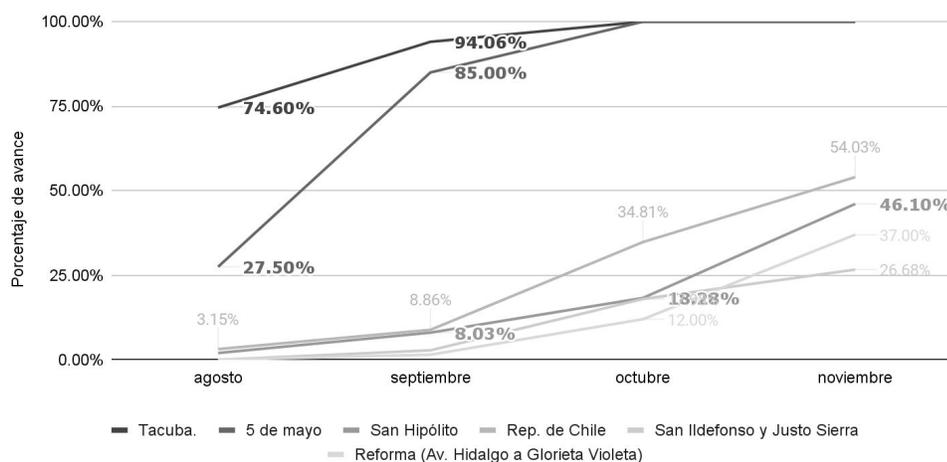


**46.6 %**  
avance promedio  
julio - noviembre

**Revitalización Integral  
Centro Histórico 2021**

**5**  
Frentes de obra  
en ejecución

## SOS-DGOIV | Seguimiento de indicadores

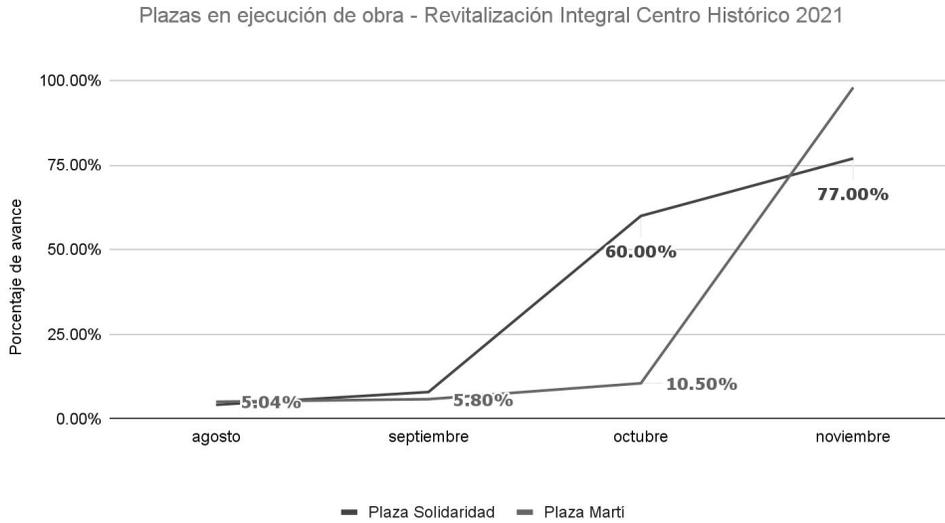

**69.66 %**  
**avance promedio**  
 julio - noviembre

**Revitalización Integral  
 Centro Histórico 2021**

**3**  
 Plazas en ejecución  
 de obra

# Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

# SOS-DGCOP | Indicadores - Construcción de PILARES “La Pulga”

AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2021

## DATOS GENERALES CONTRATISTA

NO. CONTRATO	DGCOP-LPN-L-1-275-20
CONTRATISTA	INOVACION Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
PLAZO DE EJECUCIÓN	149 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	02/10/2020
FECHA DE TERMINACIÓN	25/09/2021
SUPERFICIE DEL TERRENO	3,076.31
AREA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL	2,214.00 M2
AREAS EXTERIORES	3,625.00 M2

## ESTADO FINANCIERO

IMPORTE DEL CONTRATO S/IVA	\$	19,989,459.25
IMPORTE ESTIMADO (PAGADO) S/IVA		\$12,005,252.52
IMPORTE POR ESTIMAR S/IVA	\$	7,984,206.73

## ANTICIPO


ANTICIPO OTORGADO		SIN ANTICIPO
ANTICIPO AMORTIZADO	\$	-
ANTICIPO POR AMORTIZAR	\$	-



PERSPECTIVA DEL PROYECTO

RESIDENTE:  
**ARQ. GRACIELA DUARTE CALIXTO**  
 J.U.D. DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION C2

# SOS-DGCOP | Indicadores - Construcción de PILARES “La Pulga”

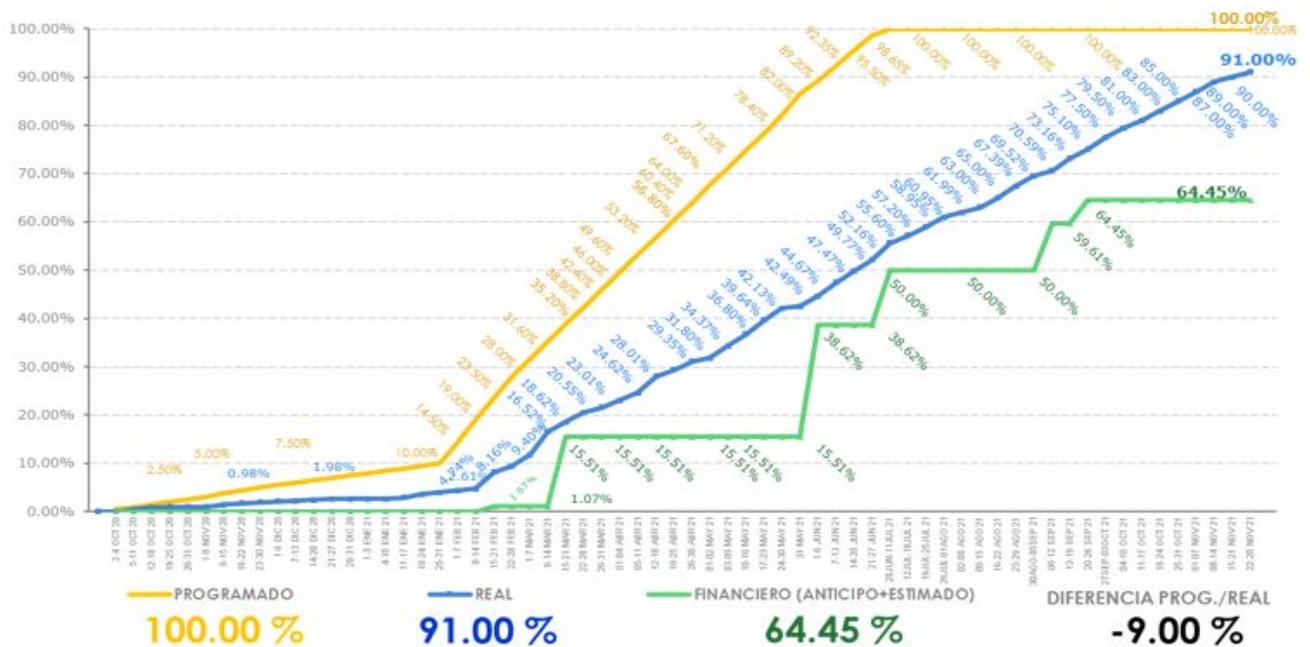

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



**ELABORACION DE MARCOS METALICOS  
PARA PUERTAS P-01 Y P-02 DE LA PLANTA BAJA  
(EJES B/1-6 Y C/1-6)**



**ELABORACION DE MESAS DE TRABAJO  
PARA LAS AREAS DE CIBERESCUELA (EJES 4-6/B-C)**

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



**ELABORACION DE TRAGALUZ A BASE DE VITROBLOCK 19X19X08 CM. EN AZOTEA DEL EDIFICIO (EJES 1-6/B-C)**

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



**INSTALACION EN SITIO DEL ELEVADOR DE PASAJEROS “SCHINDLER”  
DE TRES PARADAS (PLANTA BAJA, NIVEL PRIMERO Y AZOTEA DEL EDIFICIO)**

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



**CONFORMACIÓN DE NIVELES EN JARDÍN Y HUERTO  
CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN (EJES 7-8/E-F)**

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



**ELABORACION DE REJA DE HERRERIA H05 PARA PARQUE DE 1.90 M DE ALTURA (EJES 7/A-E Y E/1-7)**

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



**COLOCACIÓN DE PISO DE ADOCRETO CIRCULAR NEGRO DE 10 CM. DE ESPESOR Y 10 CM. DE DIÁMETRO EN PLAZA (EJES 1-7/A-E)**

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



**TRABAJOS DE LIMPIEZA EN OBRA**



**EXCAVACION EN TERRENO NATURAL PARA  
SUSTITUCION DE POSTES POR PARTE DE C.F.E.**

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



**VISTA INTERIOR  
PLANTA BAJA DEL EDIFICIO**

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



VISTA INTERIOR  
NIVEL PRIMERO DEL EDIFICIO

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



VISTA  
NIVEL AZOTEA DEL EDIFICIO

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



VISTA PANORAMICA NORESTE



VISTA PANORAMICA NOROESTE

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



VISTA PANORAMICA SURESTE



VISTA PANORAMICA SUROESTE.


## SOS-DGCOP | Seguimiento de Indicadores

# 91.00%

### avance de obra

enero - noviembre

Obra PILARES "La Pulga"



\*Está programado el término de la obra para octubre 2021

# Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad  
Alumbrado Público

## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana 47 Al 19 de noviembre	Semana 48 Al 26 de noviembre	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	870	1106	14 de diciembre

**Total 1976**

## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA 47

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo	CENTRO	54	Soldadura de tapas de registro	Vandalismo
	Av. Juárez y Av. Hidalgo	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria Apagada
	Av. Juárez y Av. Hidalgo	CENTRO	60	Cambio de relojes	Circuitos Apagados
Av. Juárez	Calle Iturbide y Calle Humboldt	CENTRO	30	Reconexión de líneas	Circuitos Apagados
	Calle López y Eje Central Lázaro Cárdenas	CENTRO	14	Reconexión de líneas	Circuito Apagado
	Calle Luis Moya y Calle García Lorca	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria Apagada
	Calle Iturbide y Calle Humboldt	CENTRO	30	Reconexión de líneas	Circuitos Apagados
		TOTAL	190		

## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA 47

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Plaza de la Constitución <i>Iluminación Artística</i>	Calle Pino Suárez y Calle 20 de Noviembre	CENTRO	662	Restablecimiento de control	Circuitos Apagados
Calle 16 de septiembre	Calle Isabel la Católica y Calle Palma	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria Apagada
Calle Francisco I. Madero	Calle Motolínea y Calle Isabel la Católica	CENTRO	17	Reconexión de líneas	Circuito Apagado
		TOTAL	680		

## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA 48

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Plaza de la Constitución <i>Iluminación Artística</i>	Calle 20 de noviembre y Calle José María Pino Suárez	CENTRO	331	Reprogramación de controles	Circuitos Apagados
	Calle 20 de noviembre y Calle José María Pino Suárez	CENTRO	331	Reconexión de líneas	Circuitos Apagados
	Calle 5 de febrero y Calle 20 de noviembre	CENTRO	268	Reprogramación de color	Cambio de color
	Calle Francisco I. Madero y Calle 5 de Mayo	CENTRO	165	Reprogramación de color	Circuito Intermitente
	Calle Monte de Piedad y Calle Moneda	CENTRO	7	Reconexión de líneas	Circuito Apagado
Calle José María Pino Suárez	Plaza de la Constitución y Calle Venustiano Carranza	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria Apagada
		TOTAL	1103		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA 48

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Av. Juárez	Calle Dolores y Calle López	CENTRO	1	Se soldá tapa de registro	Vandalismo
Alameda Central	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Se cambia balastro	Lámpara Apagada
	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Se cambia balastro y lámpara	Lámpara Apagada
TOTAL			3		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA 47

ALAMEDA CENTRAL



SOLDADURA EN TAPAS DE REGISTROS.

### AVENIDA JUÁREZ



SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

### PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN *Iluminaciones Artísticas*



SE REESTABLECE CONTROL

### PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN *Iluminaciones Artísticas*




**SE REALIZA REPROGRAMACIÓN DE COLOR.**

### ALAMEDA CENTRAL



**SE REALIZA CAMBIO DE BALASTRO.**

**AV. JUÁREZ**



**SOLDADURA EN TAPA DE REGISTRO.**

**10,158**

enero - noviembre

Reparación a luminarias en CH



# Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad  
Subdirección de Parques B



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	01 /11 AL 14/11	15/11 AL 28/11	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros Barridos de guarnición en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	8,618.512 km	12,048.328 Km	14 de diciembre
Limpieza	Metros cuadrados Barridos de Banquetas en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	16,768,780 m2	23,442,070 m2	
Limpieza	Metros Cuadrados Barridos de Plazas y Corredores en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	8,474,312 m2	12,408,814 m2	

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	01 /11 AL 14/11	15/11 AL 28/11	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros de Barrido Mecánico en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	1,279.040 km	1,279.040 km	14 de diciembre
Limpieza	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos y recolección de residuos producto del barrido en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	8,064 m3	8,153 m3	
Recolección de tierra	Metros cúbicos de tierra recolectada en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	124.25 m3	131 m3	

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	01 /11 AL 14/11	15/11 AL 28/11	Próximo reporte
Lavado de papeleras	Piezas de papeleras lavadas en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	1,120 piezas	1,120 piezas	14 de diciembre
Lavado	Metros cuadrados lavados en Plazas, Calles, Corredores peatonales y semipeatonales en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	649,529 m2	720,074 m2	
Lavado de sitios críticos	Sitios críticos lavados en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	18 Sitios (253 promedio en la quincena)	18 Sitios (256 promedio en la quincena)	

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	01 /11 AL 14/11	15/11 AL 28/11	Próximo reporte
Recolección tiraderos clandestinos	Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos en el Perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	25 Tiraderos (350 promedio en la quincena)	25 Tiraderos (350 promedio en la quincena)	14 de diciembre
Retiro de chicles	Piezas de Chicles retiradas en el Corredor Madero	Quincenal	4,001 piezas	3,013 piezas	
Eliminación de grafiti	Metros Cuadrados de grafiti eliminado en el Perímetro “A” el Centro Histórico	Quincenal	365.50 m2	7,783.50 m2	

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	01 /11 AL 14/11	15/11 AL 28/11	Próximo reporte
Retiro de propaganda	Piezas retiradas de propaganda en el Perímetro “A” el Centro Histórico	Quincenal	2,503 piezas	2,337 piezas	14 de diciembre
Atención retiro platón	Atención de limpieza por retiro de plantón, ubicado en perímetro “A”			01 atención	


## SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	01 /11 AL 14/11	15/11 AL 28/11	Próximo reporte
Desratización	Desratización en el Perímetro “A” y “B” del Centro Histórico		Colocación 6,539 Racumin pasta en una superficie de 185,816 m2, Fumigación y Desinfección en un área de 27,760 m2	Colocación 2,838 Racumin pasta en una superficie de 134,805 m2, Rodilón Block 591, en una superficie de 10,050 m2; y Fumigación en un área de 1,760 m2	14 de diciembre



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Gráficas - Acciones preventivas con el personal por COVID-19

- Toma la temperatura todos los días en los tres turnos.
- Entrega de caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.

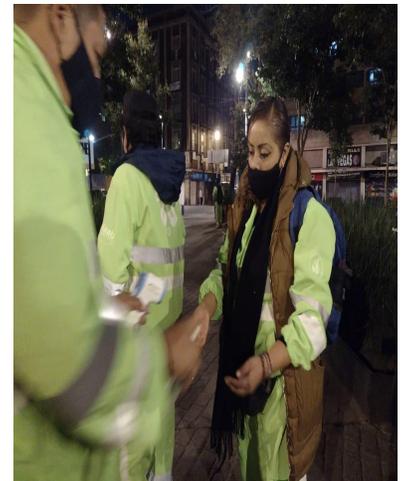



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores

### ELIMINACIÓN DE GRAFITI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
PALMA DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A VENUSTIANO CARRANZA	23	m2
TACUBA DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MONTE DE PIEDAD	19	m2
16 DE SEPTIEMBRE DE MONTE DE PIEDAD A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	21	m2
REPÚBLICA DE BRASIL DE TACUBA A BELISARIO DOMÍNGUEZ	13.50	m2
CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQUINA AV. 20 DE NOVIEMBRE	131	m2
AV. JUÁREZ DE AV. PASEO DE LA REFORMA A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (PROTESTA)	171	m2
SAN JERÓNIMO ESQUINA 5 DE FEBRERO	53	m2
REGINA DE SIMÓN BOLIVAR A JESÚS MARÍA	24	m2
TACUBA DE MONTE DE PIEDAD A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	14	m2
PINO SUÁREZ DE VENUSTIANO CARRANZA A REPÚBLICA DE URUGUAY (PROTESTA)	42	m2
REPÚBLICA DE URUGUAY DE AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (PROTESTA)	54	m2
AV. HIDALGO DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A AV. PASEO DE LA REFORMA (PROTESTA)	37	m2
SAN JERÓNIMO DE CORREO MAYOR A ALDACO	89	m2
AV. HIDALGO DE AV. PASEO DE LA REFORMA A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (PROTESTA)	212	m2
AV. JUÁREZ DE AV. PASEO DE LA REFORMA A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (PROTESTA)	68	m2
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS DE AV. HIDALGO A AV. 5 DE MAYO (PROTESTA)	12	m2
AV. 5 DE MAYO DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MONTE DE PIEDAD (PROTESTA)	1,053	m2
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y ARROYO VEHICULAR (PROTESTA)	5,747	m2
<b>TOTAL</b>	<b>7,783.50</b>	<b>m2</b>

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores

### ELIMINACIÓN DE 387.50 M2 DE GRAFITI VANDÁLICO Y 7,396 M2 DE GRAFITI DE PROTESTA

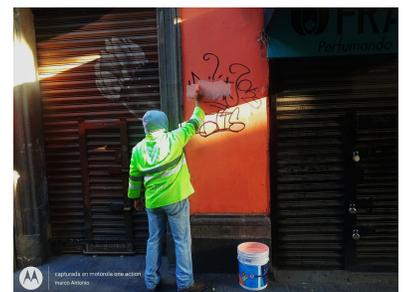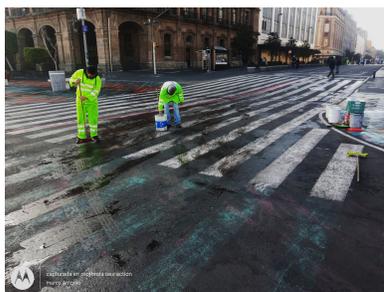

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores




## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores



# SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores



# SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores

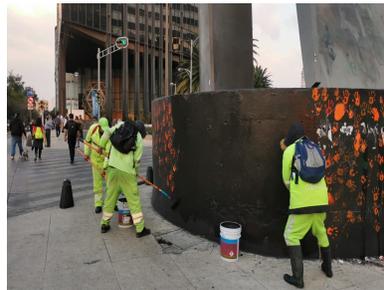

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores

### Desfile por el "111 Aniversario de la Revolución Mexicana"




## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores

### Lavado Integral en Plaza de la Constitución



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores

### Retiro de Plantón del frente de Directores Encargados del Estado de Guerrero

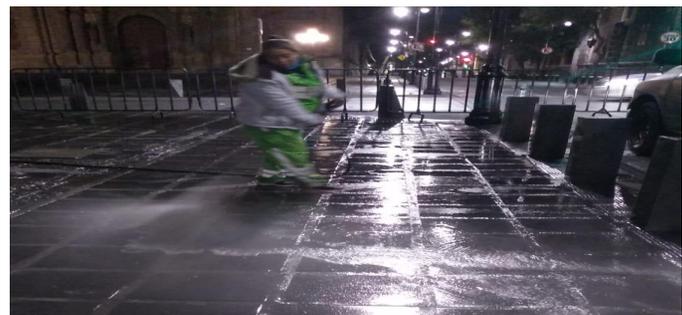

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas de indicadores

### Atención Fauna Nociva



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas de indicadores

### Atención Fauna Nociva



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad	B	Av. Del Trabajo, de Gorostiza a Panaderos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 65 Racumin Pasta, en un área de 680 m2.
Congreso de la Unión	B	De Canal del Norte a Aluminio, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 72 Racumin Pasta, en un área de 380 m2.
Congreso de la Unión	B	De Calle Circunvalación a Eje 2 Norte, Col. Michoacana, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 58 Racumin Pasta, en un área de 350 m2.
Tiradero Clandestino	B	Congreso de la Unión, Herreros a Hortelanos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 85 Racumin Pasta, en un área de 100 m2.
Tiradero Clandestino	B	Congreso de la Unión, Esq. Hortelanos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 66 Racumin Pasta, en un área de 100 m2.
Canal del Norte	B	Congreso de la Unión, de Plomeros a Eje 2 Norte, Col. Michoacán, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 98 Racumin Pasta, en un área de 1,750 m2.
Canal del Norte	B	De Bonanza a Eje 2 Oriente Congreso de la Unión, Col. Ampliación Michoacana, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 60 Racumin Pasta, en un área de 350 m2.
Congreso de la Unión (Camellón)	B	De Aluminio a Estaño, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 45 Racumin Pasta, en un área de 380 m2.
Aluminio	B	De Congreso de la Unión a Pabellón, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 38 Racumin Pasta, en un área de 760 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Exterior Del Mercado del Rastro	B	Ing. Eduardo Molina, Aluminio, Sorpresa y Estaño, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 42 Racumin Pasta, en un área de 2,150 m2.
Av. Del Trabajo	B	De Panaderos a Mecánicos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 56 Racumin Pasta, en un área de 850 m2.
Tiradero Clandestino	B	Anillo de Circunvalación, entre Corregidora a Manzanares, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Fumigación 600 ml. Amffilman, 200 m2.
Tiradero Clandestino	B	Anillo de Circunvalación, entre República de Guatemala y Moneda, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Fumigación 600 ml. Amffilman, 200 m2.
Tiradero Clandestino	B	Anillo de Circunvalación, entre República de Guatemala y Moneda, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Fumigación 600 ml. Amffilman, 200 m2.
Parque (Sin Número)	A	Caridad, Manuel Doblado y Obreros, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 45 Racumin Pasta, en un área de 220 m2.
Eje 2 Norte	B	Esquina Eje Central Lázaro Cárdenas, Col. Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 36 Racumin Pasta, en un área de 350 m2.
Tiradero Clandestino No. 62	B	Eje 1 Oriente, Esquina Constanca, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 38 Racumin Pasta, en un área de 100 m2.
Vialidad	B	Eje 1 Oriente, Esquina Caridad, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 34 Racumin Pasta, en un área de 250 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Tiradero Clandestino No. 64	B	Eje 1 Oriente, Manuel Doblado, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 30 Racumin Pasta, en un área de 100 m2.
Tramo	B	Av. Del Trabajo No. 28, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 48 Racumin Pasta, en un área de 560 m2.
Tiradero Clandestino	B	Plutarco Elías Calles y Congreso de la Unión, Col. Barrio Zapotla, Alcaldía Iztacalco	Desratización y Fumigación 35 Racumin Pasta, 850 m2
Tiradero Clandestino	B	Av. Del Trabajo y González Ortega, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 32 Racumin Pasta, en un área de 150 m2.
Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 88 Racumin Pasta, en un área de 1,600 m2.
Anillo de Circunvalación	B	De San Pablo a Fray Servando, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 69 Racumin Pasta, en un área de 800 m2
Eje 1 Oriente Anillo de circunvalación	B	De República de Guatemala a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 120 Racumin Pasta, en un área de 2,200 m2.
Exterior del Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar, Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 45 Racumin Pasta, en un área de 1,800 m2.
Área Verde	A	Tolsa, Balderas, Enrico Martínez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 38 Racumin Pasta, en un área de 800 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad	B	Plaza de la Ciudadela, Balderas, Enrico Martínez y José María Morelos, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 42 Racumin Pasta, en un área de 850 m2.
Vialidad	B	Arcos de Belén de Luis Moya a Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 62 Racumin Pasta, en un área de 1,500 m2.
Metro Oceanía	B	Río Consulado y Av. 608, Col. Pensador Mexicano, Alcaldía Gustavo A. Madero	Desratización 35 Racumin Pasta, en un área de 800 m2.
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 75 Racumin Pasta, en un área de 560 m2.
General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 48 Racumin Pasta, en un área de 1,200 m2.
San Ciprian	B	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 52 Racumin Pasta, en un área de 1,200 m2.
Exterior del Metro Candelaria	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprian y General Anaya, Col. Unidad Habitacional Candelaria de los Patos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 65 Racumin Pasta, en un área de 1,140 m2.
Exterior del Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 46 Racumin Pasta, en un área de 8,200 m2.
Eje 1 Oriente	B	De Eje 1 Norte a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 185 Racumin Pasta, en un área de 3,800 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Plaza San Fernando	B	Eje 1 Poniente, Guerrero, San Fernando, Puente de Alvarado, Col. Guerrero, Alcaldía Cuahuhtémoc	Desratización 32 Racumin Pasta, en un área de 2,500 m2.
Vialidad	A	Eje 1 Poniente Rosales, Puente de Alvarado a Reforma, Col. Centro, Alcaldía Cuahuhtémoc	Desratización 28 Racumin Pasta, en un área de 900 m2.
Vialidad	A	Balderas, Paseo de la Reforma a Av. Juárez, Col. Centro, Alcaldía Cuahuhtémoc	Desratización 46 Racumin Pasta, en un área de 1,200 m2.
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuahuhtémoc	Desratización 68 Racumin Pasta, en un área de 33,000 m2.
Bodega de Limpieza Urbana	A	Av. Juárez No. 20, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuahuhtémoc	Desratización 18 Racumin Pasta, en un área de 200 m2.
Vialidad	A	San Pablo, Eje 1 Oriente, a José María Pino Suarez, Col. Centro, Alcaldía Cuahuhtémoc	Desratización 46 Racumin Pasta, en un área de 1,800 m2
Vialidad	A	José María Izazaga, Isabel la Católica a Bolívar, Col. Centro, Alcaldía Cuahuhtémoc	Desratización 38 Racumin Pasta, en un área de 1,400 m2
Eje 1 Norte Mosqueta	A	Eje 1 Poniente Guerrero a Paseo de la Reforma, Lado Sur y Norte, Col. Guerrero, Alcaldía Cuahuhtémoc	Desratización 39 Racumin Pasta, en un área de 1,400 m2.
Roldán	B	De Fray Servando Teresa de Mier a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuahuhtémoc	Desratización 65 Racumin Pasta, en un área de 1,800 m2.
Plaza de la Constitución	A	20 De Noviembre, Pino Suarez, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuahuhtémoc	Desratización 30 Racumin Pasta, en un área de 46,800 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Plaza Teatro Blanquita	A	Eje Central Lázaro Cárdenas, Pensador Mexicano y Mina, Col. Centro, Alcaldía Cuahuhtémoc	Desratización 42 Racumin Pasta en un área de 1,800 m2.
Anillo de Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	Fray Servando y Calzada de la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 64 Racumin Pasta en un área de 650 m2.
Tramo	B	Av. Del Trabajo No. 28, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización y Fumigación 36 Rodilón Block 1,160 m2
Tiradero Clandestino	B	Plutarco Elías Calles y Congreso de la Unión, Col. Barrio Zapotla, Alcaldía Iztacalco	Desratización 45 Racumin Pasta, en un área de 580 m2.
Av. Morelos (Tramo)	B	De Congreso de la Unión a Calzada de la Viga, Col. Jamaica, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 58 Racumin Pasta, en un área de 85 m2.
Congreso de la Unión	B	De Emiliano Zapata a Herreros, (De Oriente a Poniente), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 84 Racumin Pasta, en un área de 100 m2.
Congreso de la Unión	B	De Fray Servando a Sidar y Roviroza, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 66 Racumin Pasta, en un área de 1,200 m2.
Exterior del Mercado Jamaica	B	Congreso de la Unión (Lado Oriente), Calzada Mixiuhca, y Melchor Ocampo, Col. Magdalena Mixiuhca, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 46 Racumin Pasta, en un área de 650 m2.
Exterior del Metro Moctezuma	B	Calzada Zaragoza y Troncoso, Col. Unidad Kennedy, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 38 Racumin Pasta, en un área de 260 m2

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Parque Periodistas	B	Fray Servando Teresa de Mier, Esq. Congreso de la Unión, Col. Parque, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 32 Racumin Pasta, en un área de 1,600 m <sup>2</sup>
Vialidad	B	Av. Del Trabajo, de Gorostiza a Panaderos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 27 Rodilón Block, en un área de 680 m <sup>2</sup>
Congreso de la Unión	B	De Canal del Norte a Aluminio, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 30 Rodilón Block, en un área de 380 m <sup>2</sup>
Congreso de la Unión	B	De Calle Circunvalación a Eje 2 Norte, Col. Michoacana, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 28 Rodilón Block, en un área de 350 m <sup>2</sup>
Tiradero Clandestino	B	Congreso de la Unión, Herreros a Hortelanos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 27 Rodilón Block, en un área de 680 m <sup>2</sup>
Tiradero Clandestino	B	Congreso de la Unión, Esq. Hortelanos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 40 Rodilón Block, en un área de 100 m <sup>2</sup>
Canal del Norte	B	Congreso de la Unión, de Plomeros a Eje 2 Norte, Col. Michoacán, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 36 Rodilón Block, en un área de 100 m <sup>2</sup>
Canal del Norte	B	De Bonanza a Eje 2 Oriente Congreso de la Unión, Col. Ampliación Michoacana, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 36 Rodilón Block, en un área de 1,750 m <sup>2</sup>
Congreso de la Unión (Camellón)	B	De Aluminio a Estaño, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 40 Rodilón Block, en un área de 350 m <sup>2</sup>

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Aluminio	B	De Congreso de la Unión a Pabellón, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 38 Rodilón Block, en un área de 380 m <sup>2</sup>
Exterior del Mercado del Rastro	B	Ing. Eduardo Molina, Aluminio, Sorpresa y Estaño, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 28 Rodilón Block, en un área de 2,150 m <sup>2</sup>
Av. Del Trabajo	B	De Panaderos a Mecánicos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 45 Rodilón Block, en un área de 850 m <sup>2</sup>
Parque Sin Número	A	Caridad, Manuel Doblado y Obreros, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 38 Rodilón Block, en un área de 220 m <sup>2</sup>
Eje 2 Norte	B	Esquina Eje Central Lázaro Cárdenas, Col. Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 36 Rodilón Block, en un área de 350 m <sup>2</sup>
Tiradero Clandestino No. 62	B	Eje 1 Oriente, Esquina Constancia, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 26 Rodilón Block, en un área de 100 m <sup>2</sup>
Vialidad	B	Eje 1 Oriente, Esquina Caridad, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 28 Rodilón Block, en un área de 250 m <sup>2</sup>
Tiradero Clandestino No. 64	B	Eje 1 Oriente, Manuel Doblado, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 22 Rodilón Block, en un área de 100 m <sup>2</sup>
Tiradero Clandestino	B	Av. Del Trabajo y González Ortega, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 30 Rodilón Block, en un área de 100 m <sup>2</sup>


## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas de indicadores

### LAVADO



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas de indicadores

### BARRIDO MANUAL

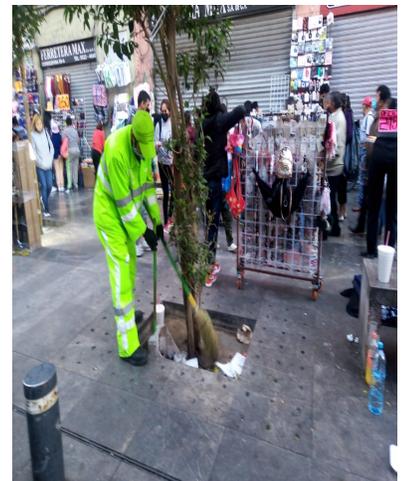

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas de indicadores

### RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas de indicadores

### RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



# SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas de indicadores

## LAVADO DE PAPELERAS





## RETIRO DE PROPAGANDA



# SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas de indicadores


## RETIRO DE CHICLES

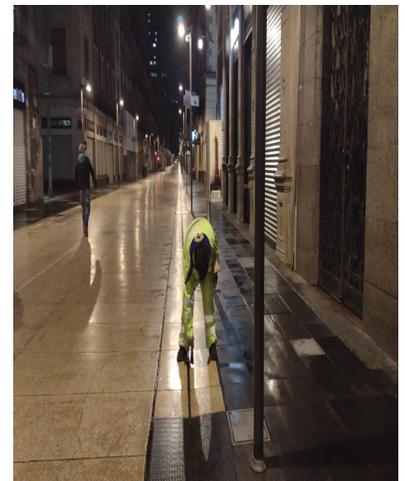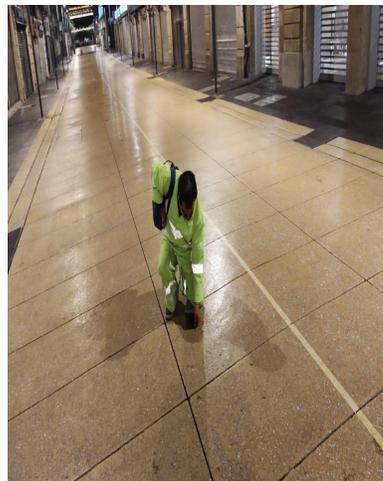

## SOS-DGSUS Recolección Zona I | Seguimiento de indicadores


# 165,416 m<sup>3</sup>

enero - noviembre

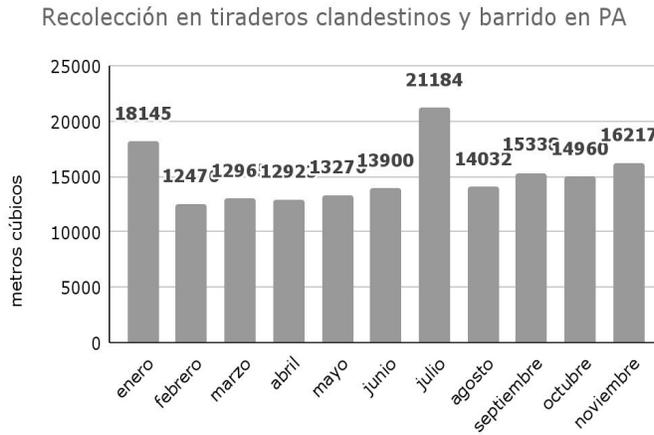

# 53,626.9 m<sup>2</sup>


enero - noviembre

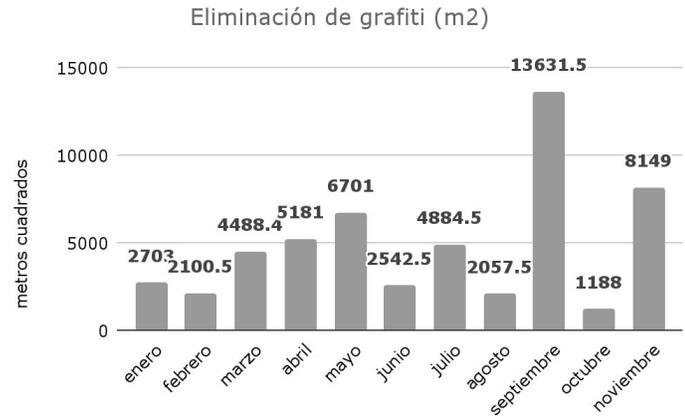

## SOS-DGSUS Recolección Zona I | Seguimiento de indicadores


# 95,383

enero - noviembre

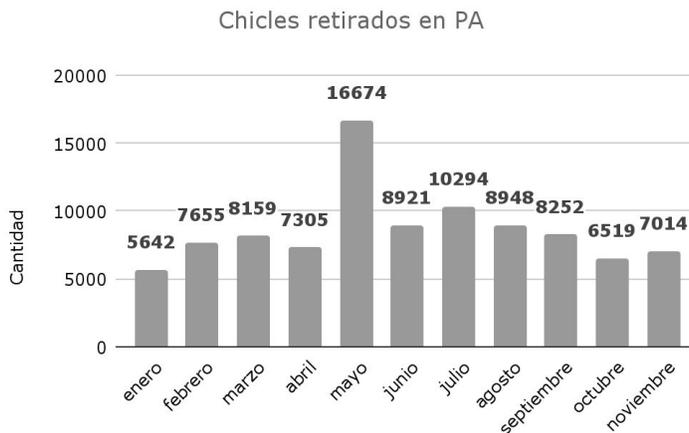

# 69,580

enero - noviembre

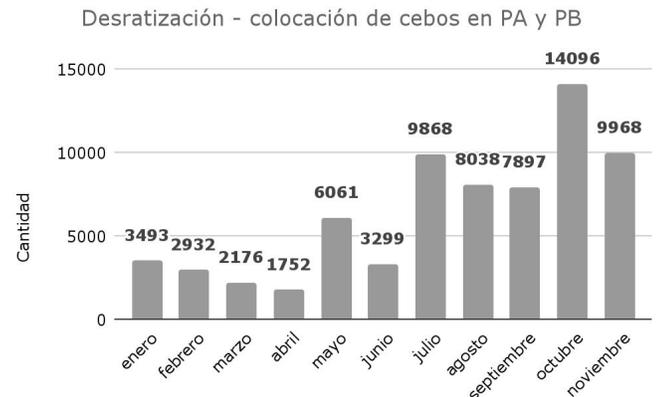


## SOS-DGSUS Recolección Zona I | Seguimiento de indicadores

El equivalente a  
**17,037 km<sup>2</sup>**

enero - noviembre


Lavado de Plazas, calles y corredores peatonales y semipeatonales en PA

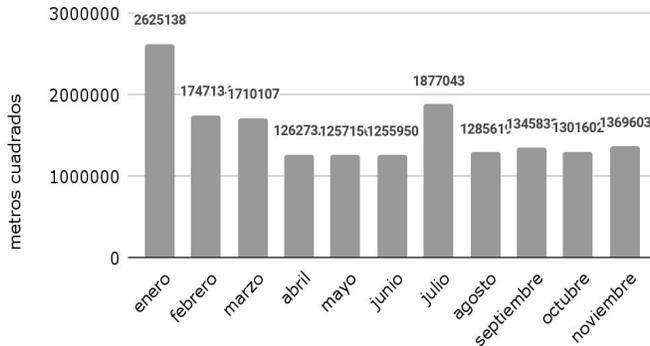

**27,209**

piezas de propaganda retirada  
enero - noviembre

Retiro de propaganda



\* En junio 2063 piezas fueron de **propaganda electoral**

# Sistema de Transporte Colectivo Metro

## STC Metro | Indicadores


Indicador	Periodicidad	al 26/11/2021	Próximo reporte
75 Escaleras eléctricas en las 29 estaciones del Centro Histórico	Quincenal	5 escaleras detenidas (en mantenimiento)	14 de diciembre
19 Elevadores en estaciones del Centro Histórico		1 elevador detenido	

## STC Metro | Seguimiento de indicadores

# 92.56%

de eficiencia en funcionamiento de escaleras eléctricas CH  
enero - noviembre


Funcionamiento de escaleras instalados en 29 estaciones de metro en Centro Histórico




# 95.32%

de eficiencia en funcionamiento de elevadores CH  
enero - noviembre

Funcionamiento de elevadores instalados en 29 estaciones de metro en Centro Histórico



# Metrobús



Metrobús | **Corredor Centro Histórico Inaugurada el 1 de abril del 2012**  
| Cuenta con 62 parabuses y 3 terminales.

CONCEPTO	PENDIENTES	REALIZADOS
Rehabilitación de Guarnición y Recinto en para bus.	18 estaciones	94%
Rehabilitación de Estelas informativas.	57 piezas	48 piezas
Suministro de Estelas informativas.	6 piezas	6 piezas
Colocación de Bolardos .	49 piezas	82%
Colocación de Elementos de Confinamiento.	5,880 piezas	5,762 piezas
Balizamiento general	73,795.15 ml	80%



**Metrobús | Para bus al 90% pero que faltan bolardos en cruces peatonales.**



**Glorieta de Colón  
México Tenochtitlán  
Plaza de la República  
Defensoría Pública**



**Metrobús | Para bus al 90% pero que faltan bolardos en cruces peatonales.**




**Alcaldía Cuauhtemoc  
Vocacional 5  
Juárez  
Eje Central**



# Metrobús | Seguimiento de indicadores

## Rehabilitación de Metrobús

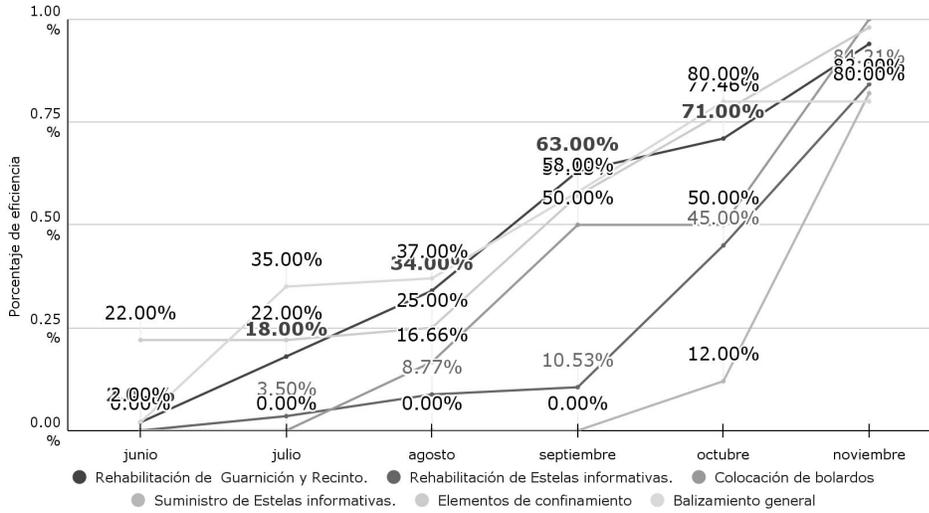

**89.70%**  
**avance de proyecto\***  
junio- noviembre

\*SE INICIARON TRABAJOS EN JUNIO 2021

# Comisión Federal de Electricidad

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena del 16 al 30 de noviembre de 2021	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de robos registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	0	14 de diciembre 2021
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	37	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	11	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	1	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	4	

## Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

### Anexo 1. Detalle de ubicaciones Número de robos registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO

## Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

### Anexo 2. Detalle de ubicaciones

#### Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
VENUSTIANO CARRANZA	EJE CENTRAL	LAS CRUCES	SIN DATO	COL. CENTRO	10	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
TACUBA	EJE CENTRAL	MONTE DE PIEDAD	SIN DATO	COL. CENTRO	9	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
REPÚBLICA DE CUBA	EJE CENTRAL	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL. CENTRO	7	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
DONCELES	EJE CENTRAL	PALMA	SIN DATO	COL. CENTRO	11	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
				<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	

## Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

### Anexo 3. Detalle de ubicaciones

#### Número de atenciones de fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
REP. DE COLOMBIA	ESQUINA	RODRÍGUEZ PUEBLA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
LEONA VICARIO	MIXCALCO	SAN ILDEFONSO	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
INCAS 17	REP. DE PERÚ	REP. DE HONDURAS	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE PERÚ 131	REP. DE ARGENTINA	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE PERÚ 100	ALLENDE	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE BOLIVIA 4	REP. DE ARGENTINA	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE ARGENTINA 34	REP. DE VENEZUELA	REP. DE COLOMBIA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE BRASIL 28	CALLEJÓN DE LOS MILAGROS	BELISARIO DOMÍNGUEZ	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
LAZARÍN DEL TORO 17	REP. DE CHILE	ALLENDE	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
INCAS 8	REP. DE PERÚ	REP. DE HONDURAS	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE ARGENTINA 64	REP. DE PERÚ	REP. DE BOLIVIA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	

## Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

### Anexo 4. Detalle de ubicaciones Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
SAN COSME	ESQUINA	MIGUEL SHULTZ	SIN DATO	COL. SAN RAFAEL	1	REPARACIÓN DE TAPA EN BÓVEDA
				TOTAL	1	

## Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

### Anexo 5. Detalle de ubicaciones Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública


DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
LAZARÍN DEL TORO 17	REP. DE CHILE	ALLENDE	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE ARGENTINA 64	REP. DE PERÚ	REP. DE BOLIVIA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
LEONA VICARIO	MIXCALCO	SAN ILDEFONSO	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE ARGENTINA 34	REP. DE VENEZUELA	REP. DE COLOMBIA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	4	

Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de indicadores

**20**

**Robos de elementos de infraestructura**  
enero - noviembre


Robos registrados de elementos de infraestructura

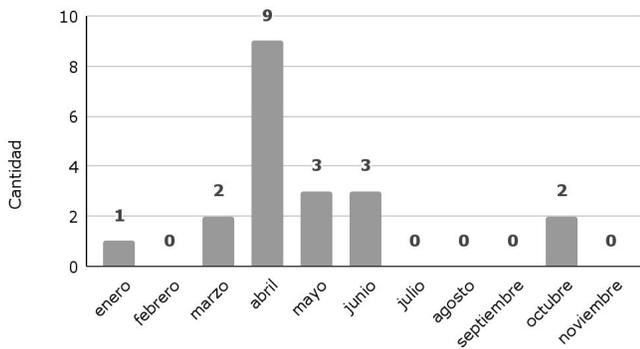

**875**

**bóvedas con acciones de desagüe**  
enero - noviembre

Bóvedas atendidas con acciones de desagüe

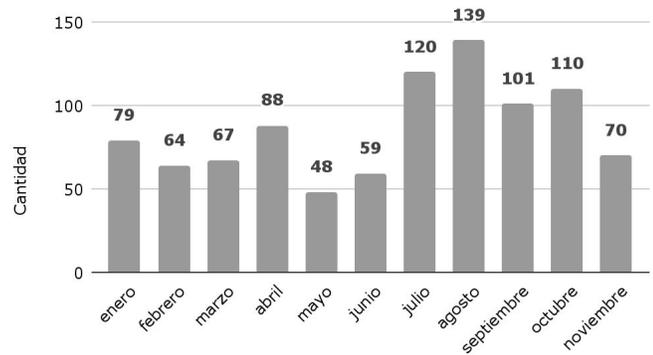


Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de indicadores

**179**

**Atenciones de fallas en suministro de energía eléctrica**  
enero - noviembre


Atenciones de fallas en el suministro de energía eléctrica

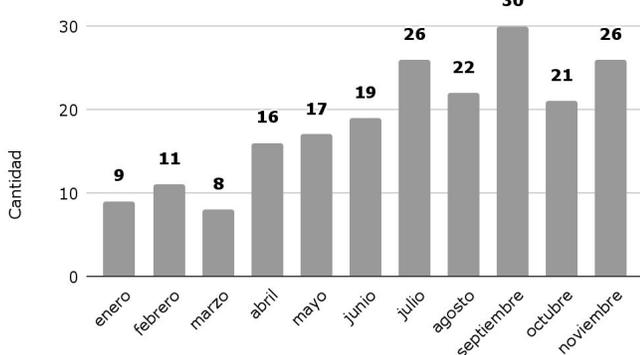

**72**

**tapas de registros y/o bóvedas reparadas**  
enero - noviembre

Tapas de registros y/o bóvedas reparadas

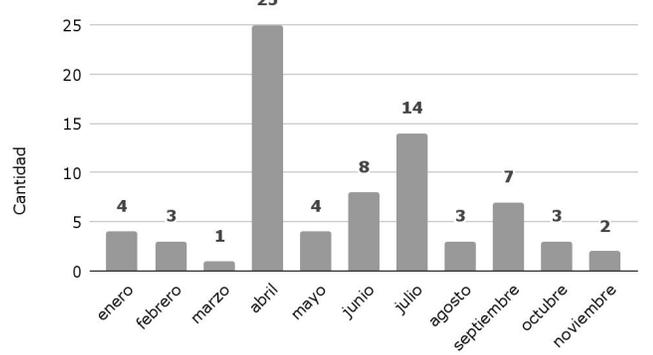


## Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de indicadores

# 167

obras de mantenimiento que implican rompimiento  
enero - noviembre

Mantenimiento que implique rompimiento en vía pública

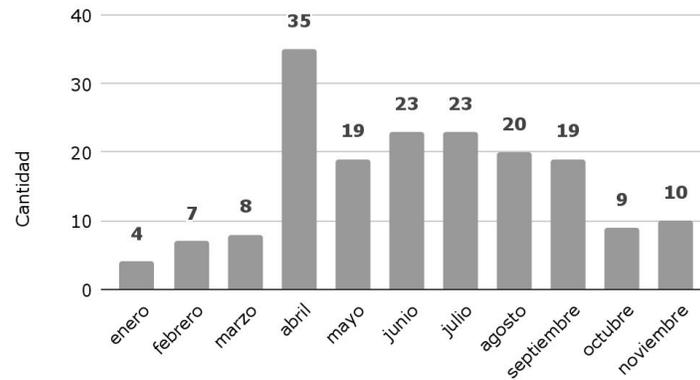

## Comisión Nacional de Vivienda



# REHABILITACIÓN DE VIVIENDA CON VALOR PATRIMONIAL “CIUDAD DE MÉXICO”

## PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 CONAVI



SC/DGSMPC/COLAB/01136/2020 CIUDAD DE MÉXICO SC/DGSMPC/COLAB/01313/2020 PRIMERAS ETAPAS					
NO. ACCIONES	ENTIDAD	MONTO TOTAL	% PROYECTO	INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA
8	CIUDAD DE MÉXICO	\$ 17,081,265.00	100%	FEBRERO-JUNIO 2021	JULIO-NOVIEMBRE 2021

SC/DGSMPC/COLAB/01136/2020 CIUDAD DE MÉXICO							
NO.	ESTADO	MONTO TOTAL	MONTO PROYECTO	% PROYECTO	MONTO DE OBRA	% AVANCE FÍSICO 30 ABRIL 2021	SUPERVICIÓN
1	MAGNOLIA #162	\$ 4,000,000.00	\$ 239,520.00	100%	\$ 3,604,782.34	85%	\$ 150,199.26
2	MANZANARES # 21	\$ 3,500,000.00	\$ 222,717.04	100%	\$ 3,140,354.36	87%	\$ 127,764.60
3	MINA # 42	\$ 900,000.00	\$ 125,743.41	100%	\$ 741,526.84	100%	\$ 30,896.95
4	MINA # 106	\$ 1,799,865.00	\$ 249,671.77	100%	\$ 1,472,350.11	85%	\$ 61,347.92
5	PENSADOR MEXICANO # 12	\$ 1,881,400.00	\$ 400,350.00	100%	\$ 1,416,529.54	100%	\$ 59,022.06
6	SEMINARIO # 12	\$ 300,000.00	\$ 44,725.08	100%	\$ 243,304.44	100%	\$ 10,137.68
7	SOLEDAD # 45	\$ 4,200,000.00	\$ 373,637.94	100%	\$ 3,643,396.29	99%	\$ 151,808.18
8	REPÚBLICA DE VENEZUELA # 93	\$ 500,000.00	\$ 69,230.22	100%	\$ 408,260.51	100%	\$ 17,010.87
<b>TOTAL CONVENIO</b>		<b>\$ 17,081,265.00</b>					






## MAGNOLIA # 162, INICIO DE TRABAJOS 22/02/2021



REINTEGRACIÓN DE ENLADRILLADO DE CUBIERTA



REINTEGRACIÓN DE APLANADOS Y PINTURA DE MUROS



## MANZANARES # 21 INICIO DE TRABAJOS 02/02/2021



LIBERACION DE ENTREPISO DE VIVENDA



INTEGRACIÓN DE ENTREPISO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA



LIMPIEZA DE VIGAS EXISTENTES Y APLICACIÓN DE PRESERVADOR DE MADERA



REINTEGRACIÓN DE APLANADOS Y LIMPIEZA DE CANTERA, LADRILLO Y REJUNTEO





## MINA # 106, INICIO DE TRABAJOS EL 12/04/2021



LIBERACIÓN DE APLANADOS EN MUROS



REMAMPOSTEO EN MUROS CAPUCHINOS



REINTEGRACIÓN DE APLANADOS EN MUROS REFORZADOA CON MALLA ELÉCTROSOLDADA



REINTEGRACIÓN DE APLANADOS EN MUROS REFORZADOA CON MALLA ELÉCTROSOLDADA



## SOLEDAD # 45 INICIO DE TRABAJOS 02/06/2021




HABILITADO DE APUNTALAMIENTO E INTEGRACIÓN DE CONTRAFUERTE EN PLANTA ALTA



INTEGRACIÓN DE CONTRAFUERTE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON CEMENTO- CAL- ARENA



## CONAVI | Seguimiento de indicadores

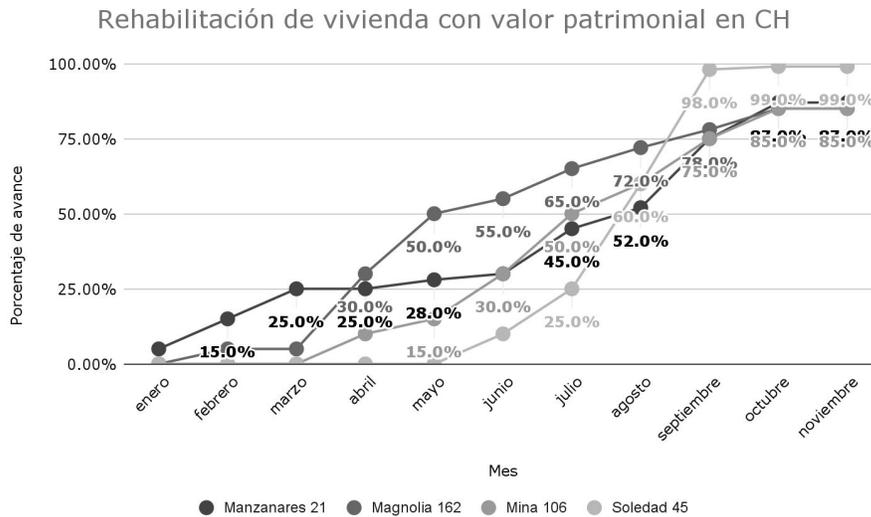

**95 %**  
avance promedio  
enero - noviembre

### Programa Nacional de Reconstrucción 2020

**04** proyectos concluidos

- Mina no. 42
- Pensador Mexicano no. 12
- Seminario no. 12
- Rep. de Venezuela no. 93

**04** proyectos en proceso

## Instituto Nacional de Antropología e Historia | Indicadores

Tema	Indicador	Quincena del 16/11 al 30/11	Próximo reporte
Obras	Número de trámites de <b>solicitud de autorización</b> de obra en inmuebles	7	14 de diciembre
Programa Ciudad al Aire Libre	Número de trámites de <b>solicitud de autorización</b> de colocación de enseres	2	
Obras	Número de <b>autorizaciones</b> de obras emitidas en inmuebles	15	
Programa Ciudad al Aire Libre	Número de <b>autorizaciones</b> emitidas para la colocación de enseres	0	

143

## Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

### Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
16/11/2021	FRANCISCO I. MADERO	71	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE LA LIMPIEZA DE MARQUESINAS CAMBIO DE LAMPARAS RESANE DE MUROS ASÍ COMO APLICACIÓN DE PINTURA	Obra menor
16/11/2021	16 DE SEPTIEMBRE	82	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL DE FACHADA	Obra menor
16/11/2021	EJE CENTRAL	15	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN FACHADA	Obra menor
16/11/2021	JOSE MARÍA IZAZAGA	137	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE LA LIMPIEZA DE MARQUESINA RESANE DE MUROS, PINTURA Y CAMBIO DE LAMPARAS	Obra menor
16/11/2021	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS	13	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE FACHADA LIMPIEZA, RESANE Y APLICACIÓN DE PINTURA, CAMBIO DE LUMINARIAS SIMILARES A LAS EXISTENTES	Obra menor
16/11/2021	FRANCISCO I. MADERO	71	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE LA LIMPIEZA DE MARQUESINAS CAMBIO DE LAMPARAS RESANE DE MUROS ASÍ COMO APLICACIÓN DE PINTURA	Obra menor

## Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

### Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
23/11/2021	SAN ILDEFONSO	30	CENTRO HISTÓRICO	Trabajos de Mantenimiento de la Fachada principal: liberación y reintegración de aplanados en mal estado. Inyección de grietas. Reintegración de toldos de lona. Mantenimiento a las carpinterías y a las herrerías. Reintegración de piezas de cantera. Eliminación de flora parásita. Aplicación de pintura a la cal. Aplicación de hidrofugante en elementos de cantera. Injertos y re-moldeos en elementos de cantera. Aplicación de cera en el portón de madera de acceso.	Obra menor

### Solicitudes de Colocación de enseres Programa Ciudad al Aire Libre

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
19/11/2021	PALMA	9	CENTRO HISTÓRICO	Colocación de enseres en vía publica en el centro histórico	Obra menor
24/11/2021	PALMA	9	CENTRO HISTÓRICO	Colocación de enseres en vía publica	Obra menor

## Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

### Autorizaciones de obra

AUTORIZACIÓN	DOMICILIO	MOTIVO	TIPO
453/21	EJE 1 SUR DR. RÍO DE LA LOSA 250	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS.	OBRA MAYOR
454/21	VENUSTIANO CARRANZA 92	RETIRO Y COLOCACIÓN DE CORTINAS METÁLICAS.	OBRA MENOR
456/21	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN SN	INSTALACIÓN DE LAMBRIN.	OBRA MENOR
460/21	REPÚBLICA DE PARAGUAY 35-37	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
461/21	REPÚBLICA DE PARAGUAY 37	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
462/21	REPÚBLICA DE BRASIL 74	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
466/21	AV. JUÁREZ 52	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE FACHADA.	OBRA MENOR
467/21	REPÚBLICA DE ECUADOR 113	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN, INMUEBLE HISTORICO.	OBRA MAYOR

## Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

### Autorizaciones de obra


AUTORIZACIÓN	DOMICILIO	MOTIVO	TIPO
468/21	SAN ILDEFONSO 33	IMPLEMENTACIÓN DE CONECTIVIDAD MOVIL.	OBRA MENOR
470/21	REPÚBLICA DEL SALVADOR 70	ADECUACIÓN AL INTERIOR DEL TEMPLO.	OBRA MAYOR
471/21	VENUSTIANO CARRANZA 92	ILUMINACIÓN EN LA FACHADA POR TEMPORADA NAVIDEÑA (3 MESES).	OBRA MENOR
475/21	PALMA 43	CAMBIO DE TUBERIA.	OBRA MENOR
476/21	BOLIVAR 38	CAMBIO DE CORTINAS METÁLICAS.	OBRA MENOR
477/21	BUCARELI 38	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
478/21	LIC. PRIMO VERDAD 10	COLOCACIÓN DE CAPELO.	OBRA MENOR

## Instituto Nacional de Antropología e Historia | Seguimiento de indicadores

# 150

solicitudes de autorización de obra  
enero - noviembre


Solicitudes de autorización de obra en inmuebles

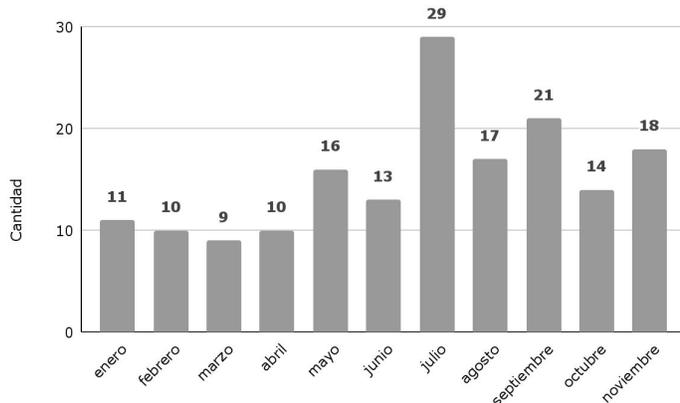

# 245

autorizaciones de obra  
enero - noviembre

Autorizaciones de obra para inmuebles

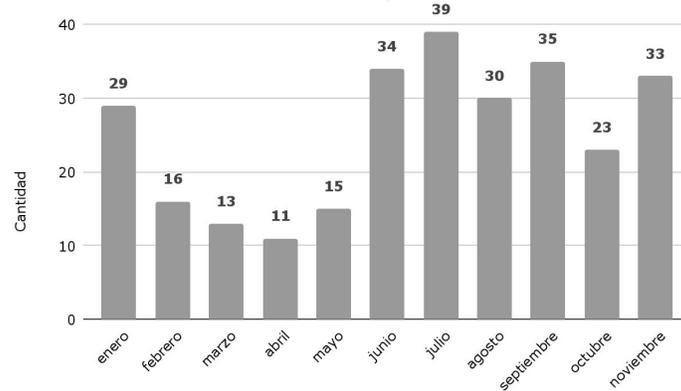


Instituto Nacional de Antropología e Historia | Seguimiento de indicadores

**93**

**Solicitudes de Colocación de enseres en vía pública**  
enero - noviembre



Solicitud de colocación de enseres - Programa Ciudad al Aire Libre

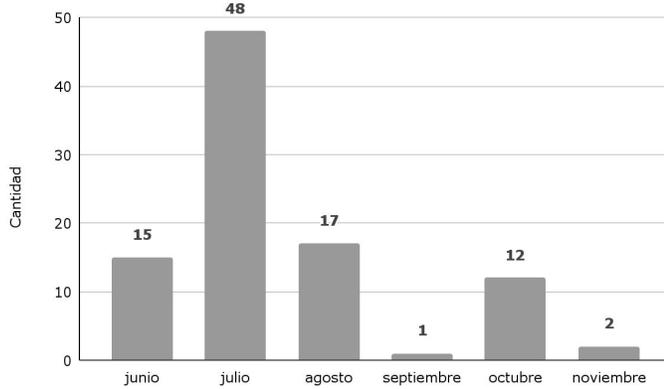

**86**

**Autorizaciones para Colocación de enseres**  
enero - noviembre

Autorización de colocación de enseres - Programa Ciudad al Aire Libre

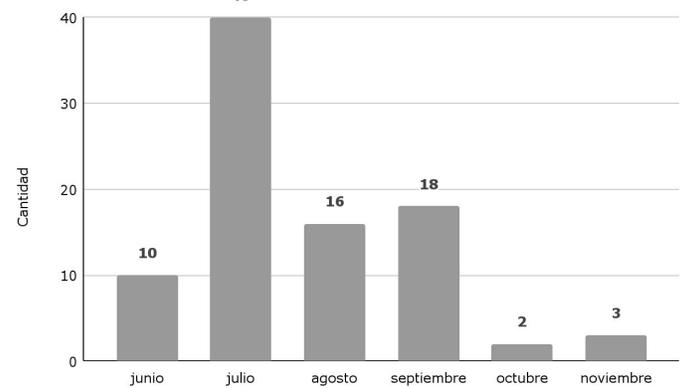

**Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura**



## Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura | Indicadores

Tema	Indicador	Quincena al 30/11	Próximo reporte	Observaciones
Obras	Número de solicitudes de autorización	12	04 de enero	<ul style="list-style-type: none"> <li>06 consultas de calidad artística</li> <li>06 solicitudes de obra</li> </ul>
Obras	Número de autorizaciones de obra	06	04 de enero	<ul style="list-style-type: none"> <li>06 obras menores</li> </ul>

151

## Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura | Indicadores

### Consultas de Calidad Artística

UBICACIÓN	CATÁLOGO
Ayuntamiento 21	No Incluido
Ayuntamiento 25	Incluido
Allende 24	Incluido
Independencia 31	Colindante
Corregidora 38	No Incluido
Motolinia 40	Incluido



Ayuntamiento 21



Ayuntamiento 25



Allende 24



Independencia 31



Corregidora 38



Motolinia 40

## Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura | Indicadores

### Autorizaciones de Obra

UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	DESCRIPCIÓN
Mina No. 52	Menor	Adecuación de local comercial
Isabel la Católica No. 12	Menor	Reparación de puertas de acceso
República de Cuba No. 92	Menor	Restauración de yeserías y molduras
Enrico Martinez No. 35	Menor	Mejoramiento de acabados en fachada
Cinco de Mayo No. 02	Menor	Restauración de fachada
Cinco de mayo No. 12	Informativo	Colocación de anuncio comercial



Mina 52



Isabel la Católica 12



República de Cuba 92



Enrico Martínez 35



Cinco de Mayo 02




Cinco de Mayo 19

## Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura | Seguimiento de Indicadores

# 68

consultas de calidad artística  
enero - noviembre


Consulta de calidad artística



# 57

obras autorizadas  
enero - noviembre

Obras autorizadas

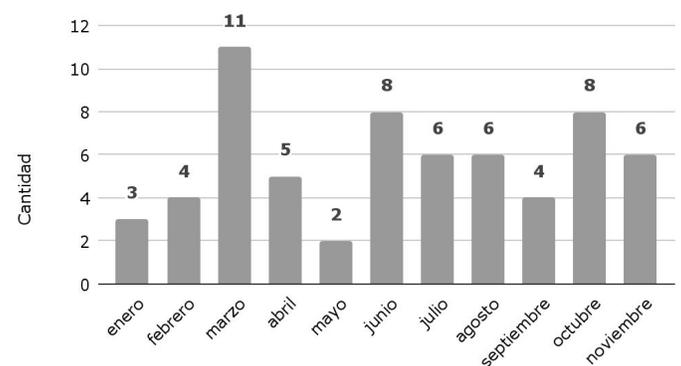

# Instituto de Vivienda de la Ciudad de México



## INVI | Indicadores


PREDIO	COLONIA	ACCIONES	ESTATUS DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE
2 DE ABRIL No. 42	GUERRERO	11	OBRA EN PROCESO	80.37%
ACADEMIA No.33	CENTRO	20	OBRA EN PROCESO	86.70%
<b>ARCOS DE BELÉN No. 49</b>	<b>CENTRO</b>	<b>24</b>	<b>OBRA CONCLUIDA</b>	<b>100.00%</b>
EJE 1 PONIENTE GUERRERO No. 164	GUERRERO	58	OBRA EN PROCESO	88.22%
<b>EJE 1 PONIENTE GUERRERO No. 110</b>	<b>BUENAVISTA</b>	<b>37</b>	<b>OBRA CONCLUIDA</b>	<b>100.00%</b>
MAGNOLIA No. 12 (ANTES No. 12 Y 16)	GUERRERO	19	OBRA EN PROCESO	91.43%
REPÚBLICA DE ARGENTINA No. 58	CENTRO	16	POR INICIAR	0.00%
REPÚBLICA DE ARGENTINA No. 87	CENTRO	25	OBRA EN PROCESO	99.80%
REPÚBLICA DE PERÚ No. 40	CENTRO	33	OBRA EN PROCESO	93.61%

# INVI | Indicadores

PREDIO	COLONIA	ACCIONES	ESTATUS DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE
<b>ALLENDE No. 46</b>	<b>CENTRO</b>	<b>32</b>	<b>OBRA CONCLUIDA</b>	<b>100.00%</b>
LERDO No. 12	GUERRERO	53	POR INICIAR	0.00%
PEDRO MORENO No. 154	GUERRERO	18	POR INICIAR	0.00%
TALAVERA No. 24	CENTRO	63	POR INICIAR	0.00%
VIOLETA No. 15	GUERRERO	26	POR INICIAR	0.00%
PEDRO MORENO No. 156	GUERRERO	18	POR INICIAR	0.00%
<b>LECUMBERRI No. 66</b>	<b>ZONA CENTRO</b>	<b>54</b>	<b>OBRA CONCLUIDA</b>	<b>100.00%</b>
BELISARIO DOMINGUEZ No. 78	CENTRO	23	OBRA EN PROCESO	98.14%
NACIONAL No. 57	MORELOS	42	OBRA EN PROCESO	85.48%



# INVI | Seguimiento de Indicadores

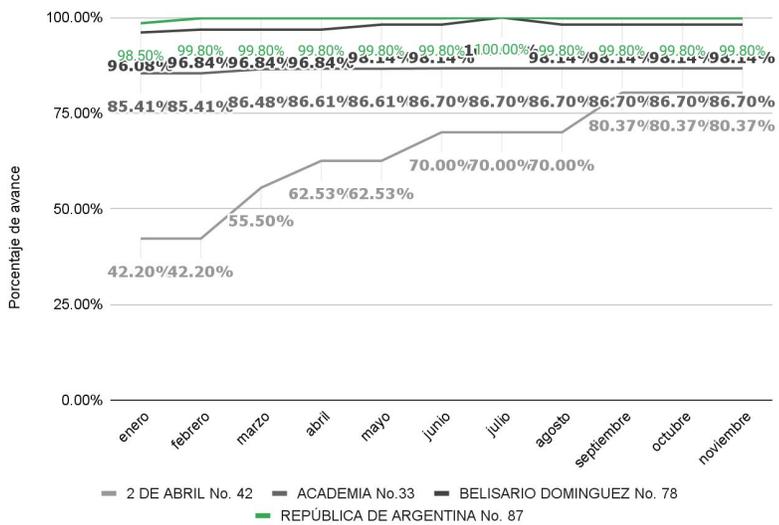

**91.77%**  
avance global  
enero - noviembre

**04** Obras de vivienda terminadas

- Arcos de Belén No. 49
- Eje 1 Pte. Guerrero No. 110
- Allende No. 46
- Lecumberri No. 66

**08** Obras en proceso

**06** Obras por iniciar



# Comisión para la Reconstrucción




## COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN | Indicadores

### JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

#### INMUEBLES CON RECURSOS DE LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO DENTRO DE LAS ZONAS DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTORICO

No.	ESTATUS ACTUAL	INTERVENCIÓN	CALLE	N.º. EXTERIOR	Edificio / Torre	COLONIA	ALCALDIA	C.P.	AVANCE FÍSICO
<b>MULTIFAMILIARES</b>									
1	EN PROYECTO	RECONSTRUCCION	CALLEJÓN DE LA IGUALDAD	32	-	CENTRO	CUAUHTEMOC	06080	EN PROYECTO
2	EN OBRA	REHABILITACION	MANUEL MARQUEZ STERLING	34	-	CENTRO	CUAUHTEMOC	06010	54.58%
3	EN PROYECTO	REHABILITACION	REVILLA GIGEDO	78	-	CENTRO	CUAUHTEMOC	06070	INICIO DE OBRA HOY 30 - no v.- 2021
4	EN OBRA	REHABILITACION	CERRADA DE AGUSTIN DELGADO	11	A	TRANSITO	CUAUHTEMOC	06820	100.00%
5	EN PROYECTO	RECONSTRUCCION	SAN ANTONIO ABAD	39	-	OBRA	CUAUHTEMOC	03100	EN PROYECTO
6	CONCILIACIÓN SOCIAL	RECONSTRUCCION	LICENCIA DO PRIMO DE VERDAD	7	-	CENTRO	CUAUHTEMOC	03300	EN PROYECTO
<b>UNIFAMILIARES</b>									
7	EN PROCESO CANCELACIÓN.	RECONSTRUCCION	RIVAPALACIO	41	-	GUERRERO	CUAUHTEMOC	7420	FOLIO CANCELADO
<b>TEMPLO DE SAN FERNANDO REY</b>									
8	EN OBRA	REHABILITACION	GUERRERO	39	-	CENTRO	CUAUHTEMOC	6300	34.00%

## COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN | Indicadores

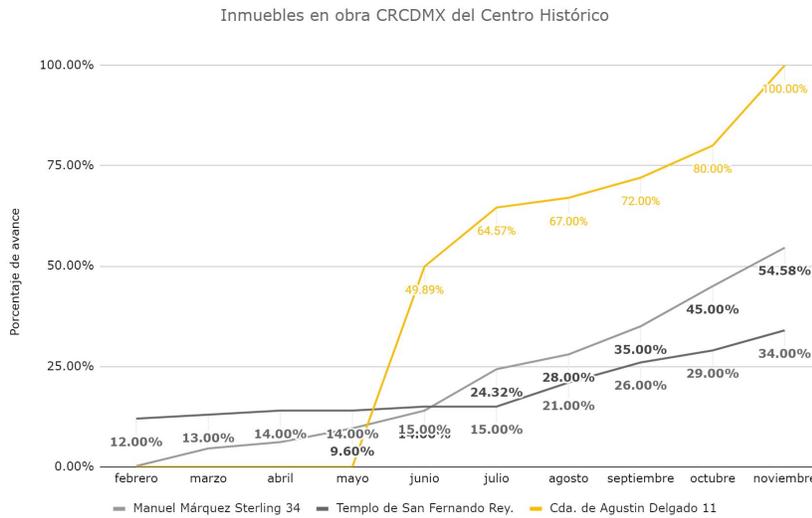


**62.86%**  
**avance global**  
 enero - noviembre

**Procuraduría Social de la  
 Ciudad de México**

# PROSOC | Indicadores


## LISTADO DEFINITIVO DE UNIDADES HABITACIONALES BENEFICIADAS RIPUH 2020

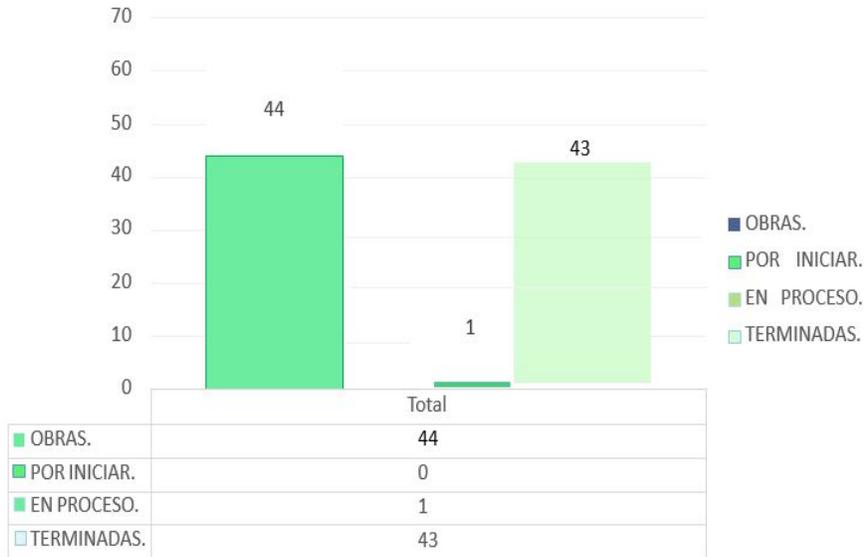


ALCALDÍA	No DE UNIDADES
CUAUHTÉMOC	<b>27</b>
VENUSTIANO CARRANZA	<b>17</b>

# PROSOC | Indicadores

## OBRAS CUAUHEMOC EJERCICIO 2020

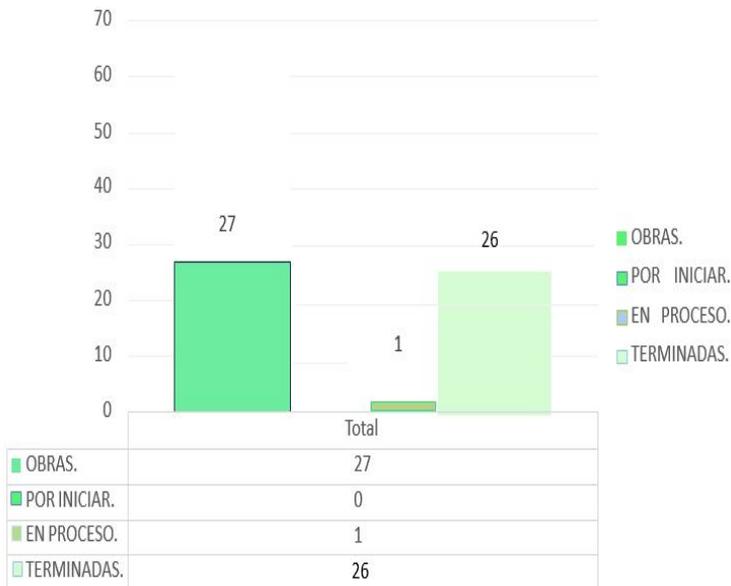

## OBRAS VENUSTIANO CARRANZA EJERCICIO 2020

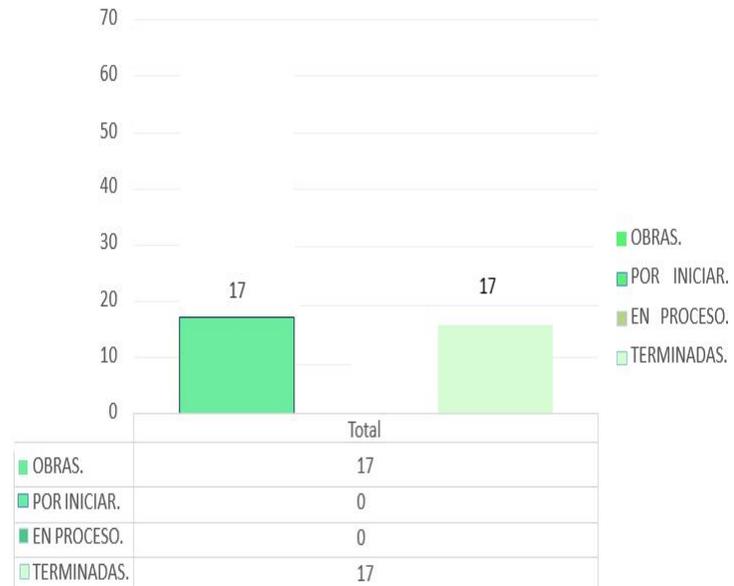

## PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Cuauhtémoc 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	LUIS MOYA 115	CENTRO	CUAUHEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
2	REPUBLICA DE VENEZUELA 77	CENTRO	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION	PROCESO	80%	A	NO CATALOGADA
3	JOSE JOAQUIN HERRERA 6	CENTRO	CUAUHEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	PROCESO	20%	A	NO CATALOGADA
4	MARQUEZ STERLING 2	CENTRO	CUAUHEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	PROCESO	90%	A	NO CATALOGADA
5	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 142	CENTRO	CUAUHEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
6	BELIZARIO DOMINGUEZ 17	CENTRO	CUAUHEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	PROCESO	40%	A	NO CATALOGADA
7	MARIANA DEL TORO 19	CENTRO	CUAUHEMOC	CALLES Y ANDADORES	POR INICIAR	0%	A	NO CATALOGADA

## PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Cuauhtémoc 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
8	ITURBIDE 18	CENTRO	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION	PROCESO	5%	A	NO CATALOGADA
9	VIZCAINAS 18	CENTRO	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION	PROCESO	40%	A	NO CATALOGADA
10	SOL 58 - 66	GUERRERO	CUAUHEMOC	ALBAÑILERIA	PROCESO	55%	B	NO CATALOGADA
11	3RA. CERRADA DE LIBERTAD 6	MORELOS	CUAUHEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
12	FLORIDA 57	MORELOS	CUAUHEMOC	CALLES Y ANDADORES	POR INICIAR	100%	B	NO CATALOGADA

## PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Cuauhtémoc 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
13	CALLEJON DEL NIÑO PERDIDO 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	POR INICIAR	0%	A	NO CATALOGADA
14	REPUBLICA DE CHILE 38	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	POR INICIAR	0%	A	NO CATALOGADA
15	BOLIVAR 158	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	PROCESO	50%	B	NO CATALOGADA
16	PRIMERA CERRADA DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 57	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA EN GENERAL	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
17	PENSADOR MEXICANO Y/O 2 DE ABRIL	GUERRERO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
18	RIVA PALACIO 45	GUERRERO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	PROCESO	30%	B	NO CATALOGADA

## PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Cuauhtémoc 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
19	CALLEJON CANAL 5	TRANSITO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	POR INICIAR	0%	B	CATALOGADA

## PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Cuauhtémoc 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
	LIBERTAD 21 C3	MORELOS	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	EN PROCESO	65%	B	NO CATALOGADA



## PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Cuauhtémoc 2020

### RIPUH- CUAUHTEMOC 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
-----	--------	---------	----------	----------	---------	----------------------	-----------	--------------



## PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Venustiano Carranza 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	CORREGIDORA 140	ZONA CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
2	HABITACIONAL CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA II	ZONA CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	CALLES Y ANDADORES	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
3	JOAQUIN HERRERA 64	ZONA CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
4	NACIONAL 52	ZONA CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
5	NACIONAL 32	ZONA CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
6	JARDINEROS 9	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
7	CIRCUNVALACION 48	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	PINTURA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA

## PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Venustiano Carranza 2020


NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
8	NACIONAL 31	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
9	VANEGAS ARROYO 30	MERCED BALBUENA	VENUSTIANO CARRANZA	IMPERMEABILIZACION	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA

## PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Venustiano Carranza 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
13	4TA LECUMBERRI 60	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	PROCESO	100%	B	NO CATALOGADA
14	NACIONAL 44	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	ESTRUCTURAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
15	NACIONAL 32	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (TINACOS)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
16	NACIONAL 52	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
17	VANEGAS ARROYO 30	MERCED	VENUSTIANO CARRANZA	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA

## PROSOC | Indicadores

LISTADO DE UNIDADES HABITACIONALES SELECCIONADAS  
RIPUH 2021

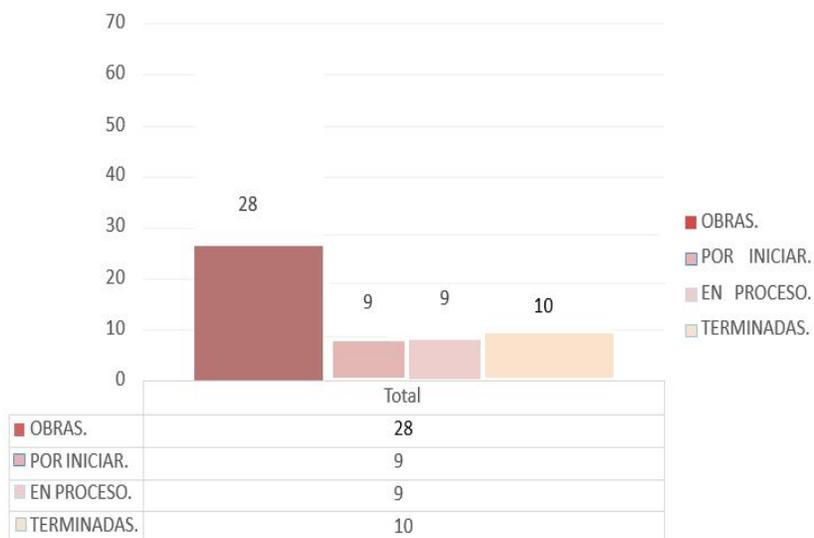

ALCALDÍA	No DE UNIDADES
CUAUHTÉMOC	<b>19</b>
VENUSTIANO CARRANZA	<b>9</b>

## PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Cuauhtémoc 2021

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	LUIS MOYA 115	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
2	REPUBLICA DE VENEZUELA 77	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	PROCESO	80%	A	NO CATALOGADA
3	JOSE JOAQUIN HERRERA 6	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	POR INICIAR	0%	A	NO CATALOGADA
4	MARQUEZ STERLING 2	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	PROCESO	60%	A	NO CATALOGADA
5	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 142	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
6	BELIZARIO DOMINGUEZ 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	PROCESO	20%	A	NO CATALOGADA
7	MARIANA DEL TORO 19	CENTRO	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	POR INICIAR	0%	A	NO CATALOGADA

## PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Cuauhtémoc 2021

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
8	ITURBIDE 18	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	PROCESO	5%	A	NO CATALOGADA
9	VIZCAINAS 18	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	PROCESO	5%	A	NO CATALOGADA
10	SOL 58 - 66	GUERRERO	CUAUHTEMOC	ALBAÑILERIA	PROCESO	50%	B	NO CATALOGADA
11	3RA. CERRADA DE LIBERTAD 6	MORELOS	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	POR INICIAR	100%	B	NO CATALOGADA
12	FLORIDA 57	MORELOS	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	POR INICIAR	100%	B	NO CATALOGADA

## PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Cuauhtémoc 2021

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
13	CALLEJON DEL NIÑO PERDIDO 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	POR INICIAR	0%	A	NO CATALOGADA
14	REPUBLICA DE CHILE 38	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	POR INICIAR	0%	A	NO CATALOGADA
15	BOLIVAR 158	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	PROCESO	50%	B	NO CATALOGADA
16	PRIMERA CERRADA DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 57	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA EN GENERAL	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
17	PENSADOR MEXICANO Y/O 2 DE ABRIL	GUERRERO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
18	RIVA PALACIO 45	GUERRERO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	PROCESO	10%	B	NO CATALOGADA


## PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Venustiano Carranza 2021

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	CORREGIDORA 140	ZONA CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
2	HABITACIONAL CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA II	ZONA CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	CALLES Y ANDADORES	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
3	JOAQUIN HERRERA 64	ZONA CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
4	NACIONAL 52	ZONA CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	PROCESO	80%	B	NO CATALOGADA
5	NACIONAL 32	ZONA CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
6	JARDINEROS 9	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
7	CIRCUNVALACION 48	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	PINTURA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA

## PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Venustiano Carranza 2021

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
8	NACIONAL 31	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
9	VANEGAS ARROYO 30	MERCED BALBUENA	VENUSTIANO CARRANZA	IMPERMEABILIZACION	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA

## PROSOC | Seguimiento de indicadores

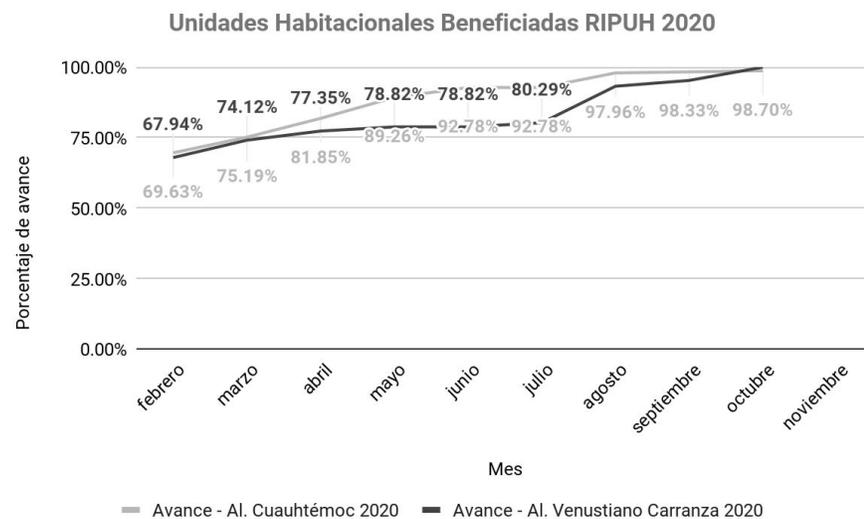

**28**  
Unidades habitacionales beneficiadas  
año 2020

**10** UNIDADES HAB. TERMINADAS  
**10** UNIDADES HAB. EN PROCESO OBRA  
**08** UNIDADES HAB. POR INICIAR

## PROSOC | Seguimiento de indicadores

# 27

Unidades habitacionales beneficiadas  
año 2021


- 18 en Al. Cuauhtémoc
- 09 en Al. Venustiano Carranza

**09** UNIDADES HAB. EN PROCESO OBRA

**10** UNIDADES HAB. POR INICIAR

**08** UNIDADES HAB. TERMINADAS

Unidades Habitacionales Beneficiadas RIPUH 2021

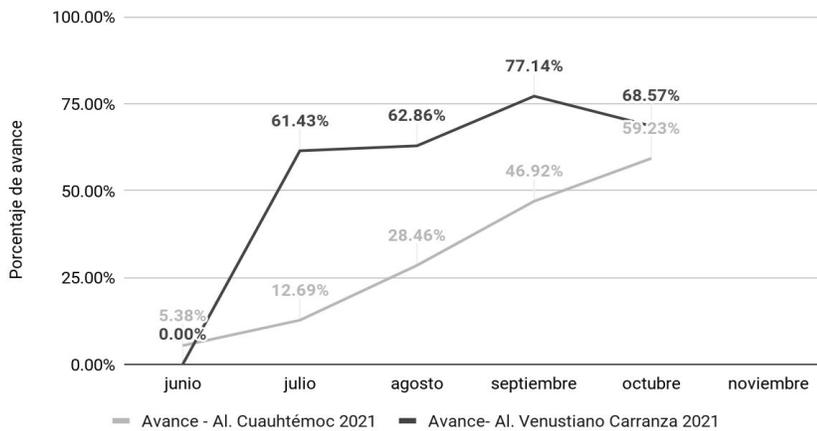

# Fideicomiso Centro Histórico

## FCH | Gráficas de obras en proceso.

### EJERCICIO 2020 – 2021.

CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH - FCHCM	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO <b>SAN JUAN DE DIOS</b>	65 Suspensión temporal	65 Suspensión temporal	SEPTIEMBRE 2021
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO DE <b>SANTA CATARINA</b>	53 Trabajos Reanudados	60	DICIEMBRE 2021

## FCH | Obras en Proceso. CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH - FCHCM.




Restitución de aplanados en muros.



Atención de grietas de extradós de bóveda principal.



## FCH | Seguimiento de indicadores.

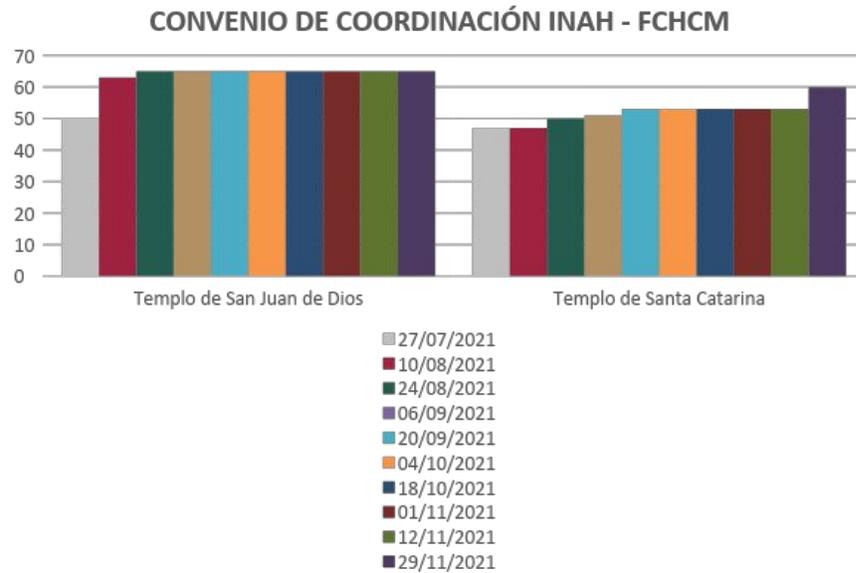


## FCH | Gráficas de obras en proceso.

### EJERCICIO 2020 – 2021.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL 'JARDÍN REGINA' . REGINA No. 40, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	95 <span style="color: red;">En espera de pago</span>	95 <span style="color: red;">En espera de pago</span>	JULIO 2021
SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B.	45	50	ENERO 2022

## FCH | Obras en Proceso. Convenio de Participación Conjunta Fideicomiso F/54 - FCHCM.




Integración de información gráfica en pendones restrictivos.

SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B

## FCH | Seguimiento de indicadores.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 - FCHCM

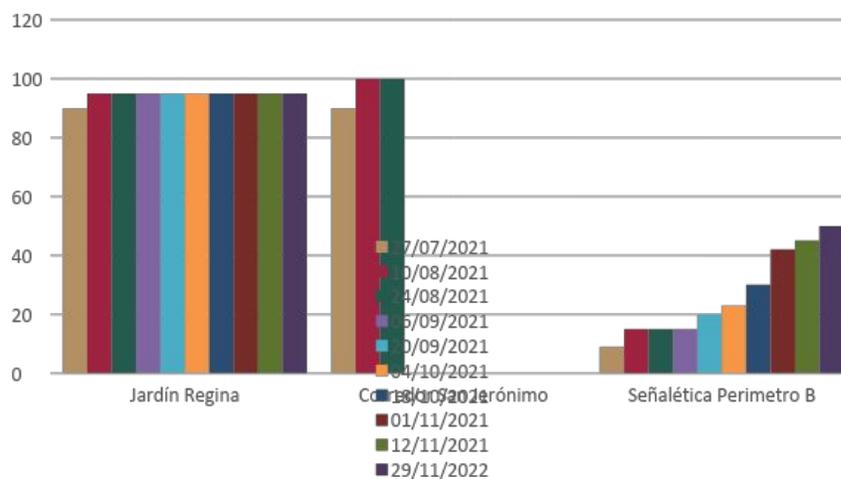

# FCH | Gráficas de obras en proceso.

## EJERCICIO 2020 – 2021.

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS FCHCM - AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO	AVANCE FÍSICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA REJA PERIMETRAL EN EL TEMPLO MAYOR.	18.5	30	SEPTIEMBRE 2021


# FCH | Obras en Proceso. REHABILITACIÓN DE ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS FCHCM - AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



REJA PERIMETRAL DEL TEMPLO MAYOR

## FCH | Seguimiento de indicadores.

### REHABILITACIÓN DE ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS FCHCM - AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

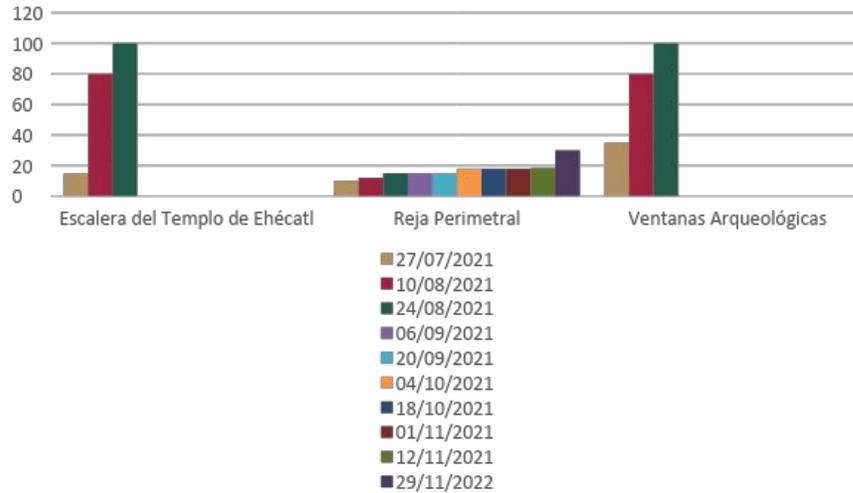

## FCH | Gráficas de obras en proceso.

### EJERCICIO 2020 – 2021.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN PARA AYUDAS SOCIALES.	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FACHADAS: OBRAJE No. 7, LAS CRUCES No. 5, RIVA PALACIO No. 45, RIVA PALACIO No. 46-48, RIVA PALACIO No. 49 y RIVA PALACIO No. 52.	71	92	OCTUBRE 2021

## FCH | Obras en Proceso. Ayudas Sociales.



**Las Cruces No.5.** Aplicación de pintura a la cal.



**Obraje No. 7.** Aplicación de pintura a la cal.



**Riva Palacio No. 52.** Rejunteo de cornisas.

### AYUDAS SOCIALES – FACHADAS.

## FCH | Obras en Proceso. Ayudas Sociales.



**Riva Palacio No. 46-48.** Aplicación de pintura a la cal.



**Riva Palacio No 45.** Aplicación de pintura a la cal.




**Riva Palacio No. 49.** Integración de pretil.

### AYUDAS SOCIALES – FACHADAS.

## FCH | Seguimiento de indicadores.

### ACUERDOS DE COLABORACIÓN PARA AYUDAS SOCIALES. FACHADAS.

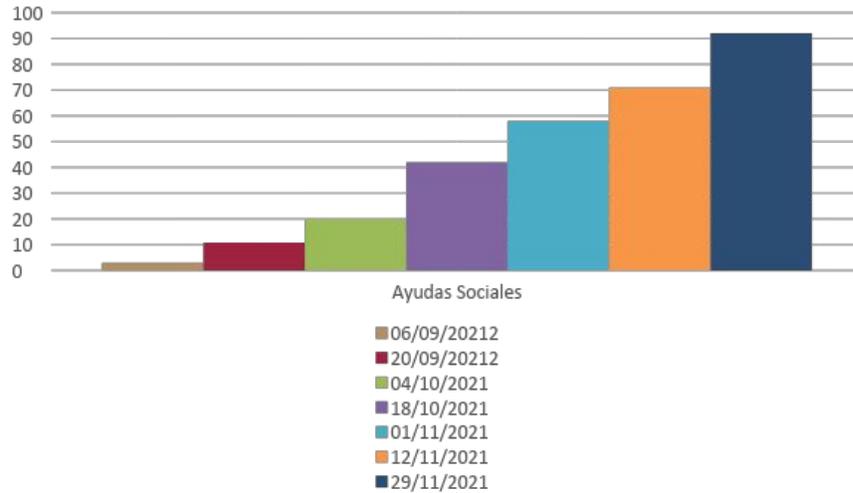

## FCH | Gráficas de obras en proceso.

### EJERCICIO 2020 – 2021.

APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL.	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
<b>“ARREGLO DE FACHADAS EN SANTA MARÍA LA REDONDA, REPÚBLICA DE BRASIL Y BARRIO LAGUNILLA, SEGUNDA ETAPA”</b> <b>(Bloque A):</b> REPUBLICA DE BRASIL No. 29 y No. 46 y REPÚBLICA DE PARAGUAY No. 44 <b>(Bloque B):</b> República de Brasil No. 44, 43, 62, 63 y 64 y República de Ecuador 95.	14	37	DICIEMBRE 2021
	8	31.75	

## FCH | Obras en Proceso. ACMPM.



**República de Brasil No. 46.** Re mamposteo y reintegración de aplanados en pretiles.



**República de Brasil No. 29.** Tratamiento de elementos de madera.



**República de Paraguay No. 44.** Reintegración de aplanados.

**APOYO A CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL- FACHADAS BLOQUE A.**

## FCH | Obras en Proceso. ACMPM.



**República de Brasil No.43.** Consolidación de elemento ornamental.



**República de Brasil No.62.** Sustitución de piezas de cantera que estaban en mal estado de conservación.



**República de Brasil No.63.** Recuperación de materiales originales en balcones.




**República de Ecuador No. 95.** Reintegración de aplanados.


**APOYO A CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL- FACHADAS BLOQUE B.**

# FCH | Seguimiento de indicadores.

### APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL. BLOQUE A.

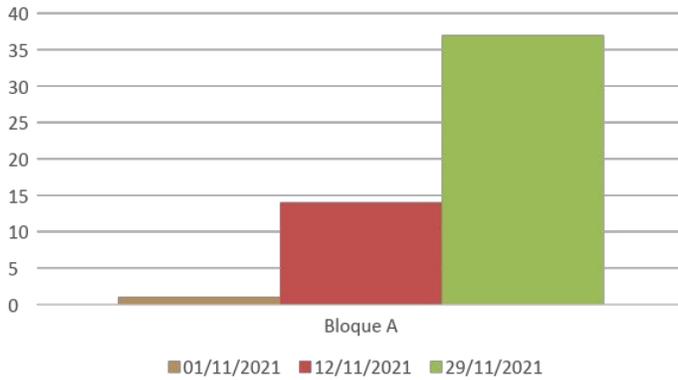


### APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL. BLOQUE B.

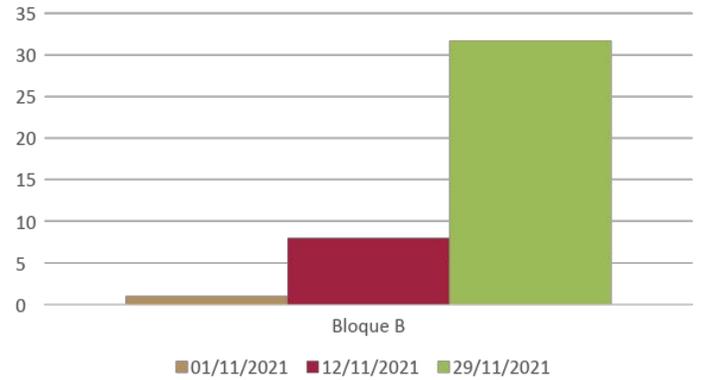


# FCH | Seguimiento de Indicadores

**62.5%**  
avance global  
marzo - noviembre

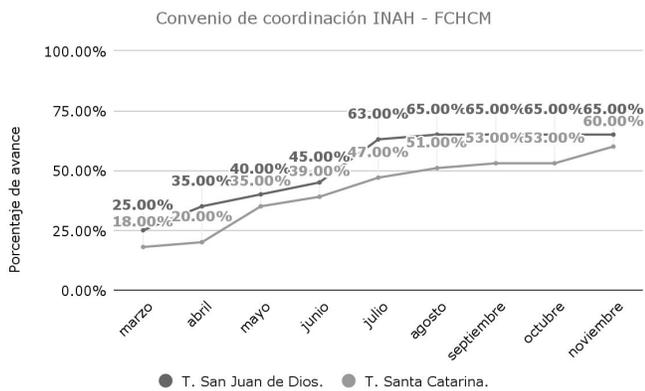

**72.5%**  
avance global  
junio - noviembre

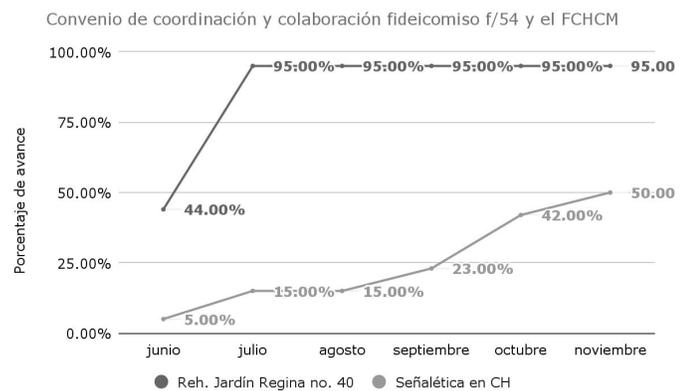


**01 Proyecto terminado**  
• T. Santísima Trinidad

**01 Proyecto terminado**  
• Mantenimiento Corredor San Jerónimo

# FCH | Seguimiento de Indicadores

## 30%

avance  
junio - noviembre

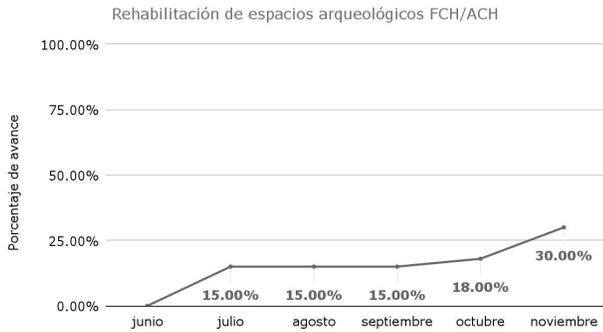


● Construcción de nueva reja perimetral en el Templo Mayor

### 02 Proyectos terminados

- Escalera de acceso al templo de Ehécatl
- Mantenimiento y rehabilitación a ventanas arqueológicas en Rep. de Argentina

## 92%

avance  
julio - noviembre

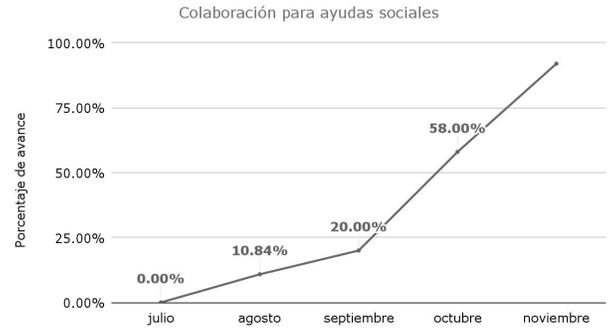


● Fachadas: Obraje 7, Las Cruces 5, Riva Palacio 46-48 y Riva Palacio 52

### 01 Proyecto en proceso

- Fachadas en Fachadas: Obraje 7, Las Cruces 5, Riva Palacio 46-48 y Riva Palacio 52

# Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la CDMX

## ILIFE | Seguimiento de Indicadores

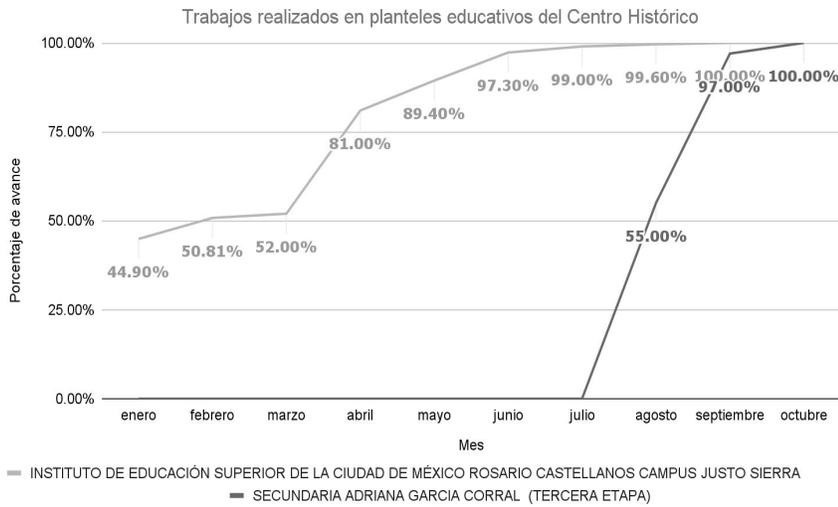

# ¡Meta cumplida!

### 03 Proyectos terminados

- Escuela Primaria Francisco González Bocanegra (enero 2021)
- Instituto de Educación Superior de la Ciudad de México Rosario Castellanos, Campus Justo Sierra
- Escuela Secundaria Adriana García Corral (Tercera etapa)

## Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)

## C5 | Indicadores

Indicador	Periodicidad	12 al 29/11	Próximo reporte
No. cámaras con falla o intermitencia		05 cámaras	
	Quincenal		14 de diciembre
Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura		01 cámara	


NOTA: Los datos proporcionados son extraídos de los Reportes de mesa de ayuda de C5

## C5 | Seguimiento de indicadores

# 215

enero - noviembre


Cámaras con falla o intermitencia

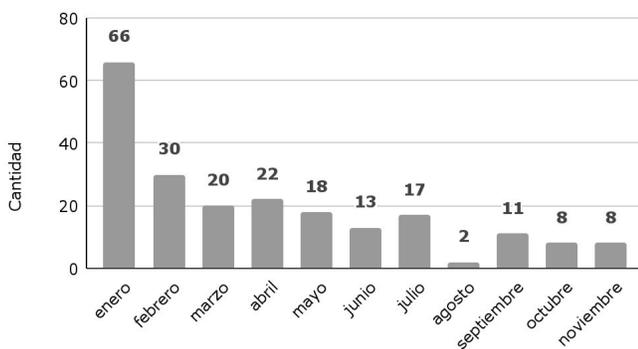

# 40

enero - noviembre

Obras de mantenimiento y/o reparación de infraestructura

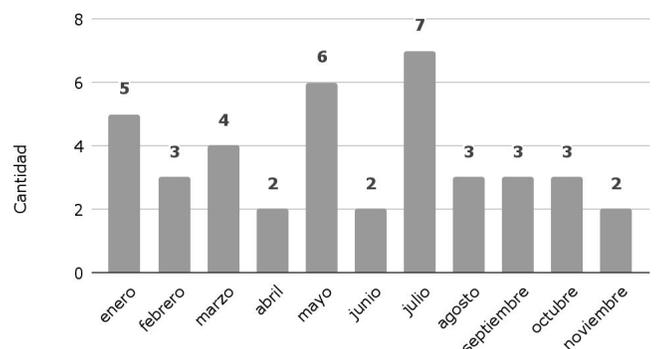

# SSC Tránsito




## SSC Tránsito | Indicadores

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	16 al 29/11	Próximo reporte
Semáforos	Número de semáforos con mantenimiento preventivo		0	
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo	Quincenal	48	14 de diciembre
Cámaras	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		0	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo	0		

## SSC Tránsito | Anexo de Indicadores

### CORRECTIVO

ACOMETIDA	2
APAGADO	3
CABLE DE COMUNICACIÓN DAÑADO	1
CORTO	2
DESINSTALACION	6
DESORIENTADO	8
FALTA VISERA	1
FOCO FUNDIDO	7
FY-CINTILANTE	3
INSTALACION DE SEMAFORO	1
INSTALACION POSTE	2
OBRA CIVIL	2
PEATON APAGADO	1
REINSTALACION	2
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	7
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>48</b>

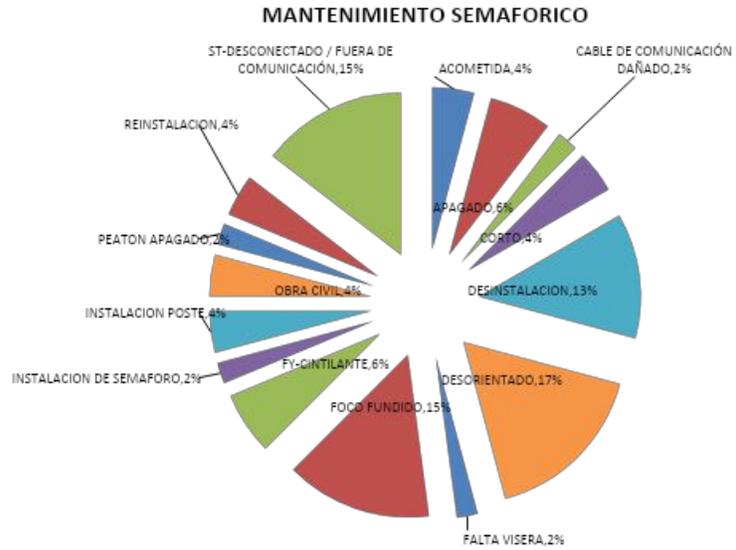


## SSC Tránsito | Seguimiento de indicadores

**157**

enero - noviembre


Acciones mantenimiento preventivo a semáforos

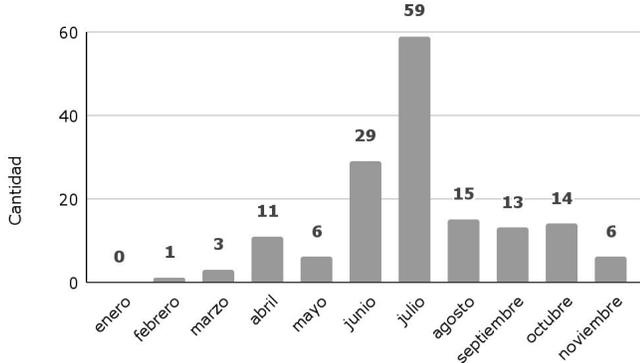

**1376**

enero - noviembre

Acciones mantenimiento correctivo a semáforos

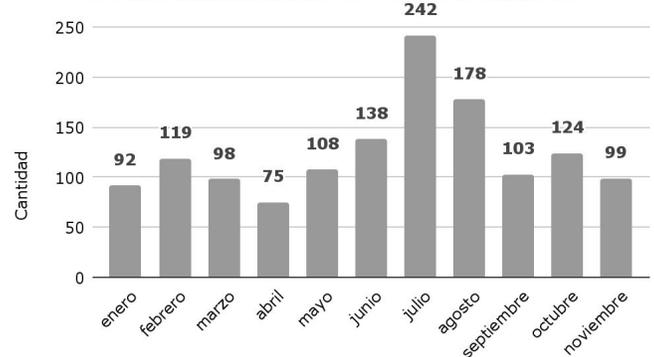

Reportes

**Turnos e incidencias urbanas**

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero a noviembre 2021

**92%  
atención**

Matriz de Turnos <b>ATIENDE</b>	ESTATUS			Suma total
	Atendido	En proceso	Pendiente	
ACH	30	2		32
Al. Cuauhtémoc	9	3	1	13
Al. Venustiano Carranza	2			2
C5	4			4
CFE	5	1		6
CONAVI	1			1
FCH	1	1		2
INAH	1			1
INBAL	1			1
METRO	1			1
Metrobús	1			1
SACMEX-Drenaje	17			17
SEDEMA	1			1
SEDUVI	2			2
SOS-AP	2			2
SOS-DGCOP	2			2
SOS-DGOIV	16			16
SOS-DGSUS	8	1		9
Telmex	1			1
Tránsito	3			3
<b>Suma total</b>	<b>108</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>117</b>

## ACH | Seguimiento a turnos **ATENDIDOS**

CLAVE	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-112	16/11/2021	Metrobús	Desazolve de pozos de visita en la calle de Aviación Militar no. 33	Venustiano Carrar		Atendido	Se realizó desazolve de pozos de visita y sondeo de atarjea así como sondeo de albañal domiciliario en la calle de aviación militar no 33 col Industrial Puerto Aereo
TCH-113	16/11/2021	Metrobús	ACH - Mesa de Reordenamiento, solicite verificación de establecimiento que vierte grasas en registro de calle Aviación Militar	Venustiano Carrar		Atendido	
TCH-114	16/11/2021	ACH	Dar seguimiento a la petición del Director de Gobierno sobre el camión de basura que hace pepena afuera del recinto de la UNAM, ubicado en Liverpool 66	Al. Cuauhtémoc		Atendido	El camión ya no se estaciona a realizar separación de basura donde lo hacia, la alcaldía lo movió.

213

## ACH | Seguimiento a turnos **EN PROCESO**

CLAVE	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-080	2/9/2021	V1 - Santa Maria la Redonda	Se atiende apuntalamiento en el predio de Violeta No. 62	Al. Cuauhtémoc		En proceso	-El miércoles 8 de agosto se contactó a la vecina. -Se generó folio SUAC -ACH compartió el reporte al Ing. Fernando Corso del Área de Protección Civil de la Alcaldía -El dictamen está en proceso. La vecina Ma. Cristina tuvo cita el lunes 27/09 -Se realizó la solicitud a la Alcaldía por oficio -Se retoma el turno con folio: TCH-108 con nuevo enlace de la alcaldía en la MIO en la 22a MIO
TCH-089	7/9/2021	Al Venustiano Carranza	Acompañamiento para trámites de obra de un Presupuesto Participativo en calle San Ciprián y alrededores del perímetro B	ACH		En proceso	Se tuvo contacto con la Arq. Moya sobre el tema y comentó que aún no requieren el apoyo, ellos indicaran si van a requerir el acompañamiento.
TCH-092	15/10/2021	ACH	Limpieza y retiro de escombros en el predio de Jaime Nuno s/n, col. Morelos	SOS-DGSUS		En proceso	La Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad efectuó jornada de limpieza el miércoles 3 de noviembre, solicita retiro del agua que aún queda en el predio para concluir con la limpieza. Ya se solicitó a Sacmex
TCH-100	28/10/2021	V4 - Alameda-Sector Financiero	Reposición de coladera rota en la banqueta en Aliende esquina Tacuba, frente a las maletas	CFE		En proceso	Se solicitó a CFE el cambio de la tapa, esta en proceso

214

## ACH | Seguimiento a turnos **EN PROCESO**

CLAVE	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATENDE	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-103	3/11/2021	PROSOC	Se le apoye con los permisos ante INAH para el Proyecto en la Unidad de Callejón Canal 5, en la colonia Esperanza. (Se le compartirá manual y se le apoyará con los trámites).	ACH		En proceso	
TCH-105	3/11/2021	ACH	Se cheque que el humidificador de la ventana arqueológica de Argentina casi esquina González Obregón esté funcionando bien.	FCH		En proceso	Ya se revisó con personal del FCH y la empresa que le dio mantenimiento, van a cambiar un timer digital para que maneje varias etapas de encendido y apagado para resolver el tema, van dos semanas que ACH con apoyo de infractores de Justicia Cívica lava estas ventanas arqueológicas.
TCH-108	3/11/2021	ACH	Retome turno pendiente de apuntalamiento del predio de Violeta número 82. (ACH compartirá el acuse del oficio)	Al. Cuauhtémoc		En proceso	FOLIO:TCH-080 -Se realizó la solicitud a la Alcaldía por oficio -Se compartirá acuse al nuevo enlace de la alcaldía
TCH-111	13/11/2021	ACH	Baches sobre arroyo vehicular (Carpetas asfálticas).	Al. Cuauhtémoc		En proceso	LA ALCALDÍA LO PROGRAMARA PARA SU ATENCIÓN

215

## ACH | Seguimiento a turnos **PENDIENTES**

CLAVE	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATENDE	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-109	13/11/2021	ACH	Problemas de inundaciones en la calle por falta del funcionamiento de la atarjea que esta dañada.	Al. Cuauhtémoc		Pendiente	LA ALCALDÍA LO PROGRAMARA PARA SU ATENCIÓN, SE REQUIERE OBRA MAYOR

216

## ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero a octubre 2021

**88%**  
atención

Dependencia	ESTATUS			Suma total
	Atendido	En proceso	Pendiente	
ACH	64		8	72
ADIP	1			1
Al. Cuauhtémoc	127		17	144
C5	5		2	7
CFE	299	1	51	351
SACMEX	197	5	28	230
SEDEMA	1			1
SGIRyPC	3		1	4
SOS-AP	122		1	123
SOS-DGOIV	42		8	50
SOS-DGSUS	61			61
STC-Metro	2			2
TELMEX	29		18	47
Tránsito	76			76
<b>Suma total</b>	<b>1029</b>	<b>6</b>	<b>134</b>	<b>1169</b>

 Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 17 de noviembre al 30 de noviembre 2021

Número	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1325	Estructura de Supervisión ACH	17/11/2021	Falla en semáforo	Palma	Francisco I. Madero				Atendido
IUCH-1326	Estructura de Supervisión ACH	17/11/2021	Falla en semáforo	Palma	Francisco I. Madero				Atendido
IUCH-1329	V7 - Viciainas-Corredor Cultural Regina	18/11/2021	Falla en semáforo	República de Uruguay	5 de febrero	Tránsito			Atendido
IUCH-1331	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	18/11/2021	Fallas en alumbrado público, apogones y fallas en el voltaje	República de Perú		Al. Cuauhtémoc			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 17 de noviembre al 30 de noviembre 2021

Número	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1334	V4 - Alameda-Sector Financiero	19/11/2021	Falla en semáforo	Palma	Francisco I. Madero	Tránsito			Atendido
IUCH-1335	V3 - Santo Domingo	19/11/2021	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Palma	Belisario Domínguez	SOS-AP			Atendido
IUCH-1336	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	20/11/2021	Desperfectos en banquetas	Leona Vicario	San Antonio Tomatlán	CFE			Atendido
IUCH-1337	V4 - Alameda-Sector Financiero	20/11/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Donceles	Xicotencatl	CFE			Atendido

219

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 17 de noviembre al 30 de noviembre 2021

Número	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1338	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	20/11/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Del Carmen	República de Venezuela	TELMEX			Atendido
IUCH-1339	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	21/11/2021	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	San Jerónimo	Isabel La Católica	SOS-AP			Atendido
IUCH-1342	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	18/11/2021	Falta de luz al interior de los inmuebles	Soledad		CFE	SIN FOTO	SON FOTO	Atendido
IUCH-1344	V1 - Santa María la Redonda	23/11/2021	Daño al equipamiento urbano	Zarco		SOS-DGOIV			Atendido

220

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 17 de noviembre al 30 de noviembre 2021

Número	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1348	V3 - Santo Domingo	23/11/2021	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Plaza Santa Catarina	República de Brasil				Atendido

221

## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 17 de noviembre al 30 de noviembre 2021

Número	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1322	Estructura de Supervisión ACH	17/11/2021	Desperfectos en banquetas	José María Pino Suárez	Venustiano Carranza				Pendiente
IUCH-1323	Estructura de Supervisión ACH	17/11/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Talavera	Jesús María				Pendiente
IUCH-1324	Estructura de Supervisión ACH	17/11/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Roldán	República de Uruguay				Pendiente
IUCH-1328	V3 - Santo Domingo	18/11/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Venezuela	República de Argentina	SACMEX			Pendiente

222

## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 17 de noviembre al 30 de noviembre 2021

Número	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1330	V3 - Santo Domingo	18/11/2021	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Jesús Carranza		SACMEX			Pendiente
IUCH-1332	V3 - Santo Domingo	18/11/2021	Fallas en alumbrado público, espigones y fallas en el voltaje	Belisario Domínguez	Eje 1 Oriente (Circunvalación)				Pendiente
IUCH-1333	V1 - Santa María la Redonda	19/11/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Caleana		SACMEX			Pendiente
IUCH-1341	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	20/11/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Soledad	Jesús María	SOS-AP			Pendiente

223

## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 17 de noviembre al 30 de noviembre 2021

Número	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1345	Estructura de Supervisión ACH	23/11/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Plaza Santo Domingo					Pendiente
IUCH-1346	Estructura de Supervisión ACH	23/11/2021	Desperfectos en banquetas	República de Guatemala	Justo Sierra				Pendiente
IUCH-1347	Estructura de Supervisión ACH	23/11/2021	Desperfectos en banquetas	República de Guatemala	Jesús María				Pendiente
IUCH-1349	Estructura de Supervisión ACH	24/11/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República del Salvador	Talavera				Pendiente

224

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

**Asuntos generales**

Acuerdos

Asistencia

