



ASOCIACIÓN DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

XVI SESIÓN. Evaluación Julio

10 de agosto de 2021

Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas


Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia



Reportes Institucionales



Autoridad del Centro Histórico

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 6/08/2021	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Quincenal	247	20 de agosto
Mantenimiento a infraestructura con apoyo de Justicia Cívica	Número de atenciones en parques, plazas o áreas verdes del Perímetro del Centro Histórico	Quincenal	2	20 de agosto

Autoridad del Centro Histórico | Obras menores

República de
Brasil
Plaza del
Empedradillo
Incas
República de
Argentina
Gante
Regina
Primer
Callejón de
Mesones San
Camilito
Madero

Los trabajos realizados consistieron en **demolición, relleno y colocación de tubería para drenaje, así como reparación de piso de acceso** en República de Brasil entre Belisario Domínguez y República de Perú, **reparación de piso colocando 47 piezas tipo recinto** en Plaza del Empedradillo, **se retiró una base de teléfono y 4 esparragos** en Incas esquina República de Honduras, **se renivelaron 58 piezas de dren** en República de Argentina entre Donceles y González Obregón, **se balizaron 3 locales** en Gante entre Madero y 16 de Septiembre, **se balizó un local** en Regina entre Isabel la Católica y Bolívar, **se balizó un local** en Regina entre 1er Callejón de Mesones e Isabel la Católica, **se balizaron 6 locales** en Primer Callejón de mesones entre Regina y Mesones, **se reparó registro** en República de Argentina entre Belisario Domínguez y República de Colombia, **se reparó tapa de registro** en San Camilito entre República de Honduras y República de Ecuador, **se reparó tapa de registro** en San Camilito entre República de Honduras y República de Perú, **se colocaron 37 pendones** en Madero, **se colocaron 74 piezas de recinto** en República de Argentina entre República de Guatemala y Donceles, **se colocaron 10 piezas de recinto** en República de Argentina entre Donceles y San Ildefonso.



Autoridad del Centro Histórico | Gráficos de obras menores



Plaza del Empedradillo




Motolinia
Regina



República de Argentina

Autoridad del Centro Histórico | Mantenimiento con apoyo de infractores de justicia cívica



Plaza Vizcaínas con apoyo de 10 infractores




Leona Vicario con apoyo de 4 infractores

Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores - enero a julio 2021


1,713

Incidentes atendidas
enero - julio

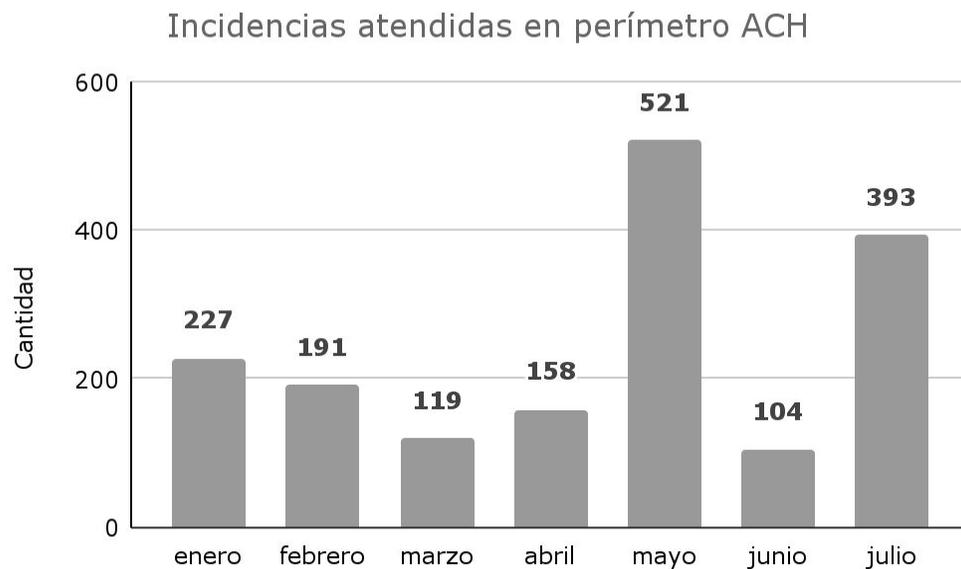

1,082

Graffitis eliminados
enero - julio

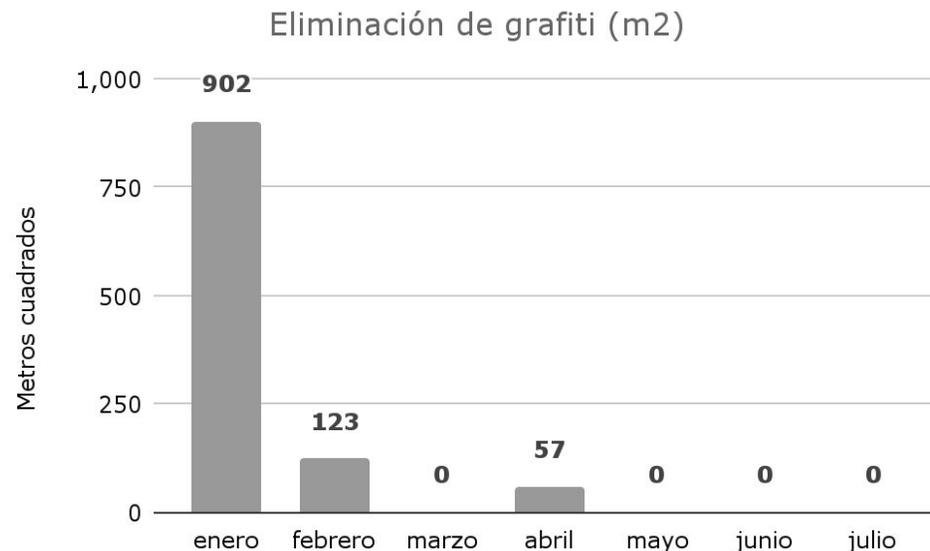

Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores - abril a julio 2021

12

Riegos por vecinos
abril - julio

13

Riegos por ACH
abril - julio


07

Riegos por ACH - DGSUS
abril - julio

03

Riegos por SEDEMA
abril - julio

Número de riegos de Áreas Verdes Centro Histórico

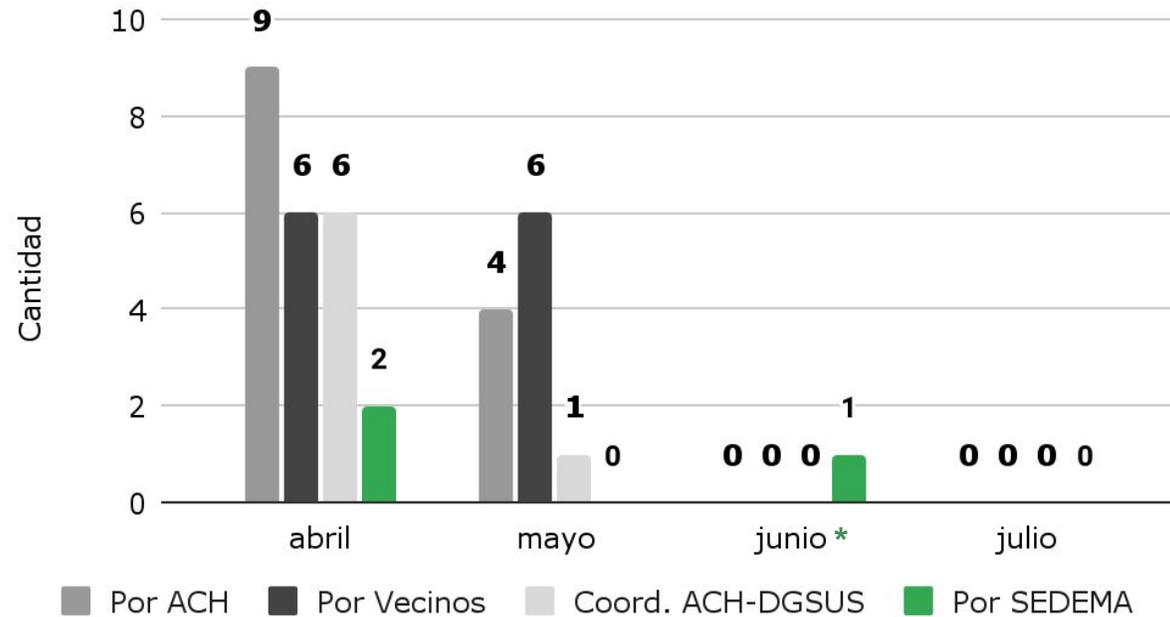

DEBIDO A LAS LLUVIAS NO SE REALIZÓ RIEGO EN JULIO,



Alcaldía Cuauhtémoc



Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Al 6 de agosto	Próximo reporte
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	100	20 de agosto
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	26	20 de agosto
Drenaje	Número de metros lineales de la red de drenaje desazolvados	Quincenal	165	20 de agosto
Drenaje	Número de rejillas de piso desazolvadas	Quincenal	23	20 de agosto
Drenaje	Número de coladeras de banqueta desazolvadas	Quincenal	59	20 de agosto

Alcaldía Cuauhtémoc | Gráficas de indicadores



Se realizó desazolve en Manuel Doblado No. 145. Se limpian 4 coladeras y se sondean 14 metros lineales de drenaje.



Se realizó desazolve en República de Honduras. Se limpian 6 coladeras y se sondean 15 mts. de drenaje



Se realizó poda en Plaza San Salvador el Seco. 6 árboles, 4 m3 de poda



Se repara 1 circuito en República de Chile. Quedan funcionando 10 Luminarias.



Se realizó poda en República de Paraguay No. 62, 5 árboles, 2 m3 de poda




Se repara 1 circuito en Roldán y Santo Tomás. Quedan funcionando 8 Luminarias.

Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores - enero a julio 2021

878

reparaciones de luminarias
enero - julio


Reparación de luminarias en vías secundarias

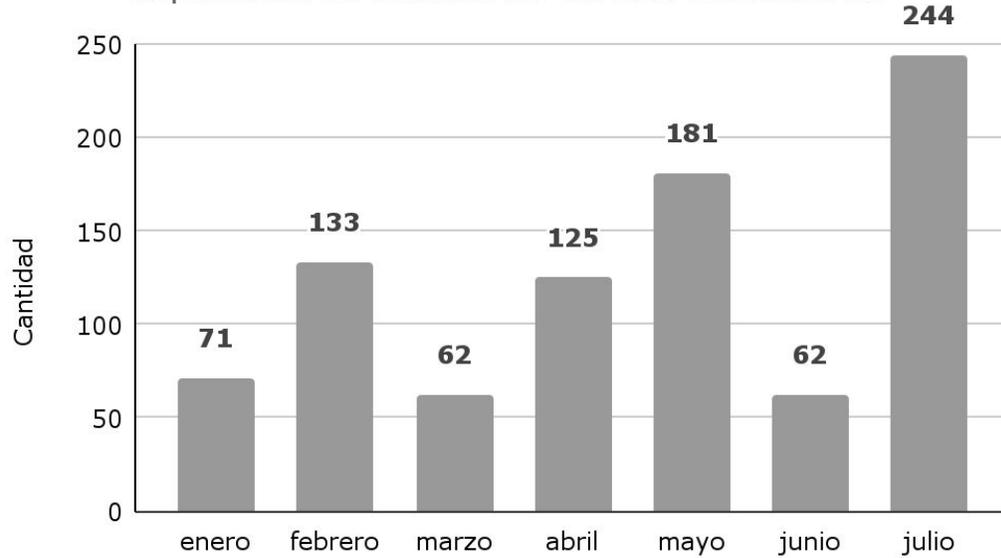

371

sujetos forestales podados
enero - julio

Sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas

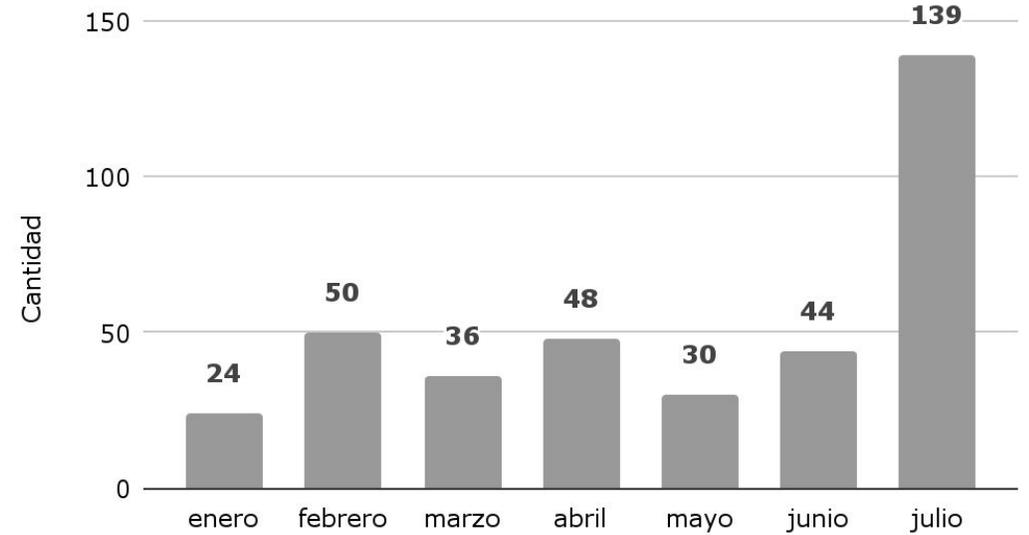


Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores - enero a julio 2021

1145 m

de desazolve en red de drenaje
enero - junio

Red de drenaje desazolvado




152

rejillas de piso
desazolvadas
enero - junio

232

coladeras desazolvadas
enero - junio

Desazolve de accesorios




Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores - abril a julio 2021

23

Riegos por Alcaldía
Cuauhtémoc
abril - julio

Número de riegos de áreas Verdes Centro Histórico

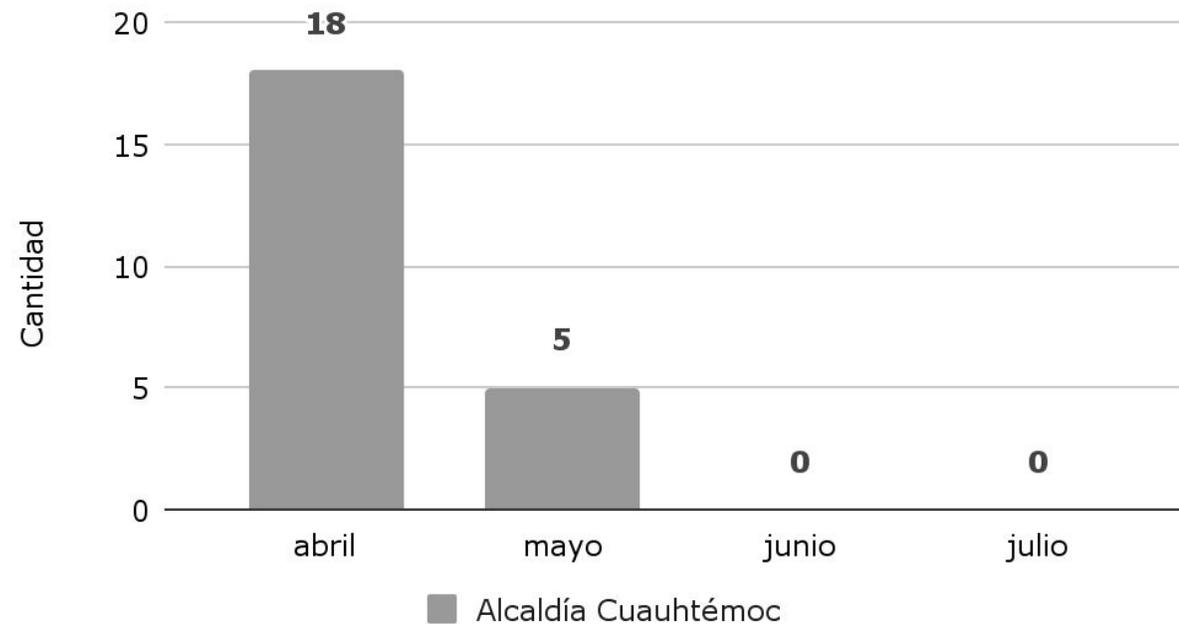

*DEBIDO A LAS LLUVIAS NO SE REALIZÓ RIEGO EN JULIO



Alcaldía Venustiano Carranza



Alcaldía Venustiano Carranza | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 6/08	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	0	20 de agosto	No se reportan trabajos
Tiraderos Clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base 26 tiraderos)	Quincenal	483	20 de agosto	Se recolectaron 32.2 toneladas diariamente de Residuos Sólidos
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	0	20 de agosto	La Coordinación Territorial Morelos no reporta trabajos de poda de sujetos forestales en el periodo.
Desazolve	Metros lineales de drenaje desazolvados	Quincenal	0	20 de agosto	No se reportan trabajos

Alcaldía Venustiano Carranza | Gráficas



Tolva 3, Col. Merced Zona Centro



Circunvalación y Carretones, Col. Merced Zona Centro



Tolva 2, Col. Merced Zona Centro



Vidal Alcocer y Berriozabal, Col. Morelos




Alcaldía Venustiano Carranza | Seguimiento de indicadores - enero a julio 2021

509

reparaciones de luminarias
enero - julio


Reparación de luminarias en vías secundarias de Al. Venustiano Carranza

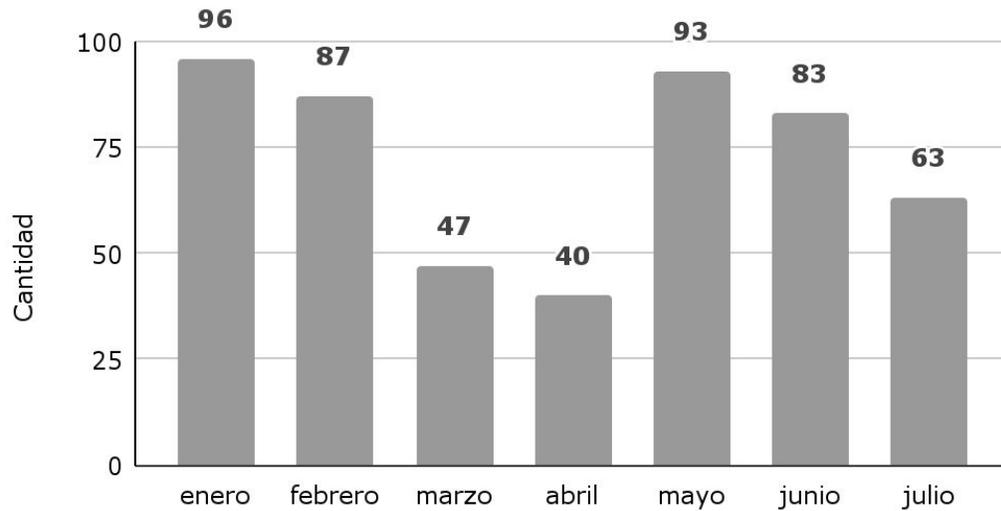

14,147.8 ton.

de residuos sólidos recolectados
enero - julio

Recolección de residuos sólidos en tiraderos clandestinos en perímetro B de Al. Venustiano Carranza

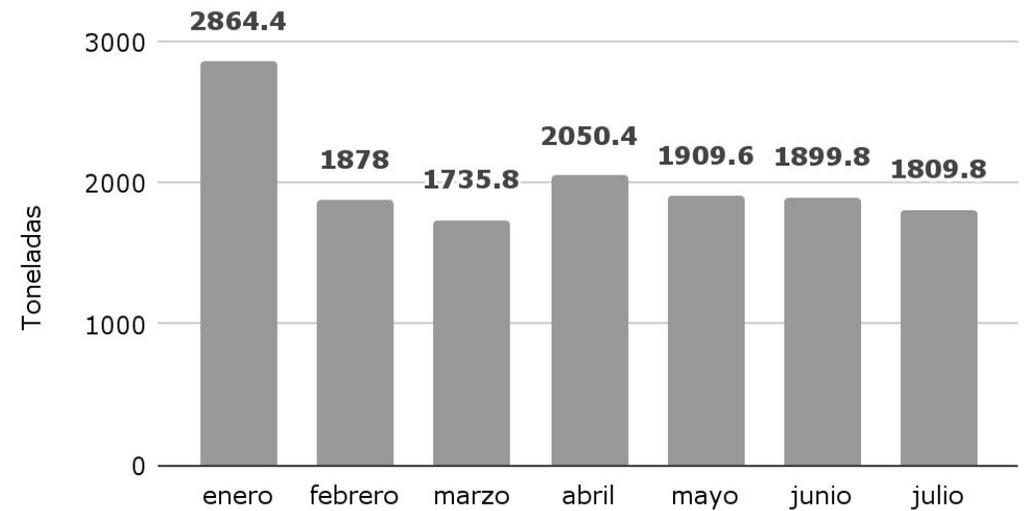


Alcaldía Venustiano Carranza | Seguimiento de indicadores - enero a julio 2021

117

sujetos forestales podados
enero - julio


Sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plaza

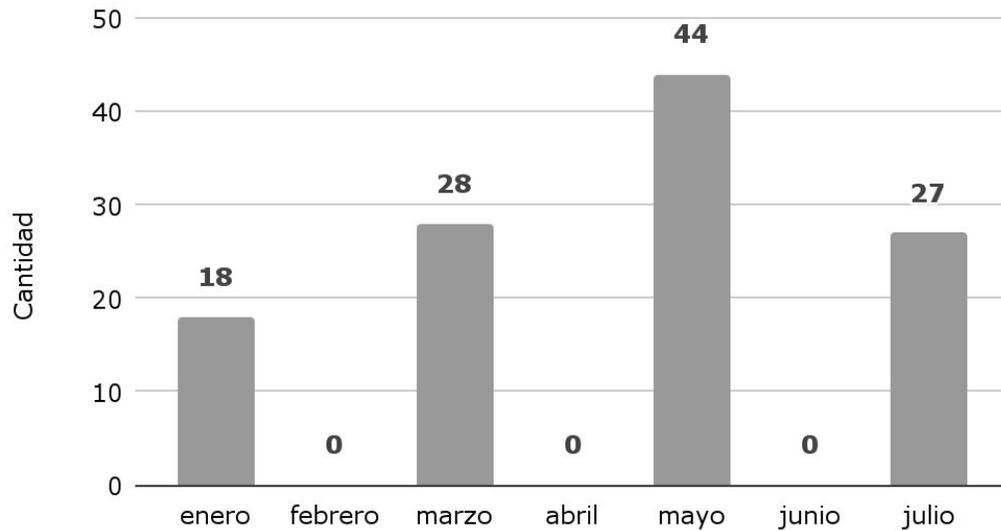

2,124 m

de desazolve en red de drenaje
enero - julio

Red de drenaje desazolvado





SACMEX

Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje




SACMEX Drenaje | Ejecución del programa


Desazolve de la red de drenaje y accesorios hidráulicos

**70 %
DE AVANCE**

	PROGRAMADO	ANTERIOR	EJECUTADO	AVANCE
ATARJEA (METROS)	21,000	14,000	780	14,780
POZOS DE VISITA	370	250	13	263
REJILLAS DE PISO	150	140	4	144
COLADERA PLUVIAL	160	159	13	172
ALBAÑAL (METROS)	1,500	1,182	51	1,233



SACMEX Drenaje | Reporte Fotográfico



CALLE MANUEL DOBLADO (ESQUINA PEÑA Y PEÑA)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 180 ML DE ATARJEA, 3 PV, 4 CP, 12 ML DE ALBAÑAL.

SACMEX Drenaje | Reporte Fotográfico



CALLE LA PALMA (ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 250 ML DE ATARJEA, 5 PV, 4 RP, 5 CP, 27 ML DE ALBAÑAL.

SACMEX Drenaje | Reporte Fotográfico



REPÚBLICA DE CUBA NO. 43 (ENTRE REPÚBLICA DE CHILE Y ALLENDE)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 200 ML DE ATARJEA, 2 PV, 1 CP, 5 REGISTROS, 30 ML DE ALBAÑAL.


SACMEX Drenaje | Reporte Fotográfico



CALLE ROLDAN (ENTRE SAN PABLO Y FRAY SERVANDO TERESA DE MIER)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 150 ML DE ATARJEA, 3 PV, 2 CP, 8 ML DE ALBAÑAL.

SACMEX Drenaje | Reporte Fotográfico



AV. 20 DE NOVIEMBRE

(ENTRE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y FRAY SERVANDO TERESA DE MIER)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 800 ML DE ATARJEA, 16 PV, 13 RP, 14 CP, 773 ML DE ALBAÑAL.

SACMEX Drenaje | Anexo de robo de elementos de infraestructura



Robo de elementos de infraestructura


SACMEX

Robo de tapas metálicas


1. Humbolt 34 (1)
2. Av. Del trabajo esq. Rivero (1)

Robo de rejillas metálicas

1. Humbolt 34 (1)

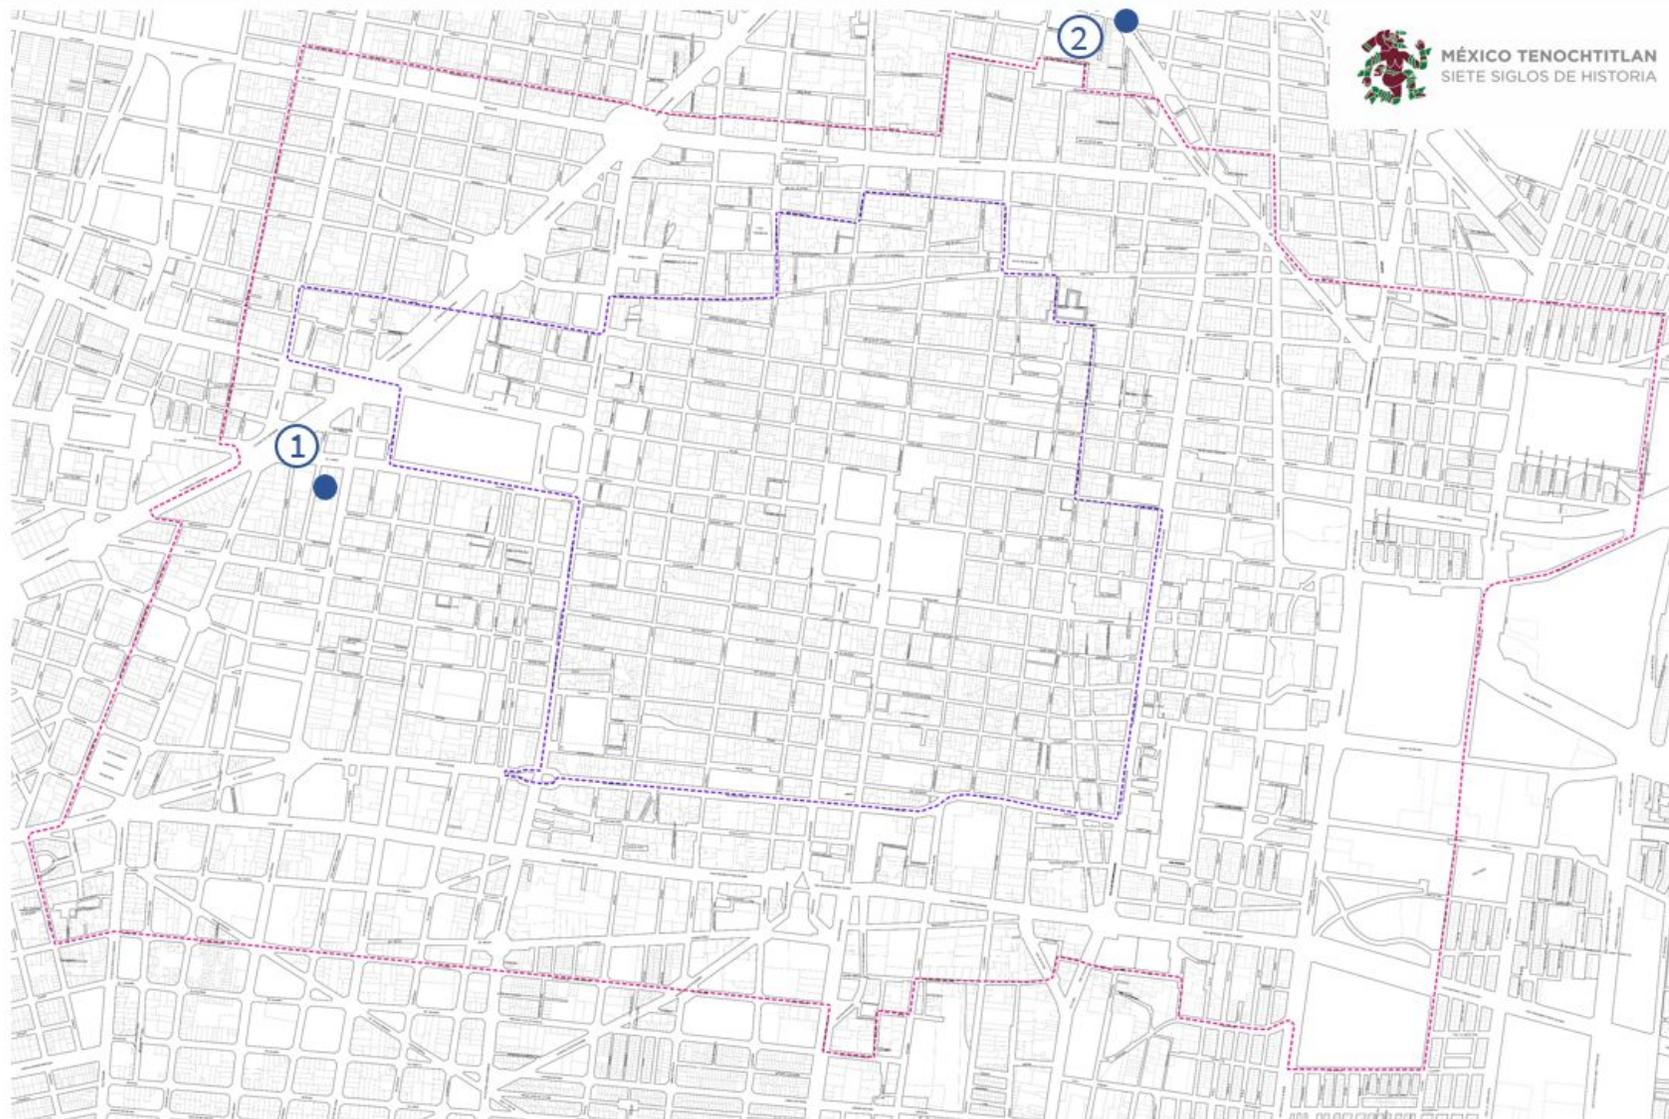

SACMEX Drenaje | Seguimiento de indicadores - marzo a julio 2021

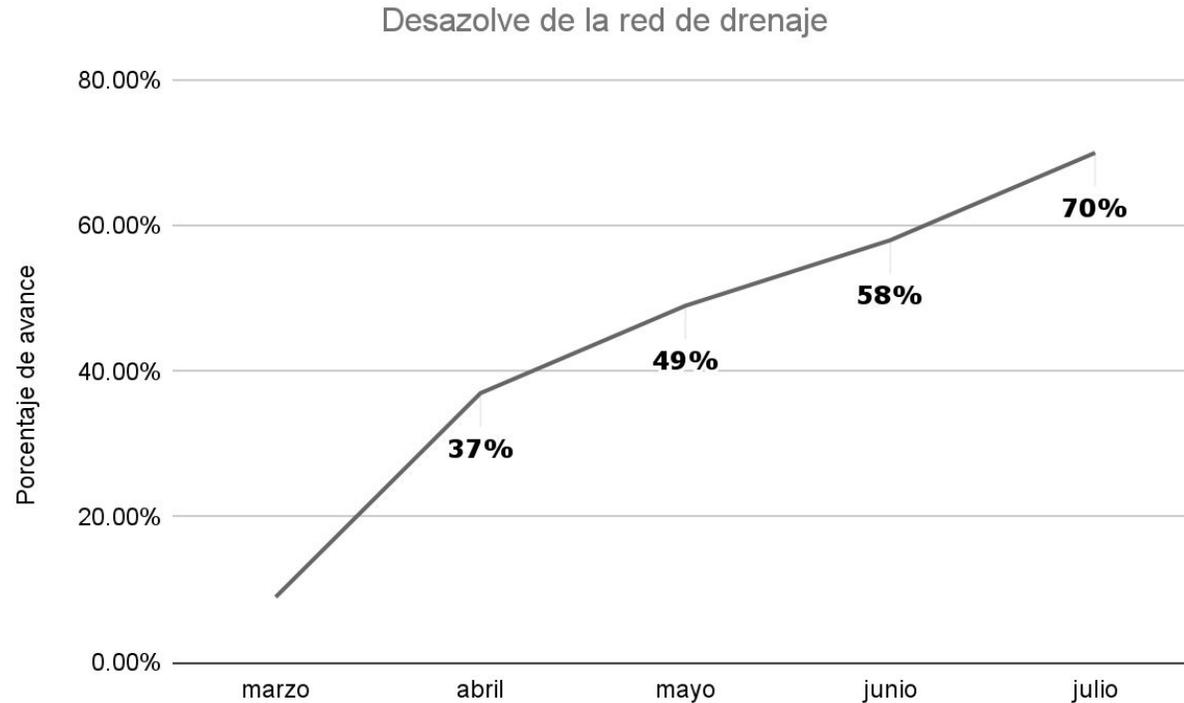

70 %
avance acumulado
marzo - julio

14.78 km en atarjea

263 pozos de visita

144 rejillas de piso

172 coladeras pluviales

1,233 m de albañal



SACMEX

Dirección de Construcción

*SUSTITUCIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE AGUA POTABLE
Y DRENAJE EN EL CENTRO HISTÓRICO.*



SACMEX Obras | Indicadores República de Chile

Avance físico real: **99 %** Monto de Inversión: \$ 15, 664 599.26

AGUA POTABLE



META: 588.00 metros
INSTALADO: 588.00 metros
DIÁMETRO: 12 pulgadas
MATERIAL: Polietileno de Alta densidad
PROCESO CONSTRUCTIVO: Cielo Abierto y Perforación Direccional

DRENAJE



META: 592.00 metros
INSTALADO: 592.00 metros
DIÁMETRO: 0.38 y 0.45 metros
MATERIAL: Polietileno de Alta densidad Corrugado
PROCESO CONSTRUCTIVO: Cielo Abierto

SACMEX Obras | Indicadores Polígono de San Hipólito

Avance físico real: **99 %** Monto de Inversión: \$ 22, 969 562.08

AGUA POTABLE



META: 2, 145.00 metros
INSTALADO: 2, 145.00 metros
DIÁMETRO: 6 y 12 pulgadas
MATERIAL: Polietileno de Alta densidad
PROCESO CONSTRUCTIVO: Cielo Abierto y Perforación Direccional

DRENAJE




META: 1, 740.00 metros
INSTALADO: 1, 740.00 metros
DIÁMETRO: 0.38 y 0.45 metros
MATERIAL: Polietileno de Alta densidad Corrugado
PROCESO CONSTRUCTIVO: Cielo Abierto

SACMEX Obras | Indicadores México-Tacuba (Tramo 3)

Calzada

Avance físico real: 100 % **Monto de Inversión:** \$ 16,084,344.58



AGUA POTABLE

META: 694.00 metros
INSTALADO: 694.00 metros
DIÁMETRO: 6 y 12 pulgadas
MATERIAL: Polietileno de Alta densidad
PROCESO CONSTRUCTIVO: Cielo Abierto y Perforación Direccional


DRENAJE

META: 1,563.00 metros
INSTALADO: 1,563.00 metros
DIÁMETRO: 0.30, 0.38 y 0.45 metros
MATERIAL: Polietileno de Alta densidad Corrugado
PROCESO CONSTRUCTIVO: Cielo Abierto y Tubería Curada en Sitio

AGUA TRATADA

META: 770.00 metros
INSTALADO: 770.00 metros
DIÁMETRO: 4 pulgadas
MATERIAL: Polietileno de Alta densidad
PROCESO CONSTRUCTIVO: Cielo Abierto y Perforación Direccional

SACMEX Obras | Seguimiento de indicadores - marzo a julio 2024

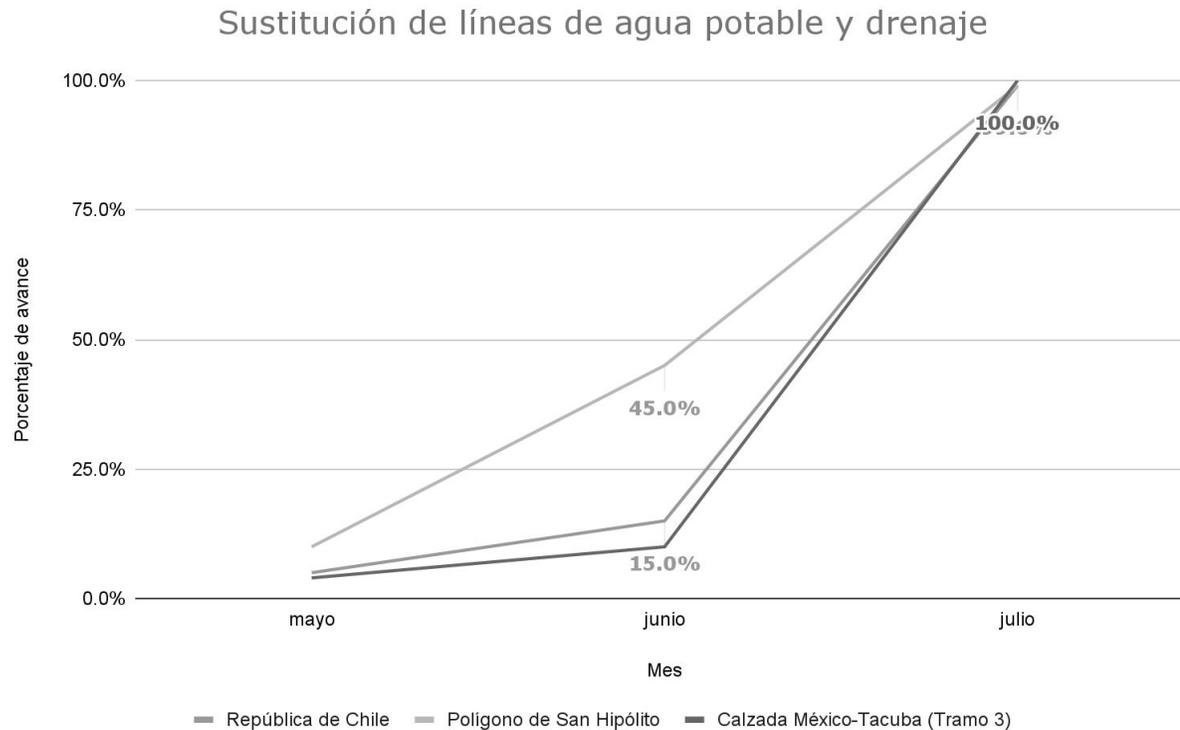

99.0%

avance global
marzo - julio

02 frentes en proceso

- República de Chile
- Polígono de San Hipólito

01 obra concluida

- Tramo 3. México-Tenochtitlan




Secretaría de Obras y Servicios



Dirección General de Obras de Infraestructura Vial



SOS-DGOIV | Indicadores - Rescate Urbano del Centro Histórico

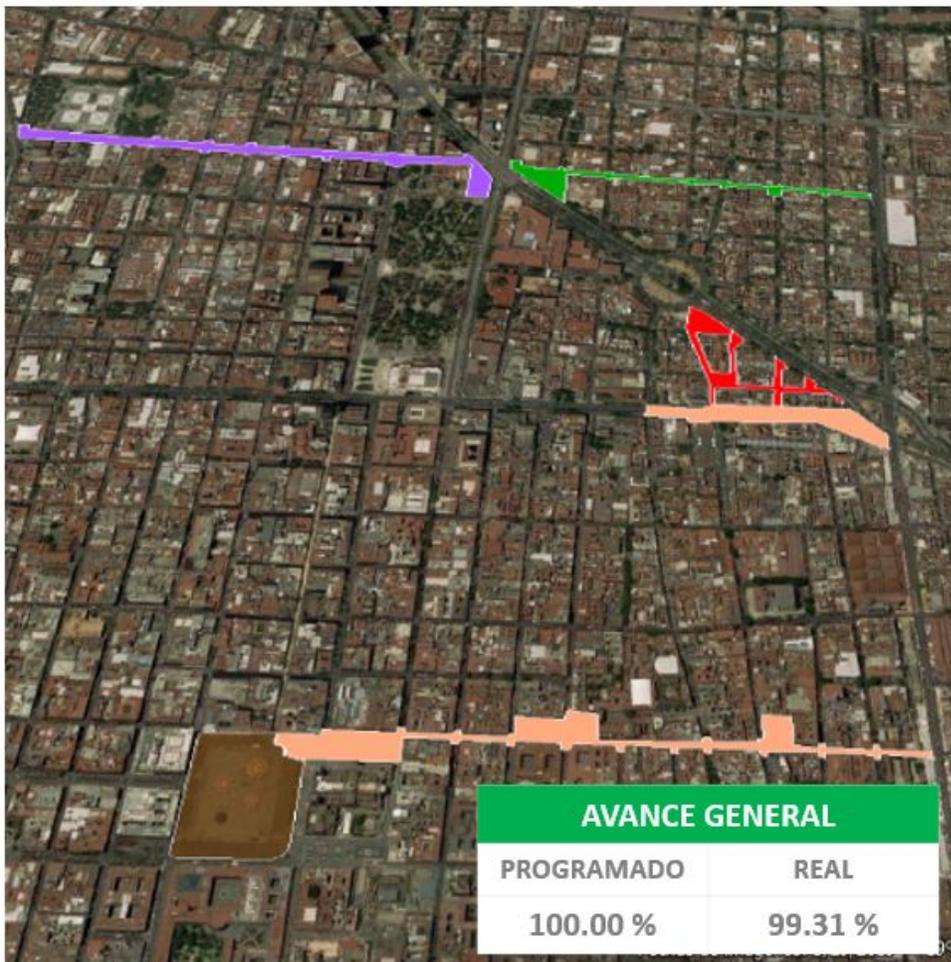

INVERSIÓN 2020-2021
270 MDP

ÁREA A INTERVENIR
83,500 M²



OBRA	PROGRAMADO	REAL	ACTIVIDADES
EJE CENTRAL	100.00%	100.00%	CONCLUIDO
REPÚBLICA DE BRASIL	100.00%	100.00%	CONCLUIDO
STA. MA. LA REDONDA	100.00%	99.78%	Se realizan trabajos en acabados y en detalles.
CALLE FCO. ZARCO	100.00%	100.00%	CONCLUIDO
AV. BALDERAS	100.00%	98.00%	Se realizan trabajos en acabados y en detalles.

SOS-DGOIV | Programa - Rescate Urbano del Centro Histórico

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRA CENTRO HISTORICO 2020-2021																																			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE	ENERO 2021				FEBRERO 2021				MARZO 2021					ABRIL 2021				MAYO 2021					JUNIO 2021				JULIO 2021				AGOSTO 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		09-ago-21																																	
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS	REAL	22/12/2020 100.00%																																	
REPUBLICA DE BRASIL	REAL	15/03/2021 100.00%																																	
CALLE FRANCISCO ZARCO	REAL	20/04/2021 100.00%												100.00%																					
SANTA MARIA LA REDONDA NORTE	REAL	30/04/2021 100.00%												99.78%																					
AV. BALDERAS	REAL	29/05/2021 100.00%												98.00%																					



SOS-DGOIV | Gráficos - Rescate Urbano del Centro Histórico

SANTA MARÍA LA REDONDA (REFORMA - EJE CENTRAL - PEDRO MORENO)

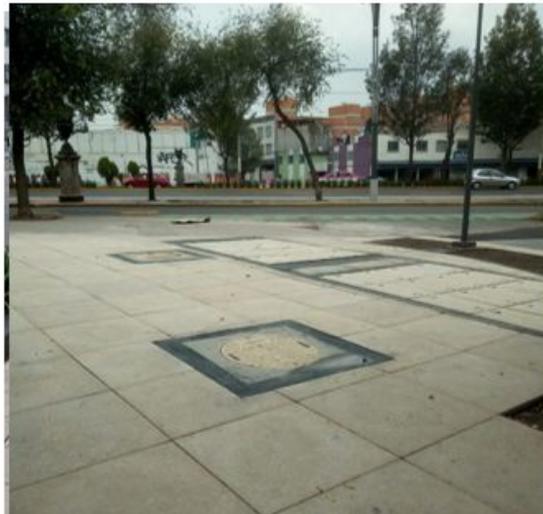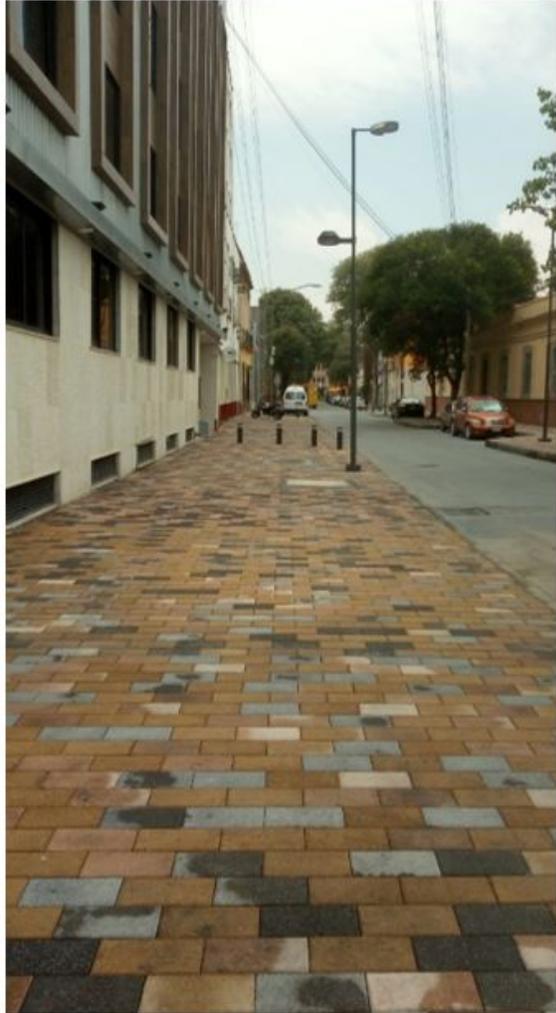

SOS-DGOIV | Gráficos - Rescate Urbano del Centro Histórico

AV. BALDERAS (ARCOS DE BELEM – AV. HIDALGO)

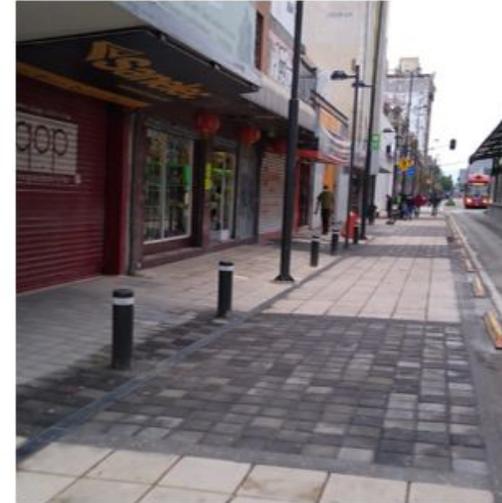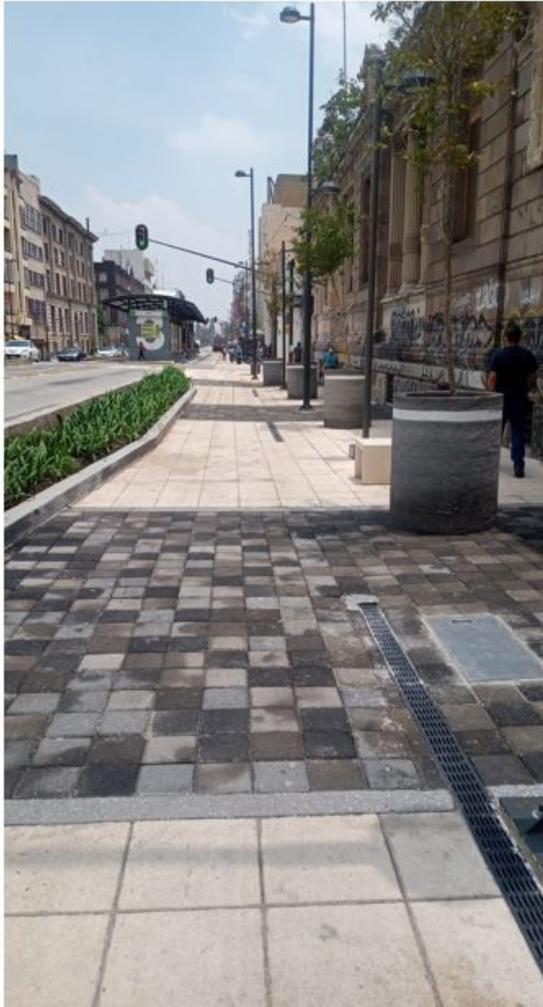

SOS-DGOIV | Gráficos - Rescate Urbano del Centro Histórico

CALLE 5 DE MAYO – CENTRO HISTÓRICO

EN PROCESO:

- SE REALIZARÁN CAMBIOS EN EL PROYECTO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA, SEÑALADOS EN RECORRIDO POR EL SECRETARIO DE OBRAS. INICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, SE REALIZARÁ REPROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA DE ACUERDO A LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO.

ESTADO ACTUAL



PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRA, AVENIDA 5 DE MAYO																																		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE	MAYO					JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE							
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
															09-ago-21																			
REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA 5 DE MAYO	PROGRAMADO						07/06/2021								12.50%								04/10/2021											
	REAL						28/06/2021								7.80%																			

SOS-DGOIV | Gráficos - Rescate Urbano del Centro Histórico

CALLE DE TACUBA – CENTRO HISTÓRICO

EN PROCESO:


- SE REALIZA REPROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA DE ACUERDO A LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO, SE REALIZA CONSTRUCCIÓN DE RE.VO. (REDUCTOR DE VELOCIDAD), COLADO DE GUARNICIONES Y COLOCACIÓN DE TIERRA VEGETAL EN JARDINERAS.

ESTADO ACTUAL



		PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRA, CALLE DE TACUBA																															
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE	MAYO					JUNIO				JULIO				AGOSTO			SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE							
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							
															09-ago-21																		
REHABILITACIÓN DE LA CALLE DE TACUBA	PROGRAMADO	21/06/2021										16.28%					18/10/2021																
	REAL	28/06/2021										9.05%																					

SOS-DGOIV | Seguimiento de indicadores - enero a julio 2021

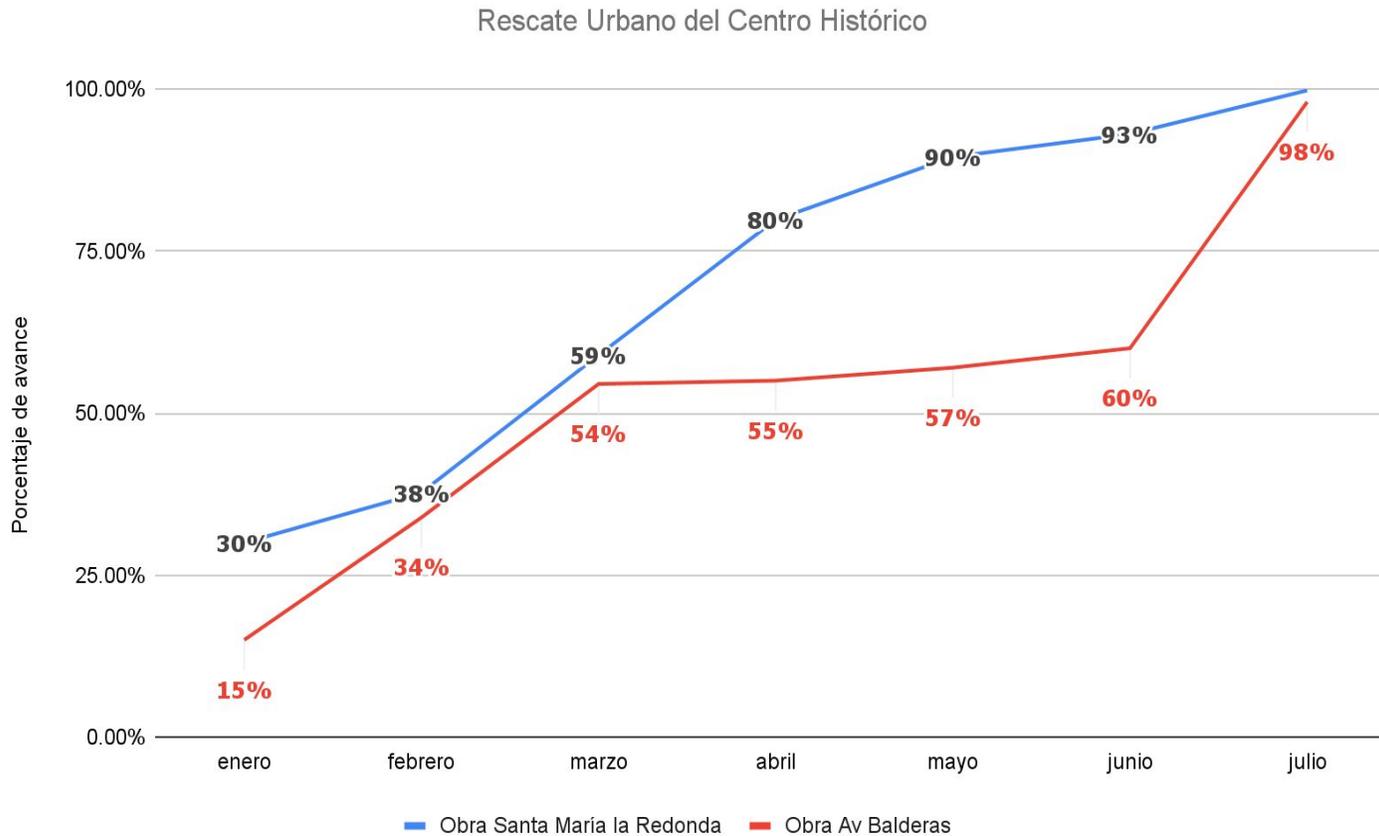

99.31%

avance global
obras 2020
enero - julio

02 frentes en proceso

- Santa María la Redonda Norte
- Av. Balderas

03 obras terminadas

- Eje Central
- Rep. de Brasil
- Zarco

Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

SOS-DCOP | Indicadores - Construcción de PILARES “La Pulga”

DATOS GENERALES CONTRATISTA

No. CONTRATO	DGCOP-LPN-L-1-275-20
CONTRATISTA	INOVACION Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
PLAZO DE EJECUCIÓN	149 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	02/10/2020
FECHA DE TEMINACIÓN	27/02/2021
SUPERFICIE DEL TERRENO	3,076.31
AREA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL	2,214.00 M2
AREAS EXTERIORES	3,625.00 M2

ESTADO FINANCIERO

IMPORTE DEL CONTRATO S/IVA	\$	19,989,459.25
IMPORTE ESTIMADO (PAGADO) S/IVA		\$8,027,891.43
IMPORTE POR ESTIMAR S/IVA	\$	11,961,567.82

ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO		SIN ANTICIPO
ANTICIPO AMORTIZADO	\$	-
ANTICIPO POR AMORTIZAR	\$	-




PERSPECTIVA DEL PROYECTO

RESIDENTE:
ARQ. GRACIELA DUARTE CALIXTO
J.U.D. DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION C2

SOS-DCOP | Indicadores - Construcción de PILARES “La Pulga”

**GRÁFICA DE AVANCES DE LA OBRA AL 08 DE AGOSTO DE 2021
CONTRATO DGCOP-LPN-L-1-275-20**



— PROGRAMADO **100.00 %**
— REAL **61.99 %**
— FINANCIERO (ANTICIPO+ESTIMADO) **50.00 %**

DIFERENCIA PROG./REAL -38.01 %

SOS-DCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



**ARMADO CON ACERO DE REFUERZO
PARA PRETILES Y CUBO DE ELEVADOR EN AZOTEA (1-6/B-C)**

SOS-DCOP | Indicadores - Construcción de PILARES “La Pulga”



**COLOCACION DE CIMBRA DE MADERA
PARA PRETILES EN AZOTEA (1-6/B-C)**

SOS-DCOP | Indicadores - Construcción de PILARES “La Pulga”



**COLADO CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2
PARA PRETILES EN AZOTEA (1-6/B-C)**

SOS-DCOP | Indicadores - Construcción de PILARES “La Pulga”



VISTA PANORAMICA NORESTE



VISTA PANORAMICA NOROESTE

SOS-DCOP | Indicadores - Construcción de PILARES “La Pulga”




VISTA PANORAMICA SURESTE



VISTA PANORAMICA SUROESTE

SOS-DCOP | Seguimiento de Indicadores - enero a julio 2021



61.99%
avance de obra*
enero - julio

*Está programado el término de la obra para octubre 2021

Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Alumbrado Público

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana 31 Al 30/07	Semana 32 Al 06/08	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	161	225	24 de agosto

Total 386

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA 31


DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alameda Central (Av. Hidalgo)	Calle Doctor Mora y Ángela Peralta	CENTRO	1	Cambio de cableado de poste a subterráneo.	Luminaria apagada
José María Pino Suárez	Plaza de la Constitución y Corregidora	CENTRO	1	Retiro de poste	Poste a punto de caer
Av. Juárez	Luis Moya y Dolores	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Av. Juárez	Dolores y López	CENTRO	19	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Av. Juárez	Av. Paseo de la Reforma y Calle Doctor Mora	CENTRO	41	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Av. Juárez	Av. Paseo de la Reforma y Calle Doctor Mora	CENTRO	23	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Alameda Central (Av. Juárez)	Calle Doctor Mora y Ángela Peralta	CENTRO	30	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Av. Juárez	Revillagigedo y Luis Moya	CENTRO	11	Reconexión de control	Circuito apagado
Alameda Central (Av. Juárez)	Calle Doctor Mora y Ángela Peralta	CENTRO	10	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
16 de Septiembre	Isabel la Católica y Simón Bolívar	CENTRO	24	Reconexión de líneas	Circuitos apagados
		TOTAL	161		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA 32

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Seminario	Plaza de la Constitución y Moneda	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
Av. Hidalgo (Alameda Central)	Calle Dr. Mora y Ángela Peralta	CENTRO	150	Falta de energía	Circuitos apagados
Calle 16 de Septiembre	Isabel la Católica y Simón Bolívar	CENTRO	24	Contactador y fotocelda.	Circuito apagado
Av. Juárez	Av. Balderas y Calle Azueta	CENTRO	1	Retiro de conexión ajena al circuito	Luminaria apagada
Calle 16 de Septiembre	Isabel la Católica y Motolinea	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Calle Francisco I. Madero	Fray Pedro de Gante y Simón Bolívar	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Calle República de Ecuador	República de Brasil y República de Argentina	CENTRO	1	Reconexión de líneas en registro	Luminaria apagada
Calle Seminario	Moneda y Plaza de la Constitución	CENTRO	21	Cableado en poste	Circuitos apagados
Av. Juárez	Calle Dolores y Calle López	CENTRO	19	Reconexión de control	Circuito apagado
Av. Juárez	Calle Dolores y Calle López	CENTRO	6	Reconexión de control	Circuito apagado
		TOTAL	225		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Seguimiento de indicadores - enero a julio 2021



6,502
reparaciones de
luminarias
enero - julio

Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Recolección Zona I

SOS-DGSUS Recolección Zona I | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	12 al 25/07	26/07 al 08/08	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros Barridos de guarnición en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	8,618.512 km	8,618.512 Km	24 de agosto
Limpieza	Metros cuadrados Barridos de Banquetas en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	16,768,780 m2	16,768,780 m2	
Limpieza	Metros Cuadrados Barridos de Plazas y Corredores en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	8,474,312 m2	8,474,312 m2	

SOS-DGSUS Recolección Zona I | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	12 al 25/07	26/07 al 08/08	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros de Barrido Mecánico en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	1,279.040 km	1,279.040 km	24 de agosto
Limpieza	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestino y recolección de residuos producto del barrido en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	7,035 m3	7,117 m3	
Recolección de tierra	Metros cúbicos de tierra recolectada en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	108.50 m3	114.75 m3	

SOS-DGSUS Recolección Zona I | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	12 al 25/07	26/07 al 08/08	Próximo reporte
Lavado de papeleras	Piezas de papeleras lavadas en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	1,120 piezas	1,120 piezas	24 de agosto
Lavado	Metros cuadrados lavados en Plazas, Calles, Corredores peatonales y semipeatonales en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	624,442 m2	633,263 m2	
Lavado de sitios críticos	Sitios críticos lavados en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	18 Sitios (255 promedio en la quincena)	18 Sitios (257 promedio en la quincena)	

SOS-DGSUS Recolección Zona I | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	12 al 25/07	26/07 al 08/08	Próximo reporte
Recolección tiraderos clandestinos	Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos en el Perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	25 Tiraderos (350 promedio en la quincena)	25 Tiraderos (350 promedio en la quincena)	24 de agosto
Retiro de chicles	Piezas de Chicles retiradas en el Corredor Madero	Quincenal	2,892 piezas	4,342 piezas	
Eliminación de grafiti	Metros Cuadrados de grafiti eliminado en el Perímetro "A" el Centro Histórico	Quincenal	1,361 m2	1,225.50 m2	

SOS-DGSUS Recolección Zona I | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	12 al 25/07	26/07 al 08/08	Próximo reporte
Desratización	Desratización en el Perímetro "A" y "B" del Centro Histórico		Colocación 3,951 cebos cereal B en una superficie de 75,730 m2	Colocación 2,364 cebos B y 1,392 cebos cereal B mini block en una superficie de 131,930 m2	24 de agosto
Retiro de propaganda	Piezas retiradas de propaganda en el Perímetro "A" el Centro Histórico		912 piezas	1,069 piezas	

SOS-DGSUS Recolección Zona I | Acciones preventivas con el personal por COVID-19

- Toma la temperatura todos los días en los tres turnos.
- Entrega de caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.



SOS-DGSUS Recolección Zona I | Actividades de limpieza integral en el Centro Histórico

ELIMINACIÓN DE GRAFITI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
CORREO MAYOR DE REPÚBLICA DE GUATEMALA A SAN JERÓNIMO	21	m2
REPÚBLICA DE URUGUAY DE JESÚS MARÍA A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	19	m2
BELISARIO DOMÍNGUEZ DE EJE CENTRAL A REPÚBLICA DE BRASIL	14	m2
AV. 5 DE MAYO DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MONTE DE PIEDAD	9	m2
MADERO DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MONTE DE PIEDAD	7	m2
CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN FRENTE A PALACIO NACIONAL (PROTESTA)	375	m2
JESÚS MARÍA DE SAN PABLO A CORREGIDORA	44	m2
REPÚBLICA DE BRASIL DE TACUBA A BELISARIO DOMÍNGUEZ	18	m2
CORREO MAYOR DE MONEDA A SAN PABLO	17	m2
VENUSTIANO CARRANZA DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A JESÚS MARÍA	9	m2
PALMA DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A VENUSTIANO CARRANZA	14.50	m2
TACUBA DE MONTE DE PIEDAD A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	48	m2
DONCELES DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A REPÚBLICA DE BRASIL	16	m2
SIMÓN BOLÍVAR DE TACUBA A AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA	25	m2
BELISARIO DOMÍNGUEZ DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A REPÚBLICA DE BRASIL	14.50	m2
LAS CRUCES DE VENUSTIANO CARRANZA A SAN PABLO	24	m2
CALLEJON DE MESONES DE MESONES A REGINA	12	m2
PLAZA SANTA VERACRUZ DE PENSADOR MEXICANO A AV. HIDALGO	58	m2
DONCELES DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A REPÚBLICA DE BRASIL	32	m2
BELISARIO DOMÍNGUEZ DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A REPÚBLICA DE BRASIL	22.50	m2
MOTOLINIA DE AV. 5 DE MAYO A 16 DE SEPTIEMBRE	14	m2
REPÚBLICA DE CHILE DE TACUBA A BELISARIO DOMÍNGUEZ	21	m2
AV. JUÁREZ DE LÓPEZ A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (PROTESTA)	391	m2
TOTAL	1,225.50	m2

SOS-DGSUS Recolección Zona I | Actividades de limpieza integral en el Centro Histórico

ELIMINACIÓN DE 766 M2 DE PROTESTA Y 459.50 M2 DE GRAFITI DE VANDÁLICO



SOS-DGSUS Recolección Zona I | Actividades de limpieza integral en el Centro

Histórico


ELIMINACIÓN DE GRAFITI VANDÁLICO



SOS-DGSUS Recolección Zona I | Actividades de limpieza integral en el Centro Histórico



SOS-DGSUS Recolección Zona I | Actividades de limpieza integral en el Centro Histórico

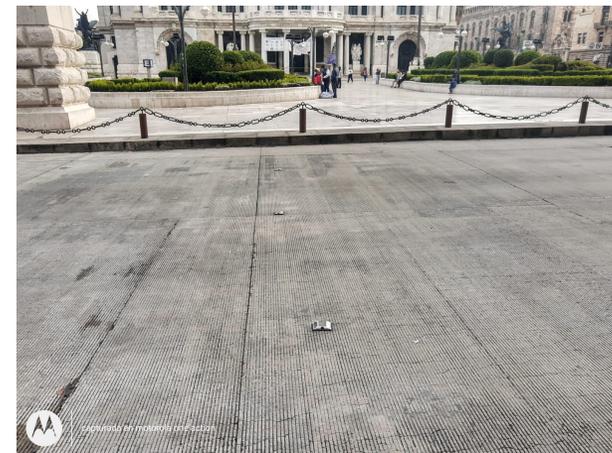

SOS-DGSUS Recolección Zona I | Atención Fauna Nociva

DESRATIZACIÓN POR MEDIO DE COLOCACIÓN DE 2,364 CEBOS B Y 1,392 CEBOS CEREAL B MINI BLOCK, EN UNA SUPERFICIE DE 131,930 M2 DE PLAZAS, CORREDORES Y VIALIDADES DEL CENTRO HISTÓRICO



SOS-DGSUS Recolección Zona I | Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 192 cebos B, en 560 m2.
Vialidad General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprian col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 96 cebos B, en 1,200 m2.
Vialidad San Ciprian	B	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier Col Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 36 cebos B, en 1,200 m2.
Exterior del Mercado Candelaria	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprian y General Anaya , Col. Merced Balbuena Venustiano Carranza	Desratización 36 cebos B, en 1,140 m2.
Exterior Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Ote. Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 72 cebos B, en 8,200 m2.
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	Eje 1 Norte a San Pablo Col. Morelos, Venustiano Carranza	Desratización 168 cebos B, en 3,800 m2.
Plaza de la Solidaridad	A	Av. Juárez esquina Balderas Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 45 cebos B en 860 m2.
Plaza San Fernando	B	Eje 1 Poniente Guerrero, San Fernando, Puente de Alvarado col. Guerrero, Cuauhtémoc	Desratización 30 cebos B en 2,500 m2.
Vialidad Puente de Alvarado	B	De Av. Paseo de la Reforma a callejón Sombrereros col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 30 cebos B en 750 m2.
Vialidad Eje 1 Poniente Rosales	B	De Puente de Alvarado a Av. Paseo de la Reforma col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 36 cebos B en 900 m2.

SOS-DGSUS Recolección Zona I | Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrante s	Ubicación	Actividad
Vialidad Balderas	B	De Av. Paseo de la Reforma a Av. Juárez Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 63 cebos B en 1,200 m ² .
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 72 cebos B en 33,000 m ² .
Bodega de Limpieza Urbana	A	Av. Juárez, No. 20 , Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 18 cebos B en un área de 200 m ² .
Vialidad San Pablo	A	De Eje 1 Oriente a Av. José María Pino Suárez, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 175 cebos B en un área de 2,100 m ² .
Vialidad Av. José María Izazaga	A	De Isabel la Católica a Simón Bolívar, col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 60 cebos B en un área de 1,400 m ² .
Vialidad Eje 1 Norte Mosqueta	A	De Eje 1 Poniente Guerrero a Av. Paseo de la Reforma, lado sur y norte col. Guerrero Cuauhtémoc	Desratización 115 cebos B en un área de 800 m ² .
Vialidad Roldan	B	De Fray Servando Teresa de Mier a Puente de Santo Tomás col. Centro, Cuauhtémoc	Desratización 66 cebos B en un área de 450 m ² .
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	Fray Servando y Calzada de la Viga, col. Esperanza Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 171 cebos B en un área de 650 m ² .
Plaza Teatro Blanquita	B	Eje Central Lázaro Cárdenas, Pensador Mexicano y Mina, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 60 cebos B en un área de 1,800 m ² .

SOS-DGSUS Recolección Zona I | Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Av. Morelos	B	Congreso de la Unión a calzada de la Viga, col. Jamaica, Venustiano Carranza	Desratización 54 cebos cereal B, mini block; 51 cebos cereal en 850 m2.
Vialidad Congreso de la Unión	B	Emiliano Zapata a Herreros de Oriente a Poniente col. Morelos, Venustiano Carranza	Desratización 96 cebos cereal B, mini block; 70 cebos cereal en 800 m2.
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Fray Servando a Sidar y Rovirosa, col. Merced Balbuena, Venustiano Carranza	Desratización 48 cebos cereal B, mini block; 45 cebos cereal en 1,200 m2.
Exterior del mercado de Jamaica	B	Congreso de la Unión lado Oriente, calzada Mixhuca y Melchor Ocampo, col. Magdalena Mixhuca, Venustiano Carranza	Desratización 36 cebos cereal B, mini block; 30 cebos cereal en 650 m2.
Parque S/N	B	Manuel Doblado y Obreros col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 171 cebos cereal B, mini block en 220 m2.
Eje 2 Norte	B	Esquina Eje Central Lázaro Cárdenas , Col. Peralvillo , Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 156 cebos cereal B, mini block en 350 m2.
Vialidad Eje 1 Oriente	B	Esquina Constancia Tiradero clandestino No. 62, col. Morelos Cuauhtémoc	Desratización 96 cebos cereal B, mini block en 100 m2.
Vialidad Eje 1 Oriente	B	Esquina Caridad Col. Morelos Cuauhtémoc	Desratización 60 cebos cereal B, mini block en 250 m2.
Vialidad Eje 1 Oriente	B	Manuel Doblado Tiradero clandestino No. 64 col. Morelos Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 90 cebos cereal B, mini block en 100 m2.

SOS-DGSUS Recolección Zona I | Atención Fauna Nociva



Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad	B	Av. del Trabajo de Gorostiza a Panaderos, Col. Morelos Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 72 Cereal B, en 680 m ²
Congreso de la Unión	B	De Canal del Norte a Aluminio, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 36 Cereal B, en 380 m ²
Congreso de la Unión	B	De Calle Circunvalación a Eje 2 Norte, Col. Michoacana, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 96 Cereal B, en 350 m ²
Tiradero Clandestino	B	Congreso de la Unión, Herreros a Hortelanos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 66 Cereal B, en 100 m ²
Tiradero Clandestino	B	Congreso de la Unión, Esq. Hortelanos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 54 Cereal B, en 2,100 m ²
Canal del Norte	B	Congreso de la Unión, de Plomeros a Eje 2 Norte, Col. Michoacán, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 30 Cereal B, en 1,750 m ²
Canal del Norte	B	De Bonanza a Eje 2 Oriente Congreso de la Unión, Col. Ampliación Michoacana, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 60 Cereal B, en 350 m ²
Congreso de la Unión, (Camellón)	B	De Aluminio a Estaño, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 36 Cereal B, en 380 m ²
Aluminio	B	De Congreso de la Unión a Pabellón, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 30 Cereal B, en 760 m ²
Ext. Del Mercado del Rastro	B	Ing. Eduardo Molina, Aluminio, Sorpresa y Estaño, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 57 Cereal B, en 2,150 m ²
Av. del Trabajo	B	De Panaderos a Mecánicos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 66 Cereal B, en 850 m ²

SOS-DGSUS Recolección Zona I | Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 126 Cebos Cereal B, Mini Block, 1,600 m ²
Anillo de Circunvalación	B	De San Pablo a Fray Servando, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 189 Cebos Cereal B, Mini Block, 800 m ²
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De República de Guatemala, a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 192 Cebos Cereal B, Mini Block, 2,200 m ²
Ext. Del Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar, Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 24 Cebos Cereal B, Mini Block, 1,800 m ²
Área Verde	A	Tolsa, Balderas, Enrico Martínez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 24 Cebos Cereal B, Mini Block, 800 m ²
Vialidad	B	Plaza de la Ciudadela, Balderas, Enrico Martínez y José María Morelos, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 30 Cebos Cereal B, Mini Block, 850 m ²
Plaza de la Constitución Zócalo	A	20 de Noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 24 Cereal B, en 46,800 m ²

SOS-DGSUS Recolección Zona I | Actividades de limpieza integral en el Centro Histórico

LAVADO

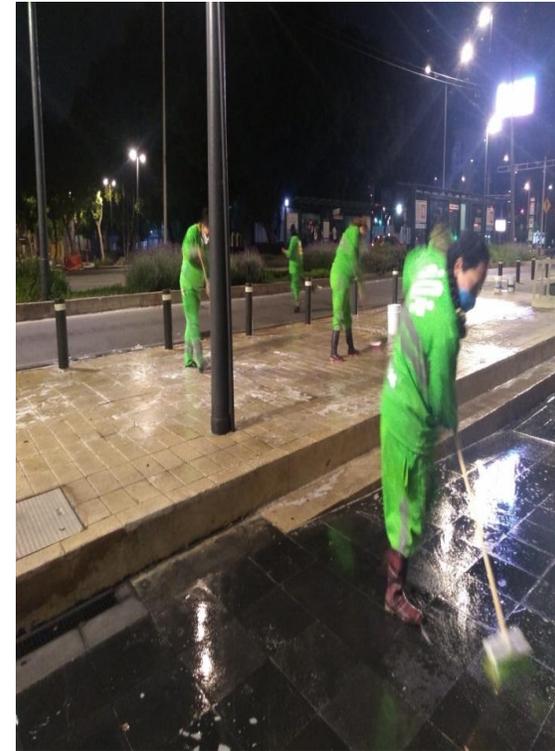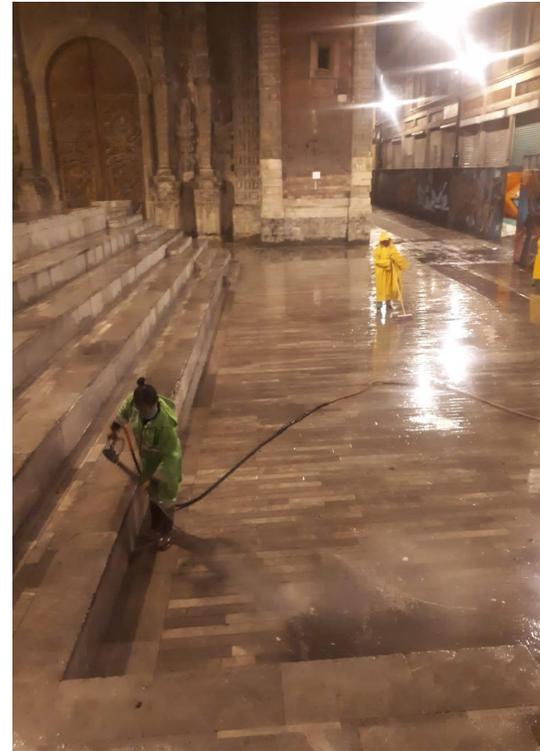

SOS-DGSUS Recolección Zona I | Actividades de limpieza integral en el Centro Histórico

BARRIDO MANUAL




SOS-DGSUS Recolección Zona I | Actividades de limpieza integral en el Centro Histórico

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS




SOS-DGSUS Recolección Zona I | Actividades de limpieza integral en el Centro Histórico

RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS

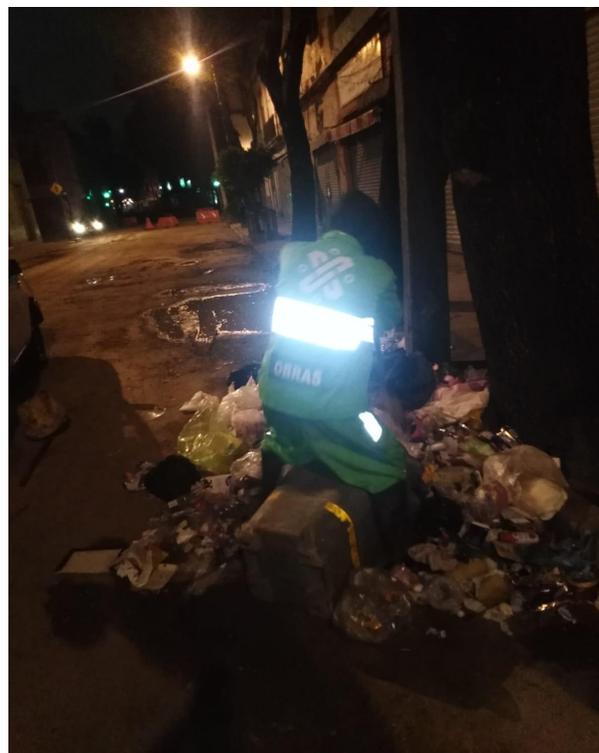


SOS-DGSUS Recolección Zona I | Actividades de limpieza integral en el Centro Histórico

LAVADO DE PAPELERAS

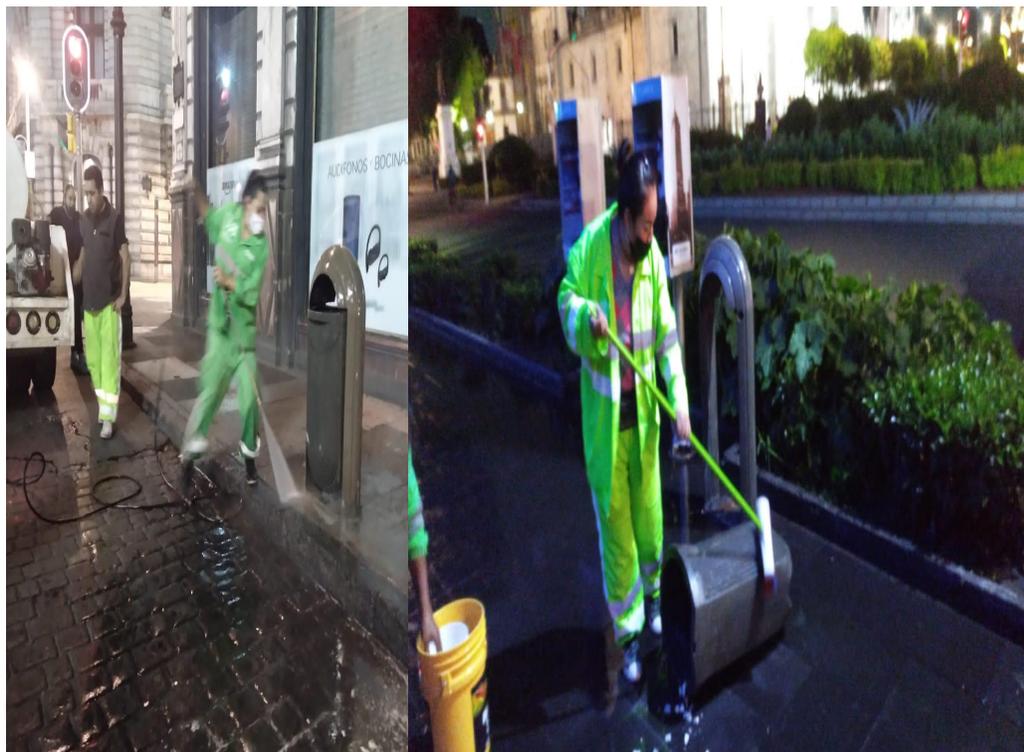

RETIRO DE PROPAGANDA



SOS-DGSUS Recolección Zona I | Actividades de limpieza integral en el Centro Histórico

RETIRO DE CHICLES




SOS-DGSUS Recolección Zona I | Seguimiento de indicadores - enero a julio 2021

104,869 m³

de recolección en tiraderos clandestinos y barrido en PA
enero - julio


Recolección en tiraderos clandestinos y de barrido en perímetro A



52,103.5 m²

de graffiti eliminado
enero - julio

Eliminación de grafiti




SOS-DGSUS Recolección Zona I | Seguimiento de indicadores - enero a julio 2021

64,650

piezas de chicle retirados en PA
enero - julio


Chicles retirados en perímetro "A"



29,581

piezas de cebos colocadas en PA y PB
enero - julio

Desratización, colocación de cebos en perímetro "A" y "B"




SOS-DGSUS Recolección Zona I | Seguimiento de indicadores - enero a junio 2021

Lo equivalente a 11,735.26 km²

de lavado de plazas, calles y corredores en PA
enero - julio


Lavado de Plazas, calles y corredores peatonales y semipeatonales en perímetro "A"



8,057

piezas de propaganda retirada
enero - julio

Retiro de propaganda



* En junio 2063 piezas fueron de propaganda electoral



Sistema de Transporte Colectivo

Metro

STC Metro | Indicadores


Indicador	Periodicidad	24/07 al 06/08	Próximo reporte
75 Escaleras eléctricas en las 29 estaciones del Centro Histórico	Quincenal	2 escaleras detenida (en mantenimiento)	20 de agosto
19 Elevadores en estaciones del Centro Histórico		1 elevador detenido	

STC Metro | Seguimiento de indicadores - enero a julio 2021

96.06%

de eficiencia en funcionamiento de escaleras eléctricas CH
enero - julio


Funcionamiento de escaleras instalados en 29 estaciones de metro en Centro Histórico



96.00%

de eficiencia en funcionamiento de elevadores CH
enero - julio

Funcionamiento de elevadores instalados en 29 estaciones de metro en Centro Histórico





Metrobús



Metrobús | Indicadores

Corredor Centro Histórico
Inaugurada el 1 de abril del 2012
Cuenta con 62 parabuses y 3 terminales.

CONCEPTO	PENDIENTES	REALIZADOS
Rehabilitación de Guarnición y Recinto en para bus.	18 ESTACIONES	18%
Rehabilitación de Estelas informativas.	57 PIEZAS	2 PIEZAS
Suministro de Estelas informativas.	6 PIEZAS	0%
Colocación de Bolardos .	49 PIEZAS	0%
Colocación de Elementos de Confinamiento.	5880 PIEZAS	1300 PIEZAS
Balizamiento general	73,795.15 ml	35%

Metrobús | Gráficas Alcaldía Cuauhtémoc



Metrobús | Gráficas México Tenochtitlan



Metrobús | Gráficas Plaza de la República



Metrobús | Gráficas Expo Reforma




Metrobús | Gráficas Vocacional 5



Metrobús | Gráficas Juárez



Metrobús | Gráficas Eje Central

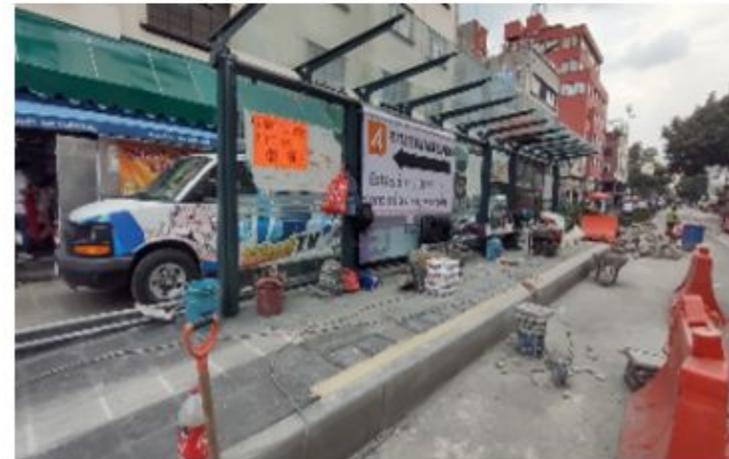


Metrobús | Gráficas Balizamiento



Metrobús | Seguimiento de indicadores junio a julio 2021

REHABILITACIÓN METROBUS



13.08 %
 avance de proyecto*
 julio

*SER INICIARON TRABAJOS EN JUNIO 2021



Comisión Federal de Electricidad

Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena del 26 de julio al 9 de agosto de 2021	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de robos registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	0	
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	53	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	9	24 de agosto 2021
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	5	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	9	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 1. Detalle de ubicaciones Número de robos registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 2. Detalle de ubicaciones Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo	
MADERO	EJE CENTRAL	PALMA	SIN DATO	COL. CENTRO	13	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
TACUBA	EJE CENTRAL	MONTE DE PIEDAD	SIN DATO	COL. CENTRO	13	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
REPÚBLICA DE URUGUAY	EJE CENTRAL	CORREO MAYOR	SIN DATO	COL. CENTRO	17	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
MESONES	AYUNTAMIENTO	INDEPENDENCIA	SIN DATO	COL. CENTRO	10	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
				TOTAL	53	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones de fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
REP. DE BOLIVIA 25	REP. DE BRASIL	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
CALLEJÓN DEL TORO 19	ALLENDE	REP. DE CHIL	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
CALLEJÓN DEL TORO 17	ALLENDE	REP. DE CHILE	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE BOLIVIA 55	REP. DE BRASIL	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
CORREGIDORA 58	JESÚS MARÍA	CORREO MAYOR	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
CORREGIDORA 88	CIRCUNVALACIÓN	CDA. CORREGIDORA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE ARGENTINA 62	REP. DE BOLIVIA	REP. DE PERÚ	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE CHILE 68	REP. DE HONDURAS	REP. DE PERÚ	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
SAN CAMILITO 24	ESQUINA	REP. DE ECUADOR	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	9	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 4. Detalle de ubicaciones Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
SAN ANTONIO TOMATLAN	ESQUINA	CIRCUNVALACIÓN	SIN DATO	COL. CENTRO	1	REPARACIÓN DE TAPA EN BÓVEDA
SAN ANTONIO TOMATLAN 48	VIDAL ALCOCER	CALLEJÓN MIXCALCO	SIN DATO	COL. CENTRO	1	REPARACIÓN DE TAPA EN BÓVEDA
REP. DE URUGUAY	ESQUINA	EJE CENTRAL	SIN DATO	COL. CENTRO	1	REPARACIÓN DE TAPA EN REGISTRO
MISIPI	ESQUINA	LERMA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	REPARACIÓN DE TAPA EN REGISTRO
TUXPAN 39	QUINTANA ROO	TEHUANTEPEC	SIN DATO	COL. CENTRO	1	REPARACIÓN DE TAPA EN REGISTRO
				TOTAL	5	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública


DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
LAZARÍN DEL TORO 17	ESQUINA	ALLENDE	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
LAZARÍN DEL TORO 19	ESQUINA	ALLENDE	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
LAZARÍN DEL TORO 24	ESQUINA	ALLENDE	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE ARGENTINA 68	REP. DE BOLIVIA	REP. DE PERÚ	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
EJE 1 NORTE	CIRCUNVALACIÓN	MANUEL DOBLADO	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE BOLIVIA 55	REP. DE ARGENTINA	DEL CARMEN	SIN DATO	COL. ROMA NORTE	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE BOLIVIA 37	REP. DE ARGENTINA	DEL CARMEN	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE BOLIVIA 39	REP. DE ARGENTINA	DEL CARMEN	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
LAZARÍN DEL TORO 11	ESQUINA	ALLENDE	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	9	

Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de indicadores - enero a julio 2021

18

Robos de elementos de infraestructura
enero - julio


Robos registrados de elementos de infraestructura

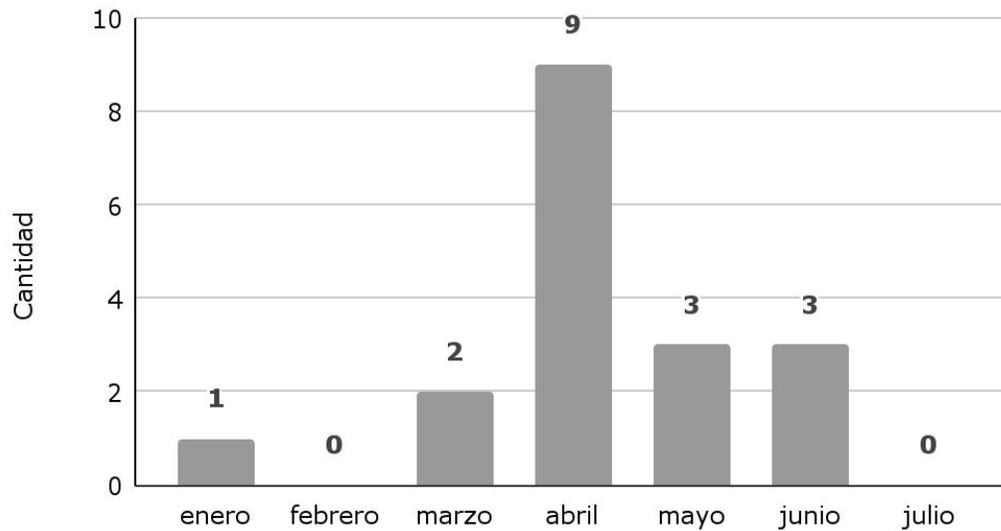

525

bóvedas con acciones de desagüe
enero - julio

Bóvedas atendidas con acciones de desagüe




Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de indicadores - enero a julio 2021

106

Atenciones de fallas en suministro de energía eléctrica
enero - julio


Atenciones de fallas en el suministro de energía eléctrica



59

tapas de registros y/o bóvedas reparadas
enero - julio

Tapas de registros y/o bóvedas reparadas




Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de indicadores - enero a julio 2021

119

obras de mantenimiento que implican rompimiento
enero - julio

Mantenimiento que implique rompimiento en vía pública





Instituto Nacional de Antropología e Historia

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Indicadores

Tema	Indicador	Quincena del 26/07 al 06/08	Próximo reporte
Obras	Número de trámites de solicitud de autorización de obra en inmuebles	6	
Programa Ciudad al Aire Libre	Número de trámites de solicitud de autorización de colocación de enseres	2	
			24 de agosto
Obras	Número de autorizaciones de obras emitidas en inmuebles	12	
Programa Ciudad al Aire Libre	Número de autorizaciones emitidas para la colocación de enseres	7	



Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Tipo de Obra
29/7/2021	BUCARELI	42	RETIRO DE PISO EXISTENTE DE MANERA MANUAL, COLOCACIÓN DE NUEVO PISO DE PORCELANATO.
30/7/2021	LEANDRO VALLE	S/N	DEMOLICIÓN DE AGREGADOS, ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS HISTÓRICOS EN ANEXOS.
31/7/2021	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	S/N	TRABAJOS EMERGENTES DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN PARA ATENDER DESPRENDIMIENTOS DE CORNISAS DE LA TORRE PONIENTE DE LA CATEDRAL METROPOLITANA Y PIEZAS DE LA CÚPULA DEL SAGRARIO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
2/8/2021	REPÚBLICA DEL SALVADOR	20	REFORZAMIENTO DE COLUMNAS MEDIANTE LA TÉCNICA DE UNA ARMADURA DE ACERO A CADA COLUMNA Y LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE ARROSTRAMIENTO LATERAL EN MARCOS RIGIDOS EN EL EDIFICIO.
4/8/2021	DONATO GUERRA	5	RESTAURACIÓN INTEGRAL DE FACHADA Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS.
5/8/2021	SAN ILDEFONSO	33	ELABORACIÓN DE CALAS EN LOS PLAFONES DEL ANFITEATRO SIMÓN BOLIVAR, PARA IDENTIFICAR EL SISTEMA CONSTRUCTIVO, LA FIJACIÓN DEL PLAFÓN Y LAS INSTALACIONES.

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Solicitudes de autorización de enseres. PROGRAMA CIUDAD AL AIRE LIBRE

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Tipo de Obra
31/7/2021	REGINA	31	COLOCACIÓN DE ENSERES DESMONTABLES EN VÍA PÚBLICA.
1/8/2021	PALMA	9	COLOCACIÓN DE ENSERES EN LA VÍA PÚBLICA CONSISTENTE EN 4 MESAS REDONDAS CON 4 SILLAS CADA UNA, PARA UN TOTAL DE 16 SILLAS, EN UNA SUPERFICIE DE 10 METROS CUADRADOS.

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Autorizaciones de obra

AUTORIZACIÓN	DOMICILIO	MOTIVO	TIPO
274/21	EJE I PONIENTE BUCARELI N° 35	REFORZAMIENTO SANITARIO Y MEJORAS DE BANQUETAS	OBRA MAYOR
278/21	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER N° 396	TRABAJOS DE REMODELACIÓN	OBRA MAYOR
279/21	TACUBA N° 1	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN FACHADA	OBRA MAYOR
290/21	LEANDRO VALLE S/N	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO EN TORNO AL PORTAL DE ESCRIBANOS	OBRA MAYOR
292/21	GUATEMALA-ARGENTINA-JUSTO SIERRA S/N	CONSTRUCCIÓN ESCALERA DE ACCESO AL TEMPLO EHECATL Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VENTANAS ARQUEOLOGICAS	OBRA MAYOR
293/21	BRASIL-ECUADOR-CRUCES-OBRAJE-PARAGUAY-RIVA PALACIO S/N	ARREGLO DE FACHADAS: BRASIL, ECUADOR, LAS CRUCES, OBRAJE, PARAGUAY Y RIVA PALACIO	OBRA MAYOR
294/21	TORRES QUINTERO S/N	CAMBIO DE PAVIMENTOS, REHABILITACIÓN DE FUENTES, CAMBIO DE MOBILIARIO URBANO	OBRA MAYOR

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Autorizaciones de obra

AUTORIZACIÓN	DOMICILIO	MOTIVO	TIPO
275/21	TENOCHTITLAN N° 111	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
287/21	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS N° 21	ADECUACIONES INTERIORES	OBRA MENOR
288/21	EMILIANO ZAPATA N° 37	TRABAJOS PRELIMINARES	OBRA MENOR
289/21	LEANDRO VALLE N° 4	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL INTERIOR DEL INMUEBLE	OBRA MENOR
296/21	CENTRO HISTÓRICO-PERÍMETRO "A" S/N	SUSTITUCIÓN DE QUIOSCOS DE PERIÓDICOS	OBRA MENOR

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores


Autorizaciones de enseres PROGRAMA CIUDAD AL AIRE LIBRE

AUTORIZACIÓN	DOMICILIO	MOTIVO	TIPO
280/21	JUÁREZ N° 64	COLOCACIÓN DE ENSERES	OBRA MENOR
281/21	ISABEL LA CATÓLICA N° 87	COLOCACIÓN DE ENSERES	OBRA MENOR
282/21	REGINA N°59	COLOCACIÓN DE ENSERES	OBRA MENOR
283/21	GANTE N° 8	COLOCACIÓN DE ENSERES	OBRA MENOR
284/21	SANTÍSIMA N°23	COLOCACIÓN DE ENSERES	OBRA MENOR
285/21	1ER. CALLEJÓN DE MESONES N° 7	COLOCACIÓN DE ENSERES	OBRA MENOR
286/21	16 DE SEPTIEMBRE N°45	COLOCACIÓN DE ENSERES	OBRA MENOR

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Seguimiento de indicadores - enero a julio 2021


155

solicitudes de autorización de obra
enero - julio

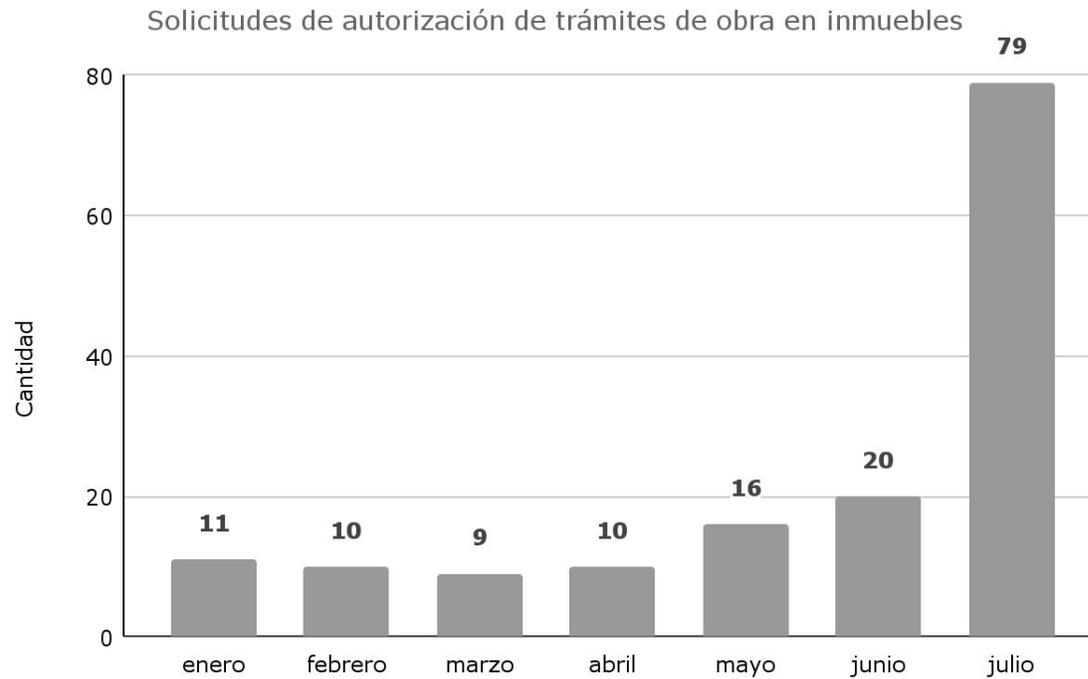

213

autorizaciones de obra
enero - julio

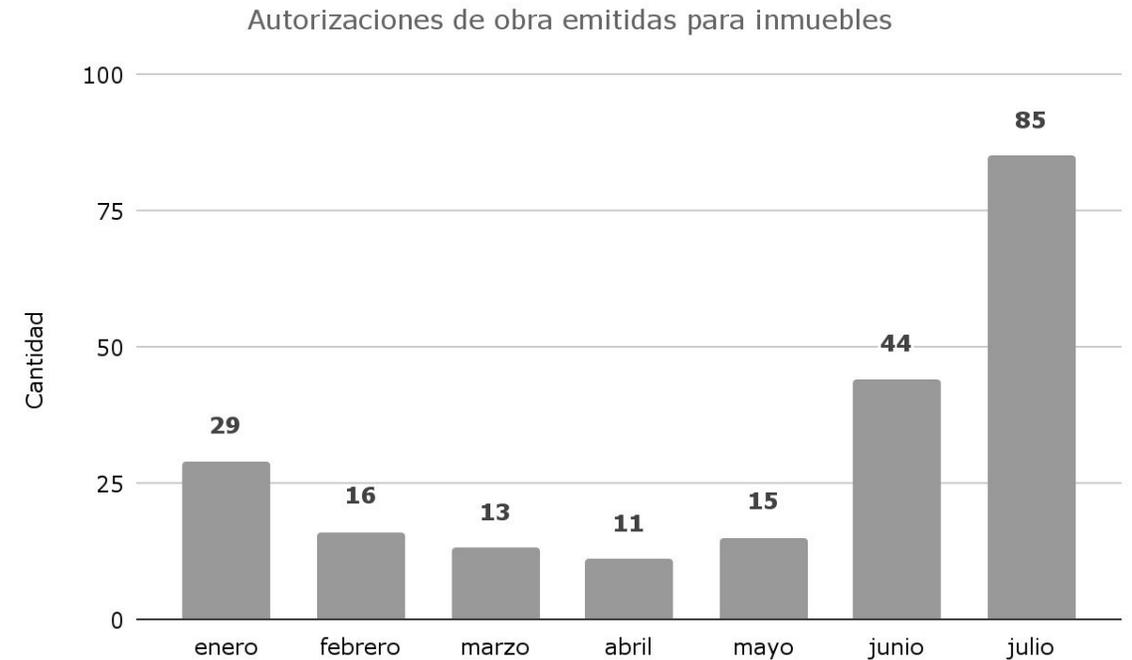



Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura | Indicadores

Tema	Indicador	Quincena al 26/07	Próximo reporte	Observaciones
Obras	Número de solicitudes de autorización	13	07 de septiembre	<ul style="list-style-type: none"> ● 07 consultas de calidad artística ● 06 solicitudes de obra
Obras	Número de autorizaciones de obra	06	07 de septiembre	<ul style="list-style-type: none"> ● 05 obras menores ● 01 obras mayores

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura | Seguimiento de indicadores - enero a julio 2021

Consultas de Calidad Artística


UBICACIÓN	CATÁLOGO
San Ildefonso 28	Incluído
Cristóbal Colón 27	No Incluído
San Camilito 13	No Incluído
Fray Servando Teresa de Mier 396	No Incluído
Palma 19	No Incluído
Las Cruces 32	No incluído
Eje Central 19	No incluído



San Ildefonso 28



Las Cruces 32

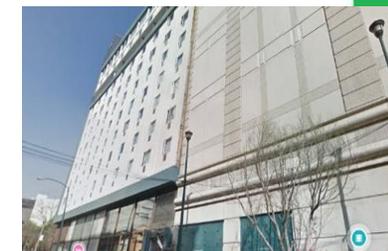

Cristóbal Colón 27



Eje Central 19



Fray Servando 396



Palma 19



San Camilito 13

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura | Seguimiento de indicadores - enero a julio 2021

Autorizaciones de Obra

UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	DESCRIPCIÓN
Monte de Piedad 115	Menor	Adecuación de interiores
16 de Septiembre 82	Menor	Reforzamiento de cortinas metálicas
San Ildefonso 38	Menor	Mejoramiento de acabados e instalaciones
Ernesto Pugibet 2	Menor	Visto Bueno de Reestructuración y mejoramiento de instalaciones
Plaza de Constitución 1	Menor	Restauración de la puerta de Corregidora de Palacio Nacional
Vizcaínas 3	Mayor	Visto Bueno de Reestructuración



Monte de Piedad 115



16 de septiembre 82



Plaza de la Constitución 1



San Ildefonso 38



Vizcaínas 3




Ernesto Pugibet 2

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura | Seguimiento de Indicadores - enero a julio 2021

36

consultas de calidad artística
enero - julio


Consulta de calidad artística

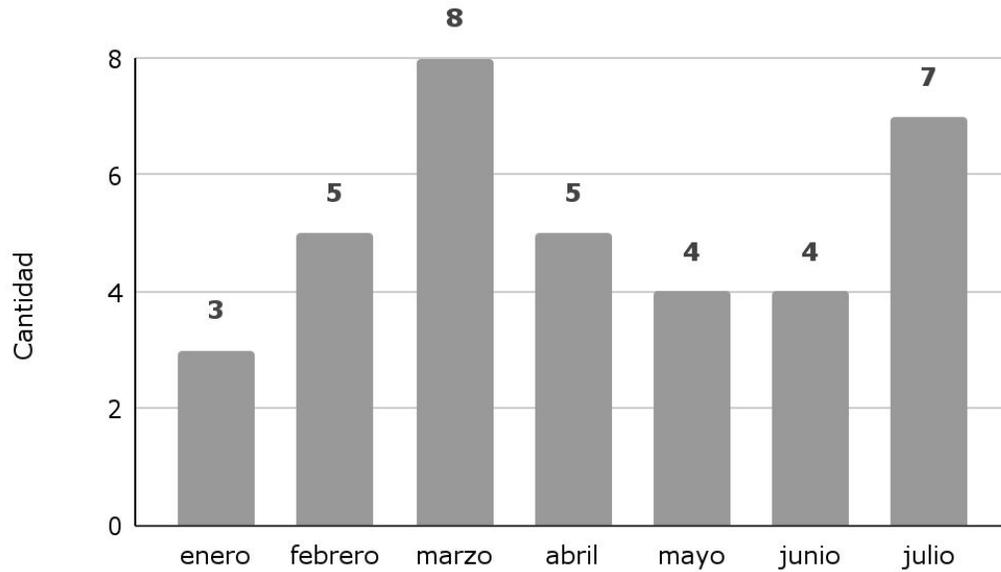

39

obras autorizadas
enero - julio

Obras autorizadas

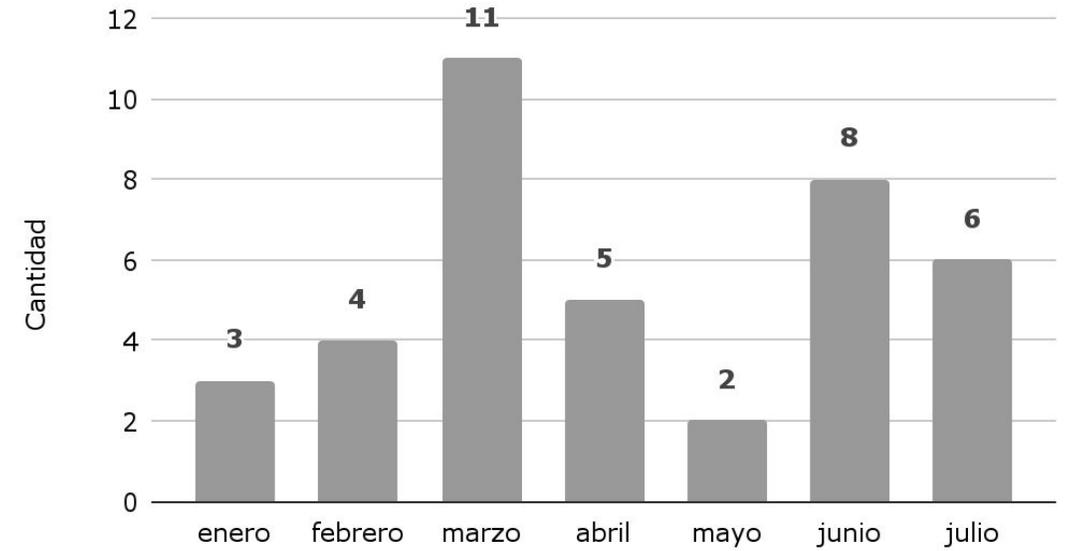



Secretaría de Cultura Federal

*Catedral de México y Sagrario
Metropolitano. Programa de
Conservación*



Secretaría de Cultura Federal | Indicadores




CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE SITIOS Y MONUMENTOS
DEL PATRIMONIO CULTURAL



Mantenimiento al sistema de pilotes de control del conjunto catedralicio



Avance físico: 97 %

Acciones por ejecutar

- Estudios topográficos
renivelación de capilla
de Ánimas

Secretaría de Cultura Federal | Indicadores



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE SITIOS Y MONUMENTOS
DEL PATRIMONIO CULTURAL



Erradicación de flora parásita y calafateo de grietas

antes



después



Avance físico: 100 %

Secretaría de Cultura Federal | Indicadores




CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE SITIOS Y MONUMENTOS
DEL PATRIMONIO CULTURAL




Rehabilitación de instalación eléctrica y sistema pararrayos



Avance físico: 100 %

Secretaría de Cultura Federal | Seguimiento de indicadores - a julio de 2021

Programa de conservación Catedral de México y Sagrario Metropolitano

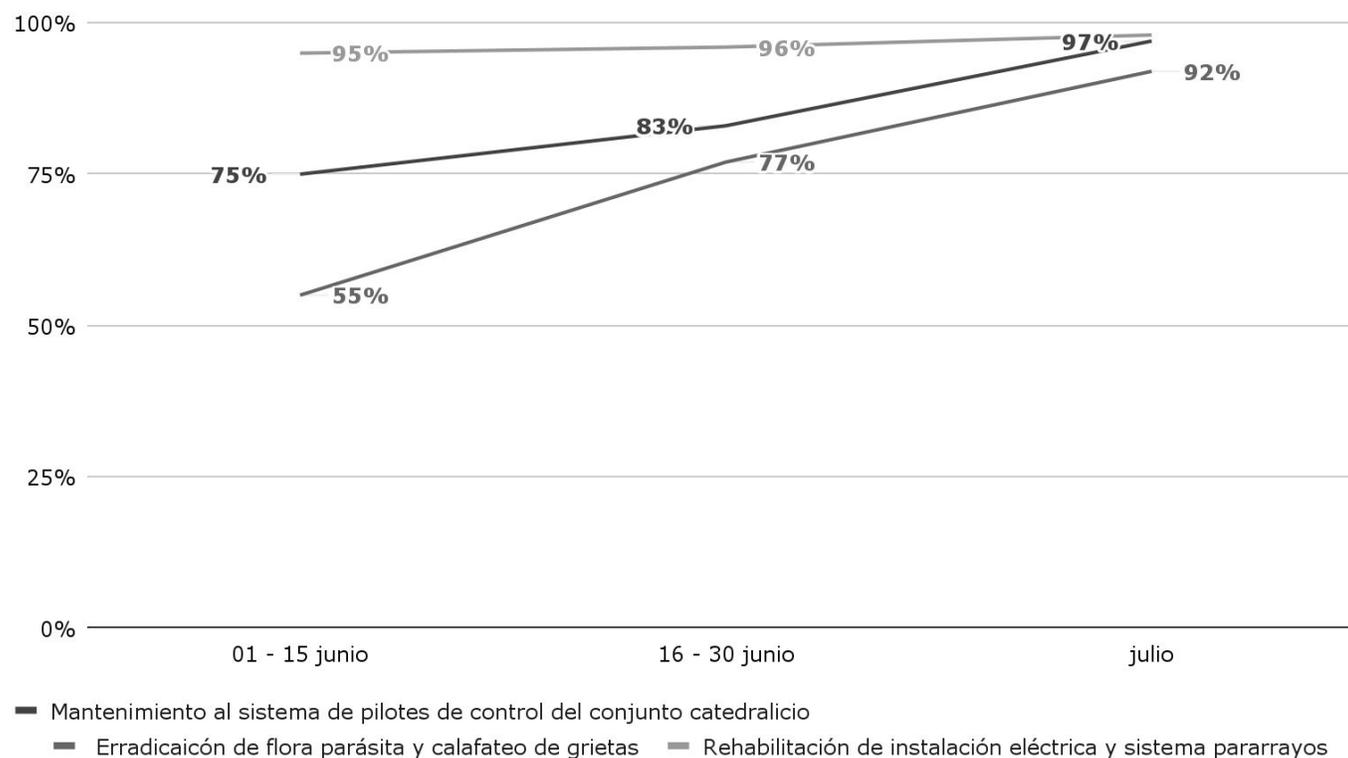

95.60%
avance acumulado
 junio - julio



Comisión Nacional de Vivienda



*REHABILITACIÓN DE VIVIENDA CON VALOR PATRIMONIAL
"CIUDAD DE MÉXICO"*

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020



CONAVI | Indicadores - Programa Nacional de Reconstrucción 2020

NO. ACCIONES	ENTIDAD	MONTO TOTAL	% PROYECTO	INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA
8	CIUDAD DE MÉXICO	\$ 17,081,265.00	100%	FEBRERO-JUNIO 2021	JULIO-OCTUBRE 2021

NO.	ESTADO	MONTO TOTAL	MONTO PROYECTO	% PROYECTO	MONTO DE OBRA	% AVANCE FÍSICO 30 ABRIL 2021	SUPERVISIÓN
1	MAGNOLIA #162	\$ 4,000,000.00	\$ 239,520.00	100%	\$ 3,604,782.34	65%	\$ 150,199.26
2	MANZANARES # 21	\$ 3,500,000.00	\$ 222,717.04	100%	\$ 3,140,354.36	45%	\$ 127,764.60
3	MINA # 42	\$ 900,000.00	\$ 125,743.41	100%	\$ 741,526.84	100%	\$ 30,896.95
4	MINA # 106	\$ 1,799,865.00	\$ 249,671.77	100%	\$ 1,472,350.11	50%	\$ 61,347.92
5	PENSADOR MEXICANO # 15	\$ 1,881,400.00	\$ 400,350.00	100%	\$ 1,416,529.54	85%	\$ 59,022.06
6	SEMINARIO # 12	\$ 300,000.00	\$ 44,725.08	100%	\$ 243,304.44	100%	\$ 10,137.68
7	SOLEDAD # 45	\$ 4,200,000.00	\$ 373,637.94	100%	\$ 3,643,396.29	25%	\$ 151,808.18
8	REPÚBLICA DE VENEZUELA # 93	\$ 500,000.00	\$ 69,230.22	100%	\$ 408,260.51	100%	\$ 17,010.87
TOTAL CONVENIO		\$ 17,081,265.00					

CONAVI | Indicadores - Programa Nacional de Reconstrucción 2020

MAGNOLIA # 162, INICIO DE TRABAJOS 22/02/2021



REINTEGRACIÓN VIGAS



REINTEGRACIÓN DE LADRILLOS EN AZOTEA



CONAVI | Indicadores - Programa Nacional de Reconstrucción 2020

MANZANARES # 21 INICIO DE TRABAJOS 02/02/2021



REINTEGRACIÓN DE ENTREPISO CON PISO DE DUELA



RETIRO DE APLANADOS SIN ADHERENCIA EN UNA CUARTA VIVIENDA.



REINTEGRACIÓN DE CUBIERTA DE AZOTEA EN UNA TERCERA VIVIENDA

CONAVI | Indicadores - Programa Nacional de Reconstrucción 2020

MINA # 106, INICIO DE TRABAJOS EL 12/04/2021



COLOCACIÓN DE CONCRETINA EN MURO COLINDANCIA PONIENTE Y APLANADOS EN PETRIL.



COLOCACIÓN DE APUNTALAMIENTOS EN DEPARTAMENTO



LIBERACIÓN DE APLANADO PARA CALAS DE GRIETAS EN MURO



RETIRO DE PUERTAS EN DEPARTAMENTO

CONAVI | Indicadores - Programa Nacional de Reconstrucción 2020

PENSADOR MEXICANO # 15 INICIO DE TRABAJOS 17/02/2021



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI INSECTOS XILÓFAGOS A LAS VIGAS



REINTEGRACIÓN DE GUALDRA EMPALMADA



REINTEGRACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA TRATADA Y PINTADA



REINTEGRACIÓN DE SILLARES DE CANTERA

CONAVI | Indicadores - Programa Nacional de Reconstrucción 2020


SOLEDAD # 45 INICIO DE TRABAJOS 02/06/2021



APUNTALAMIENT
O DE VARIAS
VIVIENDAS



CONAVI | Seguimiento de indicadores - enero a julio de 2021

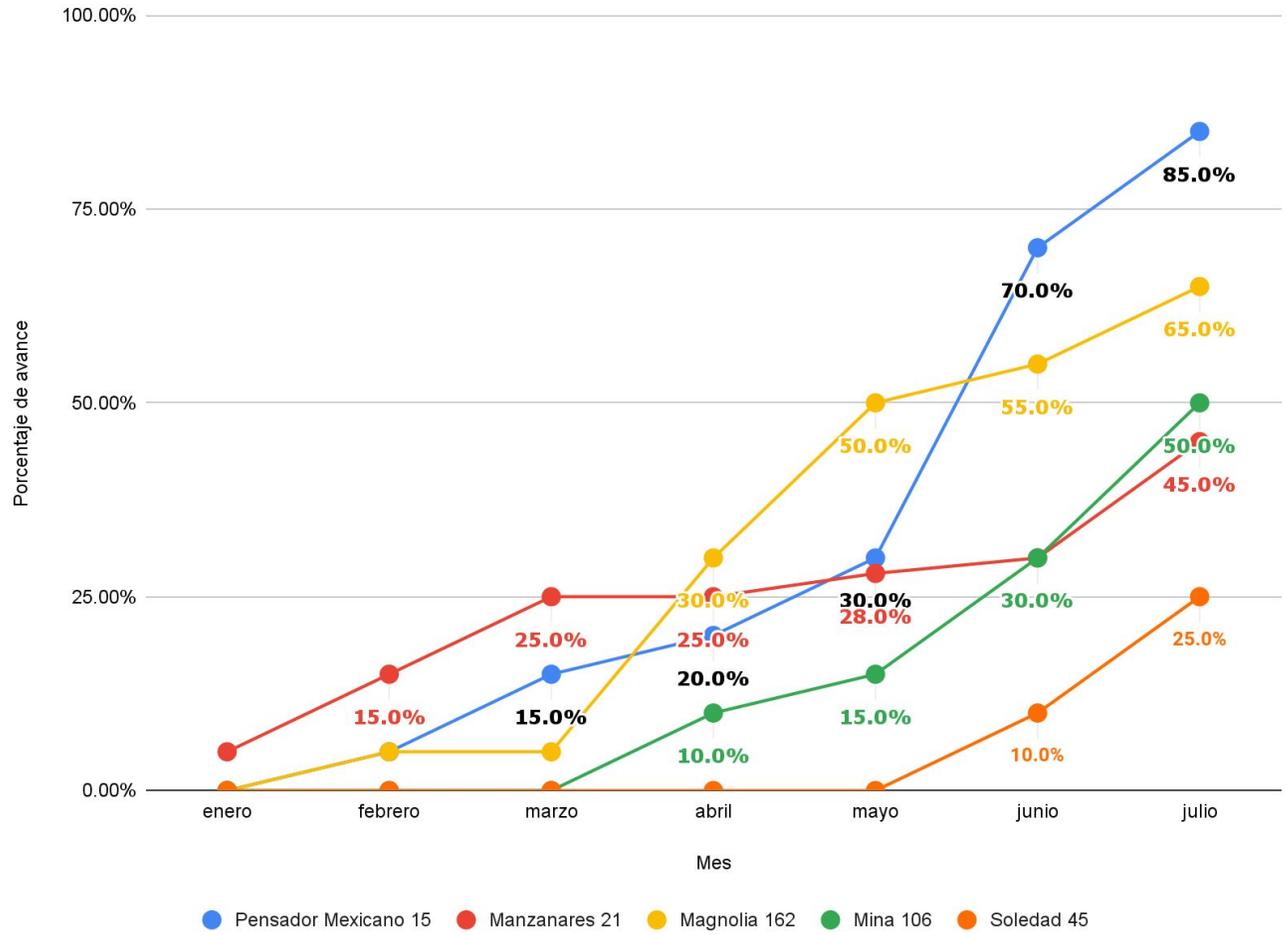


71%
avance global
enero - julio

08 proyectos para vivienda

03 viviendas rehabilitadas concluidas

- Mina 42
- Seminario 12
- Rep. de Venezuela 93

05 proyectos en proceso



Comisión para la Reconstrucción


Comisión para la Reconstrucción | Indicadores

INMUEBLES CON RECURSOS DE LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO DENTRO DE LAS ZONAS DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTORICO

No.	ESTATUS ACTUAL	INTERVENCIÓN	CALLE	NO. EXTERIOR	Edificio / Torre	COLONIA	ALCALDIA	C.P.	AVANCE FÍSICO
MULTIFAMILIARES									
1	EN PROYECTO	RECONSTRUCCION	CALLEJÓN DE LA IGUALDAD	32	-	CENTRO	CUAUHTEMOC	06080	
2	EN OBRA	REHABILITACION	MANUEL MARQUEZ STERLING	34	-	CENTRO	CUAUHTEMOC	06010	24.32%
3	EN PROYECTO	REHABILITACION	REVILLAGIGEDO	78	-	CENTRO	CUAUHTEMOC	06070	
4	EN OBRA	REHABILITACION	CERRADA DE AGUSTIN DELGADO	11	A	TRANSITO	CUAUHTEMOC	06820	64.57%
5	EN PROYECTO	RECONSTRUCCION	SAN ANTONIO ABAD	39	-	OBREERA	CUAUHTEMOC	03100	
6	CONCILIACIÓN SOCIAL	RECONSTRUCCION	LICENCIADO PRIMO DE VERDAD	7	-	CENTRO	CUAUHTEMOC	03300	FALTA DE ACUERDO CONDOMINAL
UNIFAMILIARES									
7	EN PROCESO CANCELACIÓN.	RECONSTRUCCION	RIVA PALACIO	41	-	GUERRERO	CUAUHTEMOC	7420	NO SE INTERVIENE POR FALTA DE ACUERDO FAMILIAR
TEMPLO DE SAN FERNANDO REY									
8	EN OBRA	REHABILITACION	GUERRERO	39	-	CENTRO	CUAUHTEMOC	6300	15.00%

Comisión para la Reconstrucción | Seguimiento de Indicadores - febrero a julio de 2021

Inmuebles en obra CRCDMX del Centro Histórico

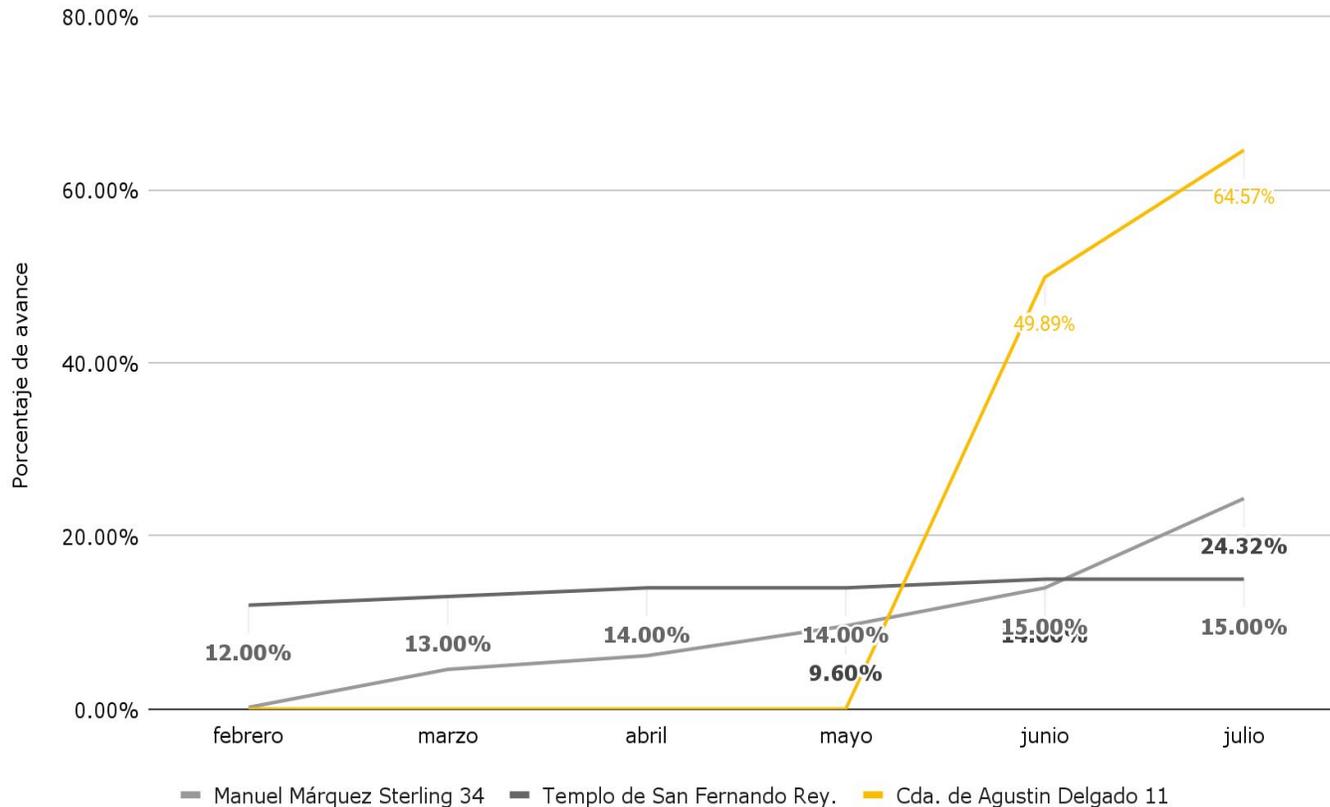

34.63%

avance global

febrero - julio

01 en proceso de administración

04 en proyecto

03 en obra

- Márquez Sterling 34
- Cda. Agustín Delgado 11
- Guerrero 39



Fideicomiso Centro Histórico

FCH | Indicadores

	INMUEBLE / ACCIÓN	STATUS
Convenio de coordinación INAH - FCHCM	Proyecto integral para la reconstrucción, recuperación y restauración del monumento inmueble conocido como Templo San Juan de Dios	En proceso, avance físico 63 %, término septiembre 2021.
	Proyecto integral para la reconstrucción, recuperación y restauración del monumento inmueble conocido como Templo de Santa Catarina	En proceso, avance físico 47 %, término diciembre 2021.
Convenio de coordinación y colaboración fideicomiso f/54 y el FCHCM	Rehabilitación y puesta en valor del espacio público y cultural 'Jardín Regina'. Regina no. 40, Centro Histórico de la Ciudad de México.	En proceso, avance físico 95%, término 23 de julio del 2021.
	Mantenimiento y conservación del espacio público y cultural 'corredor San Jerónimo'.	En proceso, avance físico 100%, término 23 de julio del 2021.
	Señalética para el Centro Histórico, Perímetro B.	En proceso, avance físico 15 %, término enero 2022.
Rehabilitación de Espacios Arqueológicos FCH/Autoridad del Centro Histórico	Construcción de escalera de acceso al Templo de Ehecatl (Monto \$338,675.00)	En proceso, avance 80%, término 12 de julio del 2021
	Construcción de nueva reja perimetral en el Templo Mayor (Monto \$3,104,000.00)	En proceso, avance 80%, término 15 de septiembre de 2021
	Mantenimiento y rehabilitación a ventanas arqueológicas ubicadas en República de Argentina (Monto \$1,048,639.07)	En proceso, avance 80%, término 13 de agosto de 2021

FCH | Gráficas de obras en proceso


OBRAS EN PROCESO: CONVENIO COORDINACIÓN INAH-FCHCM.



Calas en bóvedas.



Reintegración de ajaracas.



Reintegración de aplanados gruesos en grietas consolidadas.



Reintegración de aplanados en interior del campanario.


TEMPLO SAN JUAN DE DIOS.

FCH | Gráficas en desarrollo de proyecto integral

EN DESARROLLO DE PROYECTO INTEGRAL: CONVENIO COORDINACIÓN INAH-FCHCM.



Liberación de enladrillado en extradós de bóveda en nave principal, autorización por parte de la CNMH- INAH y el FCH para comenzar consolidación de grietas.



Movimiento del encofrado que protege el altar mayor, y colocación de apuntalamiento.



Excavación de cala arqueológica, hallazgo de cimentación original y las diferentes etapas constructivas del inmueble.



Clasificación y resguardo de material arqueológico hallado en pozo a cielo abierto.

TEMPLO DE SANTA CATARINA.

FCH | Gráficas de obras en proceso

OBRA EN PROCESO:


CONVENIO COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN FIDEICOMISO F754 y FCHCM.



Mantenimiento de estructura metálica de cubierta.



Terminación de firmes para asentamiento de piso de caucho reciclado.



Mantenimiento de Mobiliario Urbano fijo .



Fabricación de portón corredizo de barras, para sustitución del existente.

MANTENIMIENTO AL JARDÍN REGINA.

FCH | Gráficas de obras en proceso

OBRA EN PROCESO:


CONVENIO COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN FIDEICOMISO F754 y FCHCM.



Mantenimiento de áreas verdes y colocación de material para evitar la erosión del suelo.



Áreas terminadas de andador peatonal y jardineras.

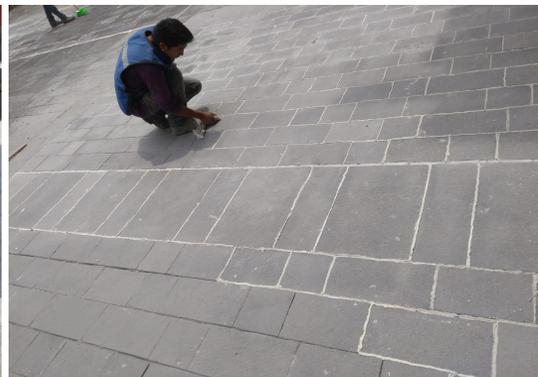


**REHABILITACIÓN CORREDOR SAN
JERÓNIMO.**

FCH | Gráficas de obras en proceso

OBRA EN PROCESO:

CONVENIO COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN FIDEICOMISO F754 y FCHCM.

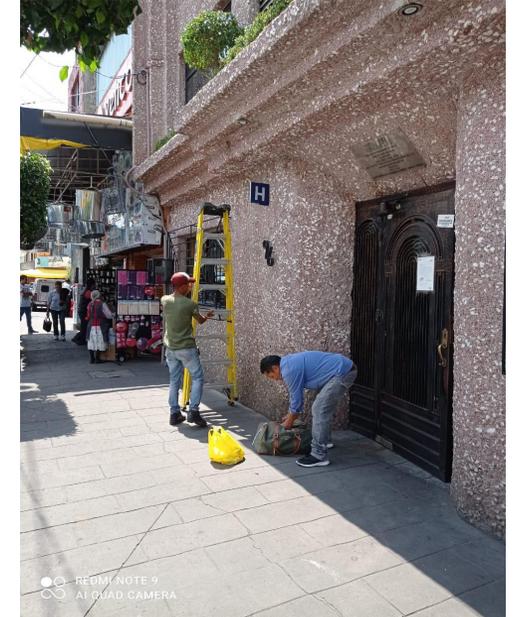


Colocación de elementos de señalética fabricados directamente en los sitios designados.

**SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO
PERÍMETRO B**

FCH | Gráficas de obras en proceso



OBRA EN PROCESO:
REHABILITACIÓN DE ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS.

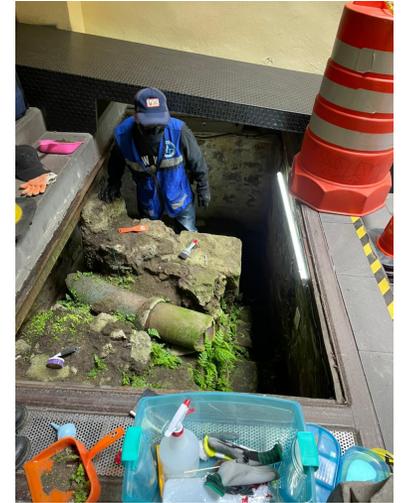

**MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VENTANAS
ARQUEOLÓGICAS**

FCH | Gráficas de obras en proceso

OBRA EN PROCESO:
REHABILITACIÓN DE ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS.




Habilitado de estructura metálica y colado de firme en huellas de escalones.

ESCALERAS DEL TEMPLO DE EHÉCATL

FCH | Gráficas de obras en proceso

OBRA EN PROCESO:
REHABILITACIÓN DE ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS.




Adquisición de laminas para rolar y crear las piezas que formarán la reja, hojas para colocación de tapial y perfiles para elaborar las puertas abatibles

**CONSTRUCCIÓN DE NUEVA REJA PERIMETRAL
DEL TEMPLO MAYOR**

FCH | Seguimiento de indicadores marzo a julio de 2021

Convenio de Coordinación INAH-FCHCM

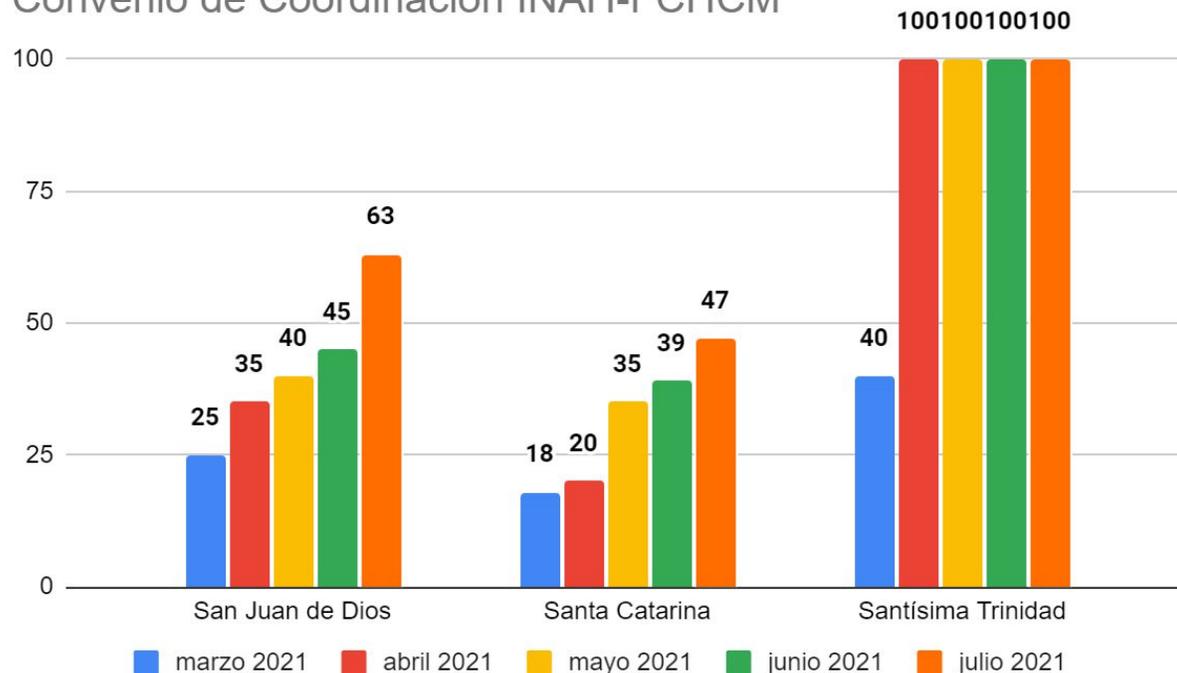


70%
avance global
 marzo - julio

- 01 Proyecto concluído**
 - Templo Santísima Trinidad
- 02 En proceso**
 - Templo Santa Catarina
 - Templo San Juan de Dios

FCH | Seguimiento de indicadores marzo a julio de 2021

CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN FIDEICOMISO F/54 Y EL FCH

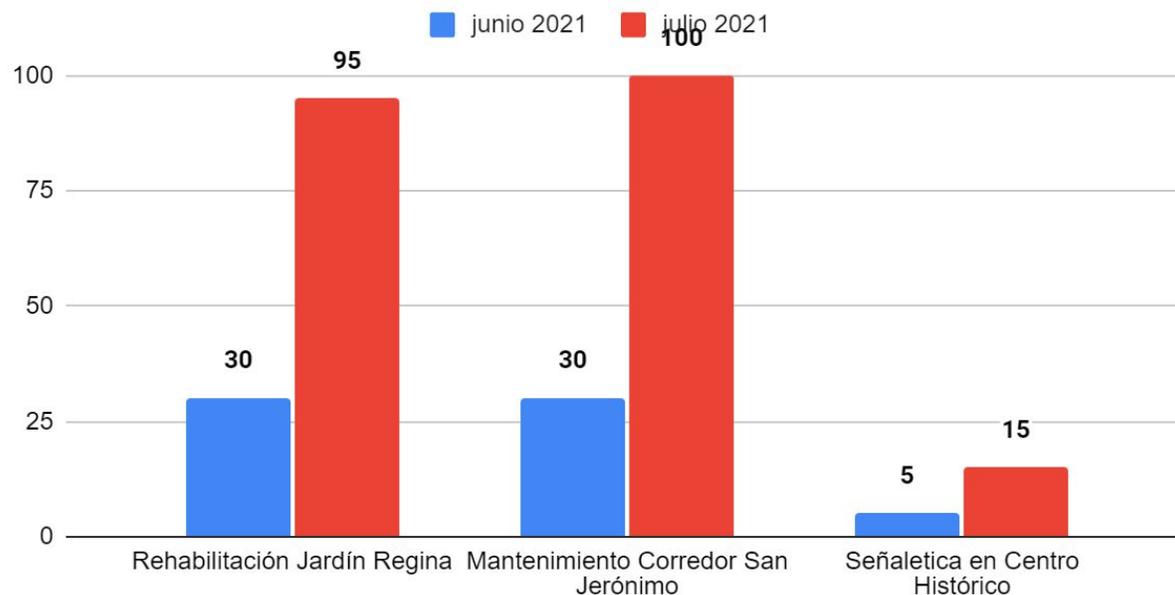

70%
avance global
julio


03 En proceso

- Rehabilitación Jardín Regina no. 40
- Mantenimiento Corredor San Jerónimo
- Señalética en Centro Histórico

*SER INICIARON TRABAJOS EN JUNIO 2021

FCH | Seguimiento de indicadores marzo a julio de 2021

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS FCH/ACH

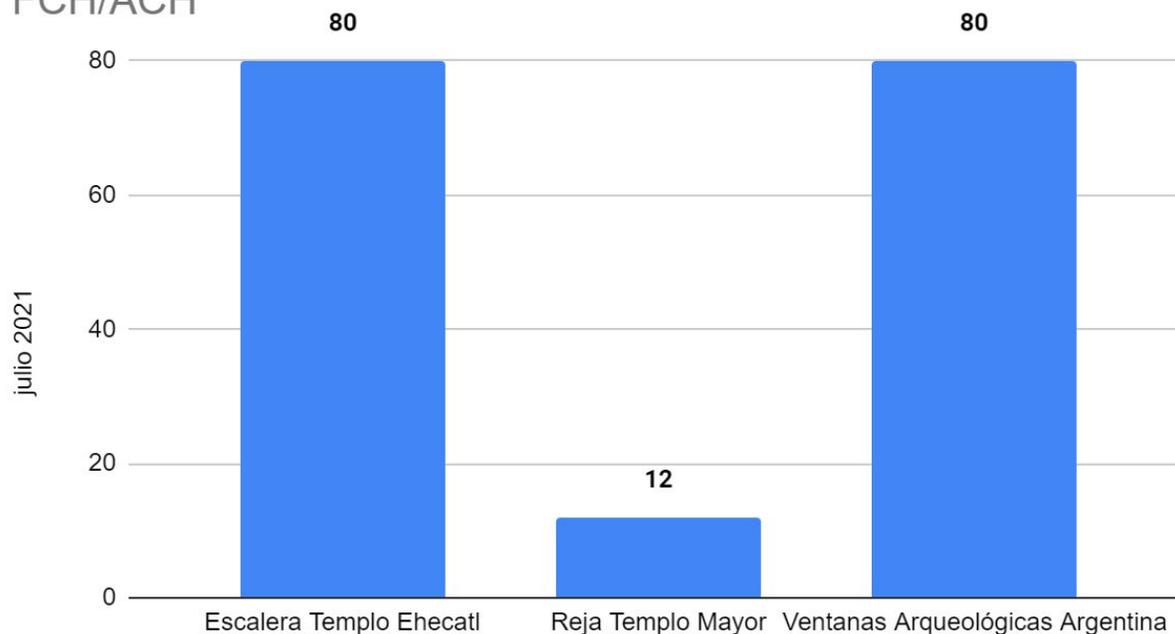

57.33%
avance global
julio

03 En proceso

- Escalera a Templo de Ehecatl
- Reja perimetral del Templo Mayor
- Ventanas Arqueológicas de República de Argentina

*SE INICIARON TRABAJOS EN JULIO 2021




Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la CDMX

ILIFE | Indicadores

Tema	Inmueble	Periodicidad	Porcentaje de avance 23/07 al 6/08	Próximo reporte
	Instituto de Educación Superior de la Ciudad de México Rosario Castellanos, Campus Justo Sierra	Mensual	99 %	24 de agosto
Rehabilitación de Inmuebles escolares en el Centro Histórico	Escuela Secundaria Adriana García Corral (segunda etapa)		Conclusión de trabajos julio 2021	
	Escuela Primaria Francisco González Bocanegra		Conclusión de trabajos enero 2021	

ILIFE | Indicadores - enero a julio

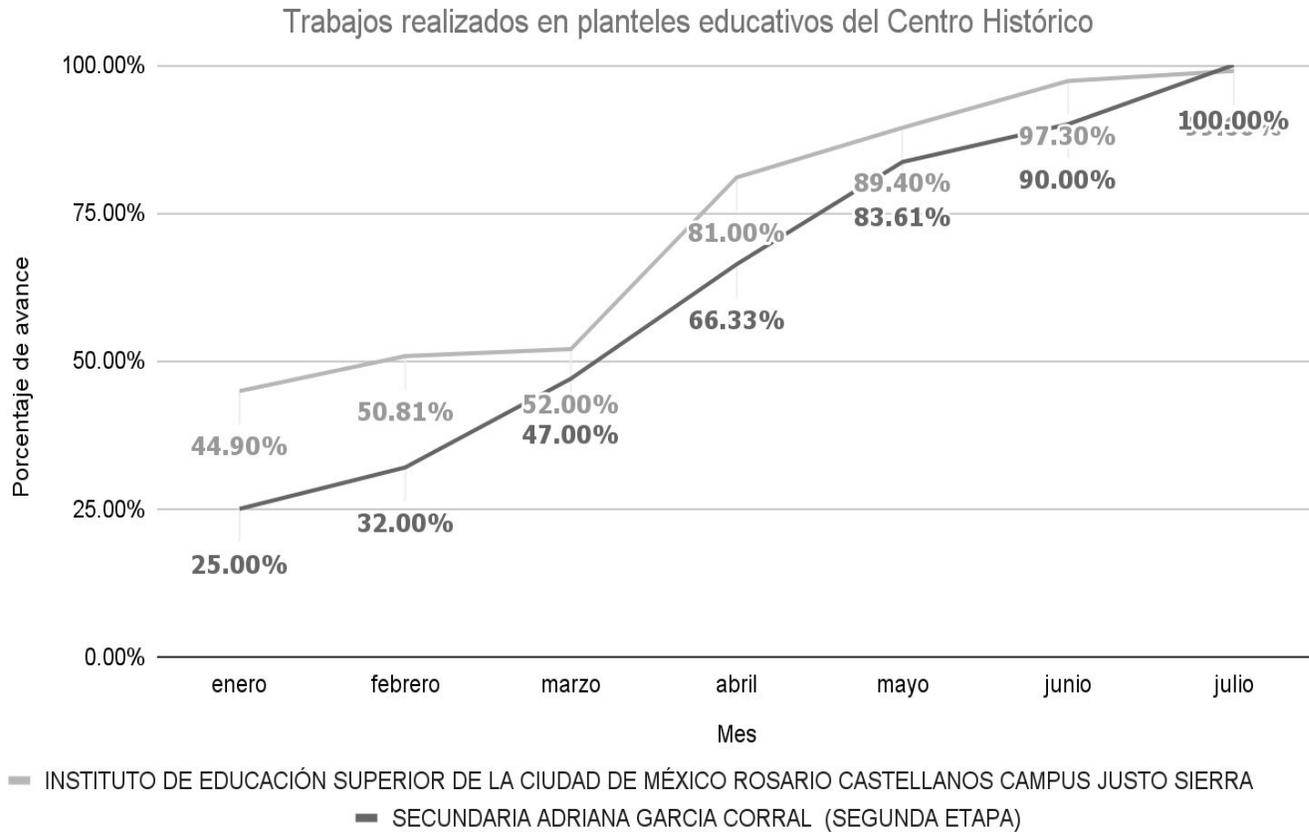

02 PROYECTOS TERMINADOS

- Escuela Primaria Francisco González Bocanegra /enero 2021
- Escuela Secundaria Adriana García Corral (segunda etapa)

01 PROYECTO EN OBRA

- Instituto de Educación Superior de la Ciudad de México Rosario Castellanos, Campus Justo Sierra

99% de avance



Instituto de Vivienda de la Ciudad de México


INVI | Indicadores

PREDIO	COLONIA	ACCIONES	ESTATUS DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE
2 DE ABRIL No. 42	GUERRERO	11	OBRA EN PROCESO	70.20%
ACADEMIA No.33	CENTRO	20	OBRA EN PROCESO	86.70%
ARCOS DE BELÉN No. 49	CENTRO	24	OBRA CONCLUIDA	100.00%
EJE 1 PONIENTE GUERRERO No. 164	GUERRERO	58	OBRA EN PROCESO	88.22%
EJE 1 PONIENTE GUERRERO No. 110	BUENAVISTA	37	OBRA CONCLUIDA	100.00%
MAGNOLIA No. 12 (ANTES No. 12 Y 16)	GUERRERO	19	OBRA EN PROCESO	91.43%
REPÚBLICA DE ARGENTINA No. 58	CENTRO	16	POR INICIAR	0.00%
REPÚBLICA DE ARGENTINA No. 87	CENTRO	25	OBRA CONCLUIDA	100.00%
REPÚBLICA DE PERÚ No. 40	CENTRO	33	OBRA EN PROCESO	93.61%

INVI | Indicadores

PREDIO	COLONIA	ACCIONES	ESTATUS DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE
ALLENDE No. 46	CENTRO	32	OBRA CONCLUIDA	100.00%
LERDO No. 12	GUERRERO	53	POR INICIAR	0.00%
PEDRO MORENO No. 154	GUERRERO	18	POR INICIAR	0.00%
TALAVERA No. 24	CENTRO	63	POR INICIAR	0.00%
VIOLETA No. 15	GUERRERO	26	POR INICIAR	0.00%
PEDRO MORENO No. 156	GUERRERO	18	POR INICIAR	0.00%
LECUMBERRI No. 66	ZONA CENTRO	54	OBRA CONCLUIDA	100.00%
BELISARIO DOMINGUEZ No. 78	CENTRO	23	OBRA CONCLUIDA	100.00%
NACIONAL No. 57	MORELOS	42	OBRA EN PROCESO	85.11%

INVI | Seguimiento de Indicadores - enero a julio de 2021

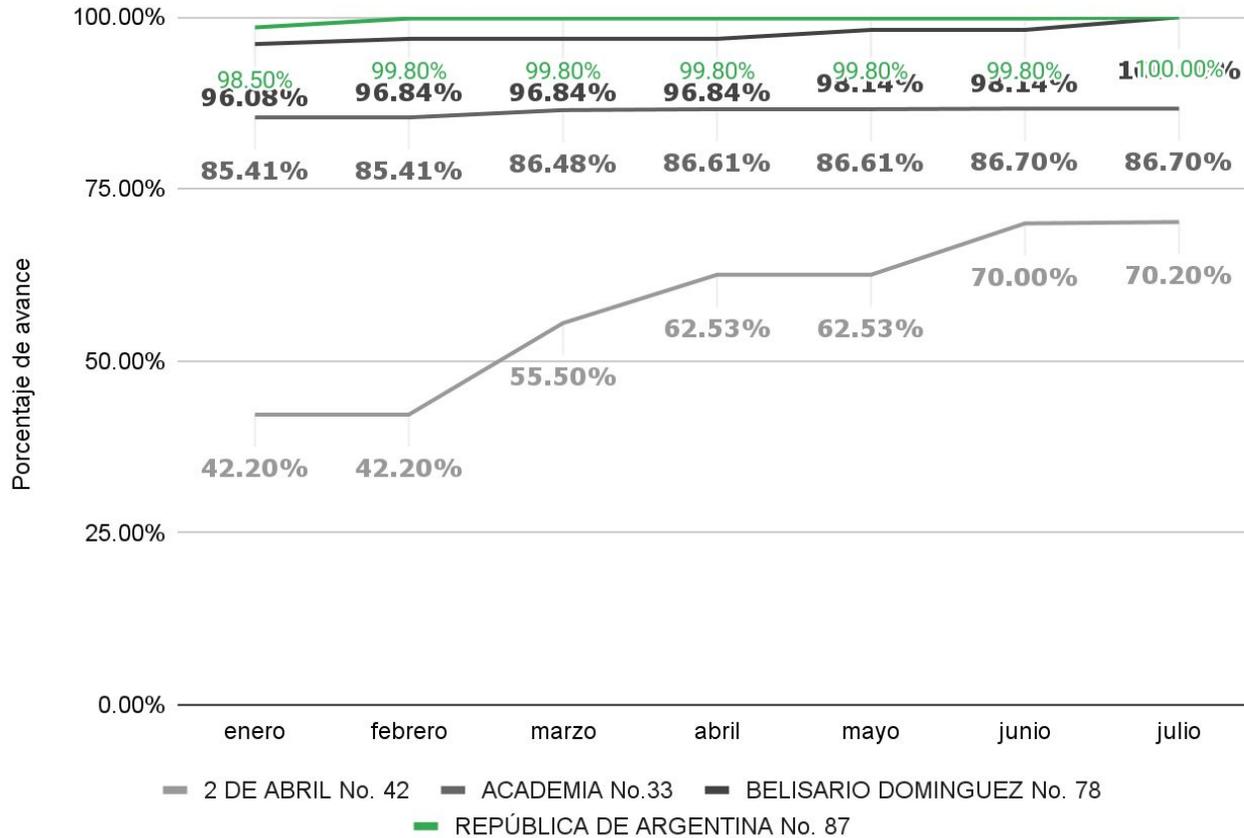


89.23%
avance global
julio

04 Obras de vivienda terminadas

- Arcos de Belén No. 49
- Eje 1 Pte. Guerrero No. 110
- Allende No. 46
- Lecumberri No. 66

08 Obras en proceso

06 Obras por iniciar




Procuraduría Social de la Ciudad de México

PROSOC | Indicadores

LISTADO DEFINITIVO DE UNIDADES HABITACIONALES BENEFICIADAS RIPUH 2020

PROSOC TOTAL DE OBRAS EJERCICIO 2020

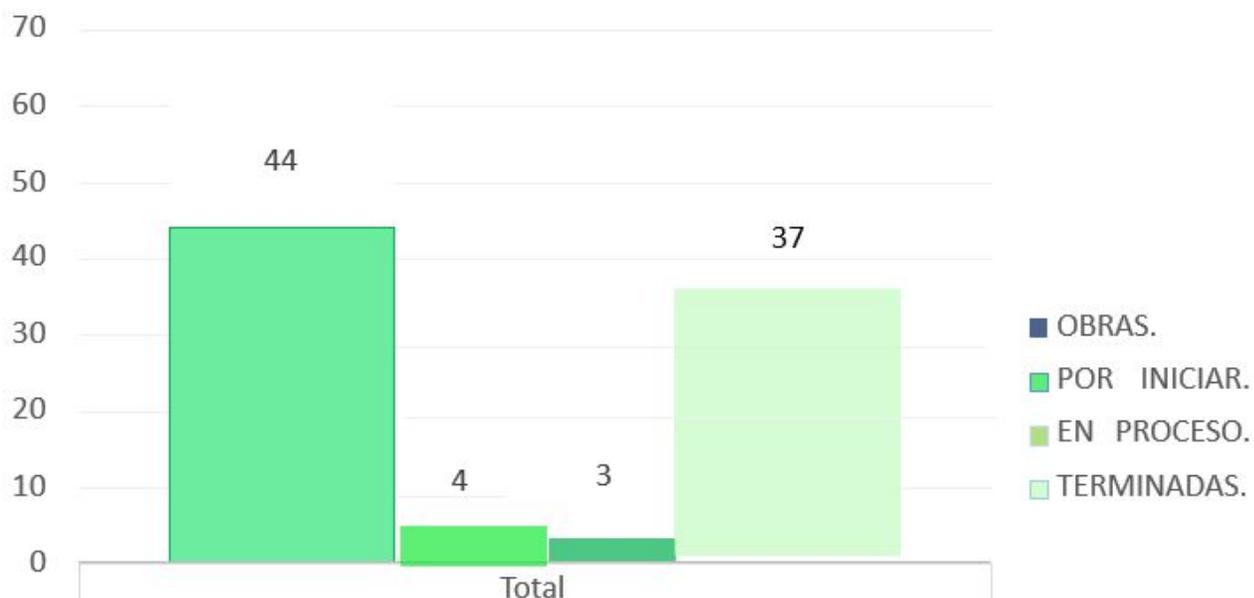


OBRAS.	44
POR INICIAR.	4
EN PROCESO.	3
TERMINADAS.	37

ALCALDÍA	No DE UNIDADES
CUAUHTÉMOC	27
VENUSTIANO CARRANZA	17


PROSOC | Indicadores

PROSOC OBRAS **CUAUHTEMOC** EJERCICIO 2020

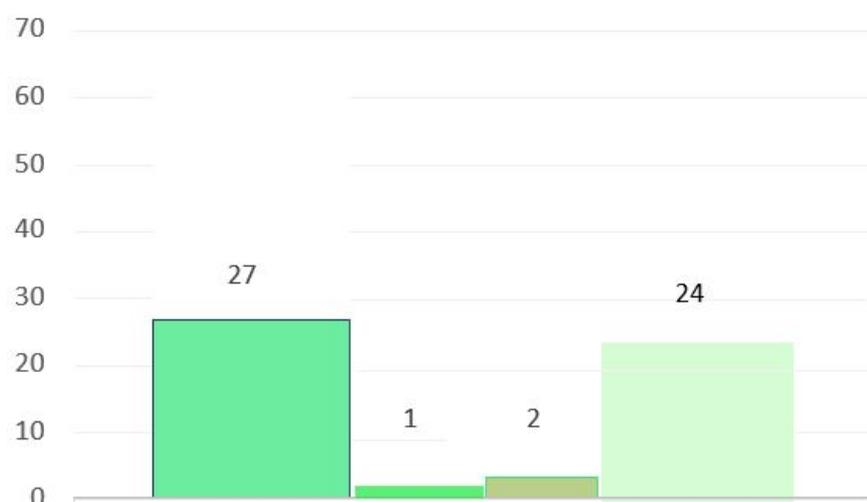

OBRAS.	27
POR INICIAR.	1
EN PROCESO.	2
TERMINADAS.	24

PROSOC OBRAS **VENUSTIANO CARRANZA** EJERCICIO 2020

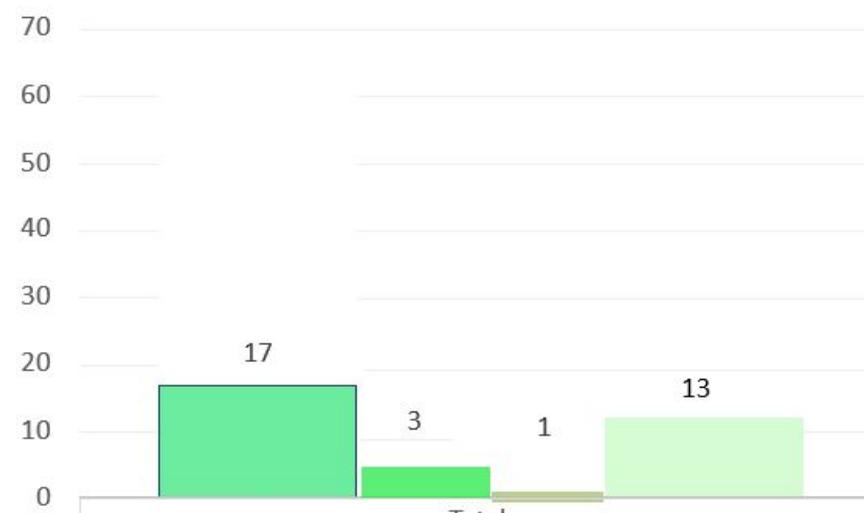

OBRAS.	17
POR INICIAR.	3
EN PROCESO.	1
TERMINADAS.	13

PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Cuauhtémoc 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	BOLIVAR 158	OBRAERA	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
2	DR. JIMENEZ 41	DOCTORES	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
3	CALZADA DE LA VIGA 18	ESPERANZA	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
4	CALZADA DE LA VIGA 16	ESPERANZA	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
5	LIBERTAD 21 C3	MORELOS	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	EN PROCESO	55%	B	NO CATALOGADA
6	3ra CERRADA DE LIBERTAD 6	MORELOS	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
7	VIOLETA 58	GUERRERO	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA

PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Cuauhtémoc 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
8	GALEANA 36	GUERRERO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		0%	B	NO CATALOGADA
9	MAGNOLIA 90	GUERRERO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
10	JOSE JOAQUIN HERRERA 10-12	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	PROCESO	50%	B	NO CATALOGADA
11	JOSE JOAQUIN HERRERA 28-32	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
12	FLORIDA 57	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	A	CATALOGADA
13	CALLEJON MONTERO 7	CENTRO	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
14	MANUEL TOLSA 56	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESTRUCTURA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA

PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Cuauhtémoc 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
15	REPUBLICA DE CHILE 49	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMINADA	100%	A	CATALOGADA
16	BUCARELI 66	CENTRO	CUAUHTEMOC	CUBOS DE AREA COMUN	TERMINADA	100%	B	CATALOGADA
17	SAN IDELFONSO 65	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	A	
18	REPUBLICA DE VENEZUELA 77	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	
19	SAN CAMILITO 25	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100 %	B	NO CATALOGADO
20	MESONES 138	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	
21	REPUBLICA DE PERU 32	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	CATALOGADA

PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Cuauhtémoc 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
22	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
23	NEZAHUALCOYOTL 136	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
24	JOSE JOAQUIN HERRERA 6	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
25	REPUBLICA DE CHILE 47	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
26	REPUBLICA DE PARAGUAY 62	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
27	JOSE JOAQUIN HERRERA 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA

PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Venustiano Carranza 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	ROSARIO 32	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
2	CORREGIDORA 148	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
3	CORREGIDORA 140	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
4	ANILLO DE CIRCUNVALACION 40	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA		0%	B	NO CATALOGADA
5	CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA 4	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	CALLES Y ANDADORES	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
6	JOAQUIN HERRERA 64	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA

PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Venustiano Carranza 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
7	ANILLO DE CIRCUNVACION 20	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESTRUCTURAS	PROCESO	65%	A	NO CATALOGADA
8	LECUMBERRI 59	CENTRO	VENUSTANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
9	UNIDAD HABITACIONAL CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA I	MORELOS	VENUSTANO CARRANZA	HERRERIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
10	UNIDAD HABITACIONAL CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA II	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
.11	UNIDAD HABITACIONAL CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA III	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
12	CIRCUNVALACION 48	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	PINTURA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA

PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Venustiano Carranza 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
13	4TA LECUMBERRI 60	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA SANITARIA		0%	B	NO CATALOGADA
14	NACIONAL 44	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	ESTRUCTURAS		0%	B	NO CATALOGADA
15	NACIONAL 32	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (TINACOS)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
16	NACIONAL 52	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
17	VANEGAS ARROYO 30	MERCED	VENUSTIANO CARRANZA	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA

PROSOC | Indicadores

LISTADO DE UNIDADES HABITACIONALES SELECCIONADAS RIPUH 2021

ALCALDÍA	No DE UNIDADES
CUAUHTÉMOC	13
VENUSTIANO CARRANZA	7

PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Cuauhtémoc 2021

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	LUIS MOYA 115	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	PROCESO	95%	A	NO CATALOGADA
2	REPUBLICA DE VENEZUELA 77	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	PROCESO	70%	A	NO CATALOGADA
3	JOSE JOAQUIN HERRERA 6	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	POR INICIAR	0%	A	NO CATALOGADA
4	MARQUEZ STERLING 2	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	POR INICIAR	0%	A	NO CATALOGADA
5	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 142	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	POR INICIAR	0%	A	NO CATALOGADA
6	BELIZARIO DOMINGUEZ 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	POR INICIAR	0%	A	NO CATALOGADA
7	MARIANA DEL TORO 19	CENTRO	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	POR INICIAR	0%	A	NO CATALOGADA

PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Cuauhtémoc 2021

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
8	ITURBIDE 18	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	POR INICIAR	0%	A	NO CATALOGADA
9	VIZCAINAS 18	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	POR INICIAR	0%	A	NO CATALOGADA
10	PLAZA SANTA CATARINA 4	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	POR INICIAR	0%	A	NO CATALOGADA
11	SOL 58 - 66	GUERRERO	CUAUHTEMOC	ALBAÑILERIA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
12	3RA. CERRADA DE LIBERTAD 6	MORELOS	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
13	FLORIDA 57	MORELOS	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA


PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Venustiano Carranza 2021

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	CORREGIDORA 140	ZONA CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	POR INICIAR	100%	B	NO CATALOGADA
2	HABITACIONAL CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA II	ZONA CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	CALLES Y ANDADORES	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
3	JOAQUIN HERRERA 64	ZONA CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
4	NACIONAL 52	ZONA CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	POR INICIAR	40%	B	NO CATALOGADA
5	NACIONAL 32	ZONA CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	POR INICIAR	95%	B	NO CATALOGADA
6	JARDINEROS 9	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	POR INICIAR	95%	B	NO CATALOGADA
7	CIRCUNVALACION 48	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	PINTURA	POR INICIAR	100%	B	NO CATALOGADA

PROSOC | Seguimiento de indicadores - enero a julio 2021

44

Unidades habitacionales beneficiadas
año 2020

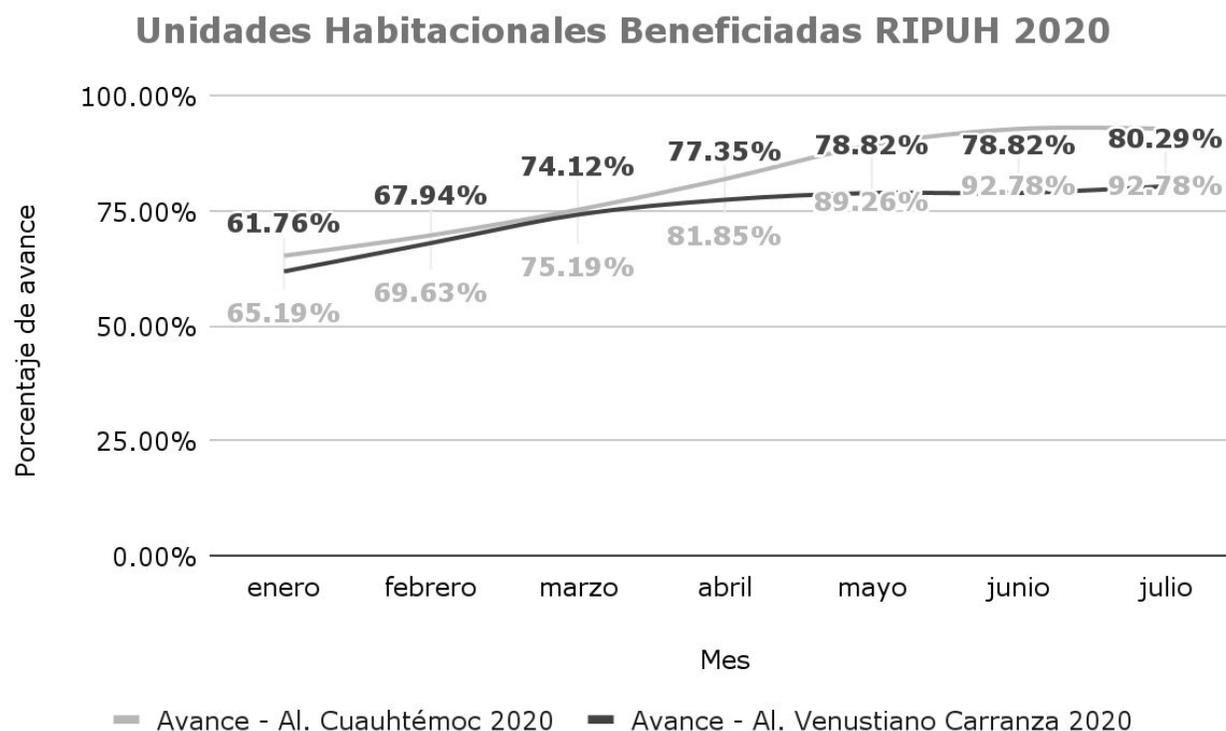

37 UNIDADES HAB. TERMINADAS

- 24 en Al. Cuauhtémoc
- 13 en Al. Venustiano Carranza


03 UNIDADES HAB. EN PROCESO OBRA

- 02 en Al. Cuauhtémoc
- 01 en Al. Venustiano Carranza

04 UNIDADES HAB. POR INICIAR

- 01 en Al. Cuauhtémoc
- 03 en Al. Venustiano Carranza

PROSOC | Seguimiento de indicadores - enero a julio 2021

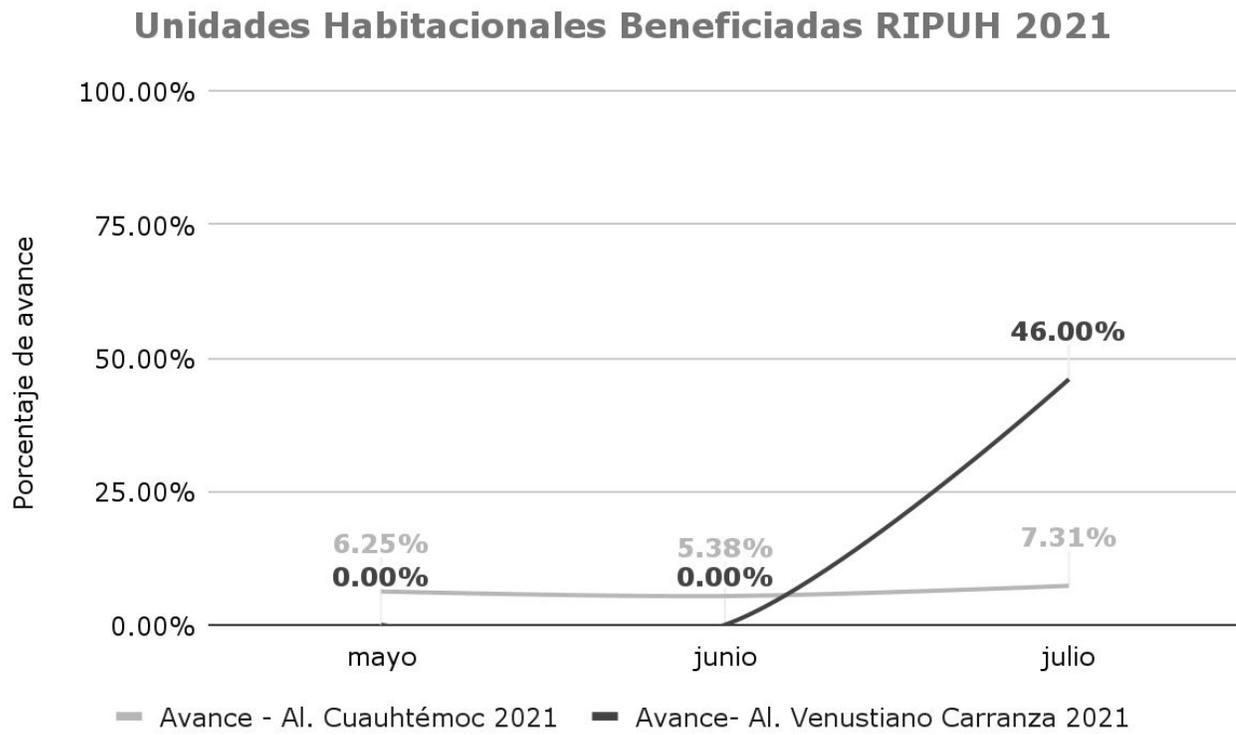

20 UNIDADES HAB. SELECCIONADAS

- 13 en Al. Cuauhtémoc
- 07 en Al. Venustiano Carranza

01 UNIDADES HAB. EN PROCESO OBRA


- 01 en Al. Cuauhtémoc

19 UNIDADES HAB. POR INICIAR

- 12 en Al. Cuauhtémoc
- 07 en Al. Venustiano Carranza





Agencia Digital de Innovación Pública



ADIP | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte al 22/07	Reporte al 06/08	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones	Ducto Maestro Santa María la Redonda	Quincenal	97%	100%	24 de agosto
Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones	Ducto Maestro Balderas	Quincenal	93%	100%	

ADIP | Anexo de indicadores | Ducto Maestro Santa María la Redonda

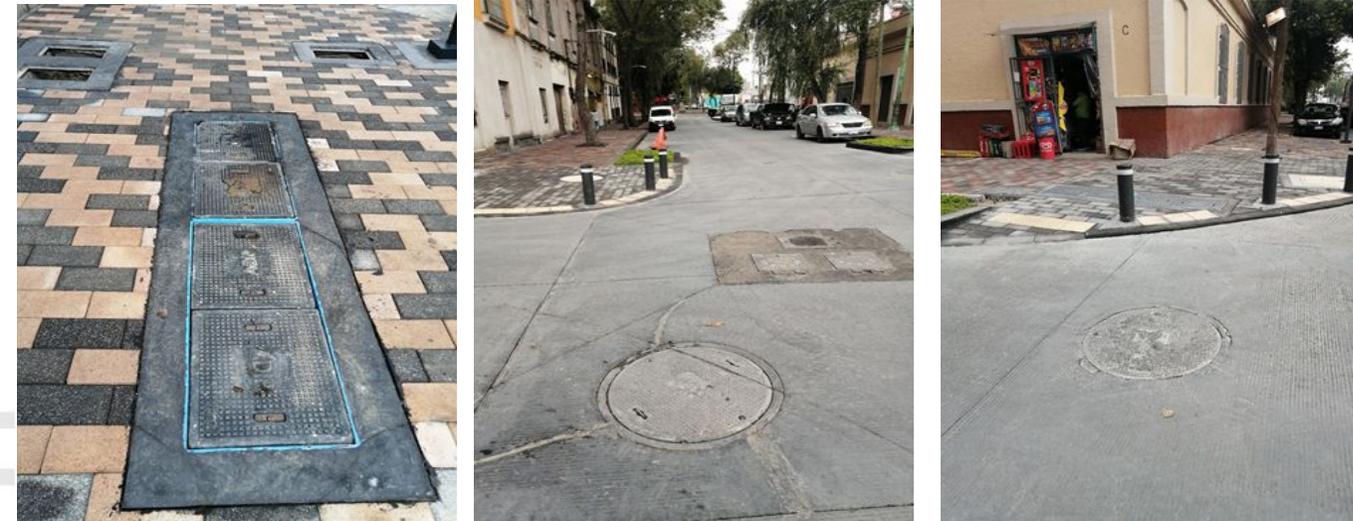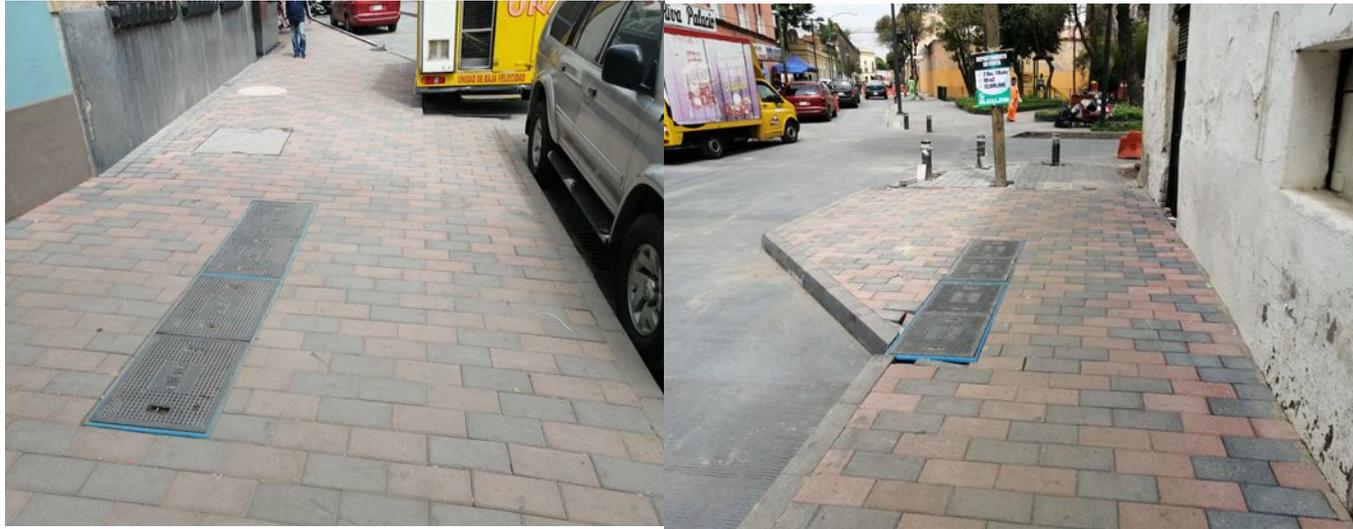

INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD

META

TRAYECTORIA	ML
RED TRONCAL	12416
RED DISTRIBUCION	156
RADIALES Y ACOMETIDAS	5096

100% DE AVANCE

ADIP | Anexo de indicadores | Ducto Maestro Balderas




INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD

META

TRAYECTORIA	ML
RED TRONCAL	10.016
RED DISTRIBUCION	4176
RADIALES Y ACOMETIDAS	4250

100 % DE AVANCE

ADIP | Seguimiento a indicadores - marzo a julio 2021



04 PROYECTOS TERMINADOS

- Ducto Maestro Rep. de Brasil
- Ducto Maestro Av. Chapultepec
- Ducto Maestro Sta. María la Redonda
- Ducto Maestro Av. Balderas

¡META CUMPLIDA!



Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)

C5 | Indicadores

Indicador	Periodicidad	23/07 al 06/08	Próximo reporte
No. cámaras con falla o intermitencia		6 cámaras	
	Quincenal		24 de agosto
Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura		03 cámaras	


*NOTA: Los datos proporcionados son extraídos de los **Reportes de mesa de ayuda de C5***

C5 | Seguimiento de indicadores - enero a julio 2021

186

**cámaras con reporte de falla o intermitencia
enero - julio**


Cámaras con falla o intermitencia



29


**obras de mantenimiento y/o reparación de
infraestructura
enero - julio**

Obras de mantenimiento y/o reparación de infraestructura





SSC Tránsito



SSC Tránsito | Indicadores


Tema	Unidad de medida	Periodicidad	26/07 al 09/08	Próximo reporte
Semáforos	Número de semáforos con mantenimiento preventivo	Quincenal	22	24 de agosto
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo		99	
Cámaras	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		0	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo		0	

SSC Tránsito | Anexo de indicadores

SSC-SCT-DSOT

CORRECTIVO	
ACOMETIDA	1
APAGADO	11
BASE NUEVA	6
CABLE DE COMUNICACIÓN DAÑADO	2
CAMBIO DE COMPONENTE	1
CORTO	13
DESINSTALACION	1
DESORIENTADO	6
FOCO FUNDIDO	7
FY-CINTILANTE	14
IMPACTADO	4
INSTALACION DE SEMAFORO	2
INSTALACION POSTE	5
OBRA CIVIL	1
REGISTRO NUEVO	3
REUBICACION	1
SINIESTRO	2
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	17
TARJETA PROCESADORA	1
TIEMPOS (EXTRACCION O REVISION)	1
PREVENTIVO	
LIMPIEZA DE COMPONENTES	22
TOTAL GENERAL	121

MANTENIMIENTO SEMAFORICO




SSC Tránsito | Seguimiento de indicadores - enero a julio 2021

109

acciones mantenimiento preventivo a semáforos
enero - julio


Acciones mantenimiento preventivo a semáforos



872

acciones de mantenimiento correctivo a semáforos
enero - julio

Acciones mantenimiento correctivo a semáforos



Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

ACH | Matriz de seguimiento a turnos

98.30 %
atención

Matriz de Turnos	ESTATUS		
	Atendido	Proceso	Suma total
ACH	17		17
Al. Cuauhtémoc	4		4
C5	2		2
CFE	4		4
CONAVI	1		1
INBAL	1		1
SACMEX	8	1	9
SEDEMA	1		1
SEDUVI	2		2
SOBSE	1		1
SOS-AP	1		1
SOS-DGCOP	2		2
SOS-DGOIV	8		8
SOS-DGSUS	5		5
Telmex	1		1
Suma total	58	1	59

ACH | Seguimiento a turnos **ATENDIDOS** - del 27 de julio al 09 de agosto 2021

CLAVE	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS
TCH-060	27/07/2021	ACH	Se realice una supervisión antes de que salgan de República de Chile y San Hipólito para que se chequen todas las conexiones de agua potable y de drenaje a fin de verificar que estén debidamente conectados y lo informen a la Mesa. (ACH se encargará de Zarco).	SACMEX-CONSTRUCCIÓN	Atendido
TCH-061	27/07/2021	SACMEX-DRENAJE	Se verifique el funcionamiento de los accesorios hidráulicos en las obras que están trabajando	SACMEX-CONSTRUCCIÓN	Atendido
TCH-062	27/07/2021	ACH	Se verifique la reconexión que se hizo de drenaje frente al número 42 de República de Brasil, dado que las luminarias están intermitentes en el tramo entre Colombia y República de Bolivia.	SACMEX-CONSTRUCCIÓN	Atendido
TCH-063	27/07/2021	ACH	Comparta el oficio que remitirá a la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH para la autorización del prototipo de puesto de periódico tipo C, a fin de dar seguimiento	FCH	Atendido
TCH-064	27/07/2021	Tránsito	Le compartan los planos de la obra inducida de las obras que se está iniciando en la calle de Tacuba y 5 de Mayo, así como la de República de Chile y República de Brasil.	DGOIV	Atendido
TCH-065	27/07/2021	ACH	Se realice recorrido en República de Brasil con la finalidad de ver la posibilidad de utilizar la infraestructura de Telmex para colocar la infraestructura de semáforos	Telmex Tránsito	Atendido
TCH-066	27/07/2021	ACH	Considere la intervención menor del módulo de policía ubicado en República de Chile esquina Mariana R. del Toro Lazarín	DGOIV	Atendido
TCH-067	27/07/2021	ADIP	Se le apoye convocando a un recorrido a las instancias que corresponda para poder instalar puntos WiFi en el Zócalo, La Alameda y Plaza Vizcainas	ACH	Atendido

ACH | Seguimiento a turnos **EN PROCESO**

CLAVE	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	FECHA DE ATENCIÓN	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-001	29/12/2020	ACH	Se realice la reparación de la atarjea rota de la calle de Roldán entre San Pablo y Ramón Corona	SACMEX	6/5/2021		Proceso	15/06 - Continúan trabajos de desazolve
TCH-053	15/06/2021	Secretaría de Cultura Federal	Desazolve de colector en Enrico Martínez en la zona de la Ciudadela.	SACMEX	26/6/2021		Proceso	Se inició el sábado 26 de junio, en Tolsá frente al Parque, con accesorios pluviales y atarjea. Continúa en seguimiento

ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas

87.71 %
atención

<i>Matriz de Incidencias</i>	<i>ESTATUS</i>			Suma total
	Dependencia	Atendido	En proceso	
ACH	50		8	58
ADIP	1			1
Al. Cuauhtémoc	70	1	9	80
C5	3			3
CFE	180		33	213
SACMEX	134	5	8	147
SEDEMA	1			1
SGIRyPC	1		1	2
SOS-AP	64		1	65
SOS-DGOIV	27	1	9	37
SOS-DGSUS	39			39
STC-Metro	2			2
TELMEX	16		5	21
Tránsito	33	2	4	39
Suma total	621	9	78	708


Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 27 de julio al 09 de agosto 2021

CLAVE	VIPPSC	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-673	VIPP 5. Zócalo	27/7/2021	Desazolve	Venustiano Carranza	Tabaqueros		 <p>Registro en venustiano Carranza esq. Con tabaqueros</p>		SACMEX	Atendido
IUCH-674	VIPP 6. Antigua Merced-Mixcalco	27/7/2021	Desazolve	Venustiano Carranza			 <p>Registro en venustiano Carranza en frente # 116 roses</p>		SACMEX	Atendido
IUCH-671	VIPP 8. San Pablo	27/7/2021	Falla en alumbrado público	Plaza Pino suaréz					Al. Cuauhtémoc	Atendido
IUCH-676	VIPP 4. Alameda - Sector Financiero	28/7/2021	Fuga de agua	Humbolt					SACMEX	Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 27 de julio al 09 de agosto 2021

CLAVE	VIPPSC	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-677	VIPP 4. Alameda - Sector Financiero	28/07/2021	Tapa en mal estado	Ayuntamiento	Victoria				SOS-DGOIV	Atendido
IUCH-680	VIPP 2. Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	29/07/21	Falla en suministro de energía	Mariana Rodríguez del Toro de Lazarón	República de Chile				CFE	Atendido
IUCH-686	VIPP 4. Alameda - Sector Financiero	29/7/2021	Falla en alumbrado público	16 de Septiembre	Isabel la Católica	Bolívar			SOS-AP	Atendido
IUCH-696	VIPP 1. Santa María la Redonda	30/07	Desazolve	Riva Palacio	Pedro Moreno	Violeta			SACMEX	Atendido
IUCH-701	VIPP 1. Santa María la Redonda	30/7/2021	Desazolve	Zarco	Esmeralda				SACMEX	Atendido


Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 27 de julio al 09 de agosto 2021

CLAVE	VIPPSC	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-688	VIPP 2. Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	30/7/2021	Fuga de agua del drenaje	República de Chile					SACMEX	Atendido
IUCH-699	VIPP 2. Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	30/7/2021	Desazolve	Eje Central	República de Ecuador	Plaza Garibaldi			SACMEX	Atendido
IUCH-707	VIPP 2. Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	30/7/2021	Desazolve	República de Cuba	Allende				SACMEX	Atendido
IUCH-689	VIPP 3. Santo Domingo	30/7/2021	Fuga de agua del drenaje	República de Chile					SACMEX	Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 27 de julio al 09 de agosto 2021

CLAVE	VIPPSC	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-691	VIPP 3. Santo Domingo	30/7/2021	Desazolve	República de Brasil					SACMEX	Atendido
IUCH-692	VIPP 3. Santo Domingo	30/7/2021	Desazolve	República de Brasil	República de Nicaragua				SACMEX	Atendido
IUCH-695	VIPP 3. Santo Domingo	30/7/2021	Desazolve	República de Paraguay	República de Argentina	República de Brasil			SACMEX	Atendido
IUCH-697	VIPP 3. Santo Domingo	30/7/2021	Desazolve	República de Venezuela	República de Argentina	Del Carmen			SACMEX	Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 27 de julio al 09 de agosto 2021

CLAVE	VIPPSC	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-700	VIPP 3. Santo Domingo	30/7/2021	Desazolve	República de Colombia	República de Argentina	República de Brasil			SACMEX	Atendido
IUCH-702	VIPP 4. Alameda - Sector Fianciero	30/7/2021	Desazolve	Balderas					SACMEX	Atendido
IUCH-706	VIPP 4. Alameda - Sector Fianciero	30/7/2021	Desazolve	República de Chile					SACMEX	Atendido
IUCH-693	VIPP 6. Antigua Merced-Mixcalco	30/7/2021	Desazolve	Leona Vicario	Mixcalco				SACMEX	Atendido
IUCH-690	VIPP 7. Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	30/7/2021	Desazolve	Regina	5 de Febrero	Isabel la Católica			SACMEX	Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 27 de julio al 09 de agosto 2021

CLAVE	VIPPSC	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-694	VIPP 7. Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	30/7/2021	Desazolve	Regina	Callejón de Mesones	5 de febrero			SACMEX	Atendido
IUCH-698	VIPP 7. Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	30/7/2021	Desazolve	Regina					SACMEX	Atendido
IUCH-703	VIPP 7. Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	30/7/2021	Desazolve	Callejón de la Esperanza					SACMEX	Atendido
IUCH-705	VIPP 7. Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	30/7/2021	Desazolve	Tizapan					SACMEX	Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 27 de julio al 09 de agosto 2021

CLAVE	VIPPSC	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-704		30/7/2021	Desazolve	Plaza San Miguel					SACMEX	Atendido
IUCH-709	VIPP 4. Alameda - Sector Fianciero	2/8/2021	Boveda con falla	Xicoténcatl	Tacuba				CFE	Atendido
IUCH-710	VIPP 6. Antigua Merced-Mixcalco	2/8/2021	Falla en suministro de energía	Callejón de Girón					CFE	Atendido
IUCH-711	VIPP 6. Antigua Merced-Mixcalco	2/8/2021	Falla en suministro de energía	San Ildefonso					CFE	Atendido
IUCH-712	VIPP 3. Santo Domingo	2/8/2021	Falla en suministro de energía	República de Perú					CFE	Atendido
IUCH-713	VIPP 3. Santo Domingo	2/8/2021	Falla en suministro de agua	Belisario Domínguez	República de Brasil	Palma			SACMEX	Atendido
IUCH-717	VIPP 5. Zócalo	3/8/2021	Mufa con corto circuito	16 de Septiembre	Palma				CFE	Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 27 de julio al 09 de agosto 2021

CLAVE	VIPPSC	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-718	VIPP 7. Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	4/8/2021	Falla en semáforo	20 de Noviembre	5 de Febrero				Tránsito	Atendido
IUCH-721	VIPP 1. Santa María la Redonda	4/8/2021	Tapas en mal estado	Pedro Moreno	Galeana	Riva Palacio			SOS-DGOIV	Atendido
IUCH-728	VIPP 6. Antigua Merced-Mixcalco	6/8/2021	Falla en el suministro de energía eléctrica	Calle de Academia	Guatemala	Corregidora			CFE	Atendido
IUCH-729	VIPP 5. Zócalo	6/8/2021	Falla en el suministro de energía eléctrica	Madero	Palma	Monte de Piedad			CFE	Atendido
IUCH-730	VIPP 8. San Pablo	7/8/2021	Falla en el suministro de energía eléctrica	Roldán					CFE	Atendido
IUCH-731	VIPP 4. Alameda - Sector Fianciero	8/8/2021	Falla en el suministro de agua	Motolinia	5 de mayo.				SACMEX	Atendido
IUCH-732	VIPP 1. Santa María la Redonda	8/8/2021	Falla en el suministro de energía eléctrica	Magnolia					CFE	Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES**

VIPPSC	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 3. Santo Domingo	15/6/2021	Falta de tapa	República de Bolivia	Del Carmen	República de Argentina		Al. Cuauhtémoc	Pendiente
VIPP 3. Santo Domingo	15/6/2021	Falta de rejilla	Republica de Brasil	Luis González Obregón			SOS-DGOIV	Pendiente

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES**

VIPPSC	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 2. Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	16/6/2021	Tapa en mal estado	Donceles				CFE	Pendiente
VIPP 3. Santo Domingo	17/6/2021	Falta de Rejilla	Donceles	República de Brasil			DGOIV	Pendiente
VIPP 3. Santo Domingo	17/6/2021	Falta de tapa	República de Perú	Leandro Valle			SOS-AP	Pendiente

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES**

VIPPSC	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 3. Santo Domingo	17/6/2021	Tapa de registro en mal estado	Allende	Belisario Domínguez			CFE	Pendiente
VIPP 6. Antigua Merced-Mixcalco	18/6/2021	Tapa en mal estado	Jesús María	Emiliano Zapata			Sacmex	Pendiente
VIPP 3. Santo Domingo	18/6/2021	Falta tapa de coladera	Joaquín Herrera	Gregorio Torres Quintero	Plaza Torres Quintero		Sacmex	Pendiente

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES**

VIPPSC	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 7. Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	19/6/2021	Pavimento en mal estado	Calle Rinconada de Jesús	República del Salvador			ACH	Pendiente
VIPP 2. Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	22/6/2021	Tapa de registro en mal estado	Allende	Tacuba		sin imagen	CFE	Pendiente
VIPP 3. Santo Domingo	23/6/2021	Falta tapa de registro	República de Ecuador	República de Argentina	República de Brasil		ACH	Pendiente
VIPP 2. Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	24/6/2021	Tapa en mal estado	Héroes del 57	Belisario Dominguez			CFE	Pendiente

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES**

VIPPSC	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 1. Santa María la Redonda	24/6/2021	Falla en suministro de energía	Riva Palacio	Moctezuma	Magnolia		CFE	Pendiente
VIPP 3. Santo Domingo	25/6/2021	Falla en semáforo	República de Perú	República de Brasil			Tránsito	Pendiente
VIPP 1. Santa María la Redonda	25/6/2021	Falla en alumbrado público	Galeana	Pedro Moreno	Obraje		Al. Cuauhtémoc	Pendiente
VIPP 3. Santo Domingo	28/6/2021	Desazolve	Tacuba	Palma	República de Chile		SACMEX	Pendiente

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES**

VIPPSC	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 3. Santo Domingo	28/6/2021	Reposición de rejilla	Tacuba	Palma	República de Chile		SACMEX	Pendiente
VIPP 4. Alameda - Sector Fianciero	28/6/2021	Ajuste direccional de semáforo	Madero	Bolívar			Tránsito	Pendiente

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia
