



UNIVERSIDAD DE LEÓN  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Mesa de Infraestructura y Obras

## EVALUACIÓN FEBRERO

### Inicio de la transmisión en vivo

### 25 de febrero de 2020

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



UNIVERSIDAD DE LEÓN  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

**\*Transmisión en vivo\***

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



UNIVERSIDAD DE LEÓN  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

**\*Transmisión en vivo\***

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



# ACH

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 10/02	Semana al 24/02	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Quincenal	2,030 m3	1,998 m3	10 de marzo
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Quincenal	4,749 m3	4,800 m3	10 de marzo
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Quincenal	57	110	10 de marzo



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## ACH | Eliminación de grafiti

**371**

**m<sup>2</sup> totales**

\*La mayoría son  
reincidencias

calles atendidas **45**  
cortinas metálicas **15**  
fachadas **52**

**117**  
**m<sup>2</sup>**  
**de cortinas**



**226**  
**m<sup>2</sup>**  
**de fachadas**



**28**  
**m<sup>2</sup>**  
**Gel antigrafiti**





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CENTRO  
HISTÓRICO

## Eliminación de grafiti en cantera

**Esta semana se retiro grafiti en cantera de edificios no catalogados con gel antigrafiti**


Se han limpiado  
en total a la fecha

**2,092 m<sup>2</sup>**

- 5 de Mayo
- Av. Juárez
- 20 de Noviembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

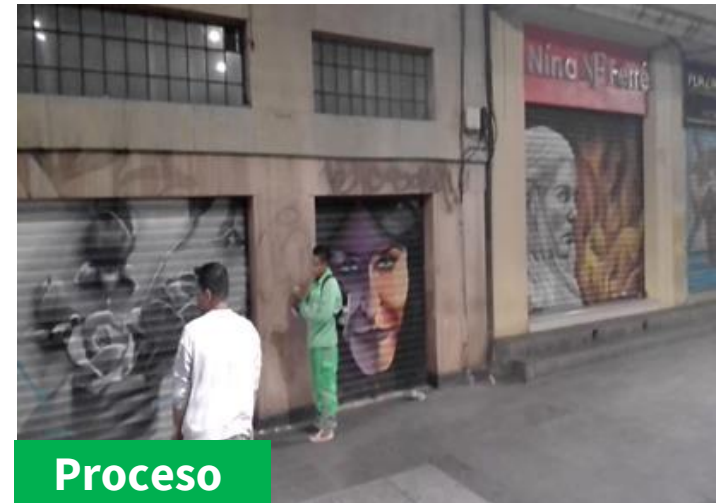



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO DE  
CENTRO  
HISTÓRICO

# ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en:

El Carmen  
Correo Mayor  
Venustiano Carranza  
Isabel la Católica  
República de Chile  
Allende  
Bolívar  
República de Honduras  
Tacuba  
República de Brasil  
Belisario Domínguez  
República de Bolivia  
Donceles  
República de Guatemala

**Colocación de 32 señalizaciones de no estacionarse** en El Carmen y su continuación Correo Mayor de Apartado a San Pablo, **colocación de 13 señalizaciones de no estacionarse** en Venustiano Carranza de Correo Mayor a Circunvalación, **colocación de 16 señalizaciones de no estacionarse** en Isabel la Católica y su continuación República de Chile de Izazaga a República de Perú, **colocación de 15 señalizaciones de no estacionarse** en Allende y su continuación Bolívar de República de Perú a Izazaga, **colocación de 5 señalizaciones de no estacionarse** en República de Honduras de República de Brasil a República de Chile, **retiro de 2 postes de caseta telefónica y reparación de arroyo vehicular** en Tacuba frente al No. 37 entre Motolinia y Allende, **retiro de 1 poste de caseta telefónica** en República de Chile frente al No. 8 entre Tacuba y Donceles, **retiro de base de papelería** en Bolívar frente al No. 8 entre 5 de Mayo y Tacuba, **colocación de 3 bolardos, reparación de banqueta y pintura de 13 bolardos** en República de Brasil esquina Belisario Domínguez, **colocación de 6 bolardos** en Belisario Domínguez esquina Allende, **reparación de banqueta** en República de Bolivia frente al No. 58 entre Correo Mayor y República de Argentina, **reparación de guarnición** en Donceles esquina República de Chile, **reparación de banqueta** en Donceles frente al No. 54, **reparación de bóveda de CFE** en Donceles entre Callejón del 57 y República de Chile, **reparación de cadena de acceso** en República de Guatemala entre República de Brasil y República de Argentina.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# ACH | ene - feb


Acciones de limpieza ACH

## 8,360 m<sup>3</sup>

Basura recolectada por barrido en perímetro ACH

## 19,706 m<sup>3</sup>

Residuos sólidos levantados de tiraderos clandestinos del perímetro ACH

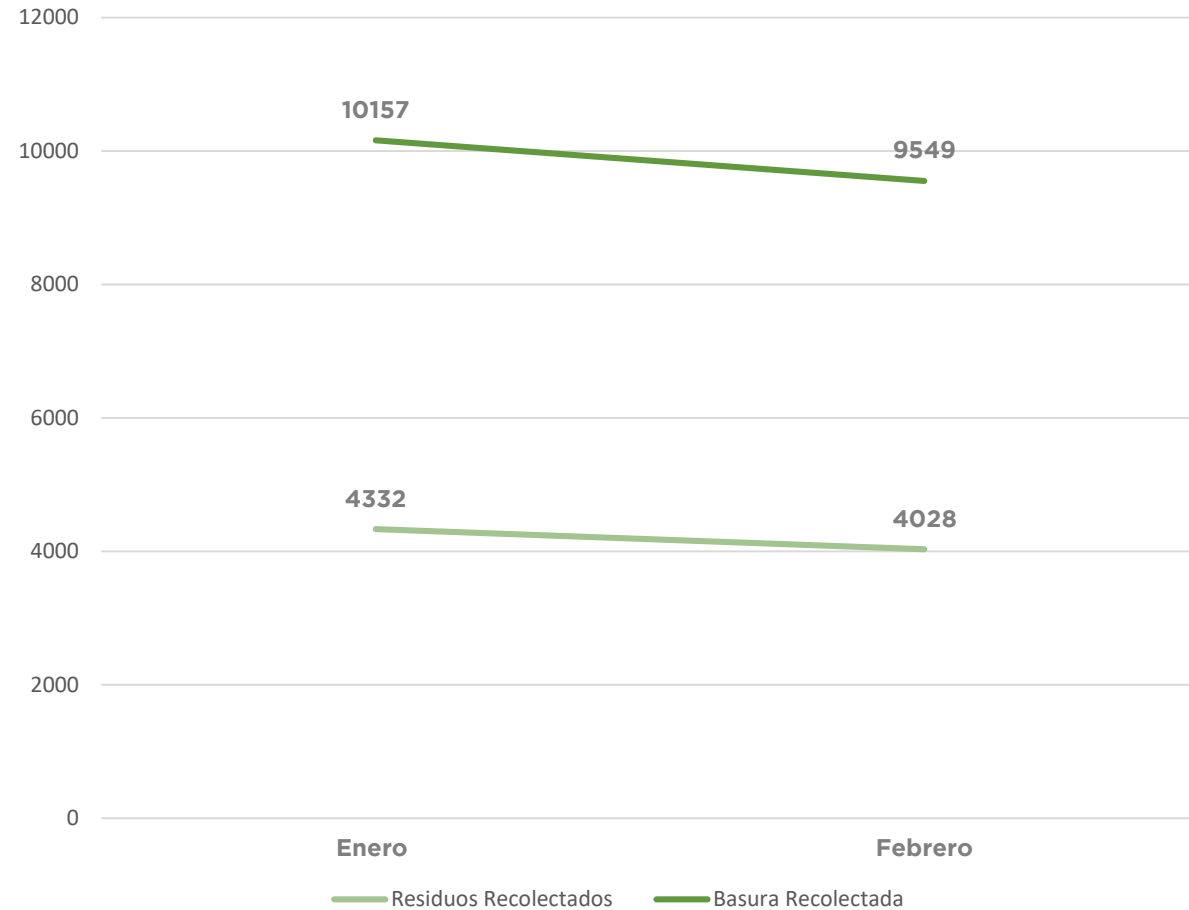





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO  
HISTÓRICO

# ACH | ene - feb


Incidencias atendidas

# 252

Incidencias de daño en  
infraestructura del  
Perímetro de la ACH  
reparadas y atendidas



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

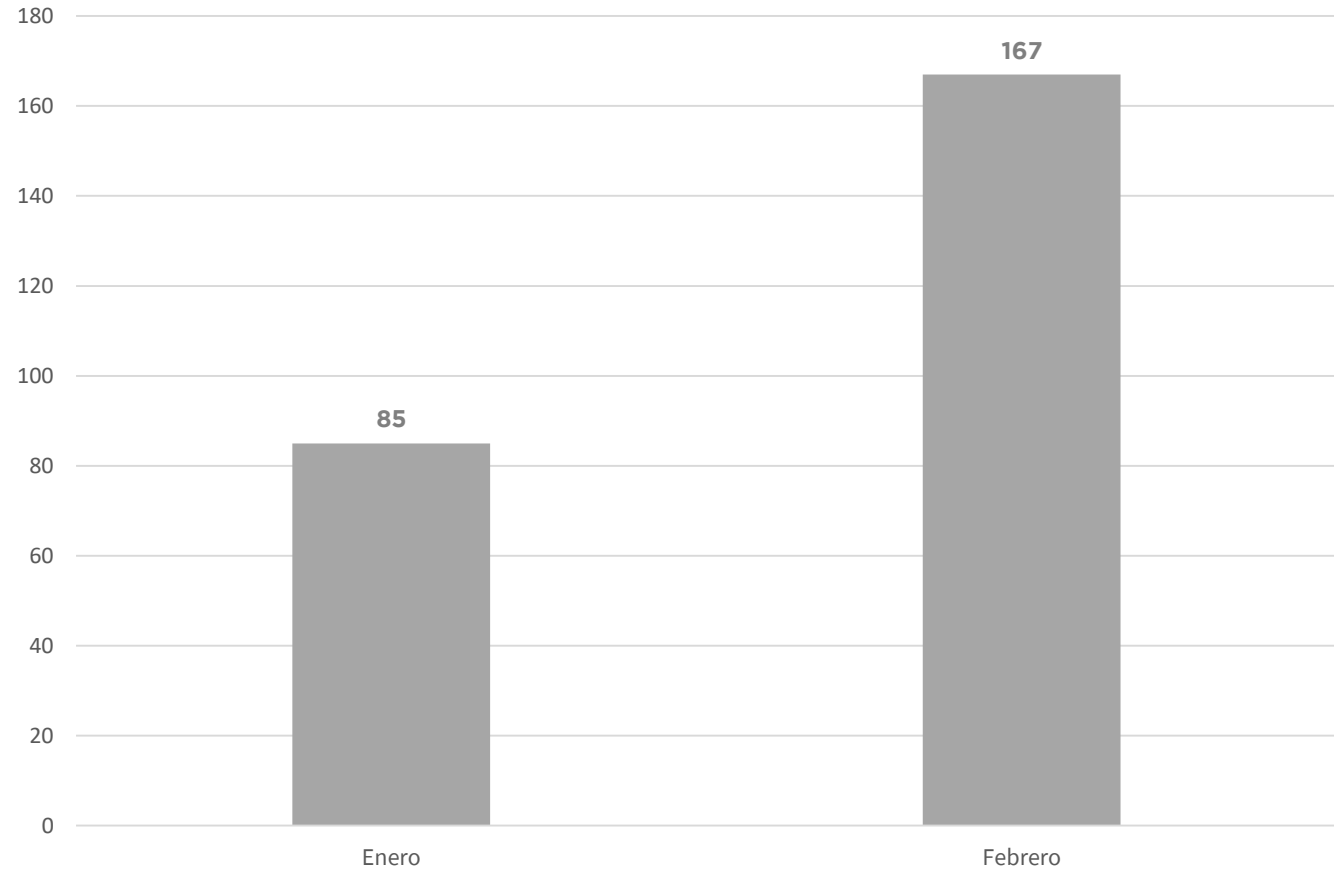



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO  
HISTÓRICO

# ACH | ene – feb

## Eliminación de grafiti

### 1, 463 m<sup>2</sup>


De cortinas limpias

### 3, 766 m<sup>2</sup>

De fachadas limpias



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

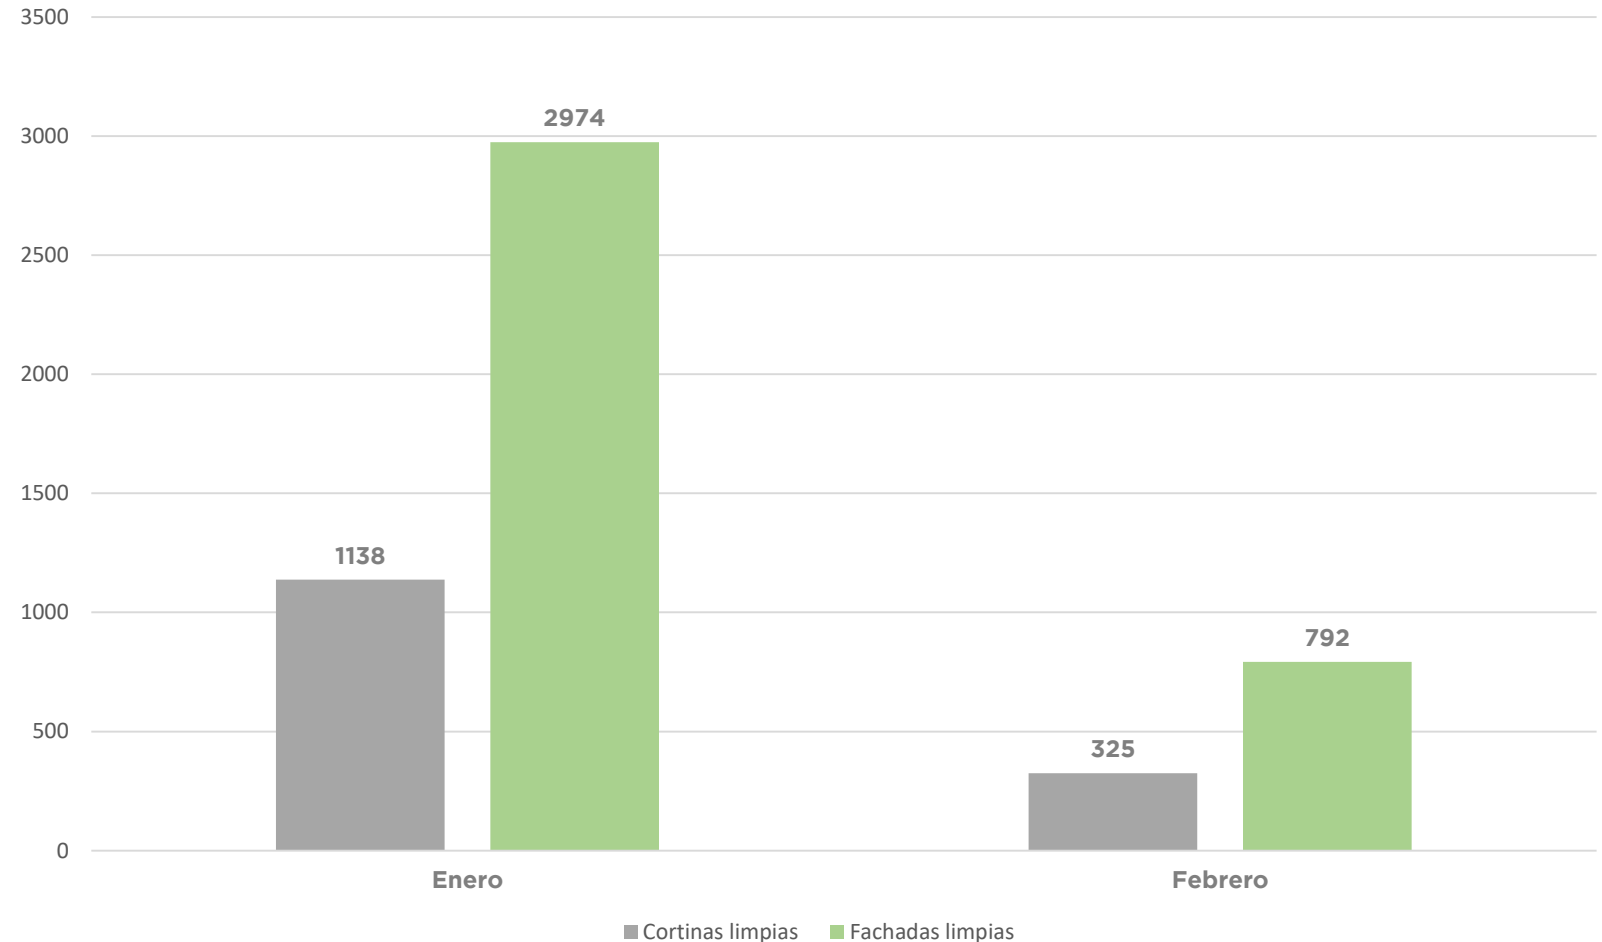



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# ACH | ene - feb

## Eliminación de grafiti

# 237 m<sup>2</sup>

De gel utilizado

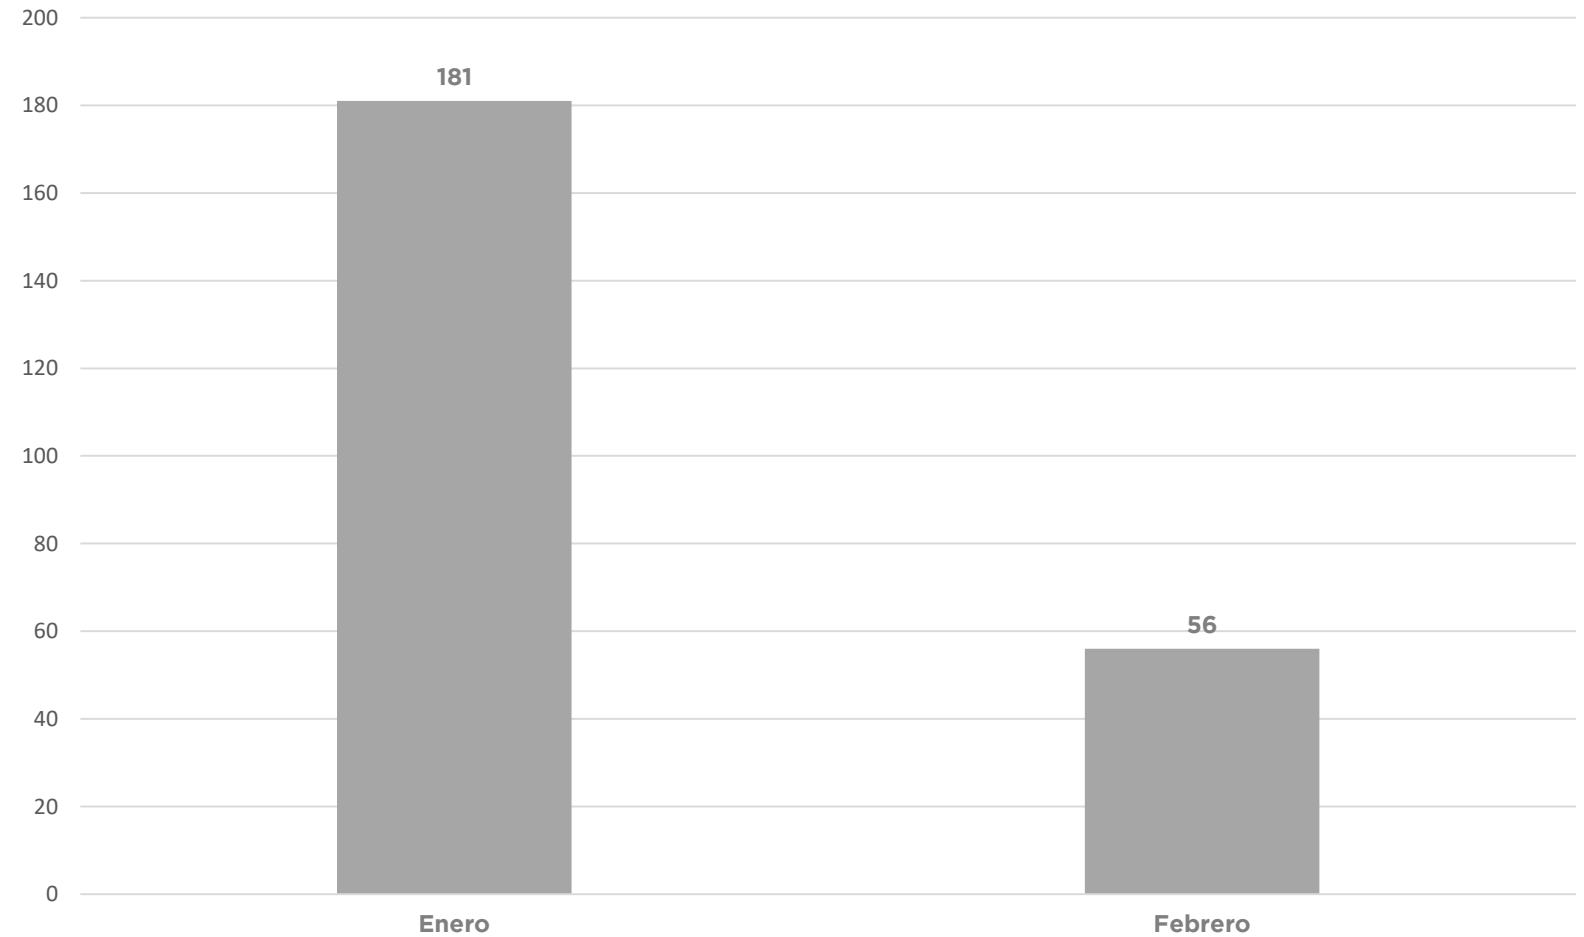

# ALC. VENUSTIANO CARRANZA

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 10/02	Quincena al 24/02	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	13	27	10 de marzo	Se detalla la ubicación y causa en el anexo
Tiraderos Clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base 26 tiraderos)	Quincenal	1047.2	970.2	10 de marzo	Se recolectaron 34 toneladas diariamente de residuos sólidos
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	24	6	10 de marzo	Se detalla la ubicación y causa en el anexo



# ALC. VENUSTIANO CARRANZA

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 13/02	Semana al 20/02	Próximo reporte	Observaciones
Desazolve de drenaje	Número de metros lineales de la red de drenaje desazolvados	Quincenal	59	59	10 de marzo	Se desazolvaron 118 metros lineales
Bacheo en líneas secundarias	Número de acciones de bacheo en líneas secundarias	Quincenal	113	110.25	10 de marzo	Se realizó un bacheo de 223.25

# ALC. VENUSTIANO CARRANZA

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
ANFORA 14	HEROE DE NACUZARI		7 DE JULIO	1	MANTENIMIENTO
JOSE JOAQUIN HERRERA 1	NICOLAS BRAVO	VIDAL ALCOCER	MORELOS I	2	MANTENIMIENTO
TAPICERIA 49	MIGUEL NEGRETE	CANAL	10 DE MAYO	1	MANTENIMIENTO
ENCUADERNADORES	SN ANTONIO TOMATLAN	HEROES DE NACUZARI	PENITENCIARIA	1	MANTENIMIENTO
SASTRERIA	EJE 1 NTE.		AMPL. PENITENCIARIA	1	MANTENIMIENTO
SASTRERIA 71	CONGRESO DE LA UNION	PENITENCIARIA	AMPL. PENITENCIARIA	1	MANTENIMIENTO
MIGUEL DOMINGUEZ	JOSE JOAQUIN HERRERA	PENITENCIARIA	AMPL. PENITENCIARIA	1	MANTENIMIENTO
MIGUEL DOMINGUEZ	JOSE JOAQUIN HERRERA	PENITENCIARIA	AMPL. PENITENCIARIA	1	MANTENIMIENTO
MIGUEL DOMINGUEZ	PENITENCIARIA	HEROES DE NACUZARI	AMPL. PENITENCIARIA	1	MANTENIMIENTO
MIGUEL DOMINGUEZ 39	JOSE JOAQUIN HERRERA	PENITENCIARIA	AMPL. PENITENCIARIA	1	MANTENIMIENTO
MIGUEL DOMINGUEZ	PENITENCIARIA	HEROES DE NACUZARI	AMPL. PENITENCIARIA	1	MANTENIMIENTO
MIGUEL DOMINGUEZ 24	HEROE DE NACUZARI	PENITENCIARIA	AMPL. PENITENCIARIA	1	MANTENIMIENTO
EMILIANO ZAPATA 143			CENTRO I	1	MANTENIMIENTO
NICOLAS BRAVO	ALARCON	GRAL. EMILIANO ZAPATA	CENTRO I	13	RECONEXION DE LINEAS
			TOTAL	27	


# ALC. VENUSTIANO CARRANZA

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1.4	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	1.15	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACAZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.2	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.35	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.3	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.05	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.2	S-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	1.15	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.3	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.15	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.25	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.05	S-9

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.2	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.35	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.05	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.2	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.1	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.35	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.35	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.3	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.35	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.35	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.35	S-9

# ALC. VENUSTIANO CARRANZA

## Tiraderos clandestinos

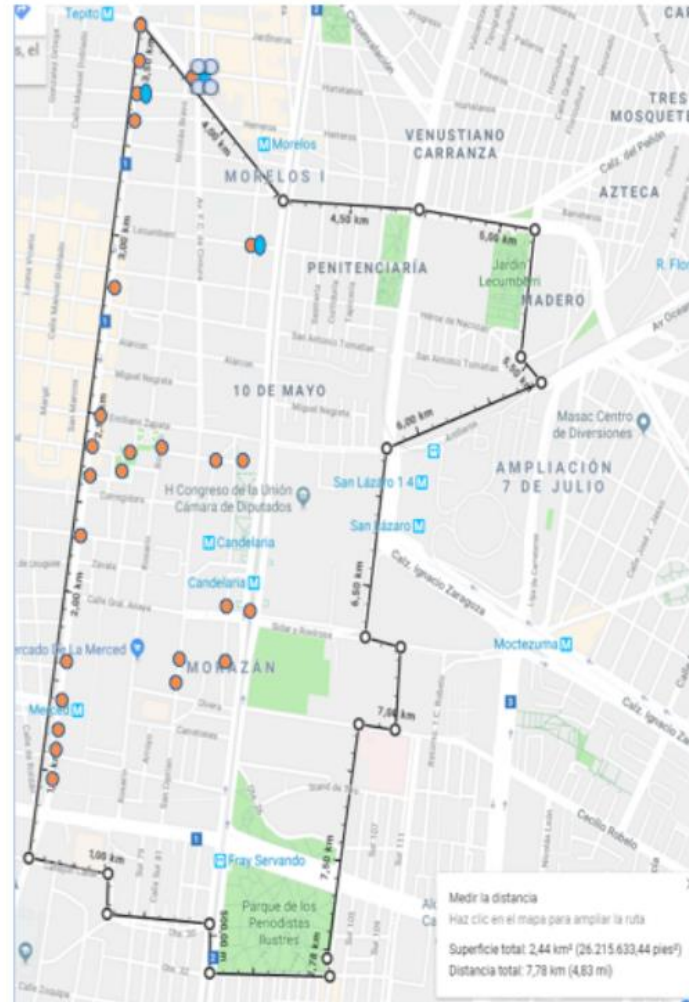

Montón Tradicional



Recolección de cascajo





# ALC. VENUSTIANO CARRANZA

REPORTE DE PODAS REALIZADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
PLAZA SAN LÁZARO NO. 05-A	ESQUINA	EL ROSARIO	CENTRO I	6	REDUCCIÓN DE COPA
			TOTAL	6	



# ALC. VENUSTIANO CARRANZA

METROS LINEALES DE LA RED DE DRENAJE DESAZOLVADOS					
DIRECCION	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD ML	MOTIVO
PLAZA SAN LAZARO N° 30	SAN CIPRIAN	ROSARIO	CENTRO I	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
MIGUEL NEGRETE N° 18-201 A	CIRCUNVALACION	BRAVO	CENTRO I	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
ALARCON N° 24	F.C. CINTURA	BRAVO	CENTRO I	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
ALARCON N° 26	F.C. DE CINTURA	BRAVO	CENTRO I	10	ALBAÑAL DOMICILIARIO
CDA. DE ROSARIO N° 68	ROSARIO	CABAÑAS	CENTRO II	24	LIMPIEZA DE 3 COLADERAS PLUVIALES
CDA DE ROSARIO N° S/N	ROSARIO	CABAÑAS	CENTRO II	8	LIMPIEZA DE COLADERA PLUVIAL
NACIONAL N° 43	VIDAL ALCOCER	BRAVO	MORELOS I	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
1RA CDA DE SAN ANTONIO TOMATLAN N° 11	HEROE DE NACAZARI	SAN ANTONIO TOMATLAN	7 DE JULIO	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
CORREGIDORA N° 148	SAN CIPRIAN	ROSARIO	CENTRO I	16	ALBAÑAL DOMICILIARIO

**TOTAL: 118**

ACCIONES DE BACHEO EN VIAS SECUNDARIAS					
DIRECCION	ENTRE CALLES		COLONIA	M2	MOTIVO
VULCANIZACION N° 26	HERREROS	ALBAÑILES	VENUSTIANO CARRANZA	39.75	5 BACHES
HERREROS S/N	TIPOGRAFIA	SERICULTURA	VENUSTIANO CARRANZA	24.50	3 BACHES
TIPOGRAFIA N° 31	ALBAÑILES	HERREROS	VENUSTIANO CARRANZA	13.50	1 BACHE
HERREROS S/N	ROTOGRABADOS	LITOGRAFIA	VENUSTIANO CARRANZA	50.50	1 BACHE
HERREROS S/N	LITOGRAFIA	HORTICULTURA	VENUSTIANO CARRANZA	17.10	1 BACHE
HERREROS S/N	SERICULTURA	ROTOGRABADOS	VENUSTIANO CARRANZA	4.00	1 BACHE
4TA CDA. DE SAN ANTONIO TOMATLAN S/N	HEROES DE NACAZARI	SAN ANTONIO TOMATLAN	7 DE JULIO	21.00	1 BACHE
1RA CDA. DE SAN ANTONIO TOMATLAN N° S/N	SAN ANTONIO TOMATLAN	HEROES DE NACAZARI	7 DE JULIO	14.50	2 BACHES
ANFORA S/N	ESQ. HEROES DE NACAZARI		7 DE JULIO	38.40	3 BACHES


**TOTAL: 223.25**



# Al. V. Carraza | ene - feb


## 75

### Reparaciones de luminarias

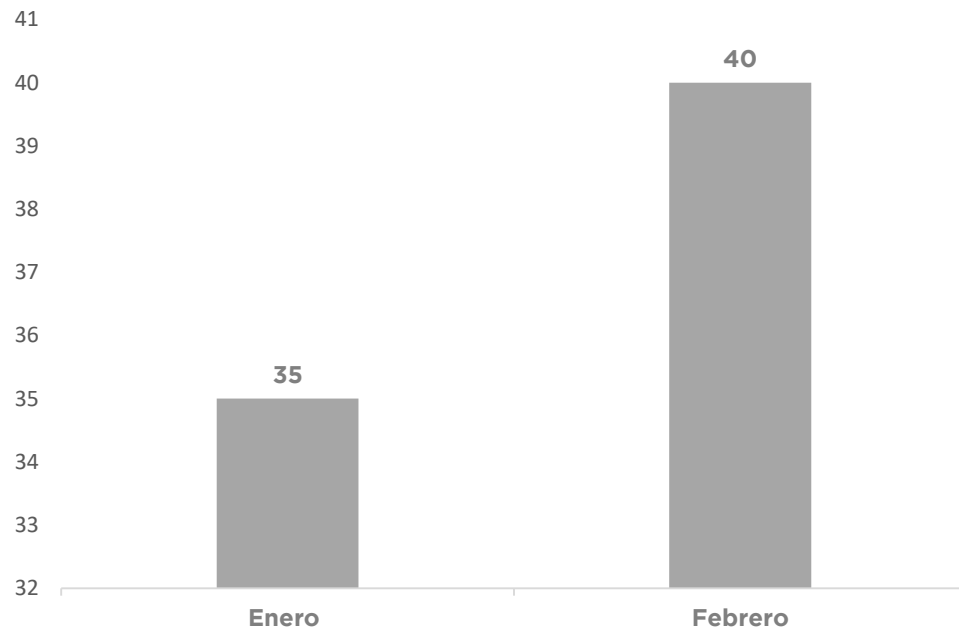

## 9, 179 m<sup>3</sup>

### Residuos sólidos recolectados

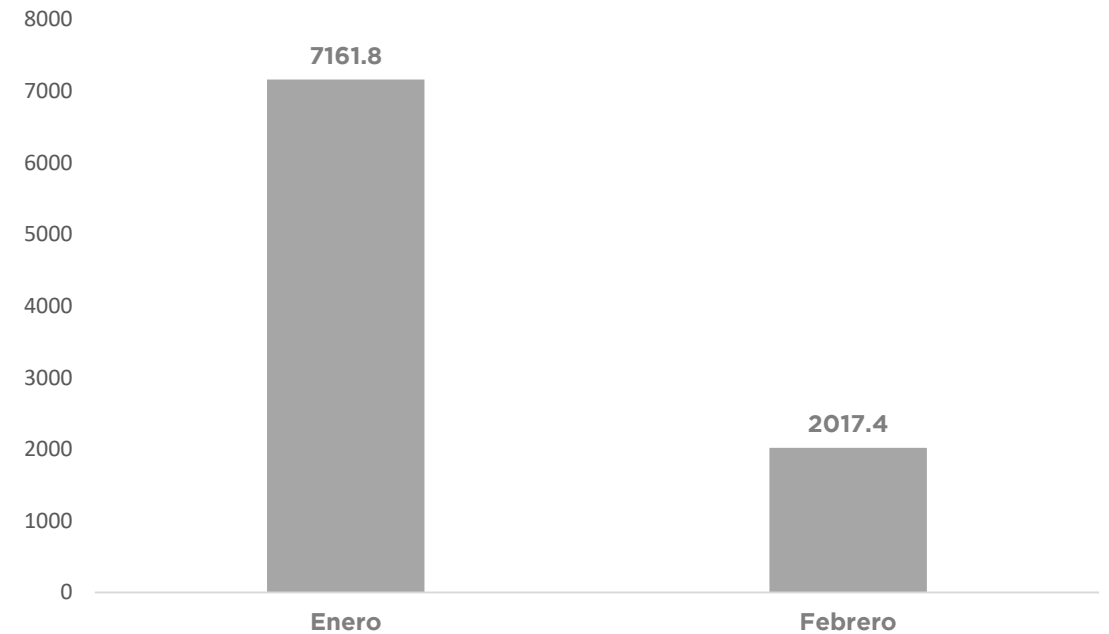




Al. V. Carraza | ene - feb

218

metros de la red de drenaje desazolvados en PB

Red de drenaje desazolvado en PB

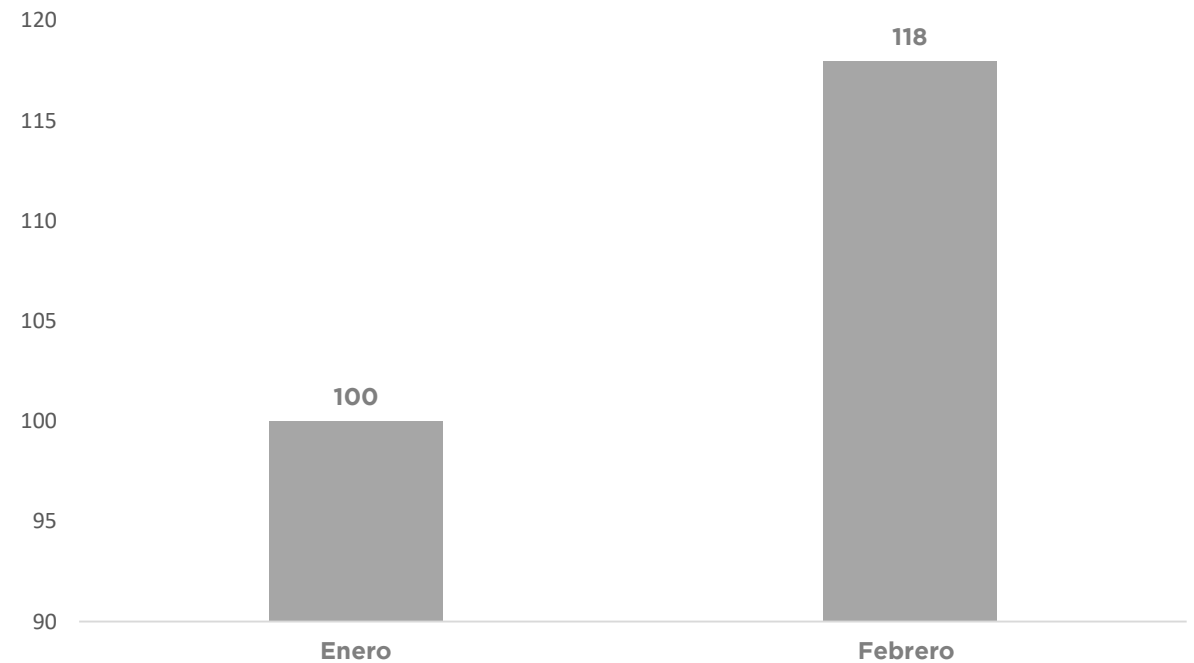

# SACMEX

## DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS DEL CENTRO HISTÓRICO

- REPORTE DE AVANCES DE TRABAJO



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SACMEX

## METAS DEL PROGRAMA

**21,000** metros de atarjea

**370** pozos de visita

**150** rejillas de piso

**160** coladeras pluviales

**1,500** metros de albañal

Centro Histórico de la Ciudad de México delimitado por las vialidades Eje 1 Norte (Norte), Eje Central Lázaro Cárdenas (Poniente), Circunvalación (Oriente) y Fray Servando Teresa de Mier (Sur).




GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO

SACMEX



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

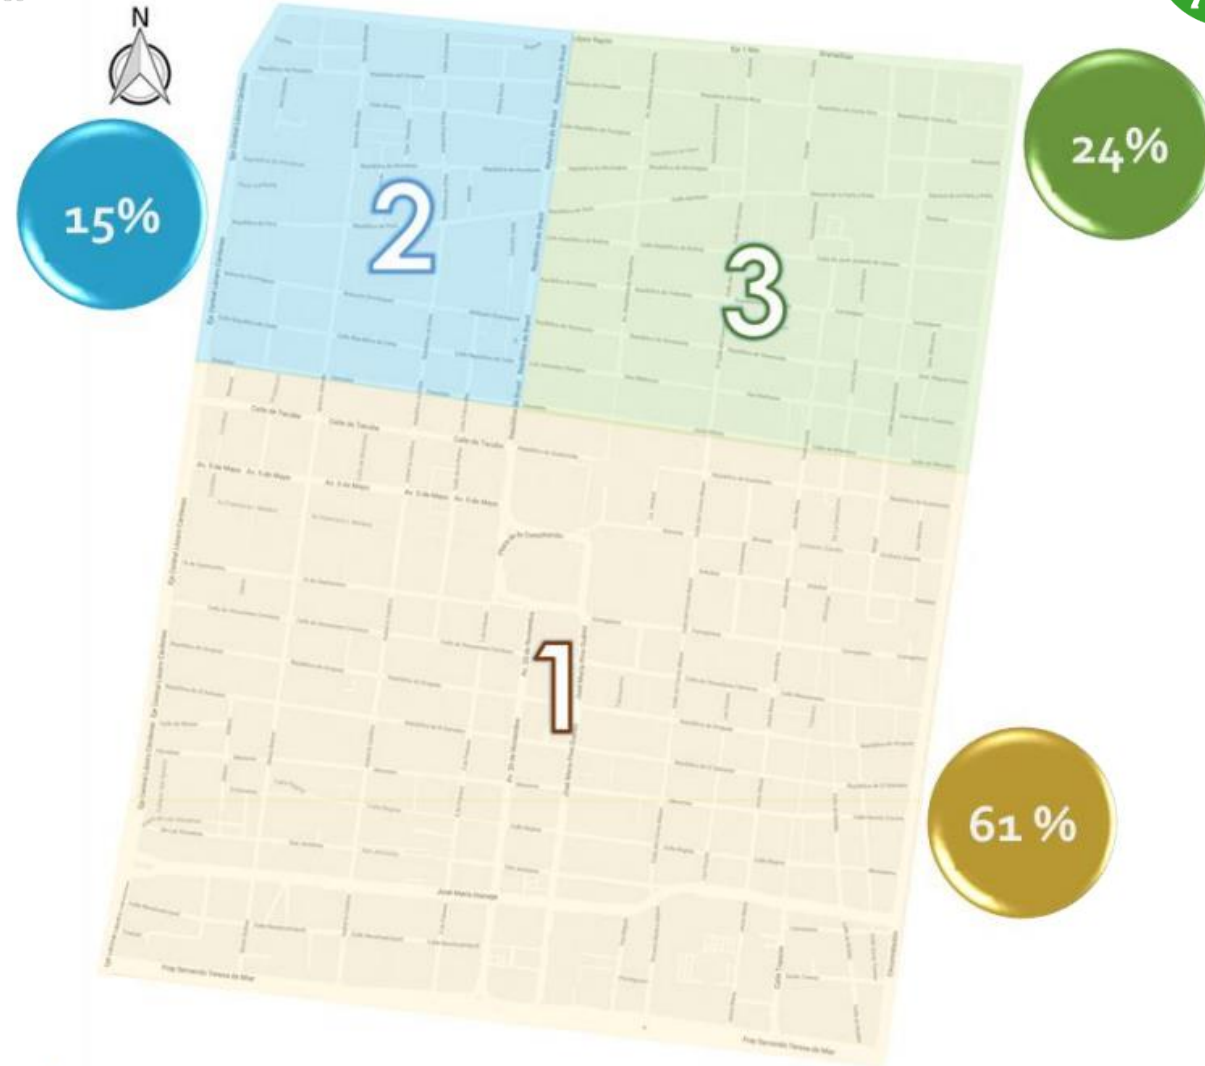

## DELIMITACIÓN


SE CONTARA CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS OFICINAS DE REHABILITACIÓN CENTRO, PONIENTE Y NORTE PARA EL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE DESAZOLVE.



# SACMEX

40 % DE AVANCE

	PROGRAMADO	AVANCE
ATARJEA (METROS)	21,000	8,400
POZOS DE VISITA	370	148
REJILLAS DE PISO	150	60
COLADERAS PLUVIALES	160	64
ALBAÑAL (METROS)	1,500	600







GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO

SACMEX



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



**PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN**  
(Área Perimetral)



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# SACMEX



**JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ**

(Entre Plaza de la Constitución y Fray Servando Teresa de Mier)



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO

# SACMEX



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



## MOTOLINIA

(Entre Francisco I. Madero y 16 de Septiembre)



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# SACMEX



**BELISARIO DOMÍNGUEZ**  
(Entre República de Chile y República de Brasil)



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO

# SACMEX



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



**REPÚBLICA DE ARGENTINA**  
(Entre Granaditas y Justo Sierra)



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# SACMEX



**REPÚBLICA DE CHILE**  
(Entre Donceles y República de Perú)



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO

SACMEX



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



**CALLE DEL CARMEN**  
(Entre Justo Sierra y Granaditas)



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# SACMEX | ene - feb

# 40%

Avance de  
desazolve de la red de drenaje  
en el Centro Histórico

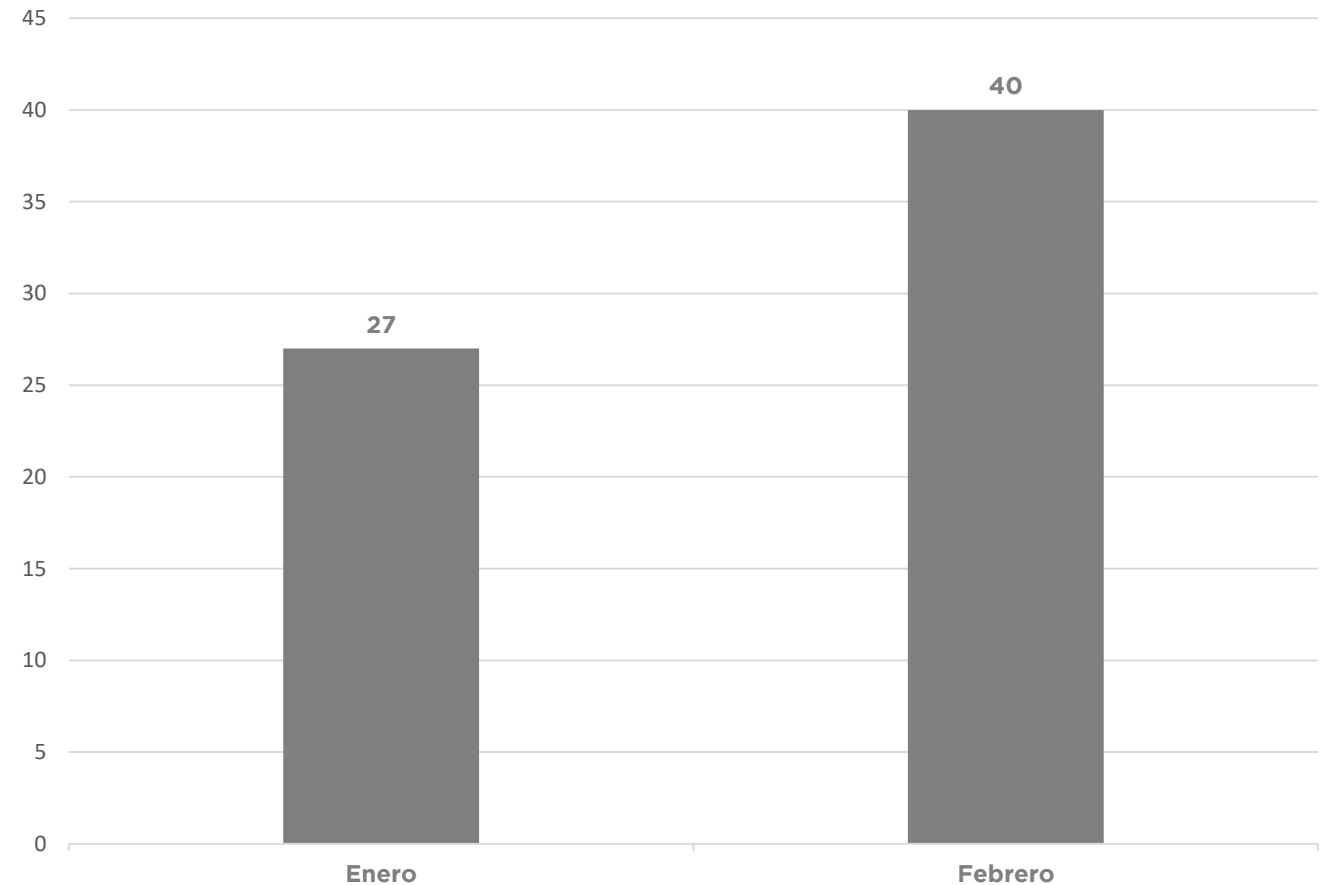





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# SOS – Alumbrado Público

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 17-feb	Semana al 24-feb	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	208	210	10-mar-20



# SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

## Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico Perímetro A

Incidencias atendidas al 17 de febrero 2020

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
José Mariano Jiménez	Esq. San Jerónimo		1	Cableado, cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Eje 1 ote	San Simón	Manzanares	5	Cableado de circuito	Circuito apagado
Calle Gante	Francisco I. Madero	16 de septiembre	5	Reconexión de circuito	Circuito apagado
Eje 1 ote	Corregidora	Manzanares	2	cambio de fotocelda	Luminarias encendidas de día
Lecumberri	Leona Vicario	Rodríguez Puebla	2	Cableado, reconexión de líneas	Luminarias apagadas
Leona Vicario	Esq. República de Venezuela		1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Eje 1 nte	Esq., Aztecas		1	Reinstalación de luminaria	Luminaria en riesgo de caer
Eje 1 ote	Nacional	Joaquín Herrera	1	Cierre de tapa	Luminaria abierta
Corregidora	Correo Mayor	Jesús María	32	Reparación de circuito	Circuito apagado
Lecumberri	Rodríguez Puebla	Cjon. Mixcalco		Ajuste de fotocelda	Luminaria apagada
Manuel Doblado	Lecumberri	José Joaquín de Herrera	6	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
Manzanares	2q cjon de Manzanares	3er cjon de Manzanares	21	Reparación de circuito	Circuito apagado
20 de noviembre	Nezahualcóyotl	Izazaga	26	Reparación de circuito	Circuito apagado
República del Salvador	5 de febrero	Isabel la Católica	1	Reinstalación de luminaria	Luminaria en riesgo de caer
Eje 1 ote	Esq. José Joaquín Herrera		1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Eje 1 ote	Esq., Calle Nacional		1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Santo Tomás	Plaza San Pablo	Misioneros	2	Cambio de lámparas	Luminarias apagadas
Ramón Corona	Esq. Talavera		1	Cambio de lámpara y balastro	Luminarias apagadas
5 de febrero	Esq. República del Salvador		1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>110</b>		



# SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

## Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico Perímetro A

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD
2º Cjon. de Manzanares	Esq. Manzanares		2
Torres Quintero	José Joaquín Herrera	Manuel de la Pea y Peña	1
Cjon. Girón	Republica de Colombia	Rodríguez Puebla	3
Allende	Esq. Belisario Domínguez		1
República de Venezuela	Calle del Carmen	Rodríguez Puebla	1
Donceles	Eje Central	Allende	7
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>125</b>

## Incidencias atendidas al 17 de febrero 2020

MOTIVO	INCIDENCIA
Cambio de lámpara y balastro	Luminarias apagadas
Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Cambio de lámparas	Luminarias apagadas
Retiro de poste	Poste impactado
Reparación de poste	Poste inclinado
Reparación de circuito	Circuito apagado



# SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

## Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico Perímetro A Incidencias atendidas al 17 de febrero 2020

DIRECCION	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA	
Plaza de la Constitución	José Ma. Pino Suarez	Moneda	Centro	2	Se retira poste diseño 1900 con cable cal 10 ,dos brazos con cable calibre 10, dos luminarias bellotas, un juego de tapa metalica y su respectiva tornillería	Retiro de Poste
Plaza de la Constitución	5 de Febrero República del Salvador	20 de Noviembre	Centro	8	SE REVISAS CONTROL Y SE REPROGRAMA RELOJ CON FECHA Y HORA CORRECTA	Control dañado
Centro Histórico	Alameda Central	Ramón Corona	Centro	1	SE REALIZA CAMBIO DE SHOKET PGZ Y LAMPARA PGZ 140W	Lampara apagada
		Av. Juárez	Centro	1	SE REALIZA RECONEXION DE LINEAS DE LUMINARIO	Lampara apagada
Plaza Seminario	Moneda	República de Guatemala	Centro	10	Se realiza reconexión en líneas de alimentación	Circuito apagado
Plaza de la Constitución	Fco. I. Madero	16 de Septiembre	Centro	8	SE REVISAS CONTROL Y SE REPROGRAMA RELOJ CON FECHA Y HORA CORRECTA	Circuito apagado
Plaza de la Constitución	José Ma. Pino Suarez	Moneda	Centro	2	se realiza instalación de poste, cableado y fijación de 2 brazos con luminario tipo rizo vial y peatonal, reconexión de líneas en registro y retiro de tapa de registro	Falta Poste
Centro Histórico	Cara Av. Hidalgo	Av. Juárez	Centro	1	Se instala luminaria urban, se le pone lampara y balastro y reconexión de líneas	Sin luminario
Centro Histórico	Azueta	Revillagigedo	Centro	1	se realiza cambio de lampara e39 de 140 w y balastro de 140 w y reconexión, REF 012 2019D156	Lampara apagada
Fco. I Madero	Isabel la Católica	Palma	Centro	2	Se retira poste diseño 1900 con cable cal 10 ,dos brazos con cable calibre 10, dos luminarias bellotas, un juego de tapa metálica y su respectiva tornillería	Retirar Poste
Manzanera	Santo Tomás	3er callejón manzanera	Centro	10	reconexión de líneas enciende del 057655 al 057665	Circuito apagado
Centro Histórico	Revillagigedo	Luis Moya	Centro	19	se restablece contro se checa amperaje enciende del 079040 al 079059	Control dañado
Plaza de la Constitución	José Ma. Pino Suarez	Moneda	Centro	2	Se retira poste diseño 1900 con cable cal 10 ,dos brazos con cable calibre 10, dos luminarias bellotas, un juego de tapa metálica y su respectiva tornillería	Retirar Poste
Plaza de la Constitución	José Ma. Pino Suarez	Moneda	Centro	2	se realiza instalación de poste, cableado y fijación de 2 brazos con luminario tipo rizo vial y peatonal, reconexión de líneas en registro y retiro de tapa de registro	Falta Poste
Plaza de la Constitución	José Ma. Pino Suarez	Moneda	Centro	2	Se retira poste diseño 1900 con cable cal 10 ,dos brazos con cable calibre 10, dos luminarias bellotas, un juego de tapa metálica y su respectiva tornillería	Retirar Poste
Alameda Central	Av. Hidalgo	Av. Juárez	Centro	1	se cambia luminaria urban por una nueva y balastro de 140 w y lampara pgz de 140 w, REF 027 2020D24	Lampara apagada
Centro Histórico	Balderas	Azueta	Centro	1	2020D41 Cambio de balastro	Lampara apagada
Plaza de la Constitución	José Ma. Pino Suarez	Moneda	Centro	2	Se retira poste diseño 1900 con cable cal 10 ,dos brazos con cable calibre 10, dos luminarias bellotas, un juego de tapa metálica y su respectiva tornillería	Retirar Poste
Centro Histórico	Isabel la Católica	16 de Septiembre	Centro	6	reconexión de líneas	Circuito apagado
Plaza de la Constitución	José Ma. Pino Suarez	Moneda	Centro	2	Se retira poste diseño 1900 con cable cal 10 ,dos brazos con cable calibre 10, dos luminarias bellotas, un juego de tapa metálica y su respectiva tornillería	Retirar Poste
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>83</b>		
	<b>TOTAL</b>			<b>208</b>		



# SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico Perímetro A

Incidencias atendidas al 24 de febrero 2020

DIRECCION	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
REPÚBLICA DE ECUADOR	República de Brasil	República de Argentina	CENTRO	SE REALIZA REPARACION DE BORNES Y RECONEXION DE LINEAS PDL 057762 AL 057778 CONTROL 057768	CONTROL DAÑADO
AV. JUÁREZ	Luis Moya	Dolores	CENTRO	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO Y RECONEXIÓN DE LÍNEAS	LÁMPARA APAGADA
ALAMEDA CENTRAL	Av. Hidalgo	Av. Juárez	CENTRO	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA E39 90W Y BALASTRO DE 90W Y RECONEXION	LÁMPARA APAGADA
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	Venustiano Carranza	República de Uruguay	CENTRO	SE REALIZA RECONEXION DE LUMINARIA	DEFECTO CONEXIÓN
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	San Jerónimo	Eje 1 Sur	CENTRO	SE REALIZA RECONEXION DE LUMINARIA	DEFECTO CONEXIÓN
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	San Jerónimo	Eje 1 Sur	CENTRO	SE REALIZA RECONEXION DE LUMINARIA	DEFECTO CONEXIÓN
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	San Jerónimo	Eje 1 Sur	CENTRO	SE REALIZA RECONEXION DE LUMINARIA	DEFECTO CONEXIÓN
PLAZA SEMINARIO	Moneda	República de Guatemala	CENTRO	SE CAMBIA LÁMPARA DE 140W PGZ Y BALASTRO DE 140W COSMOWHITE	DEFECTO CONEXIÓN
Francisco I. Madero	Fray Pedro de Gante	Bolívar	CENTRO	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA PGZ 90W Y RECONEXION DE LINEAS POR SULFATAMIENTO	LÁMPARA APAGADA
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	Monte de Piedad	16 de Septiembre	CENTRO	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA PGZ140W Y BALASTRO 140W	LÁMPARA APAGADA
AV. JUÁREZ	Iturbide	Humboldt	CENTRO	CAMBIO DE LÁMPARA SOQUET Y BALASTRO Y RECONEXIÓN DE LÍNEAS.	LÁMPARA APAGADA
AV. JUÁREZ	Iturbide	Humboldt	CENTRO	CAMBIO DE LÁMPARA SOQUET Y BALASTRO Y RECONEXIÓN DE LÍNEAS.	LÁMPARA APAGADA
AV. JUÁREZ	Iturbide	Humboldt	CENTRO	CAMBIO DE LÁMPARA SOQUET Y BALASTRO Y RECONEXIÓN DE LÍNEAS.	LÁMPARA APAGADA
AV. JUÁREZ	Iturbide	Humboldt	CENTRO	CAMBIO DE LÁMPARA SOQUET Y BALASTRO Y RECONEXIÓN DE LÍNEAS, CAMBIO DE LÁMPARA SOQUET Y BALASTRO Y RECONEXIÓN	LÁMPARA APAGADA
ALHÓNDIGA	Soledad y	Corregidora	CENTRO	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS	LÁMPARA APAGADA
Francisco I. Madero	Fray Pedro de Gante	Bolívar	CENTRO	SE REESTABLECE BREAK DEL CIRCUITO 051619 AL 051601	CIRCUITO APAGADO (5 O MÁS LÁMPARAS CONTINUAS)
Francisco I. Madero	Fray Pedro de Gante	Eje Central	CENTRO	SE REESTABLECE BREAK DEL CIRCUITO 051684 AL 051703	CIRCUITO APAGADO (5 O MÁS LÁMPARAS CONTINUAS)
AV. JUÁREZ	Luis Moya	Dolores	CENTRO	SE REPARA CORTO CIRCUITO EN REGISTRO DE SUELO	CIRCUITO APAGADO (5 O MÁS LÁMPARAS CONTINUAS)
<b>SUBTOTAL</b>			<b>88</b>		



# SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

## Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico Perímetro A

Incidencias atendidas al 24 de febrero 2020

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA	
Cjon. Girón	Rodríguez Puebla	República de Colombia	Centro	4	Cambio de lámparas y balastos	Luminarias apagadas
Marconi	Tacuba	Donceles	Centro	3	Cambio de fotocelda	Luminarias encendidas de día
República de Colombia	República de Argentina	Del Carmen	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
República de Paraguay	Esq. Comonfort		Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Lecumberri	Esq. Leona Vicario		Centro	8	Reparación de circuito	Circuito apagado
Eje 1 nte	Jesús Carranza	Aztecas	Centro	8	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Eje 1 nte	Florida	González Ortega	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Manzanares	Roldán	Eje 1 ote	Centro	30	Reparación de circuito	Circuito apagado
Isabel la Católica	Regina	República del Salvador	Centro	12	Reparación de circuito	Circuito apagado
República del Salvador	Esq. Isabel la Católica		Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Eje 1 ote	Corregidora	Manzanares	Centro	2	Reconexión de línea	Luminarias apagadas
Leona Vicario	Miguel Alemán	San Antonio Tomatlán	Centro	10	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
Calle Loreto	Justo Sierra	San Idelfonso	Centro	9	Cambio de fotocelda	Luminarias encendidas de día
Manuel Doblado	Mixcalco	República de Guatemala	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Cjon. Mixcalco	Lecumberri	Miguel Alemán	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Leona Vicario	República de Venezuela	San Antonio Tomatlán	Centro	2	Cableado de circuito	Luminarias apagadas
Manuel de la Peña y Peña	Cjon. Girón	Torres Quintero	Centro	1	Cambio de luminaria	Luminaria apagada
Leona Vicario	Esq. San Antonio Tomatlán		Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Torres Quintero	José Joaquín Herrera	Manuel de la Peña y Peña	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>		



# SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

## Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico Perímetro A


Incidencias atendidas al 24 de febrero 2020

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
Manuel de la Peña y Peña	Manuel de la Peña Y Peña	Cjon. Girón	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
República de Costa Rica	Aztecas	Republica de Argentina	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Cjon. Girón	Rodríguez Puebla	República de Bolivia	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Corregidora	1ª Cda de Corregidora	Eje 1 ote	2	Cambio de lámpara y cableado	Luminarias apagadas
Corregidora	Jesús María	Alhóndiga	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
San Antonio Tomatlán	Cjon. Mixcalco	Loreto	13	Cableado de circuito	Circuito apagado
República de Colombia	Cjon. Girón	Rodríguez Puebla	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Argentina	Esq. República de Nicaragua		1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Republica de Uruguay	Las Cruces	Correo Mayor	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>22</b>		Luminaria apagada
		<b>TOTAL</b>	<b>210</b>		



# SOS – Alumbrado Público

## Número de luminarias reparadas en el perímetro A del CH

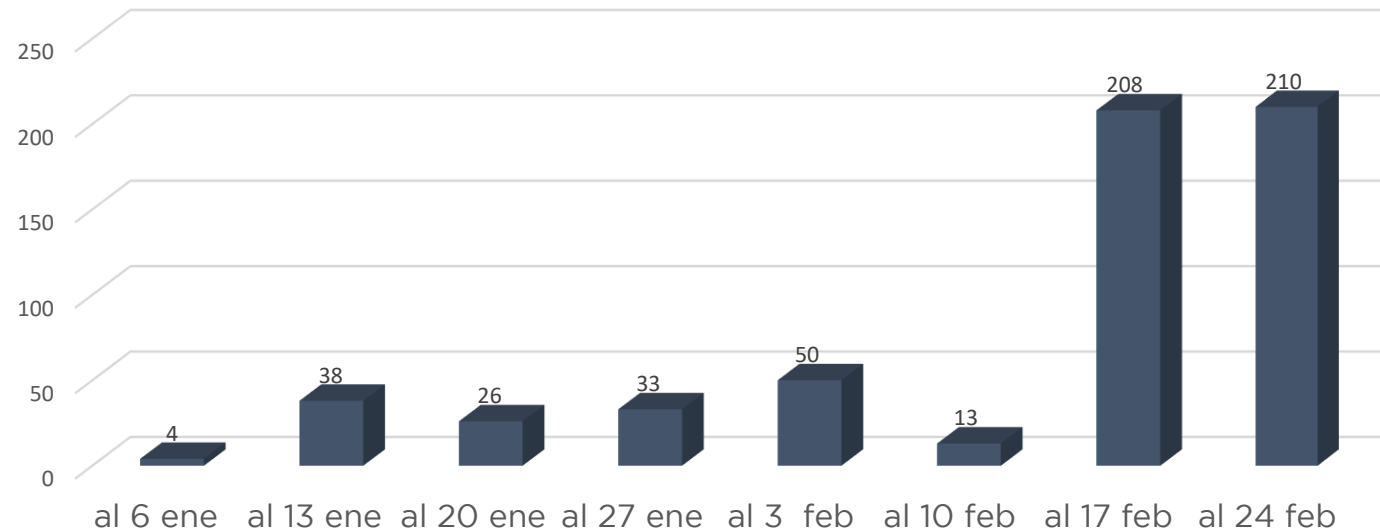



# STC-METRO

Tema	Indicador	Quincena al 10/02	Quincena al 24/02	Observaciones	Próximo reporte
Infraestructura	Número de escaleras electromecánicas con falla o algún problema (línea base: 75 escaleras en 29 estaciones)	8 escaleras detenidas	4 escaleras detenidas	73 equipos están funcionando (dos equipos se habilitaron)	10 de marzo
Infraestructura	Número de elevadores en reparación (línea base: 19 elevadores en 29 estaciones)	0 elevadores detenidos	0 elevadores detenidos	No se reportó equipo con fallas	10 de marzo

# ILIFE

Tema	Indicador	Periodicidad	Al mes de Enero	Al mes de Febrero	Próximo reporte
Mantenimiento de escuelas	Porcentaje de avance de mantenimiento de escuelas (línea base: 23 escuelas)	Mensual	92.27%	96.24%	24/03/2020

## ILIFE | Inmuebles escolares en proceso de atención 2018 -2020 en Centro Histórico

No.	Plantel	Porcentaje de avance	Observaciones
1	ESCUELA SECUNDARIA ADRIANA GARCIA CORRAL (1era. Etapa)	99.00 %	
2	ESCUELA PRIMARIA MARCELINO DÁVALOS	71.98 %	
3	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE PANAMÁ	77.46 %	
4	TELESECUNDARIA NO. 91	94.80 %	
5	ESCUELA SECUNDARIA ÁNGEL TRÍAS ÁLVAREZ	90.20 %	
6	ESCUELA PRIMARIA JOAQUÍN GARCÍA ICAZBALCETA	80.30 %	
<b>7</b>	<b>JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI</b>	<b>100.00 %</b>	<b>TERMINADA OCTUBRE</b>
<b>8</b>	<b>ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE</b>	<b>100.00 %</b>	<b>TERMINADA OCTUBRE</b>
<b>9</b>	<b>JARDÍN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU</b>	<b>100.00 %</b>	<b>TERMINADA OCTUBRE</b>
<b>10</b>	<b>ESCUELA PRIMARIA LIC. PONCIANO ARRIAGA</b>	<b>100.00 %</b>	<b>TERMINADA OCTUBRE</b>
<b>11</b>	<b>ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE LÍBANO</b>	<b>100.00 %</b>	<b>TERMINADA OCTUBRE</b>
<b>12</b>	<b>ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MANUEL RAMOS</b>	<b>100.00 %</b>	<b>TERMINADA OCTUBRE</b>


# ILIFE | Inmuebles escolares en proceso de atención 2018 -2020 en Centro Histórico

No.	Plantel	Porcentaje de avance	Observaciones
13	JARDÍN DE NIÑOS CAJETES DE LA NAVAL	100.00 %	TERMINADA OCTUBRE
14	ESCUELA NACIONAL PARA CIEGOS LIC. IGNACIO TRIGUEROS	100.00 %	TERMINADA EN OCTUBRE
15	ESCUELA SECUNDARIA NO. 1 CÉSAR A. RUÍZ	100.00 %	SE CONCLUYERON TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BARDA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR PARTE DE LA FUNDACIÓN ROBERT BOSCH
16	ESCUELA PRIMARIA SARA MANZANO	100.00 %	TERMINADA SEPTIEMBRE
17	ESCUELA PRIMARIA PABLO MORENO	100.00 %	TERMINADA SEPTIEMBRE
18	ESCUELA PRIMARIA MIGUEL SERRANO	100.00 %	TERMINADA JUNIO
19	ESCUELA PRIMARIA ALFREDO E. URUCHURTU	100.00 %	TERMINADA ABRIL
20	ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ SEC TEC No. 6	100.00 %	TERMINADA ABRIL
21	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE BOLIVIA	100.00 %	TERMINADA ABRIL
22	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE ARGENTINA	100.00 %	TERMINADA ABRIL
23	ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS	100.00 %	TERMINADA ABRIL

# ILIFE | Inmuebles escolares en proceso de atención 2018 -2020 en Centro Histórico

**17**  
**Planteles educativos rehabilitados\***

(\*) de una meta de 23 planteles, representando un avance del 92.27%

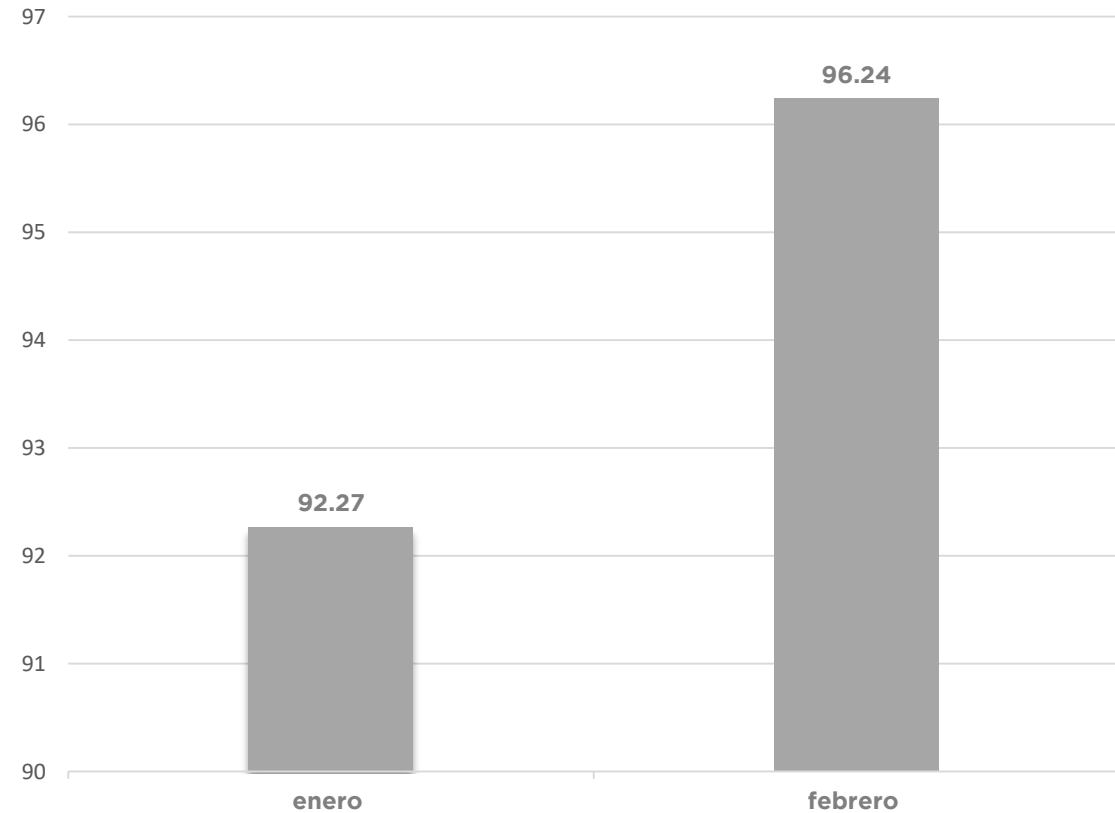

# PROSOC

Tema	Indicador	Periodicidad	Ubicación	Al mes de enero	Al mes de febrero	Próximo reporte	Observaciones
Unidades habitacionales	Porcentaje de avance de proyectos de unidades habitacionales (línea base: 61)	Mensual	Alcaldía Cuauhtémoc (56 unidades habitacionales)	76.48 %	78.482 %	10 de marzo	8 obras por iniciar 11 obras en proceso 37 obras terminadas
			Alcaldía Venustiano Carranza (5 unidades habitacionales)	66.00 %	66.00 %		1 obra por iniciar 2 obras en proceso 2 obras terminadas
			<b>Total acumulado</b>	<b>71.24 %</b>	<b>72.24 %</b>		

# PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	TIZAPAN 8	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
2	SAN CAMILITO 25	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	EN PROCESO	100%	B	NO CATALOGADO
3	ROSARIO 32	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
4	REPUBLICA DEL SALVADOR 206	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	A	CATALOGADO
5	REPUBLICA DE PERU 32	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	CATALOGADO
6	REPUBLICA DE PERU 28	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO

# PROSOC

<b>NO.</b>	<b>PREDIO</b>	<b>COLONIA</b>	<b>ALCALDIA</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>ESTATUS</b>	<b>PORCENTAJE DE AVANCE</b>	<b>PERÍMETRO</b>	<b>CATALOGACIÓN</b>
7	REPUBLICA DE COSTA RICA 129	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
8	REPUBLICA DE COSTA RICA 125	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADO
9	REPUBLICA DE CHILE 49	CENTRO	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	EN PROCESO	80%	A	NO CATALOGADO
10	REPUBLICA DE CHILE 47	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA A HIDRAULICA	EN PROCESO	80%	A	CATALOGADO
11	PLAZA SAN LAZAROB-16	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
12	ORGANO 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA A HIDRAULICA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
13	ORGANO 16-18	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO



# PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
14	NEZAHUALCOYOTL 136	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	EN PROCESO	100%	B	NO CATALOGADO
15	MISIONEROS 9	CENTRO	CUAUHTEMOC	ALBAÑILERIA	TERMINADA	100%	A	CATALOGADO
16	MANUEL TOLSA 56	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESTRUCTURA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
17	MANUEL DOBLADO 140	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
18	LAZARIN DEL TORO 26	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA	EN PROCESO	90%	A	CATALOGADO
19	JOSE JOAQUIN HERRERA 28-32	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADO	100%	B	NO CATALOGADO
20	JOSE JOAQUIN HERRERA 2-4	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO

# PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
21	JOSE JOAQUIN HERRERA 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
22	JOSE JOAQUIN HERRERA 10 Y 12	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
23	ISABEL LA CATOLICA 134	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	EN PROCESO	75%	B	NO CATALOGADO
24	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 142	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
25	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
26	ECUADOR 23 (ANTES ALLENDE 82 Y 86)	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	EN PROCESO	100%	B	NO CATALOGADO
27	CORREGIDORA 148	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	EN PROCESO	50%	B	NO CATALOGADO

# PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
28	CORREGIDORA 140	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
29	CERRADA FRAY SERVANDO 59	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
30	CALLEJON MONTERO 7	CENTRO	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	EN PROCESO	100%	B	NO CATALOGADO
31	ANILLO DE CIRCUNVALACION 40	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	EN PROCESO	80%	B	NO CATALOGADO
32	ALDACO 8	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	CATALOGADO
33	5 DE FEBRERO 93	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	POR INICIAR	70%	B	NO CATALOGADO
34	1RA. CERRADA FRAY SERVANDO 57	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	POR INICIAR	40%	B	NO CATALOGADO

# PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
35	CHIMALPOPOCA 51	OBRELA	CUAUHTEMOC	PINTURA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
36	FLORIDA 57	MORELOS	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
37	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS 29	MORELOS	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA (DRENAJE)	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
38	JESUS CARRANZA 20	MORELOS	CUAUHTEMOC	ESCALERAS Y HERRERIA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
39	LIBERTAD 21 A1	MORELOS	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
40	LIBERTAD 21 B2	MORELOS	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	EN PROCESO	75%	B	NO CATALOGADA
41	LIBERTAD 21 C3	MORELOS	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	EN RPOCESO	50%	B	NO CATALOGADA
42	LIBERTAD 21 D4	MORELOS	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA

# PROSOC

<b>NO.</b>	<b>PREDIO</b>	<b>COLONIA</b>	<b>ALCALDIA</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>ESTATUS</b>	<b>PORCENTAJE DE AVANCE</b>	<b>PERÍMETRO</b>	<b>CATALOGACIÓN</b>
43	BOLIVAR 158	OBRERA	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	EN PROCESO	100%	B	NO CATALOGADA
44	SEGUNDA CERRADA DE CHIMALPOPOCANO.16	OBRERA	CUAUHTEMOC	BASE DE TINACOS	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
45	CERRADA FRAY SERVANDO 42	TRANSITO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA (CABLEADO)	EN PROCESO	80%	B	NO CATALOGADA
46	CHIMALPOPOCA 294	TRANSITO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
47	MINA 167	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
48	MOCTEZUMA 199	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	HERRERIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
49	MOCTEZUMA 33	GUERRERO	CUAUHTEMOC	HERRERIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
50	VIOLETA 104	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA

# PROSOC


NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
51	AVENIDA NIÑOS HEROES 51	DOCTORES	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y HERRERIA (ESCALERA MARINA)	EN PROCESO	100%	B	NO CATALOGADA
52	DR. ANDRADE 14	DOCTORES	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION, INFRAESTRUCTURA SANITARIA, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
53	DR. ANDRADE 15	DOCTORES	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	EN PROCESO	80%	B	NO CATALOGADA
54	CALZADA DE LA VIGA 16	ESPERANZA	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
55	CALZADA DE LA VIGA 18	ESPERANZA	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
56	CALZADA DE LA VIGA 30	ESPERANZA	CUAUHTEMOC	PINTURA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
57	PENSADOR MEXICANO 47	GUERRERO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA

# PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
58	SANTA VERACRUZ 47	GUERRERO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
59	VIOLETA 58	GUERRERO	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	EN PROCESO	60%	B	NO CATALOGADA
60	GALEANA 36	GUERRERO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (BOMBA)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
61	HEROES 54	GUERRERO	CUAUHTEMOC	ESTRUCTURAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
62	HEROES 68	GUERRERO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA

# RIPUH 2020

- “Rescate innovador y participativo en unidades habitacionales” tiene por objetivo y estrategia general el promover el rescate y la participación ciudadana de las unidades habitacionales de interés social y popular (**UHISyP**) mediante la rehabilitación, reconstrucción y mantenimiento de áreas y bienes de uso común, a través de la asignación de recursos, la organización de sus habitantes y la corresponsabilidad social entre gobierno y ciudadanía.

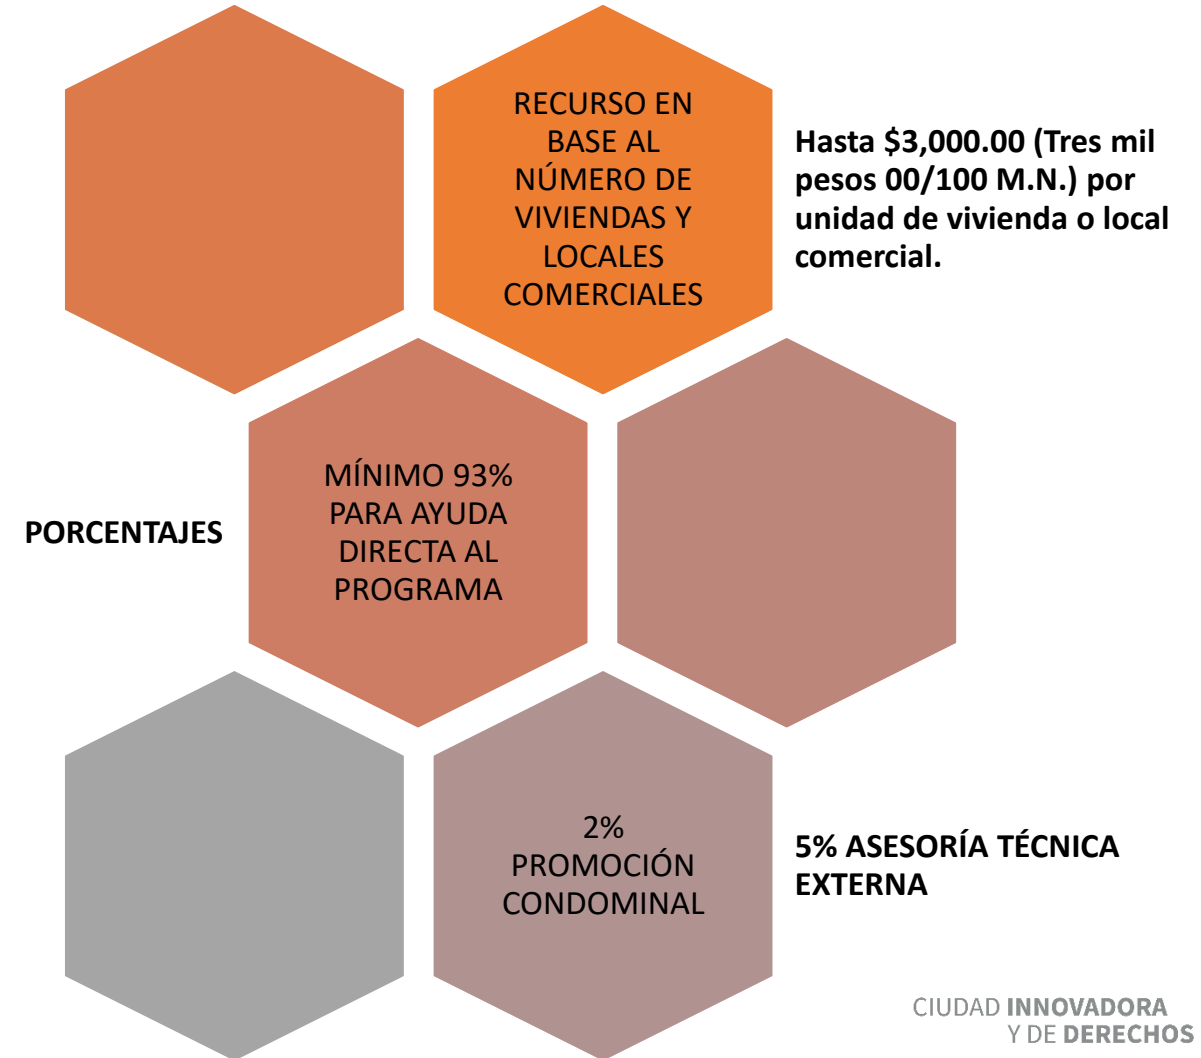



## REQUISITOS DE ACCESO

- Unidad habitacional de interés social.
- Adquirida a un organismo público (**FIDEURBE, FOVISSSTE, INFONAVIT, FONHAPO, FIVIDESU, FICAPRO, INDECO, INVI**)
- Inmuebles con más de **20 años** de antigüedad.
- No haber sido beneficiada por más de tres años consecutivos

## POSIBLES CONCEPTOS A TRABAJAR

- Calles y andadores
- Infraestructura hidráulica y sanitaria
- Equipamiento Urbano
- Cuidado del medio Ambiente
- Sistemas de seguridad
- Infraestructura eléctrica y de gas
- Herrería en general
- Impermeabilización y pintura
- Mejora de la imagen urbana
- Escaleras
- Celdas de cimentación
- Elevadores, mantenimiento mecánico y modernización.

# VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA

- 17 DE FEBRERO 2020 – 2 DE MARZO 2020

## DOCUMENTACIÓN NECESARIA

<https://www.prosoc.cdmx.gob.mx/programas/programa/programa-social-rescate-innovador-y-participativo-en-unidades-habitacionales>

## OFICINA CENTRAL


Recepción de documentación e informes: Puebla #182, colonia Roma norte, alcaldía Cuauhtémoc.



# PROSOC | ene - feb

# 72%

## Promedio de avance de obras de mantenimiento en las Alcaldías Cuauhtémoc y V. Carranza

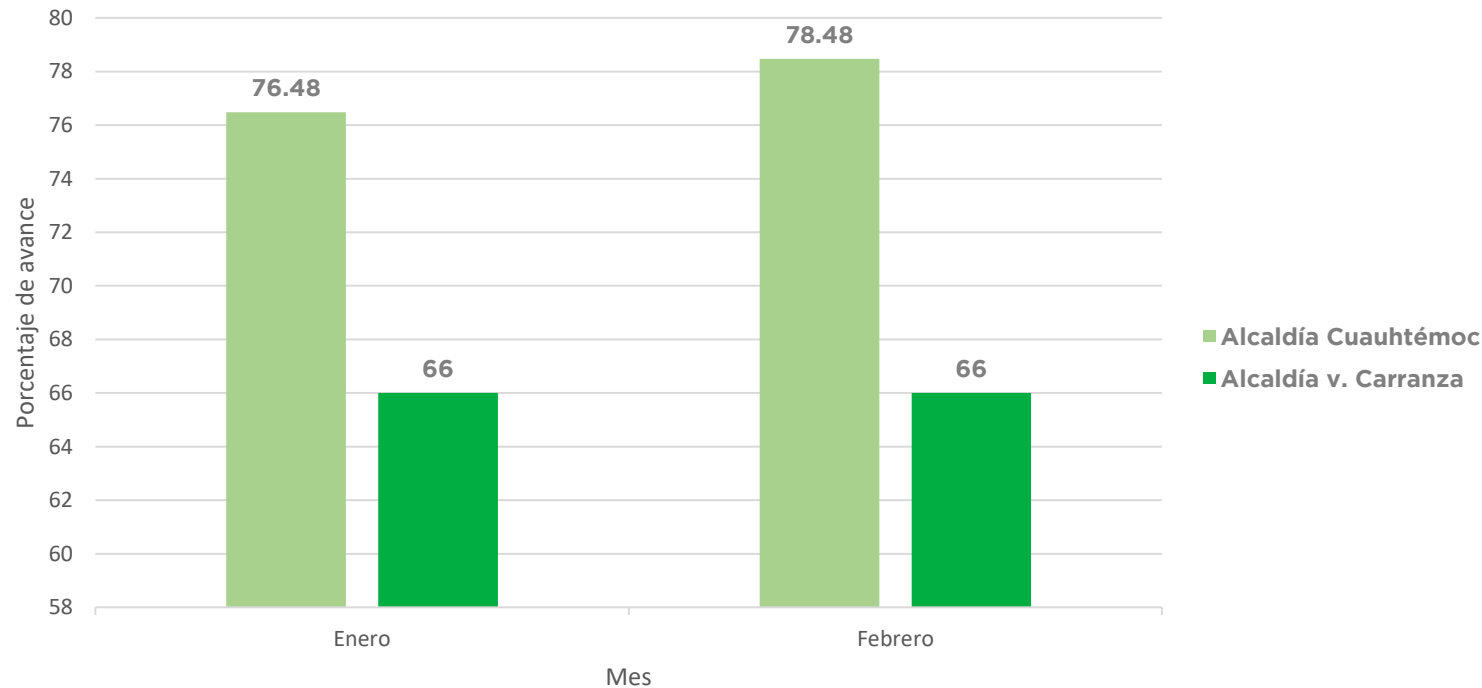

# CFE

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena del 10 de febrero al 24 de febrero	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	0	10 de marzo
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	40	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	9	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	4	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	2	





# CFE

## Anexo 2. Detalle de ubicaciones

### Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
EL SALVADOR	ENTRE EJE CENTRAL Y PINO SUAREZ	SIN DATO	COL.CENTRO	9	INSPECCIION DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BOVEDAS
16 DE SEPTIEMBRE	ENTRE EJE CENTRAL Y PALMA	SIN DATO	COL.CENTRO	15	INSPECCIION DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BOVEDAS
ROLDAN, TALAVERA, MISIONEROS	RAMON CORONA, CORREGIDORA, JESUS MARIA, SANTO TOMAS	SIN DATO	COL.CENTRO	16	INSPECCIION DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BOVEDAS
			<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	



# CFE

## Anexo 3. Detalle de ubicaciones

### Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
AV CIRCUNVALACION 612 LOC 2	MIGUEL ALEMAN Y LECUMBERRY	SIN DATO	COL.CENTRO	1	
MARGIL 30 EDIF- I D-301	ENTRE ZAPATA Y SOLEDAD	3IN DATO	COL.CENTRO	1	
CORREGIDORA 75 CP.06060	ENTRE ROLDAN Y 2 CALLEJON DE MANZANARES	SIN DATO	COL.CENTRO	1	
APARTADO 24	ABRAHAN CASTELLANOS Y ARGENTINA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	
REP DE NICARAGUA 51 CP.06000	ENTRE APARTADO Y AZTECAS	SIN DATO	COL.CENTRO	1	
REP DE ARGENTINA 54 A CP.06000	ENTRE COLOMBIA Y BOLIVIA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	
NICARAGUA 14 12	ENTRE BRASIL Y ARGENTINA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	
REPUBLICA DE HONDURAS 6 LOC CP	ENTRE CALLEJON DE AMARGURA Y SAN CAMILITO	SIN DATO	COL.CENTRO	1	
COLOMBIA 14 L-1 CP.06020	ENTRE BRASIL Y ARGENTINA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	
<b>TOTAL</b>				<b>9</b>	



# CFE

## Anexo 4. Detalle de ubicaciones

### Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
BUCARELI	ESQUINA ALLENDE	SIN DATO	COL. CENTRO	1	NINGUNA
INDEPENDENCIA	ESQUINA LOPEZ	SIN DATO	COL. CENTRO	1	NINGUNA
URUGUAY	ENTRE TALAVERA Y JESUS MARIA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	NINGUNA
CIRCUNVALACION	ESQUINA EMILIANO ZAPATA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	NINGUNA
			<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	





# TELMEX

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 24 de febrero	Próximo reporte
	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	0	
Mantenimiento a infraestructura	Número de incidencias de riesgo atendidas	Quincenal	16	10 de marzo
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	0	



# TELMEX

Anexo 1. Detalle de ubicaciones

Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCION

ENTRE CALLES

NO. EXT O REFERENCIA

COLONIA

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

SIN SINIESTROS QUE REPORTAR

TOTAL

0





# TELMEX

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
<h1>SIN SINIESTROS QUE REPORTAR</h1>					
				<b>TOTAL</b>	<b>0</b>



# INAH

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte al 24/02	Próximo reporte	Observaciones
Obras en el Centro Histórico	Número de trámites de solicitud de autorización de obra en inmuebles ubicados en el Centro Histórico	Quincenal	13	10 de marzo	Anexo 1
	Número de autorizaciones de obra en inmuebles ubicados en el Centro Histórico	Quincenal	10		Anexo 2



INAH

**Anexo 1. Tramites de solicitudes de autorización de obra en inmuebles ubicados en el "Centro Histórico de la Ciudad de México" ingresados en la Ventanilla Única del 11 al 24 de febrero de 2020**

Fecha de ingreso	Ubicación	Nº	Tipo de Obras	Dictamen
12-feb.-20	REP VENEZUELA	72	SUSTITUCION DE TAPANCO	ATENDIDO
13-feb.-20	FRANCISCO I MADERO	67	ADECUACION	ATENDIDO
13-feb.-20	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS	71	OBRA NUEVA	
14-feb.-20	ISABEL LA CATOLICA	44	RESTAURACION DE FACHADA	ATENDIDO
14-feb.-20	ISABEL LA CATOLICA	44	MANTENIMIENTO PORTON	ATENDIDO
14-feb.-20	SAN ILDEFONSO	30	REFUERZO ESTRUCTURAL	
14-feb.-20	REP CUBA	92	MANTENIMIENTO	ATENDIDO
14-feb.-20	DR CLAUDIO BERNARD	171	DEMOLICION	
19-feb.-20	REP VENEZUELA	8	MANTENIMIENTO	ATENDIDO
21-feb.-20	LIC PRIMO VERDAD	7	DEMOLICION	
21-feb.-20	REP CUBA	20 Y 22	RESTAURACION DE BARDA	
21-feb.-20	LIC PRIMO VERDAD	7	OBRA NUEVA	
21-feb.-20	NEZAHUALCOYOTL	3	ADECUACION	



**Anexo 2. Autorizaciones de obra en inmuebles ubicados en el Centro Histórico  
del 11 al 24 de febrero de 2020**

INAH

Ubicación	N°	Tipo de obra	Autorización
FRANCISCO I. MADERO	60	ADECUACIÓN	044/20
REPÚBLICA DE BRASIL	113	MANTENIMIENTO DE FACHADA	045/20
REPÚBLICA DEL SALVADOR	43-47	LIBERACIÓN DE CORNISA	047/20
REPÚBLICA DEL SALVADOR	20	REGULARIZACIÓN DE OBRA	049/20
FRANCISCO I. MADERO	33	RESTAURACIÓN	051/20
ISABEL LA CATOLICA	5	TRABAJOS PRELIMINARES	052/20
REPÚBLICA DE CUBA	92	PRÓRROGA. MANTENIMIENTO EN PUERTAS.	054/20
VENUSTIANO CARRANZA	64	REMODELACIÓN	056/20
EMILIANO ZAPATA	37	PRÓRROGA. MANTENIMIENTO EN APLANADOS.	059/20
20 DE NOVIEMBRE	195	MANTENIMIENTO DE FACHADA	060/20




INAH | ene-feb

47

Solicitudes de  
autorización


29

Autorizaciones de  
obra

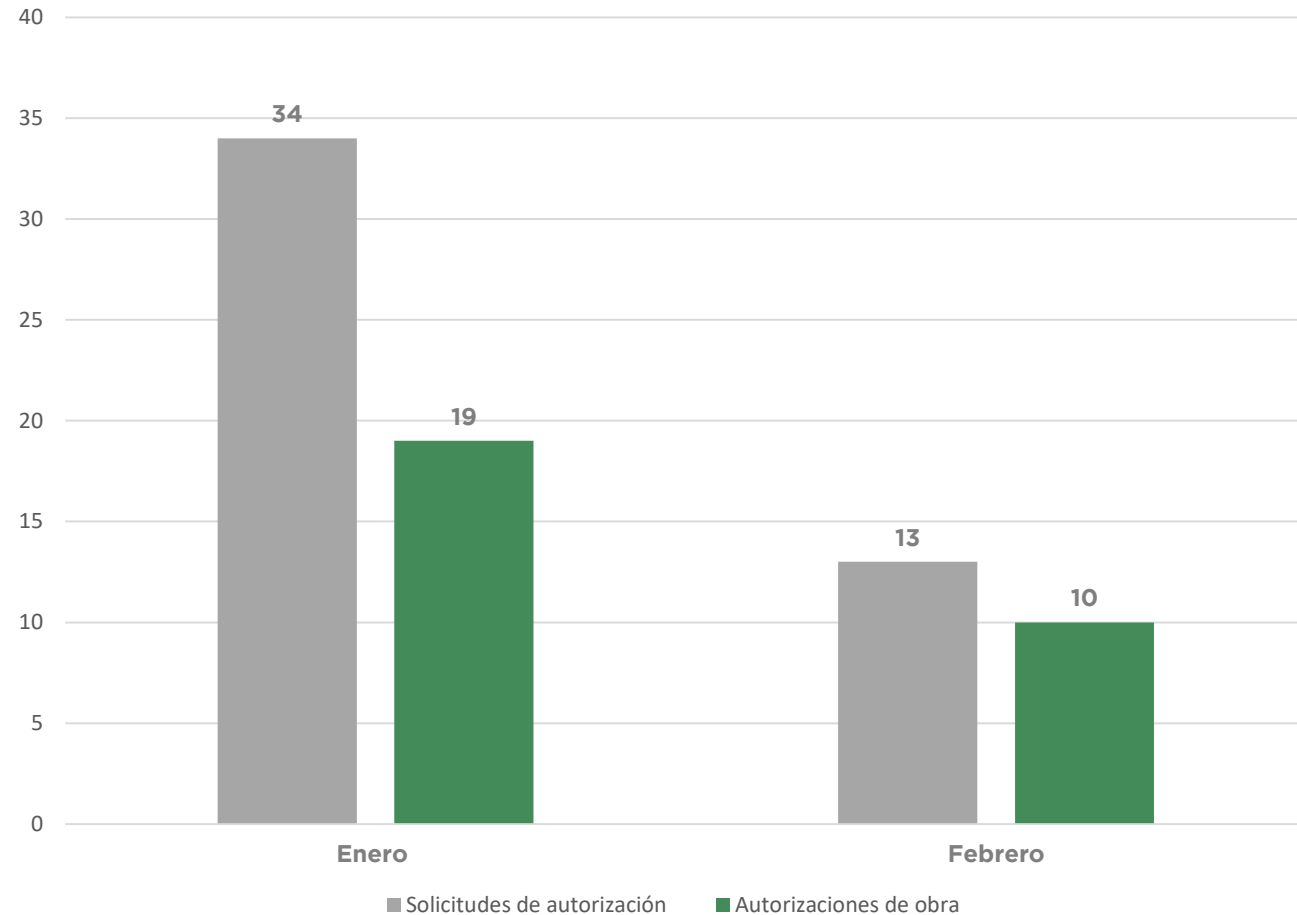



# INBAL

Tema	Indicador	Periodicidad	Del 08 al 24/01	Del 25/01 al 16/02	Próximo reporte	Observaciones
Obras en el Centro Histórico	Número de solicitudes ingresadas para intervenciones diversas en inmuebles ubicados en el Centro Histórico	Mensual	17	15	24/03/2020	12 solicitudes de información 1 solicitud de obras menores 2 solicitudes de obras mayores  (4 inmuebles patrimonio artístico, 5 colindantes, 5 sin injerencia)

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	ALCALDÍA	RESPUESTA	FOLIO	CONSULTA	MENORES	MAYORES	INCLUIDO	COLINDANTE	NO INCLUIDO	TRABAJOS	VIGENCIA	IMAGEN
1	REPÚBLICA DE GUATEMALA	70	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	198	1					1	NO APLICA	UN AÑO	
2	REPÚBLICA DE GUATEMALA	74	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	199	1					1	NO APLICA	UN AÑO	
3	REPÚBLICA DE GUATEMALA	75	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	200	1					1	NO APLICA	UN AÑO	
4	AV. 20 DE NOVIEMBRE	195	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	216	1					1	NO APLICA	UN AÑO	
5	REPÚBLICA DE PARAGUAY	4	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	227	1				1		NO APLICA	UN AÑO	
6	AV. FRANCISCO I. MADERO	67	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	228	1				1		NO APLICA	UN AÑO	
7	BALDERAS	71	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	254	1			1			NO APLICA	UN AÑO	

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	ALCALDÍA	RESPUESTA	FOLIO	CONSULTA	MENORES	MAYORES	INCLUIDO	COLINDANTE	NO INCLUIDO	TRABAJOS	VIGENCIA	IMAGEN
8	REPÚBLICA DE CUBA	74	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	279	1			1			NO APLICA	UN AÑO	
9	AV. JUÁREZ	64	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	293	1				1		NO APLICA	UN AÑO	
10	AV. HIDALGO	1	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJOS AUTORIZADOS	313		1		1			APLICACIÓN DE ADHESIVO ANTIDERRAPANTE EN ESCALERA	UN AÑO	
11	16 DE SEPTIEMBRE	51	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	318	1				1		NO APLICA	UN AÑO	
12	ESCUELA MÉDICO MILITAR	30	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	331	1					1	NO APLICA	UN AÑO	
13	BUCARELLI	66	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	337	1			1			NO APLICA	UN AÑO	

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	ALCALDÍA	RESPUESTA	FOLIO	CONSULTA	MENORES	MAYORES	INCLUIDO	COLINDANTE	NO INCLUIDO	TRABAJOS	VIGENCIA	IMAGEN
14	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	71	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INTERVENCIONES MAYORES	SIN FOLIO			1		1		RECOMENDACIÓN TÉCNICA PARA PROTECCIÓN A COLINDANCIA (EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS 74) LIBERADO	UN AÑO	
15	16 DE SEPTIEMBRE	51	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INTERVENCIONES MAYORES	SIN FOLIO			1		1		RECOMENDACIÓN TÉCNICA PARA RECOMENDACIÓN A COLINDANCIA (VENUSTIANO CARRANZA 46) EN PROCESO DE REVISION	UN AÑO	
<b>Totales</b>							<b>12</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>			


# INBAL | ene- feb

**32**  
Solicitudes ingresadas

**27**  
Solicitudes de información

**3**  
Solicitudes de obras menores

**2**  
Solicitudes de obras mayores

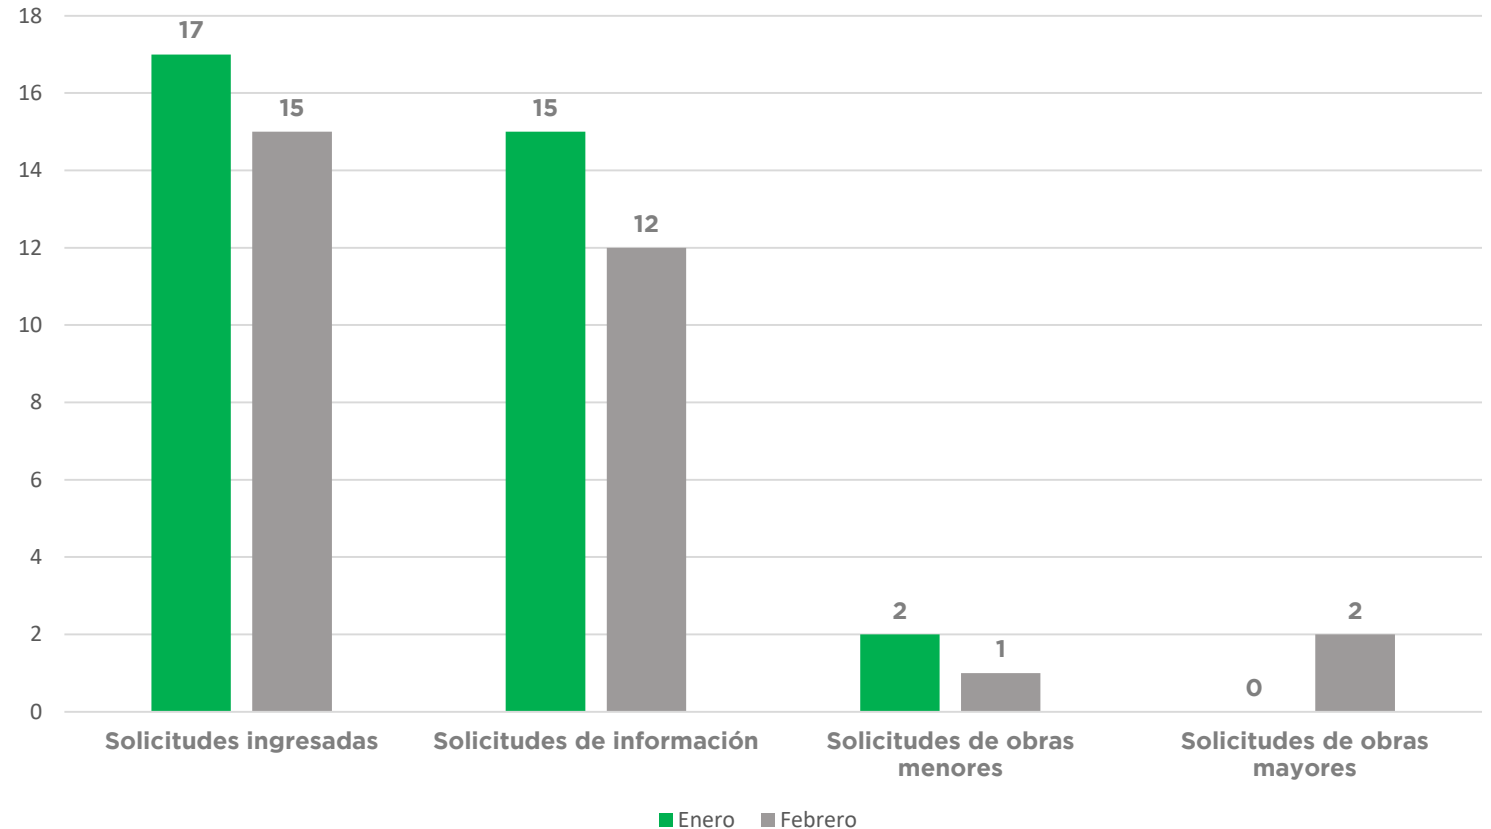



# SEDECO

## Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México

Estatus al 25 de febrero 2020

Alcaldían	Mercado	Obra y Servicio	Fecha de inicio	Fecha término	AVANCE			
					Empresa	Importe del Contrato	Avance físico	Actualización Alcaldía
Cuauhtémoc	San Camilito	REHABILITACIÓN	01/08/2019	21/12/2019	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLO INMOBILIARIO VILALVA, S.A. DE C.V.	6,669,870.46	100%	09/01/2020
Cuauhtémoc	Lagunilla Ropa y Telas	REHABILITACIÓN	01/08/2019	21/12/2019	PROYECCIÓN Y DISEÑO EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	13,307,986.69	85%	20/12/2019
Cuauhtémoc	San Juan Curiosidades	REHABILITACIÓN	30/07/2019	21/12/2019	DESARROLLO E INGENIERÍA DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	32,346,718.04	85%	20/12/2019

**NOTA:** El mercado San Juan Curiosidades, fue afectado por el sismo del 19 de septiembre de 2017.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO




CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SEDECO | ene-feb

### Avance porcentual del Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos

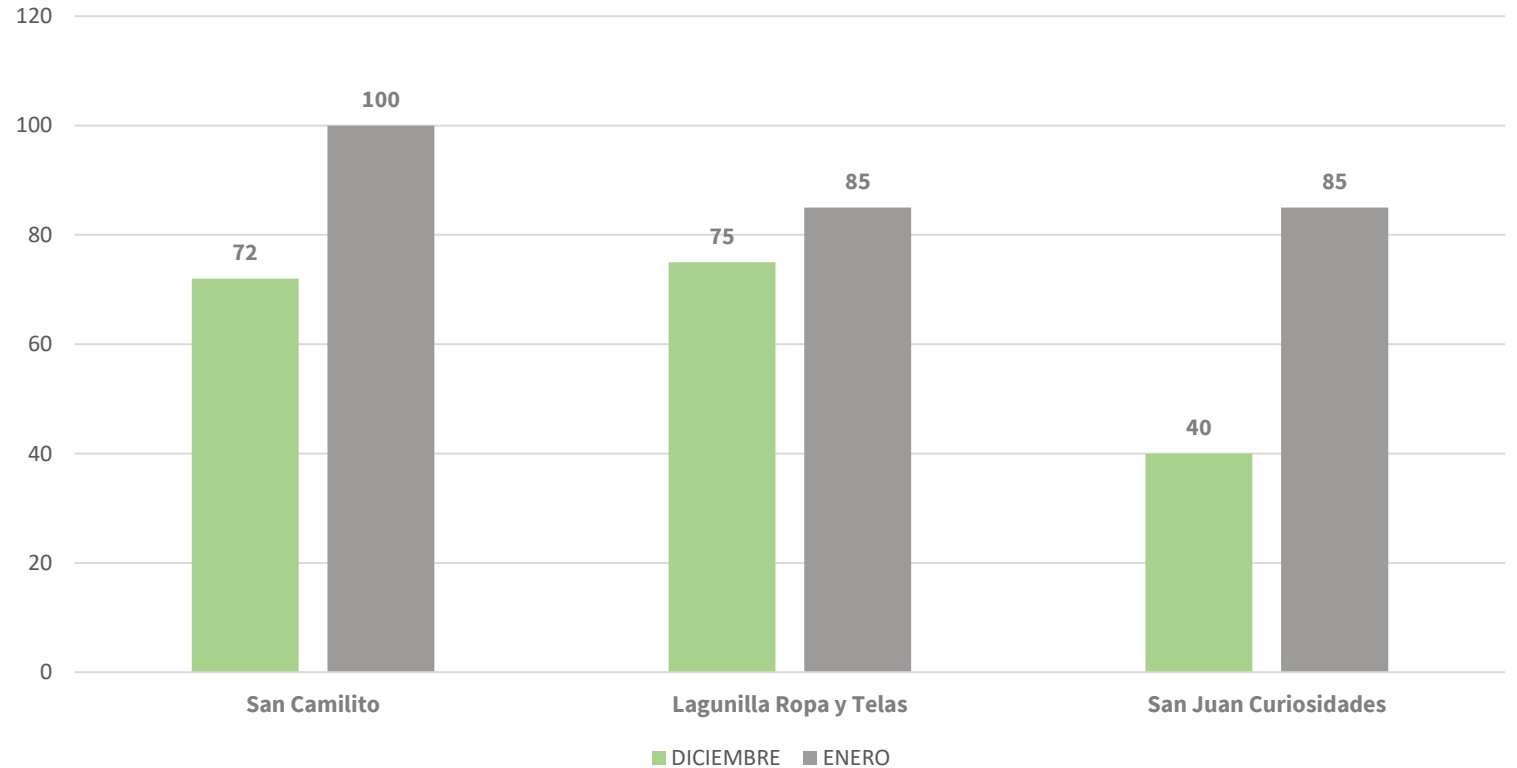

# 100%

de avance físico de obras de rehabilitación del Mercado San Camilito





# SEDECO

## Programa de Supervisión Preventiva y Correctiva de Instalaciones Eléctricas, Gas en Hidrosanitarias de los 329 Mercados Públicos de la Ciudad de México. (Segunda Etapa)

**Segunda etapa:** Inició el 27 de enero y concluirá el 2 de marzo del 2020. Se revisarán otros 50 mercados públicos, estando contemplados del Centro Histórico:

En la Alcaldía Cuauhtémoc: (4 mercados públicos).

En la Alcaldía Venustiano Carranza: (1 mercado público)



# SEDECO

## Programa de Supervisión Preventiva y Correctiva de Instalaciones Eléctricas, Gas en Hidrosanitarias de los 329 Mercados Públicos de la Ciudad de México. (Segunda Etapa)

Estatus al 25 de febrero 2020

Alcaldía	Mercado Público	Fecha programada	Fecha de visita	AVANCE
Cuauhtémoc	San Juan Pugibet	28/01/2020	28/01/2020	80%
Cuauhtémoc	Martínez de la Torre (anexo)	29/01/2020	29/01/2020	
Cuauhtémoc	San Lucas	13/02/2020	13/02/2020	
Cuauhtémoc	Abelardo Rodríguez (zona)	18/02/2020	18/02/2020	
Venustiano Carranza	Merced comidas	27/02/2020		



# SEDECO

## Programa de Supervisión Preventiva y Correctiva de Instalaciones Eléctricas, Gas en Hidrosanitarias de los 329 Mercados Públicos de la Ciudad de México. (Primer Etapa)

Estatus al 25 de febrero 2020

	ALCALDÍA	MERCADO PÚBLICO	OPINIÓN TÉCNICA/SGIRPC
1	Cuauhtémoc	Juárez	Riesgo medio
2	Cuauhtémoc	Lagunilla ropa y telas	Riesgo medio
3	Cuauhtémoc	Lagunilla varios	Riesgo medio
4	Cuauhtémoc	Lagunilla zona	Riesgo alto
5	Cuauhtémoc	Martínez de la Torre (zona)	Riesgo medio
6	Venustiano Carranza	Merced Banquetón	Riesgo alto
7	Venustiano Carranza	Merced Nave Mayor	Riesgo alto
8	Venustiano Carranza	Merced Nave Menor	Riesgo alto
9	Cuauhtémoc	San Juan Arcos de Belén	Riesgo medio
10	Cuauhtémoc	Tepito fierros viejos	Riesgo medio
11	Cuauhtémoc	Tepito ropa y telas (granaditas)	Riesgo medio
12	Cuauhtémoc	Tepito varios	Riesgo alto
13	Cuauhtémoc	Tepito zona	Riesgo medio

De los mercados públicos supervisados durante la 1ra. Etapa, el 12 de febrero del 2020, mediante oficio SEDECO/OSE/122/2020, firmado por el Secretario, se enviaron a las Alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza las OPINIONES TÉCNICAS emitidas por la SGIRPC, con los resultados que se presentan.

# MERCADO LA MERCED

Avances por siniestro de incendio 24 de diciembre 2019  
y obra de reconstrucción



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SEDECO

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



# SEDECO

## Mercado La Merced

### Avances por siniestro de incendio 24 de diciembre de 2019 y obra de reconstrucción

Estatus al 25 de febrero 2020

#### SEGUIMIENTO/SEDECO

Alcaldía	Mercado	NO. Oficial	Tema	Período	Acciones realizadas
Venustiano Carranza	Merced Nave Mayor	101	Incendio del 24 de diciembre de 2019 (puertas de la 8 a la 17)	Del 12 al 24 de febrero del 2020	Por parte de la Alcaldía Venustiano Carranza se encuentra reubicando locatarios afectados en las diferentes ubicaciones de carpas instaladas por SIBISO.  Falta por reubicar 150 locatarios para liberar el área que comprende la puerta 8 a la 17 para colocar tapial.
	Merced Nave Mayor	101	Obra de reconstrucción (puertas de la 17 a la 22)	Del 12 al 24 de febrero del 2020	Se van a reubicar 70 locatarios para liberar una área de losas y poder reconstruir.
	Merced Banquetón	109			

# METROBÚS

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS LÍNEA 3, 4 Y 7 DE METROBÚS.



Rehabilitación de rejillas en cubo de ventilación de “Línea 3” del Metro, ubicadas en carril confinado, sentido de circulación sur-norte de la Estación Hidalgo de Metrobús.



Rehabilitación de revos sobre lateral de Av. paseo de la Reforma, esquina con Lafragua, utilizado por los autobuses de Línea 7 de Metrobús como vía alterna para realizar desvíos.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS LÍNEA 3, 4 Y 7 DE METROBÚS.

REHABILITACIÓN DE REJILLAS EN EL CUBO DE VENTILACIÓN DE LA “LÍNEA 3” DEL METRO, UBICADAS EN CARRIL CONFINADO, SENTIDO DE CIRCULACIÓN SUR-NORTE DE LA ESTACIÓN HIDALGO DE METROBÚS.




REJILLAS	CONCEPTO	AVANCE EN %										AVANCE EN %	
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100		
31	RETIRO DE PLACAS CENTRALES Y ANGULO PERIMETRAL, ASI COMO DEMOLICIÓN PERIMETRAL Y DE DIAFRAGMAS	[Progress bar showing 70% completion]										70%	23%
	HABILITADO DE ACERO ENCAJONADO CON CIMBRA DE MADERA Y COLADO DE DIAFRAGMAS	[Progress bar showing 0% completion]										0%	
	FIJACION DE CONTRAMARCO Y REJILLAS MEDIANTE SOLDADURA.	[Progress bar showing 0% completion]										0%	

# METROBÚS

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS LÍNEA 3, 4 Y 7 DE METROBÚS.

### REHABILITACIÓN DE REVOS SOBRE LA LATERAL DE AVENIDA PASEO DE LA REFORMA.



UBICACIÓN	CONCEPTO	FECHA	AVANCE								% X CONCEPTO	TOTAL	
			10	20	30	40	50	60	70	80			90
Reforma y La Fragua, direccion Campo Marte	Demolición	miércoles, 12/02/20	█	█	█	█	█	█	█	█	█	20	100
	Concreto Fluido	jueves, 13/02/2020	█	█	█	█	█	█	█	█	█	20	
	Armado	jueves, 13/02/2020	█	█	█	█	█	█	█	█	█	20	
	Concreto MR-45	viernes, 14/02/2020	█	█	█	█	█	█	█	█	█	20	
	Limpieza y Liberación	sábado, 15/02/2020	█	█	█	█	█	█	█	█	█	20	





# ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte al 10/02	Reporte al 24/02	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura Tecnológica	Número de puntos de conexión wifi habilitados en postes de C5 (Línea base: 561)	Semanal	515	525	10/03/2020

INCIDENCIAS	AFECTACIONES	PLAN DE ACCIÓN
<b>WIFI OK</b>	<b>525</b>	<b>CONCLUIDOS</b>
Sin Acceso	10	6 SITIOS PROGRAMADOS 12/02/2020 CON SSC
Acompañamiento SSC	4	PROGRAMADO CON SSC 13/02/2020
Canalización Obstruida	3	EN REVISIÓN POR C5
Daño en Router	3	EN REVISIÓN POR C5
Requiere Permiso	1	EN REVISIÓN POR ALCALDÍA Y ACH
Sin Energía	15	EN REVISIÓN POR C5
<b>Total general</b>	<b>561</b>	

¿Cómo saber dónde están?

Ingresa al módulo **WiFi más cercano** en App CDMX



**WiFi más cercano**





**525**  
**POSTES**  
EN EL  
CENTRO  
HISTÓRICO

 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | ADIP

## ¿Cómo funcionan?

---



Funcionan con un radio de cobertura de hasta **50 metros**



Su utilización **no tiene límite de tiempo ni de contenido** y es **totalmente provisto por el Gobierno de la Ciudad**



Velocidad hasta de **20 Mbps**




Hasta **20 personas conectadas simultáneamente** por cada poste




# ADIP

## Puntos de conexión wifi habilitados en postes del C5

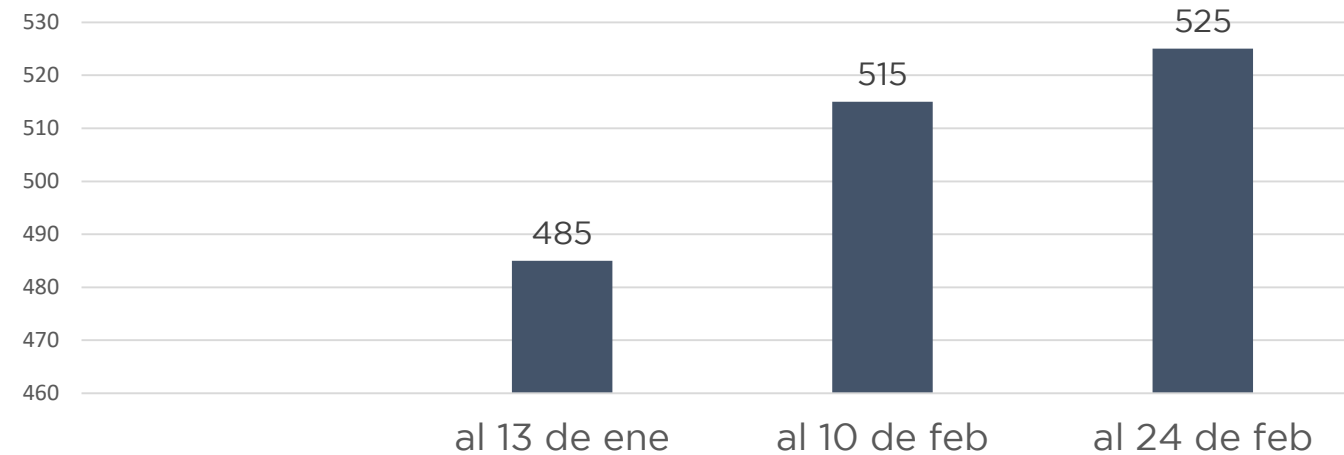

Indicador	Línea base	Periodicidad	Semana del 10 al 24/02	Próximo reporte
No. cámaras con falla o intermitencia			<b>43 cámaras</b>	
Número de cámaras sustituidas del Programa 360	385 cámaras de 77 sitios en los Perímetros A y B		<b>55 cámaras en 11 sitios</b>	
Número de cámaras habilitadas del Programa Sitios nuevos 360	10 cámaras en 2 sitios nuevos	Quincenal	<b>El segundo sitio se reubica queda fuera del CH</b>	10 de marzo
Número de cámaras habilitadas del Programa Mi C911e	Línea base (266 cámaras en 133 sitios)		<b>0</b>	
Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura			<b>5 cámaras en 5 sitios</b>	

## Evaluación - comparativo mensual

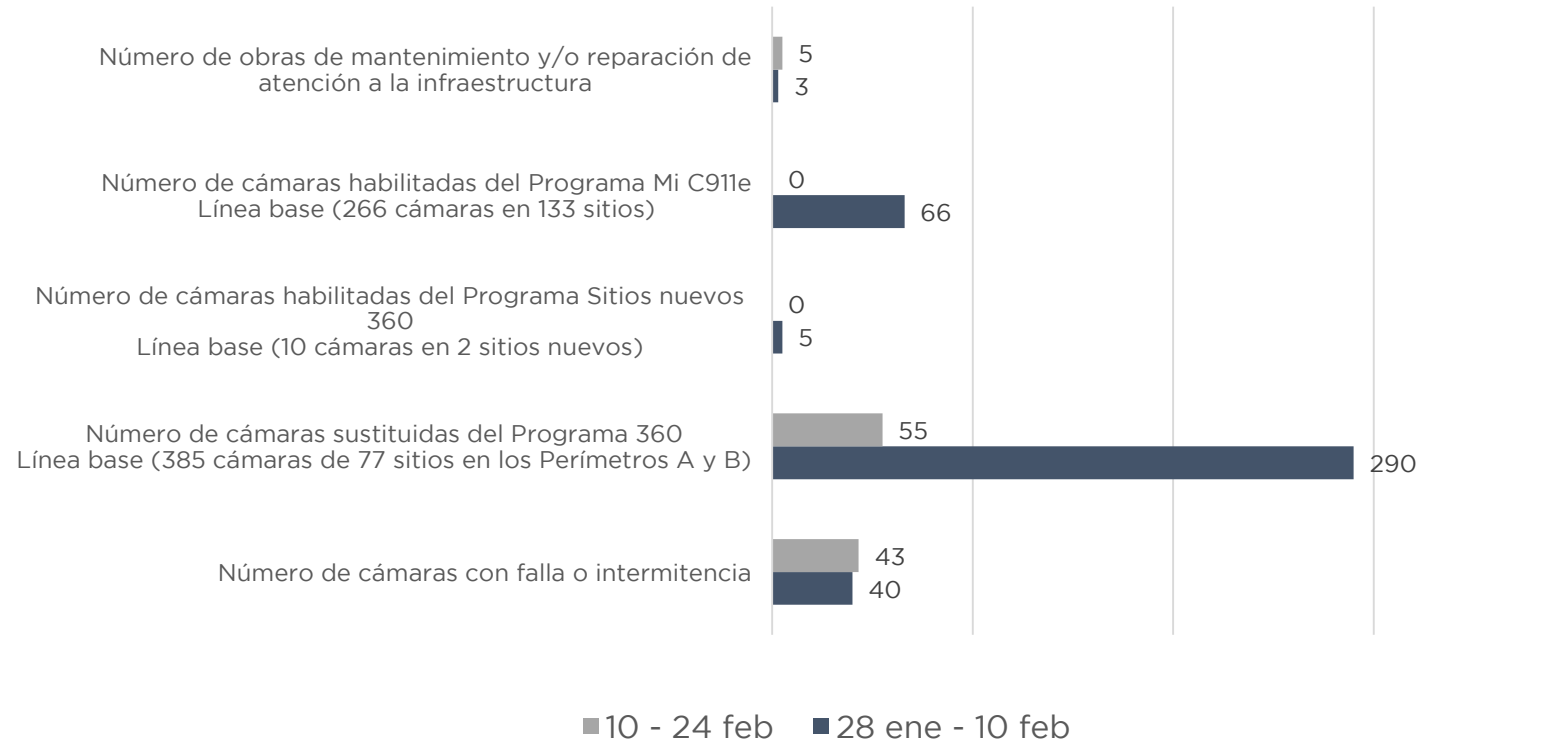

**META CUMPLIDAD**  
cámaras habilitadas del Programa Sitios nuevos 360

# SSC-TRÁNSITO (SEMÁFOROS Y CÁMARAS)

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Del 12 AL 24/02	Próximo reporte
Semáforos	Número de semáforos con mantenimiento preventivo	Quincenal	12	10 de marzo
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo		42	
Cámaras	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		5	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo		9	



# SSC-SCT-DSOT

## CORRECTIVO

ACOMETIDA	1
APAGADO	1
CABLE DE COMUNICACIÓN	3
CINTILANTE	15
CORTO	1
DESCONECTADO	6
DESORIENTADO	3
FOCO FUNDIDO	1
INSTALACION	4
PUERTA ABIERTA	3
REINSTALACION	1
REVISION DE CABLE	1
TARJETA DAÑADA	2


## PREVENTIVO

12

TOTAL GENERAL

54

# MANTENIMIENTO SEMAFORICO

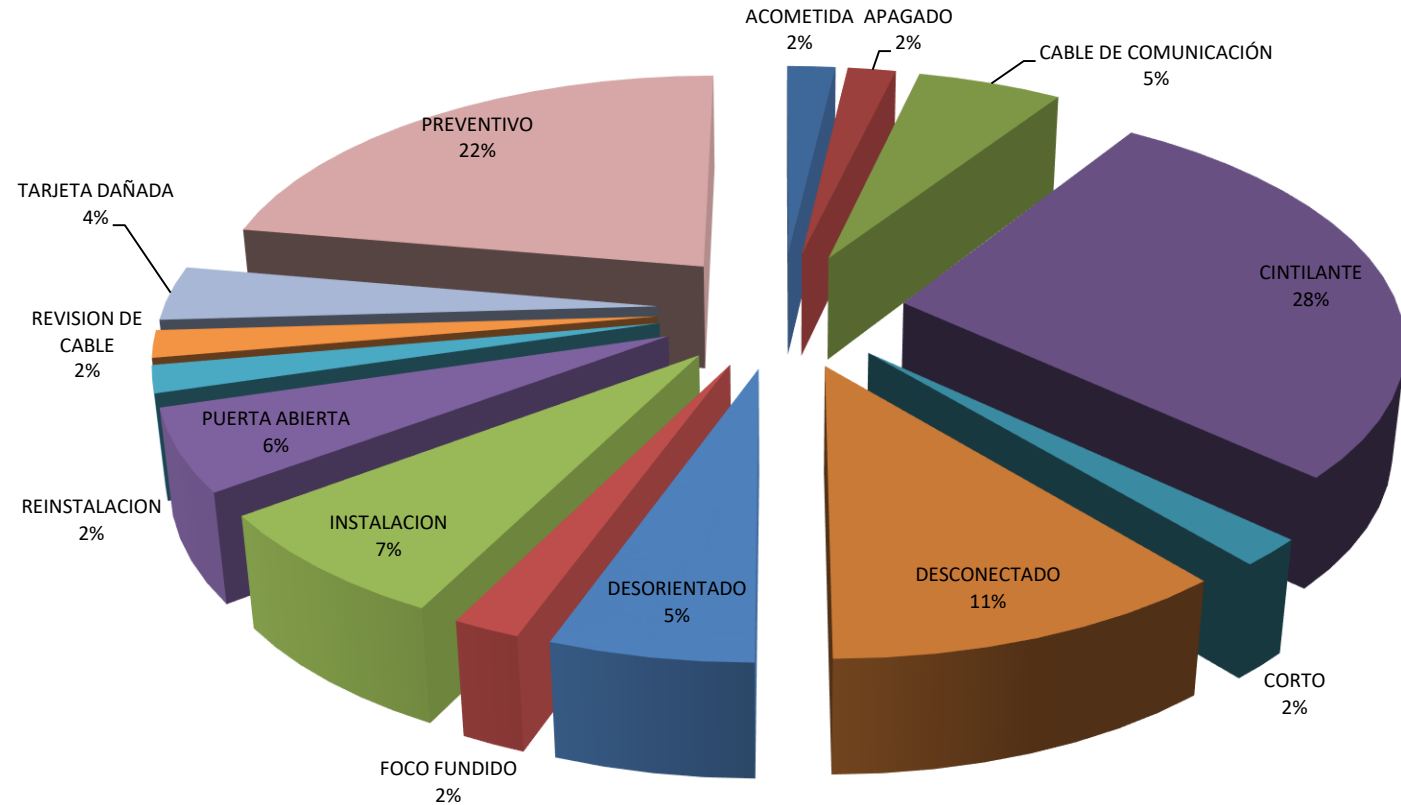




# SSC-SCT-DSOT


CORRECTIVOS	
CORTO	4
SISTEMA SPRIT	3
TIRA DE CONEXIÓN	2
PREVENTIVOS	
	5
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14</b>

## MANTENIMIENTO CAMARAS DE TRANSITO

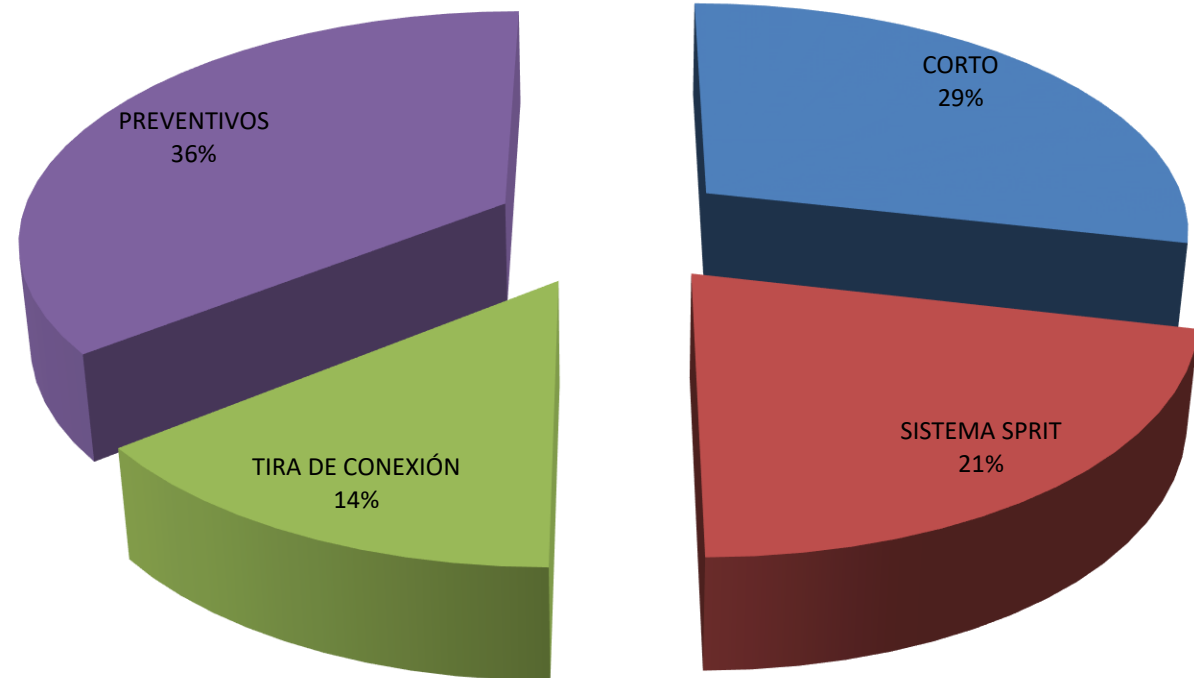



# SSC-TRÁNSITO (SEMÁFOROS Y CÁMARAS)

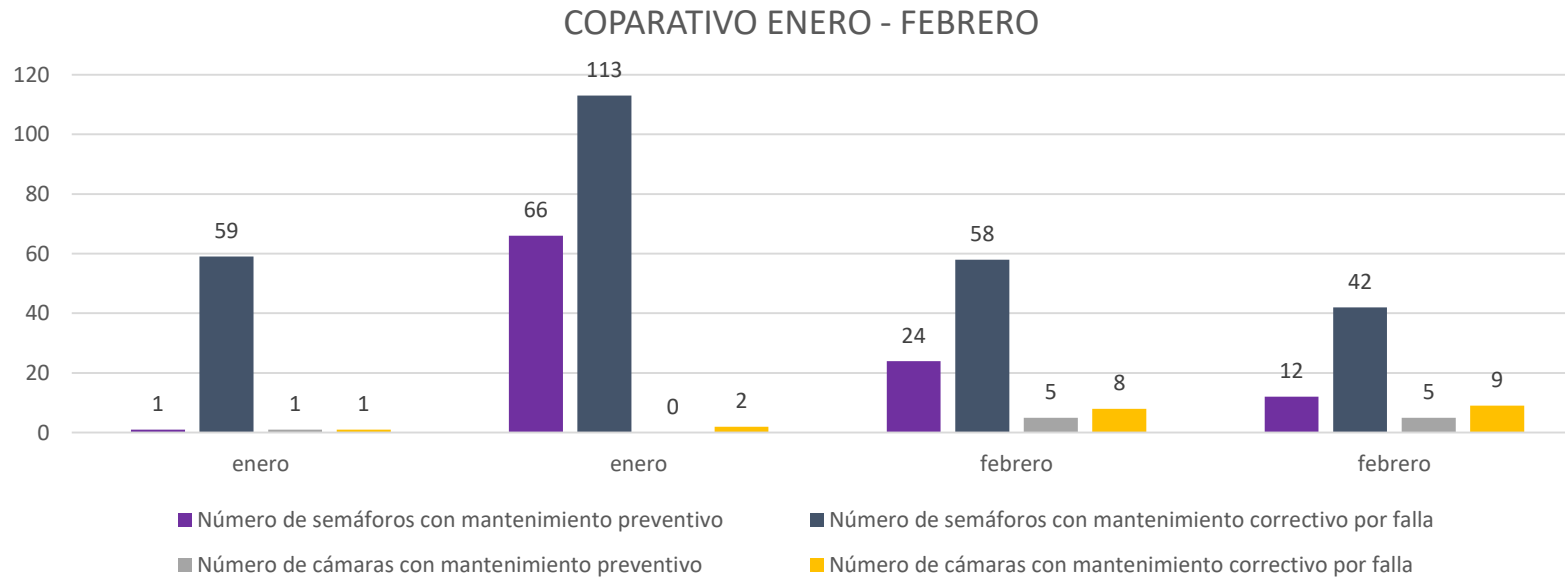



UNIVERSIDAD DE LEÓN  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

**Mesas de trabajo**

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

**\*Transmisión en vivo\***

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

# Mesa de Obras Irregulares

## Informe

Seguimiento a obras irregulares

### 11 obras en seguimiento en febrero de 2020

- República de Perú 122
- República de Bolivia 83
- República de Bolivia 58
- República de Argentina 96
- Motolinia 40
- Tacuba 71
- Magnolia 162
- Colón 1
- Emiliano Zapata 45
- San Pablo 9
- San Jerónimo 70



República de Bolivia 58



Motolinia 40

# Mesa de Obras Irregulares

## Informe

Seguimiento a obras irregulares

### Suspensión de obra de República de Argentina 96 por INAH



#### Estatus técnico actual

- Excedieron los niveles permitidos por el **INAH** por lo que se instrumentó visita de revisión de la obra que no se pudo efectuar ya que no se permitió el acceso, motivo por el cual se impusieron sellos de suspensión de la obra.
- Violaron los sellos de suspensión del **INVEA** y la obra seguía ejecutándose.

# Mesa de Obras Irregulares

## Informe

Seguimiento a obras irregulares

**Se continuará...**

**Protocolo para detener y/o regularizar Irregulares** para coordinar y agilizar la atención institucional a las obras irregulares.

**Seguimiento de las obras irregulares detectadas** por medio de la mesa de trabajo

**Fomento a la denuncia ciudadana**



**PROTEJAMOS EL PATRIMONIO**

REPÚBLICA DE PERÚ 122, TACUBA 71,  
REPÚBLICA DE BOLIVIA 83,  
REPÚBLICA DE ARGENTINA 96, COLÓN 1,  
MOTOLINÍA 40, MAGNOLIA 162 (DEPTOS. 1-5 6),  
SAN PABLO 9, SAN JERÓNIMO 70,  
EMILIANO ZAPATA 45

**¡ALTO!**  
Si observas que estas obras continúan envíanos un mensaje


**REPORTA OBRAS IRREGULARES**  
Por WhastApp 55 4615 2425  
Correo electrónico [ach.obrasirregulares@gmail.com](mailto:ach.obrasirregulares@gmail.com)



# Mesa de Obras Irregulares

## Informe

Prevención a obras irregulares

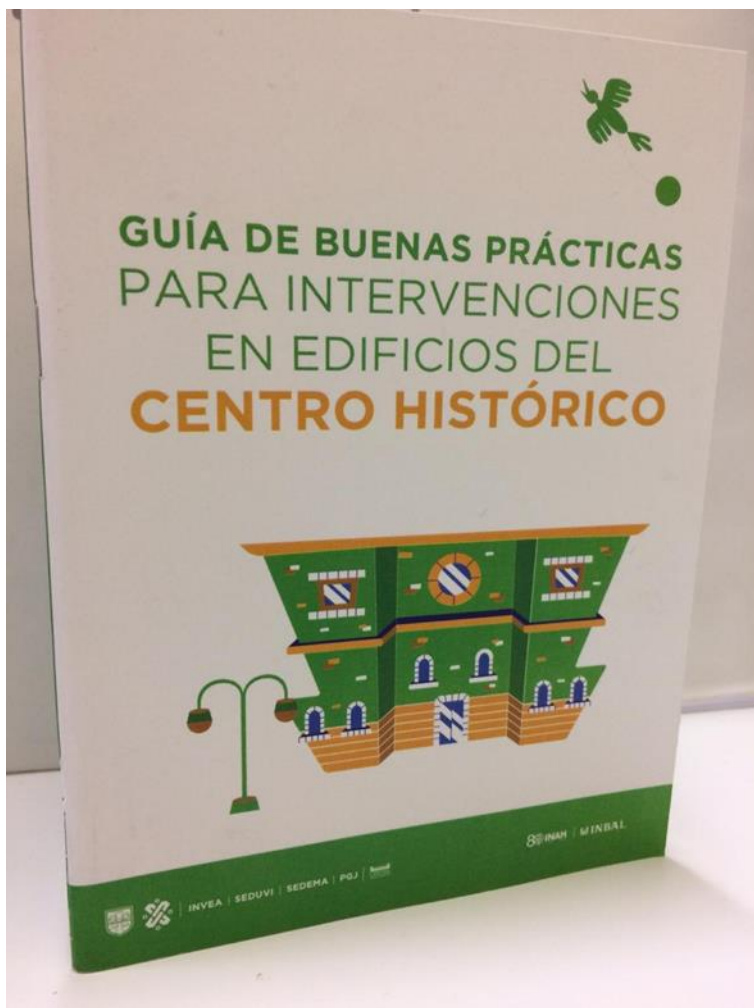

**La Guía de Buenas Prácticas para Intervenciones en Edificios del Centro Histórico** a fin de prevenir el desarrollo de obras irregulares se encuentra en la página oficial de la Autoridad del Centro Histórico

[www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx](http://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx)

Acciones para salvaguardar la infraestructura y seguridad de las personas

### Retiro de Conexiones Eléctricas Irregulares de Infraestructura de CFE



En operativo conjunto realizado de las 22:00 horas del martes 18 a las 02:00 horas del 19 de febrero se retiraron 245 acometidas (conexiones de luz irregulares) en 47 puntos de riesgo del Centro Histórico.

Participaron:

- CFE
- ACH
- SOS - DGSUS
- SG - Subsecretaría de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública
- AI. CUAUHTÉMOC - DGG
- SGIRPC
- TELMEX
- C5
- SSC

# Prevención de Riesgos

## Informe

Acciones para salvaguardar la infraestructura y seguridad de las personas

### Retiro de Conexiones Eléctricas Irregulares de Infraestructura de CFE

**El objetivo es abatir riesgos que afecten la integridad de las personas y promover la regularización de los servicios.**

**Las calles en las que se trabajaron fueron** República de Brasil, República de Costa Rica, República de Venezuela y Del Carmen, en ellas además personal de Teléfonos de México retiró marañas de cables.





### Regularización del Servicio

Se promueve la regularización entre los vecinos, quienes fueron informados a través de carteles los lugares y horarios donde pueden realizar su contratación con la empresa eléctrica y así convivir con instalaciones seguras.

**¿Te quedaste sin luz?**

**La instalación de conexiones irregulares es ilegal**  
Artículo 41 Ley de la Industria Eléctrica (140 y 151 del Reglamento)  
Artículo 368 Código Penal Federal

Su instalación genera puntos de riesgo que pueden provocar fallas en el suministro eléctrico, cortos circuitos y siniestros

**Acude a los siguientes centros de atención y presenta la documentación requerida para realizar tu contrato o comunícate al 071**

Centro de atención a clientes Condesa  
Av. Sonora 47, Roma Norte

Centro de atención a clientes Vértiz  
Av. Vértiz 312, Doctores

Centro de atención a clientes Centro Histórico  
Venustiano Carranza 24, Centro

**Regularízate**

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS NUESTRA CASA

**¿Te quedaste sin luz?**

**La instalación de conexiones irregulares es ilegal**  
Artículo 41 Ley de la Industria Eléctrica (140 y 151 del Reglamento)  
Artículo 368 Código Penal Federal

Su instalación genera puntos de riesgo que pueden provocar fallas en el suministro eléctrico, cortos circuitos y siniestros

**Acude a los siguientes Centros de Atención y presenta la documentación requerida para realizar tu contrato o comunícate al 071**

Centro de atención a clientes Condesa  
Av. Sonora 47, Roma Norte

Centro de atención a clientes Vértiz  
Av. Vértiz 312, Doctores

Centro de atención a clientes Centro Histórico  
Venustiano Carranza 24, Centro

**Regularízate**

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS NUESTRA CASA



UNIVERSIDAD DE LEÓN  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

**Acuerdos**

**Asistencia**

**\*Se reanuda  
transmisión en vivo\***

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



UNIVERSIDAD DE LEÓN  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# PRÓXIMA SESIÓN

10 de marzo de 2020

## A las 10:30 horas

**\*Transmisión en vivo\***

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”
