



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Evaluación enero - diciembre 2019

Inicio de la transmisión en vivo
31 de diciembre de 2019



Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo



ACH

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 16/12	Semana al 30/12	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Semanal	1,205 m3	1,274 m3	07 de enero
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Semanal	2,670 m3	2,829 m3	07 de enero
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Semanal	30	47	07 de enero



ACH | Eliminación de grafiti

883

m² totales

*La mayoría son reincidencias

- calles atendidas **37**
- cortinas metálicas **56**
- fachadas **34**





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CENTRO
HISTÓRICO

Eliminación de grafiti en cantera

**Se retiraron 28 m2 de grafiti sobre cantera esta semana
En Regina de Pino Suárez a Misioneros**

Se han limpiado
1,571 m²

Se trabajo en
inmuebles que no
son catalogados con
gel desincrustante.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y
PATRIMONIO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en:

Motolinia
República de Brasil
Tlalpan
Parque de Bolsillo
Tacuba
5 de Febrero

Los trabajos realizados consistieron en **renivelación de dos piezas de dren y un registro** en Motolinia, **reparación de guarnición** en Bolívar, **colocación de 2 bolardos**, **reparación de dos tapas de registro**, **reparación de 2 tramos de banquetta y pintura de 22 bolardos** en Belisario Domínguez y República de Brasil, **retiro de 2 caminadoras elípticas**, **colocación de 2 bancas y un montable y reparación de piso** en Parque de Bolsillo **demolición de muro de concreto armado**, **forjado de escalón y emboquillado de dos muretes** en Tlalpan (Plaza Pino Suárez), **reparación de 3 tramos de piso estampado en arroyo vehicular** en 5 de Febrero entre Venustiano Carranza y Mesones.





ACH | ene - dic


Acciones de limpieza ACH

116, 781 m³

Basura recolectada por barrido en perímetro ACH

63, 928m³

Residuos sólidos levantados de tiraderos clandestinos del perímetro ACH

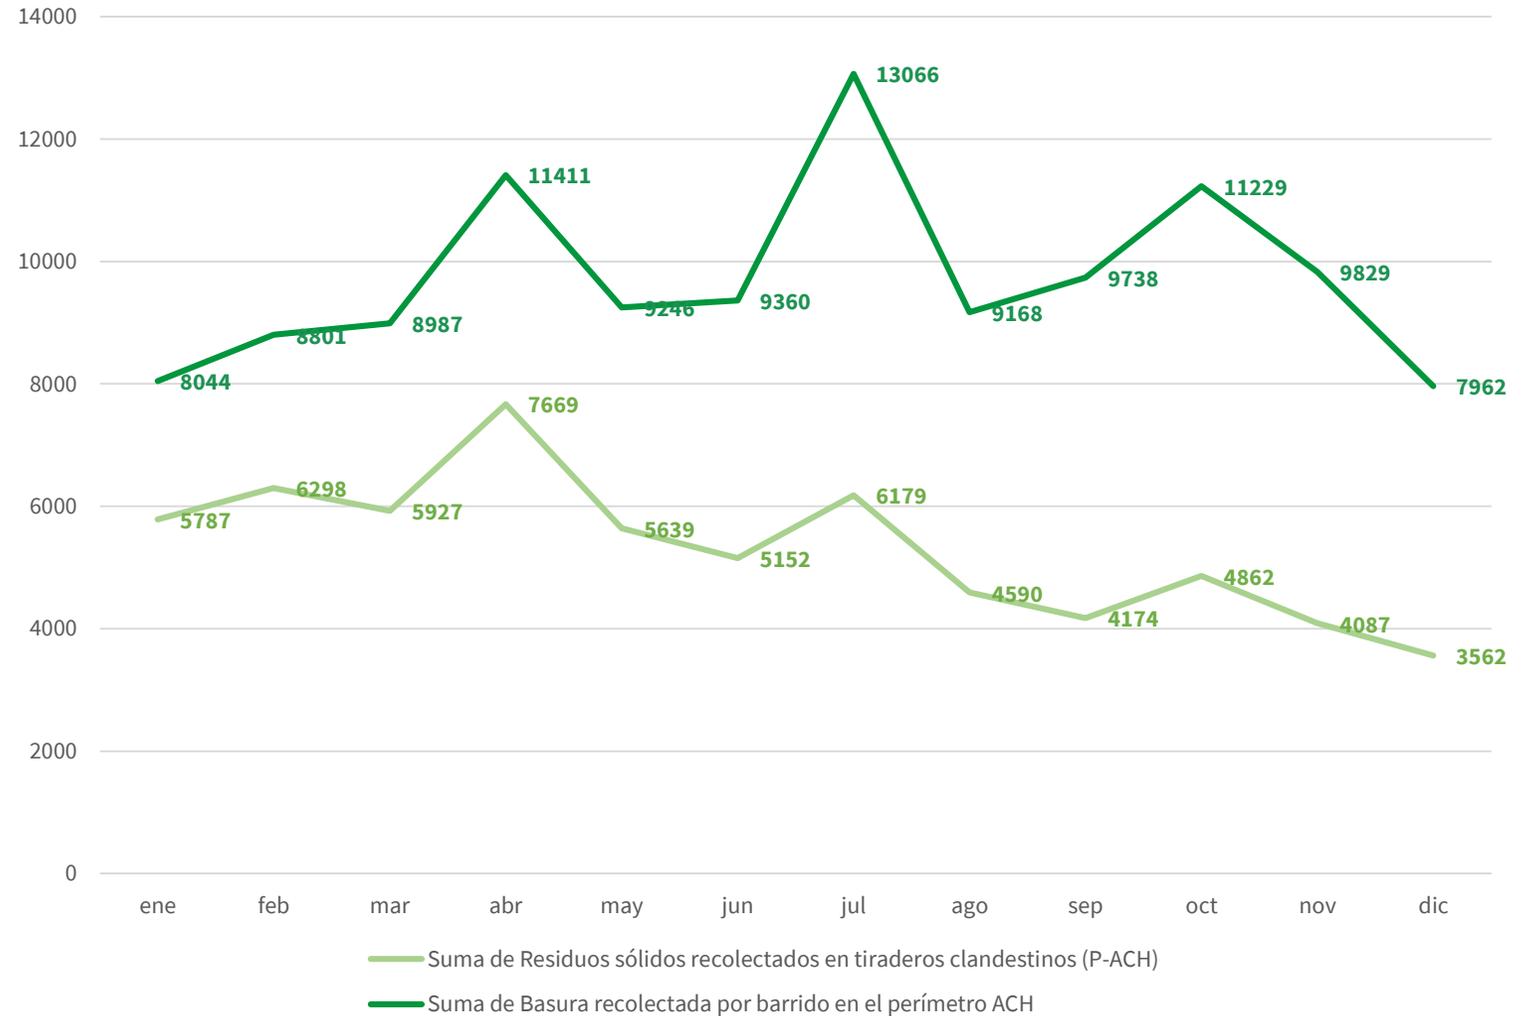




ACH | ene - dic

Incidencias atendidas

1,305

Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas*

(*) de una meta de 2,190 incidencias, representando un avance del 59%

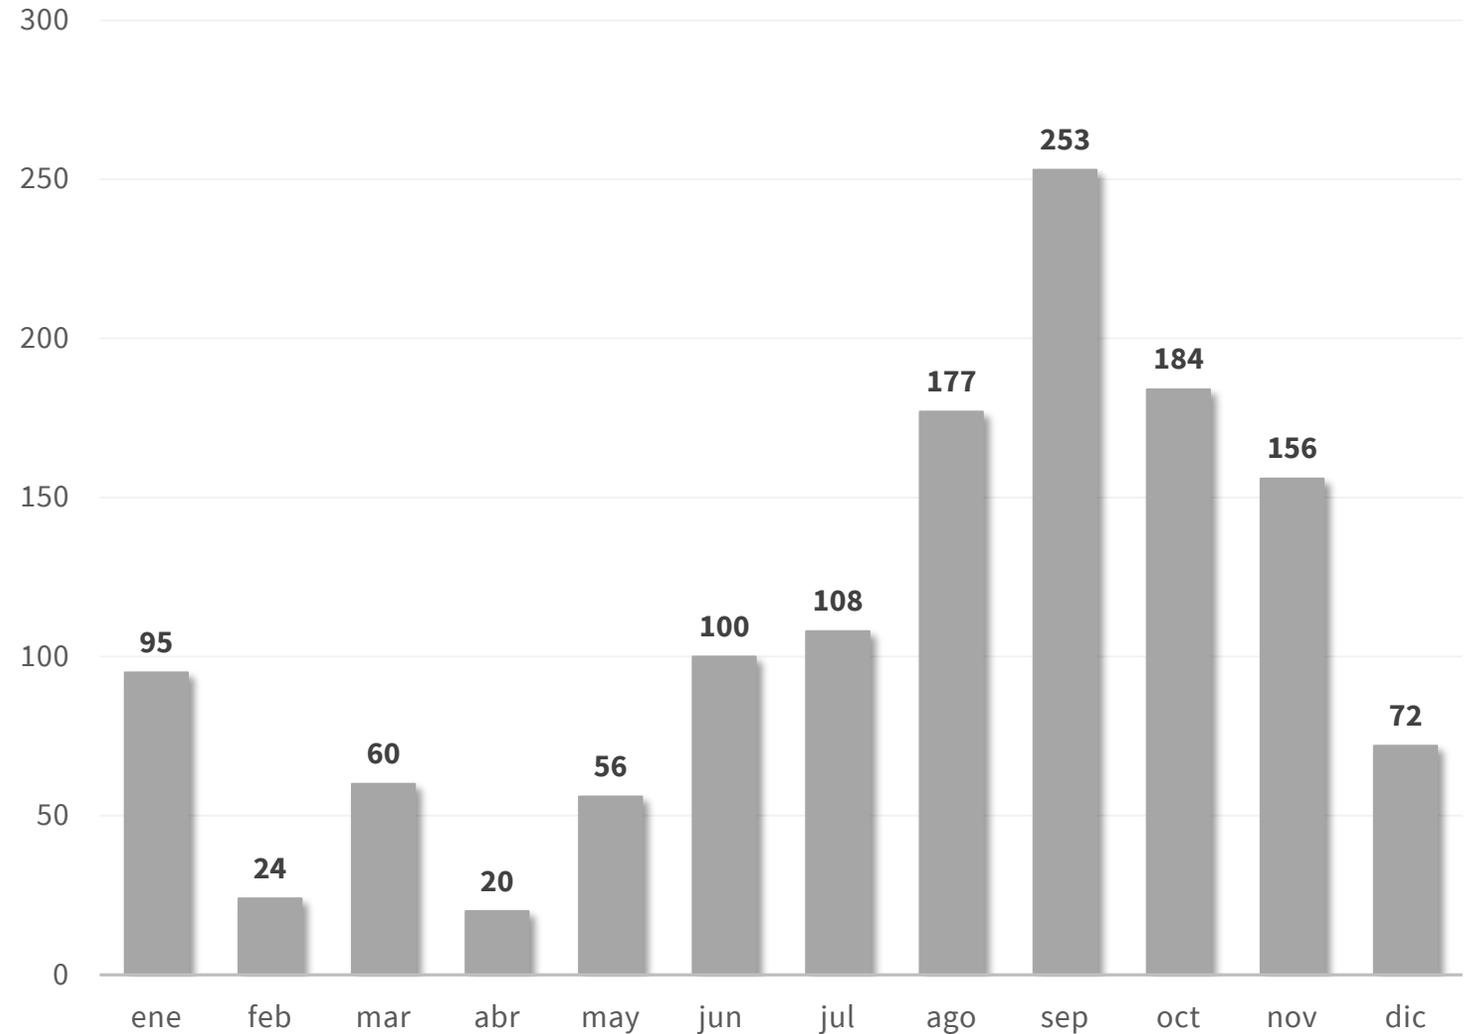



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ACH | feb - dic


Eliminación de grafiti

55,453 m²

De cortinas limpias

25,757 m²

De fachadas limpias

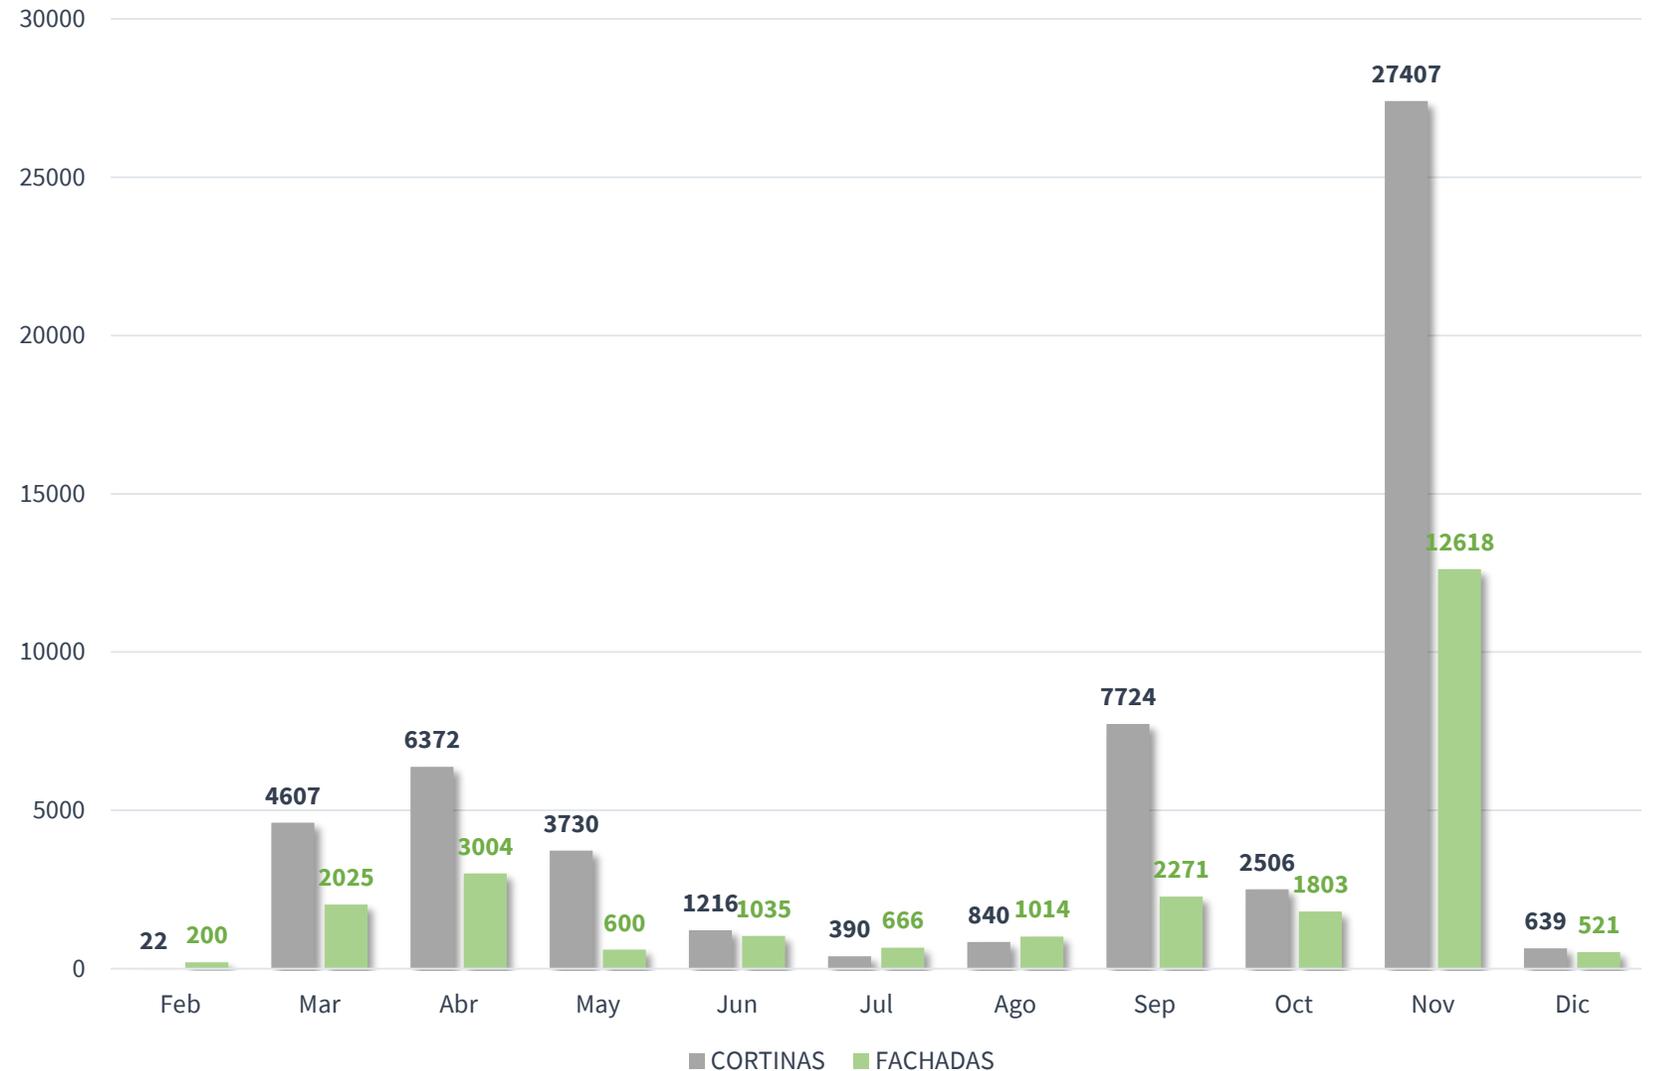



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ACH | feb - dic

Eliminación de grafiti

817 m²


De antigrafiti utilizado

2,836 m²

De thinner utilizado

3,503 m²

De gel utilizado

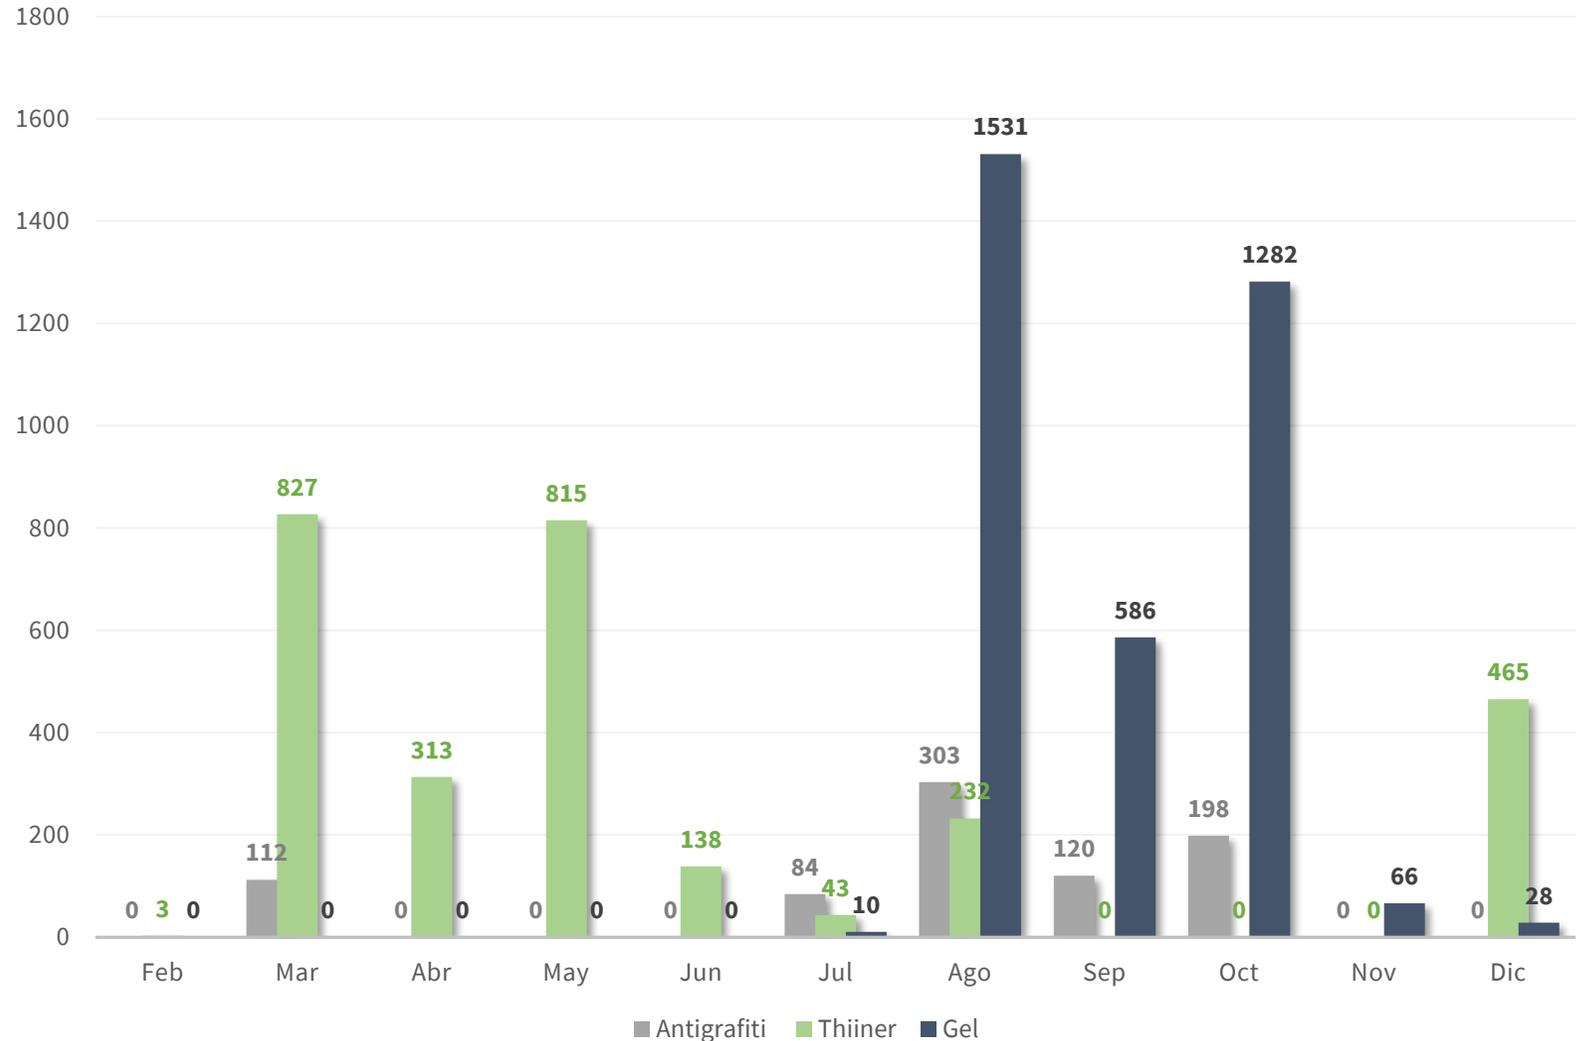



Alc. Cuauhtémoc

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 23/12	Semana al 30/12	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias en PB de Cuauhtémoc	Quincenal	15	12		Se realizó la revisión a 27 luminarias
Poda	Número de sujetos forestales podados	Quincenal	6	0		Se realizó la poda a 06 sujetos forestales liberando 6 cámaras



Alc. Cuauhtémoc

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 22/12	Semana al 30/12	Próximo reporte	Observaciones
Desazolve	Red de drenaje desazolvada en PB de Cuauhtémoc (m lineales)	Quincenal	30	18		Se realizó el desazolve de 48 metros lineales.
Limpia (Colecta de solidos)	Escuelas limpias y toque de campana	Quincenal	245	145		Se recolectaron 390 m3 de residuos sólidos (35 m3 de residuos orgánicos y 355 m3 de inorgánicos)
	Reparación de banquetas	Quincenal	8m2	2m2		Se realizaron 10m2



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Al. Cuauhtémoc | ene - dic


3,196

Reparaciones de luminarias

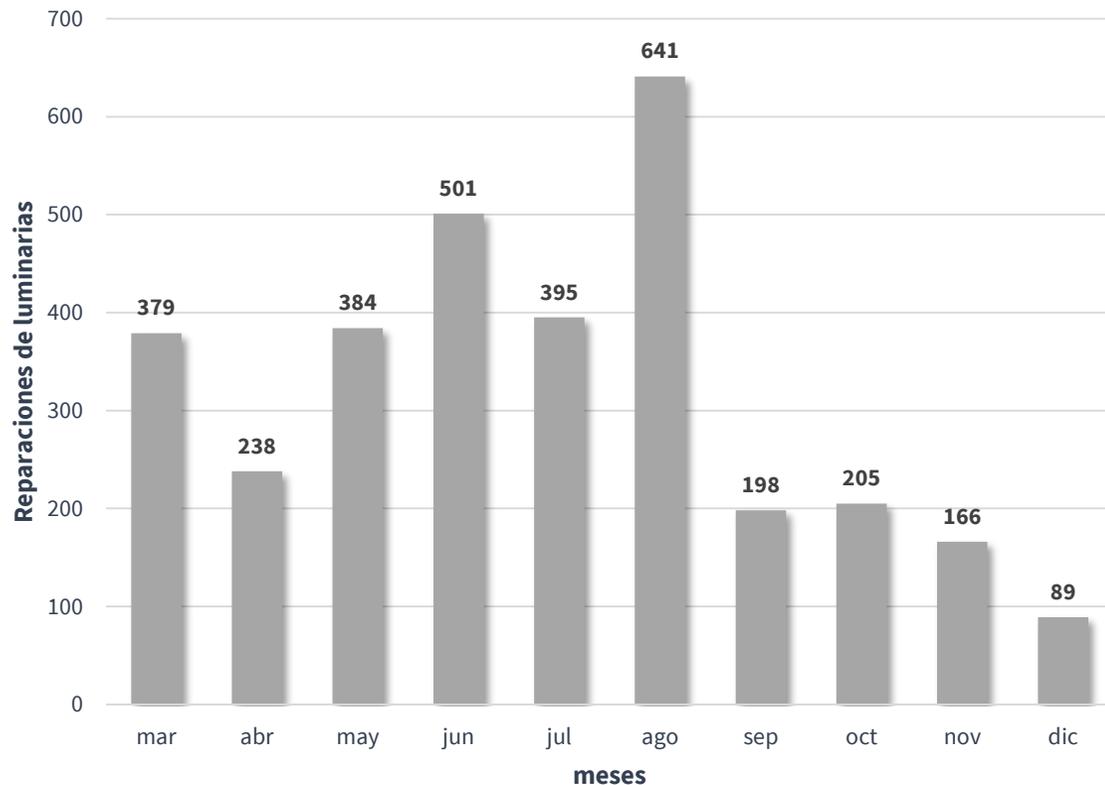

810

Sujetos forestales podados

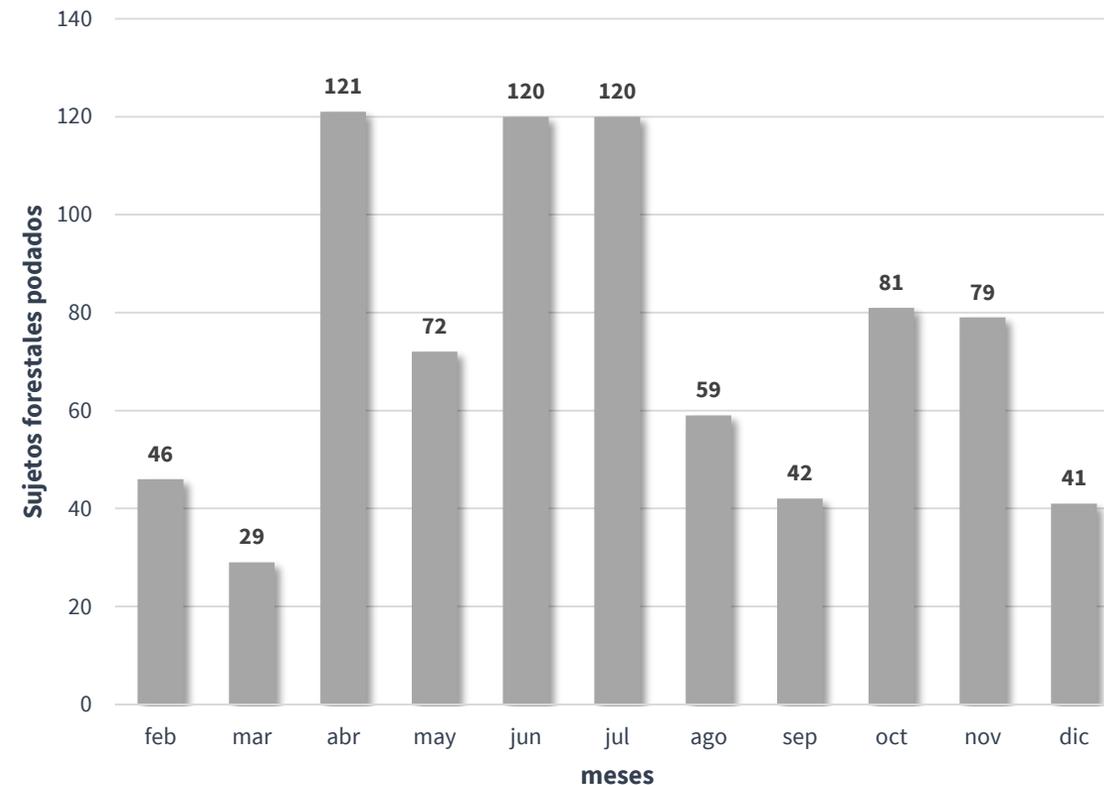




Al. Cuauhtémoc | ene - dic


6,025 m

Drenaje Desazolvado

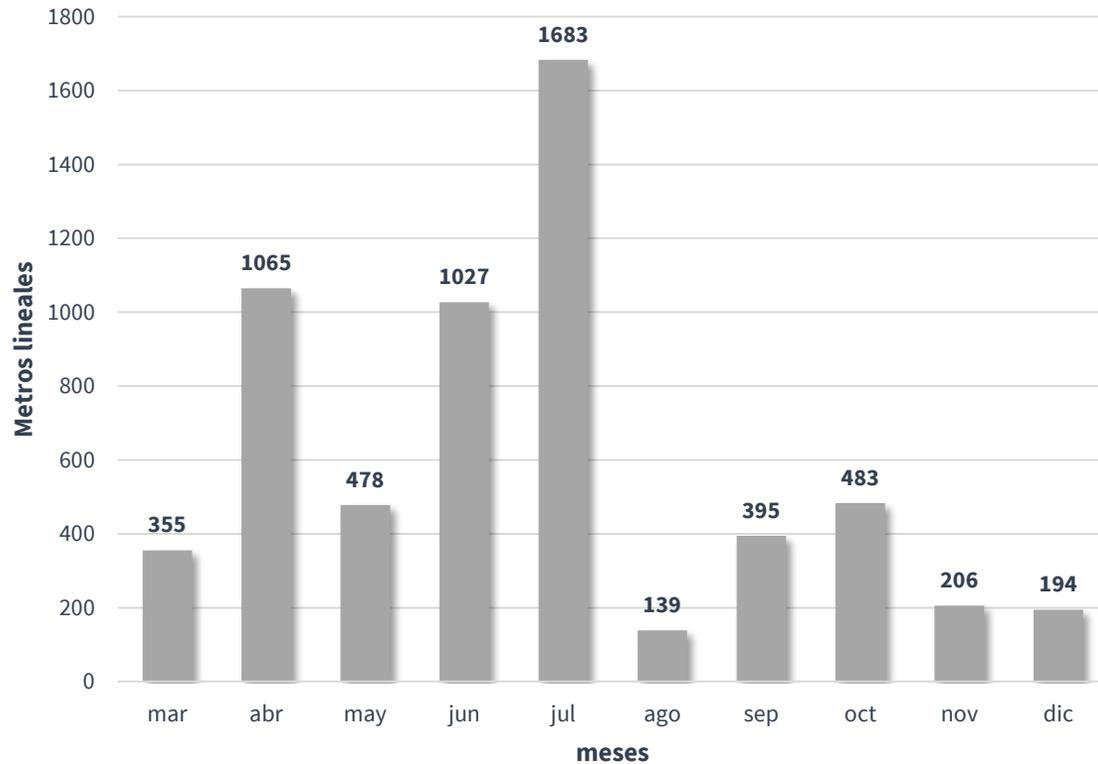

9,609 m³

Residuos Sólidos Recolectados

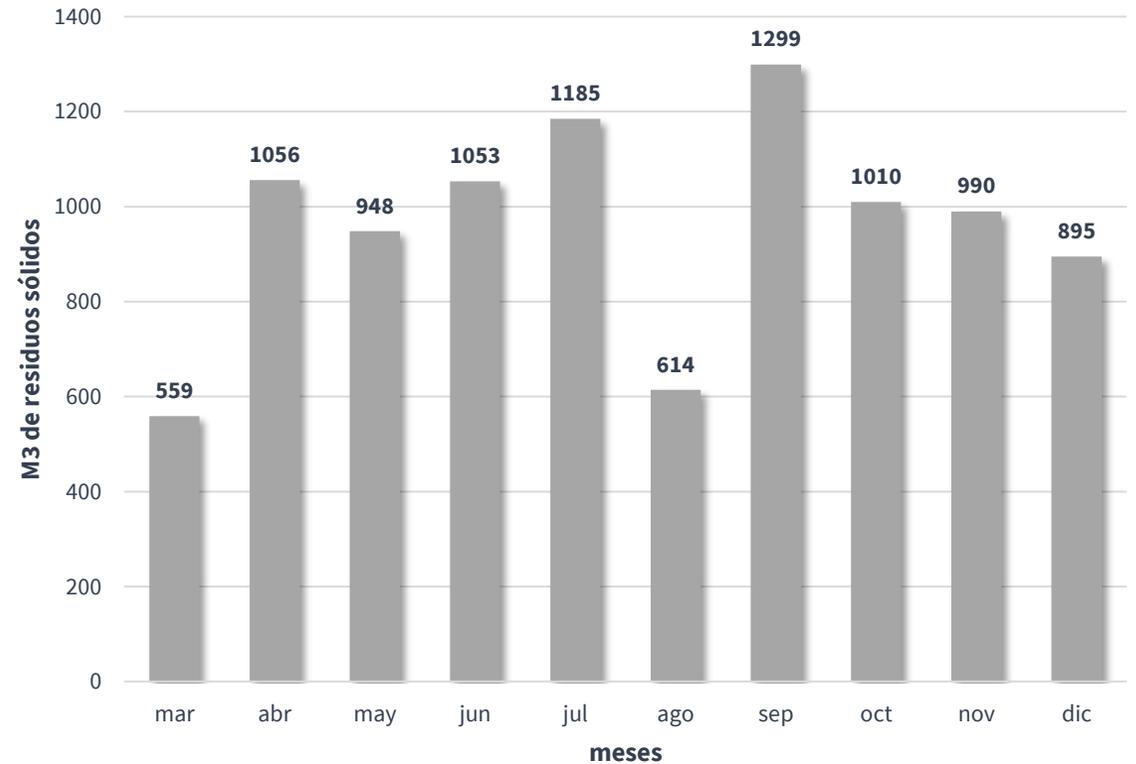




Al. V. Carraza | ene - dic


1,040


Reparaciones de luminarias

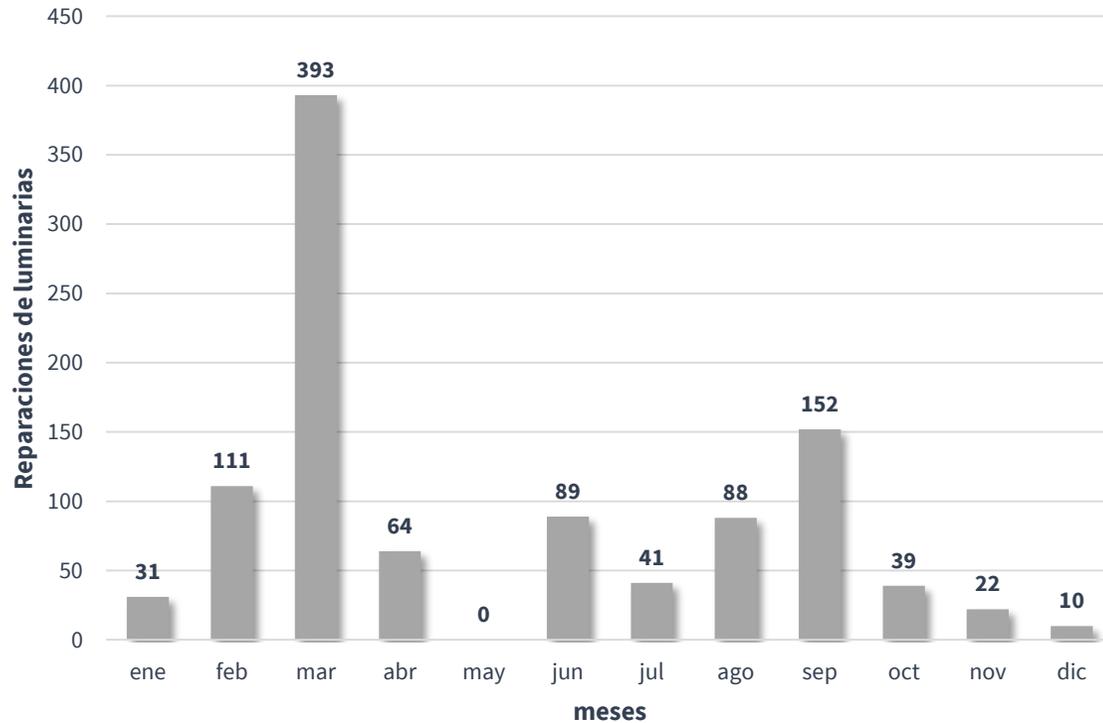

19,861.09 m³

Residuos sólidos recolectados

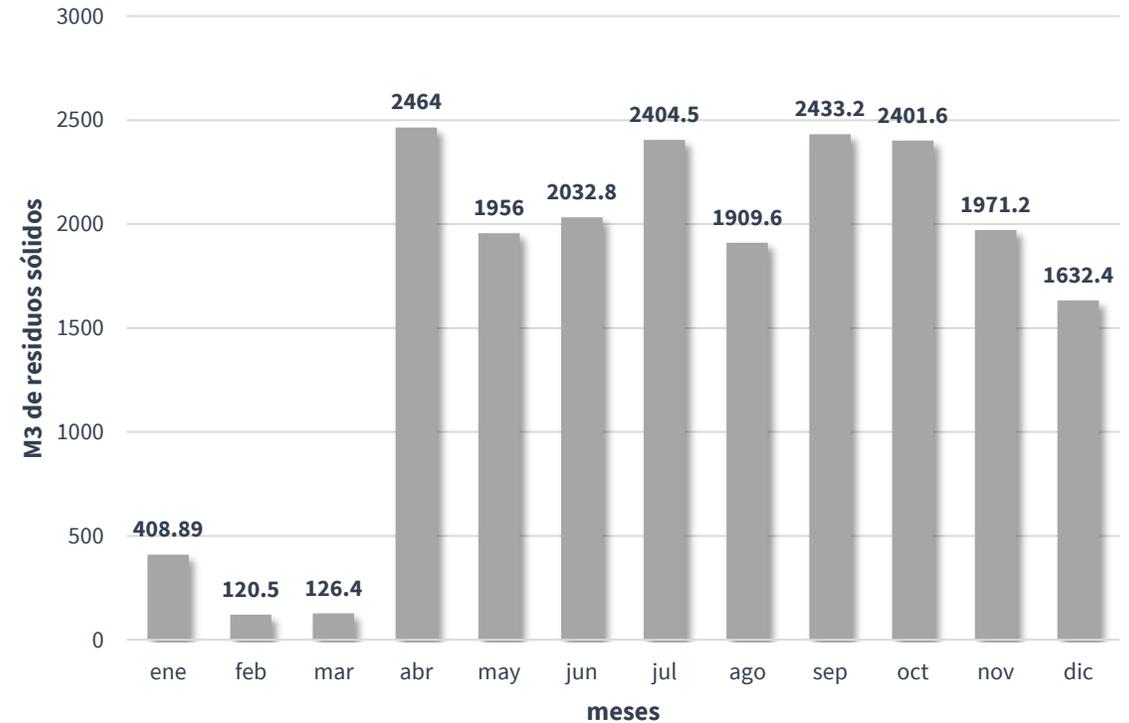



Trabajos de Intervención en Av. Hidalgo y Eje Central Lázaro Cárdenas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Sustitución de la Red de Agua Potable

Av. Hidalgo.



Avance físico programado global: 100.00%
 Avance físico real global: 100.00%

Fecha de inicio
24 Octubre 2019
Fecha de termino:
 De Eje Central a 2 de Abril: **20 de Nov 2019**
 De Valerio Trujano a Reforma: **18 de Dic 2019**

- Tubería Existente — — 370.00 m.
- Tubería Instalada — — 370.00 m
- Cajas y conexiones pendientes
- conexiones realizadas

Sustitución de la Red de Drenaje

Av. Hidalgo y Eje Central



Avance físico programado global: 100.00%
 Avance físico real global: 100.00%

Fecha de inicio
24 Octubre 2019
Fecha de termino
 De Eje Central a 2 de Abril: **20 de Nov 2019**
 De Valerio Trujano a Reforma: **7 de Dic 2019**
 De Valerio Trujano a 2 de abril: **7 de Dic 2019**

Tubería Existente		526.00 m.
Tubería Instalada		526.00 m.
Eje Central Ø 30 = 156.00		
Av. Hidalgo Ø 30 = 170.00		
Av. Hidalgo Ø 38 = 200.00		






Sacmex | oct - dic

Porcentaje de avance de obra acumulado

100.00%

Sustitución de infraestructura de agua potable y de drenaje

Av. Hidalgo y Eje Central





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Sacmex | ene - dic

Metraje de red secundaria de drenaje desazolvada

323,147 m
Atarjeas desazolvadas

27,669 m
Albañal desazolvado

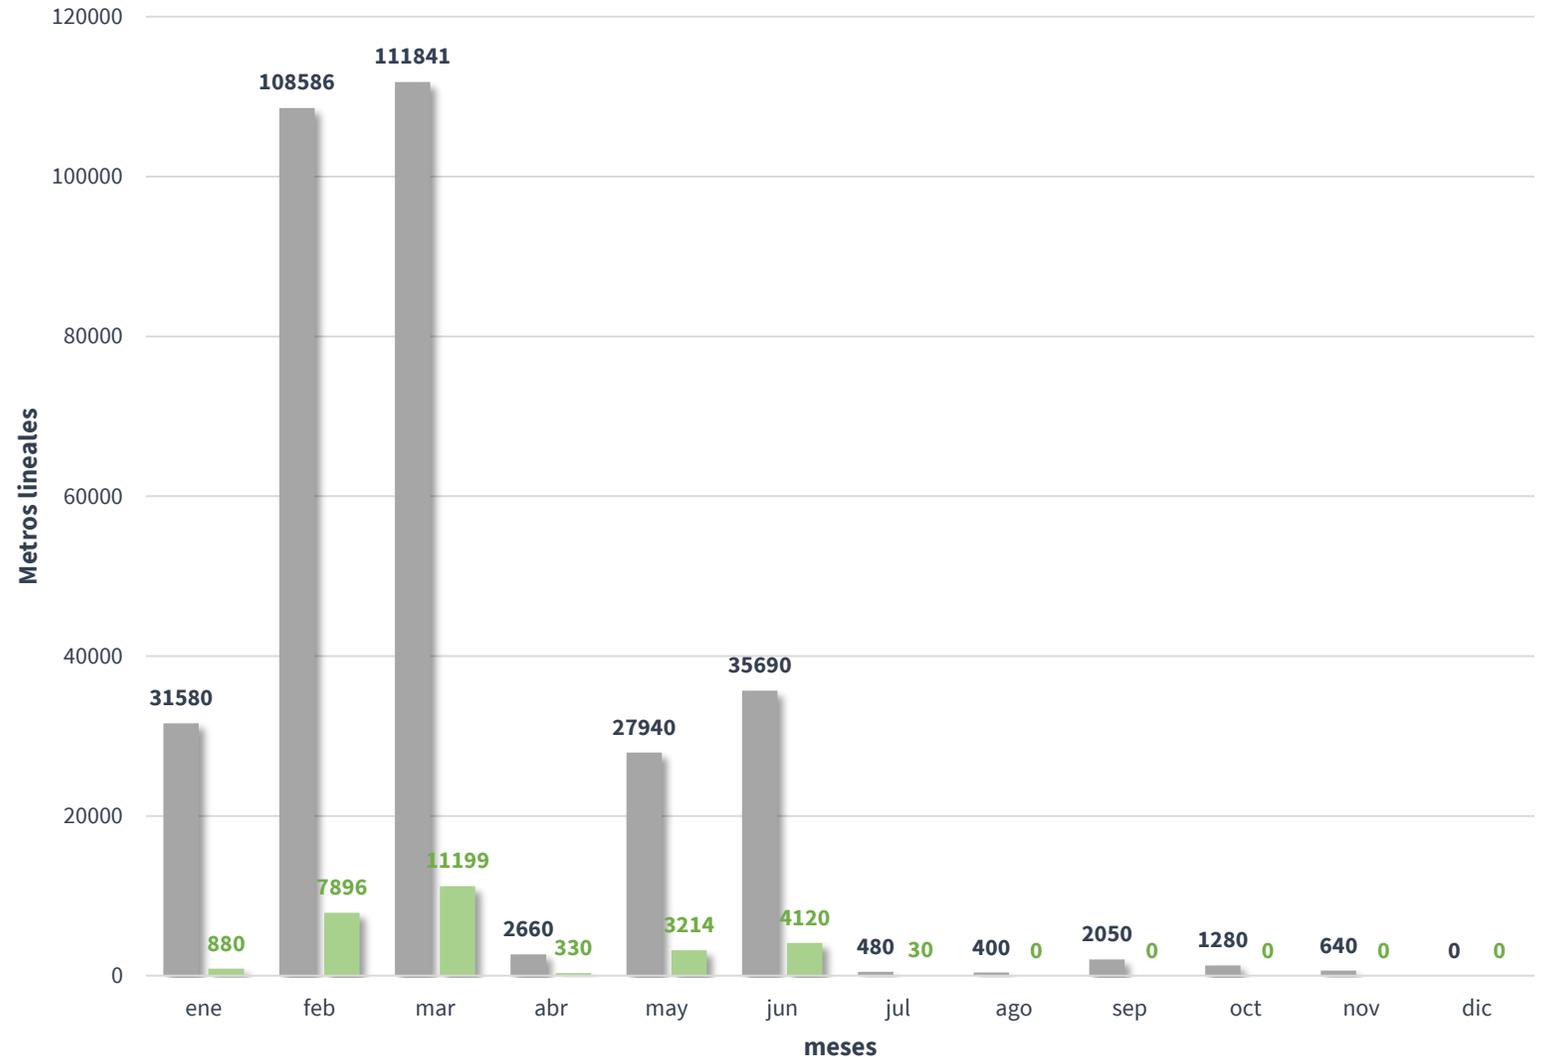




Sacmex | ene - dic


7,710

Coladeras pluviales

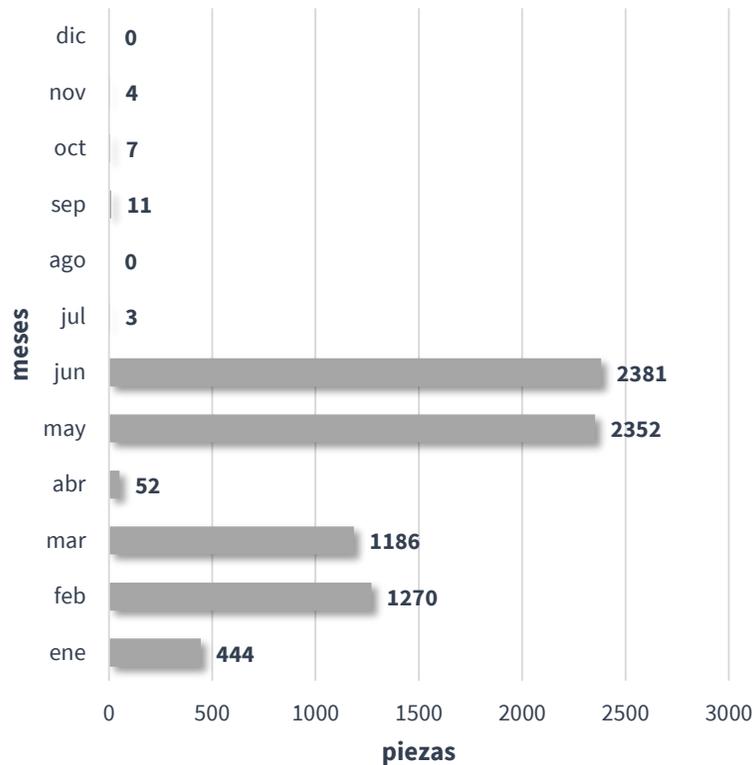


3,932

Rejillas de piso

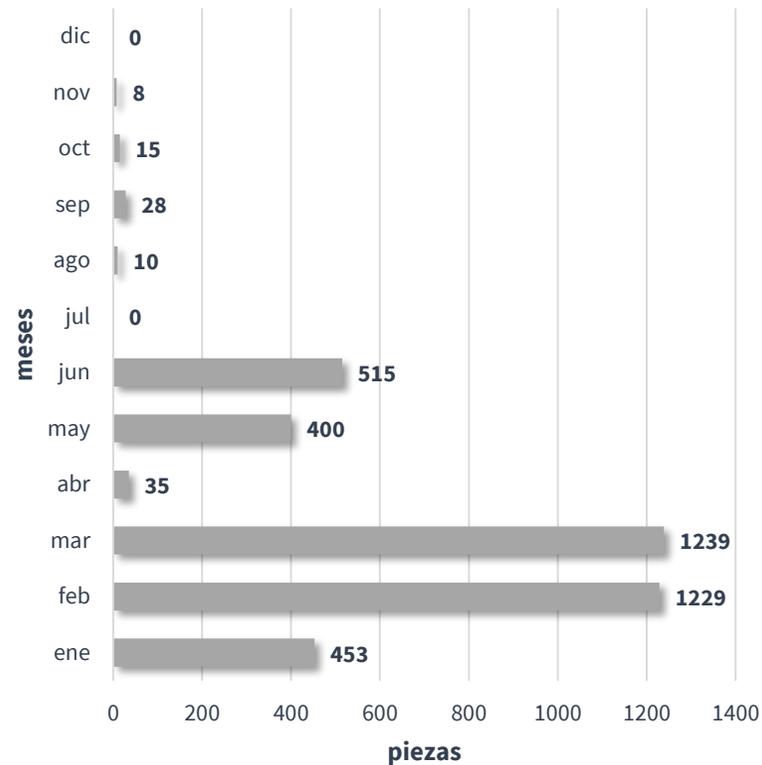

6,147

Pozos de visita

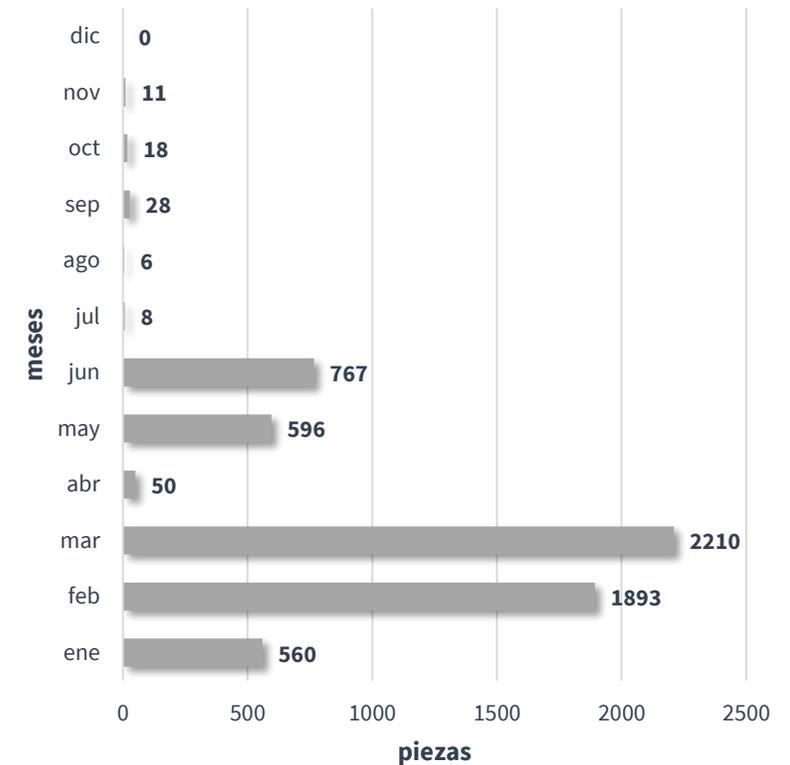

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

2019




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS



VIOLETA, GALEANA Y RIVA PALACIO



- **Calle Violeta avance de obra 88%**
Colocación de precolado y recinto,
Colocación de luminarias
Colocación de tierra vegetal en jardineras
Detalles
- **Calle Riva Palacio Sur avance de obra 96%**
Colocación de luminarias
Detalles
- **Calle Riva Palacio Norte avance de obra 60%**
Colocación de recinto y precolados
Detalles
- **Calle Galeana Norte avance del 63%**
Colocación de recinto y precolado,
Detalles
- **Calle Galeana Sur avance del 55%**
Colocación de recinto
Colocación de luminarias
Colocación de bolardos
Detalles



VIOLETA, GALEANA Y RIVA PALACIO



Colocación de bolardos Violeta



Avance de obra Galeana Norte



Preparación de Jardineras Violeta




Avance de obra Galeana Sur



Jardineras Galeana Norte



ANTIGUO BARRIO SAN PABLO DE ZOQUIAPAN



- **Calle Soledad avance de obra 90%**
Colocación de recinto en banquetas
Colocación de luminarias
Colado de MR-45 en cruce con Correo Mayor
Detalles



- **Callejón de Lecheras avance de obra 99.5%**
Detalles



- **Calle de la Santísima avance de obra 40%**
Colocación de mármol



- **Leona Vicario avance de obra 55%**
Colado de MR-45
Colado de guarnición
Colado de fluido en arroyo vehicular y banquetas
- **Emiliano Zapata avance de obra 0%**
Sin Intervención




ANTIGUO BARRIO SAN PABLO DE ZOQUIAPAN



Colado de MR45 Soledad y Correo Mayor




Canalización para luminarias

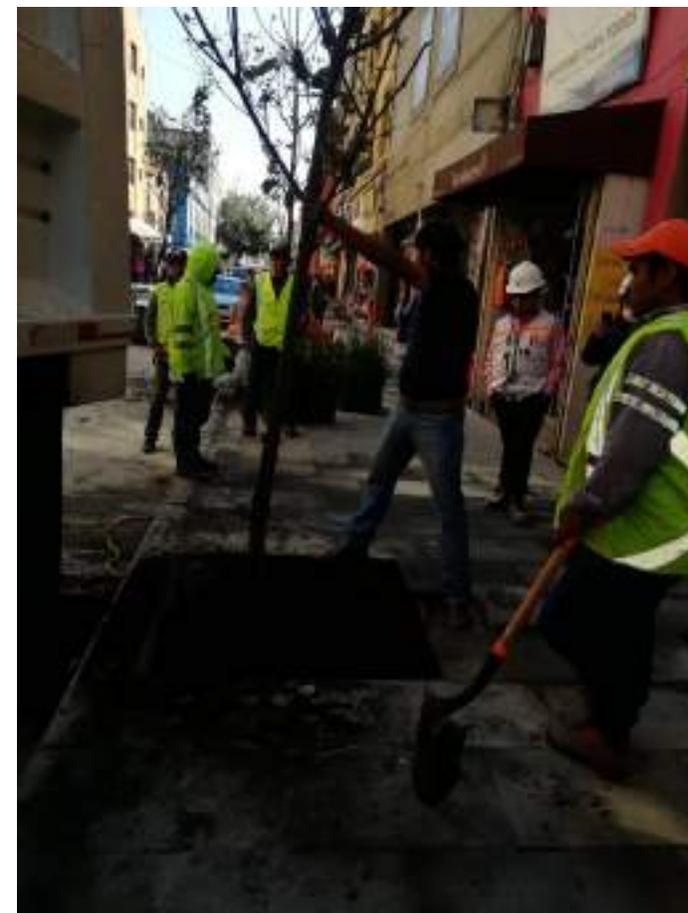


Colocación de vegetación




PLAZA LORETO, JARDIN DEL OBISPO Y VALERIO TRUJANO

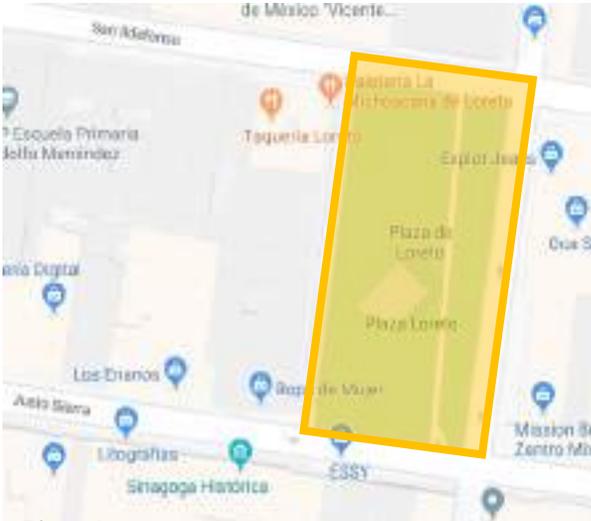

Plaza Loreto

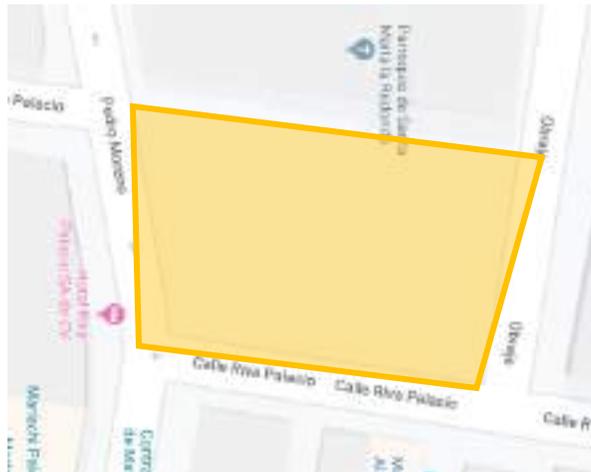

Jardín del Obispo

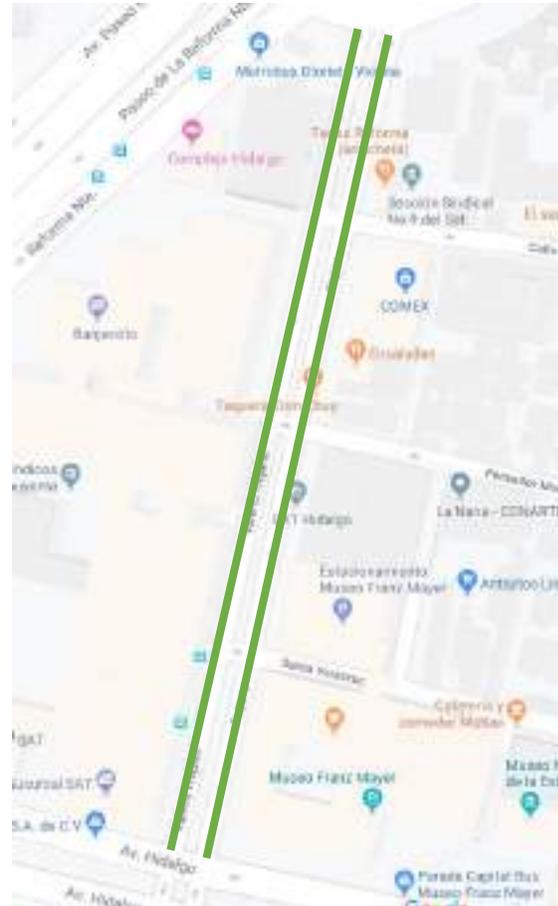

Calle Valerio Trujano



- **Calle Valerio Trujano Oriente avance de obra 94%**

Movimiento de postes para reubicación
Detalles

- **Calle Valerio Trujano acera Poniente avance de obra 80%**

Colado de MR45 en vialidad
Colocación de recinto

- **Calle Valerio Trujano Camellón.**

Preparación de Jardineras para recibir tierra vegetal



- **Plaza Loreto avance de obra 27%**

Fabricación de tapas metálicas para registros de CFE de distintas medidas
Fabricación de bases trapezoidales para postes de luminarias
Colocación de recinto

- **Jardín del Obispo avance de obra 55%**

Colocación de acabados



PLAZA LORETO, JARDÍN DEL OBISPO Y VALERIO TRUJANO



Bases para luminarias Plaza Loreto



Avance Plaza Loreto



Avance Plaza Loreto




Avance Jardín del Obispo



Avance Valerio Trujano



BARRIO DE SANTA MARÍA LA REDONDA

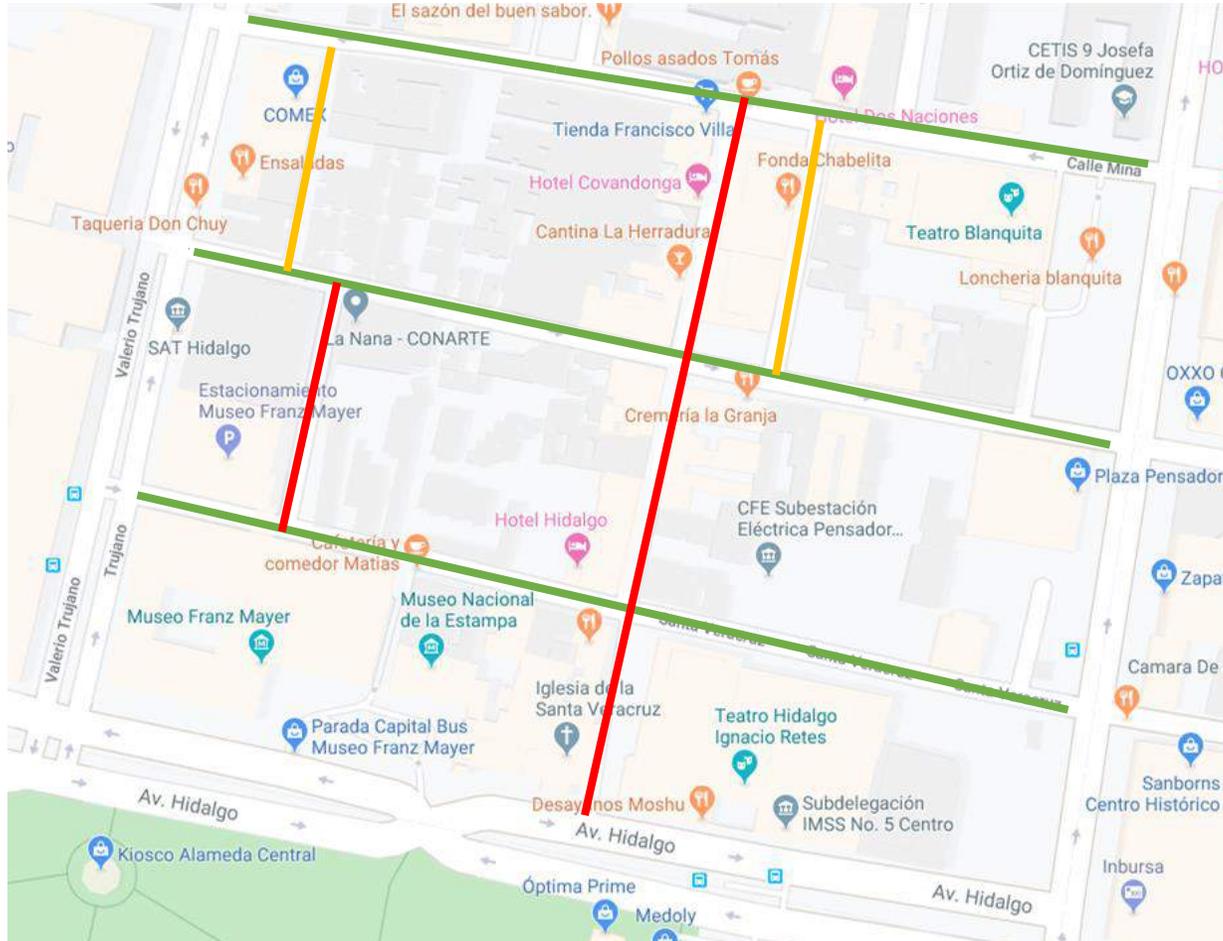

- **3er Callejón de San Juan de Dios avance de obra 50%**
Sin actividad



- **Plaza 2 de Abril avance de obra 65%**
Sin actividad

- **Calle Pensador Mexicano avance de obra 50%**
Colocación de Recinto
Colado de relleno fluido en banquetas
Colado de MR45 en vialidad
Colocación de relleno fluido en vialidad

- **Calle Mina avance de obra 25%**
Colado de MR45
Demoliciones

- **Calle Santa Veracruz avance de obra 48%**
Demolición de banqueta
Colocación de recinto
Detalles



- **2do Callejón de San Juan de Dios 0%**
Sin intervención

- **Calle 2 de Abril**
Sin intervención



BARRIO DE SANTA MARÍA LA REDONDA




Colado de MR45 Calle Mina



Retiro de Vegetación de Ornato Santa Veracruz




Avance de obra Pensador Mexicano



Avance de obra Pensador Mexicano



EJE CENTRAL

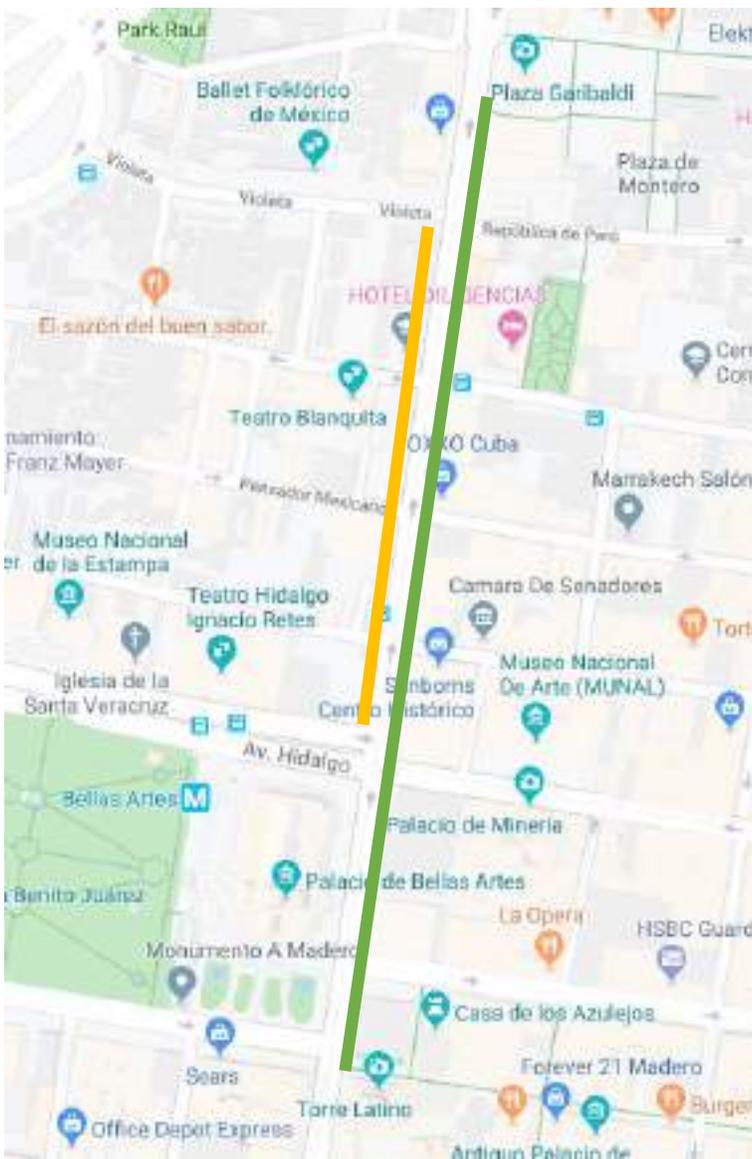

- **Eje Central acera Oriente avance de obra 24%**

En el tramo de Belisario Domínguez-Perú cimbrado de murete, colocación de recinto.

En el tramo de Cuba-Belisario Domínguez armado de arriates, colocación de marcos para registros

En el tramo de Donceles- Cuba, cimbra en rampa, colocación de registro eléctrico, colado de relleno fluido

En el tramo de Donceles entre Marconi y Eje Central, colocación de recinto

En el tramo de Tacuba-Donceles, cimbra en murete, retiro de parabús, colocación de base para poste

En el tramo de 5 de mayo-Tacuba, Instalaciones eléctricas y sanitaria, colocación de marcos para registros, colocación de recinto

En el tramo de Madero- 5 de mayo, armado de guarnición.

- **Eje Central acera Poniente avance de obra 12%**

En el tramo de Pensador Mexicano-Mina cimbra en guarnición. Y colocación de recinto

En el tramo de Santa Veracruz -Pensador Mexicano Demolición de banquetas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS


EJE CENTRAL



Avance de obra



AV. HIDALGO

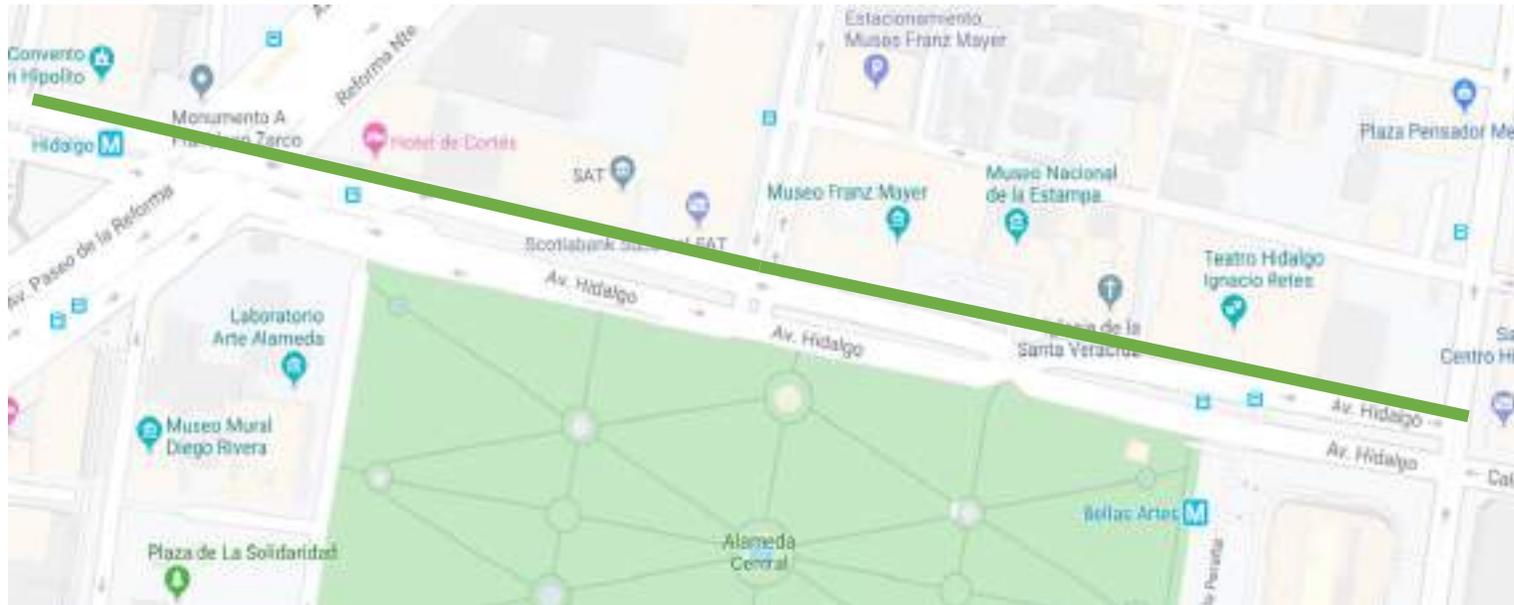

- **Av. Hidalgo avance de obra 58%**
 - Colocación de recinto
 - Colocación de tierra vegetal en jardineras
 - Busardeo de guarniciones
 - Canalización para luminarias
 - Colocación de precolado amarillo Oaxaca y colado de ajuste



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AV. HIDALGO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS



Avance de obra






SOS DGOIV | sep - dic

51.27%

Santa María la Redonda

51.91%

La Antigua Merced

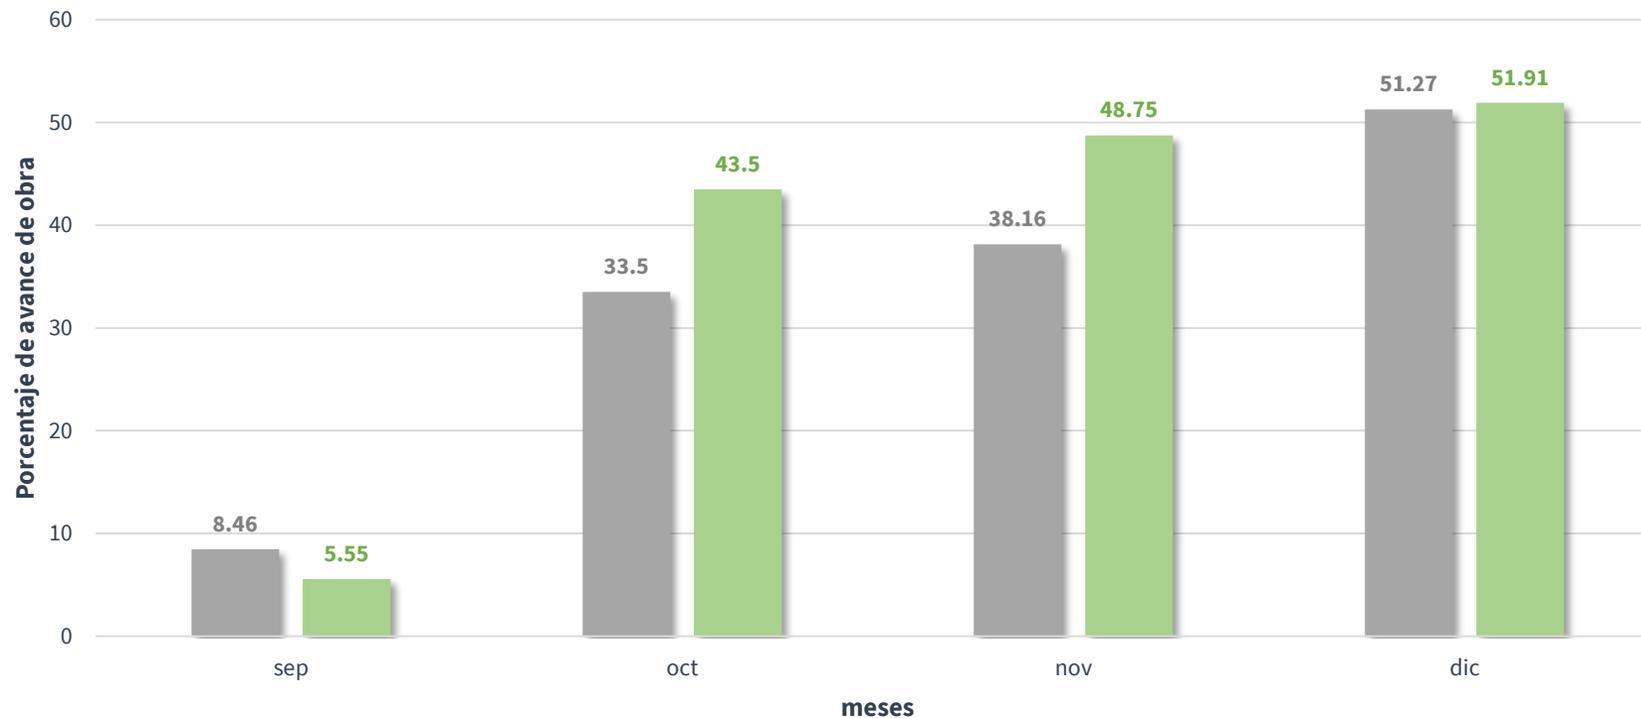



SOS – Alumbrado Público

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 16/12	Semana al 30/12	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	17	102	07 de enero
Alumbrado Público	Mantenimiento de iluminaciones artísticas	Semanal	0	0	07 de enero



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Reporte de luminarias reparadas en el Centro Histórico Perímetro A

Dirección	Entre calles	Colonia	Cantidad	Motivo	Incidencia	
REPÚBLICA DEL PERÚ, COL. CENTRO	Eje Central	Plaza de la Concepción	CENTRO	10	se realiza cambio de timer y se restablece circuito del 057600 al 057610.	Circuito apagado (5 o más lámparas continuas)
MANZANARES, COL. CENTRO	Santo Tomas	3er. Cjón. Manzanares	CENTRO	10	se realiza deteccion de corto circuito y reparacion se restablece circuito. del 057655 al 057665	Defecto Conexión
ALAMEDA CENTRAL	Cara Av. Hidalgo	Av. Juárez	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Lámpara apagada
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	Venustiano Carranza	República de Uruguay	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Lámpara apagada
AV. JUÁREZ, COL. CENTRO	Humboldt	Balderas	CENTRO	1	Reparación de corto circuito cambio de lampara balastro y soquet y reconeccion de lineas.	Defecto Conexión
AVENIDA JUÁREZ	Azueta	Revillagigedo	CENTRO	1	SER REALIZA CAMBIO DE BALASTRO COSMO 140W Y LAMPARA PGZ 140W	Lámpara apagada
ALAMEDA CENTRAL	Av. Hidalgo	Av. Juárez	CENTRO	1	SE RREALIZA CAMBIO DE LAMPARA E39 DE 140W Y RECONEXION DE LINEAS	Lámpara apagada
ALAMEDA CENTRAL	Av. Hidalgo	Av. Juárez	CENTRO	1	SE REALIZA CORRECCION EN ALIMENTADOR DE LUMINARIA POR SULFATAMIENTO	Defecto Conexión
ALAMEDA CENTRAL	Av. Hidalgo	Av. Juárez	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXION DE CABLES QUE ALIMENTAN A LA LUMINARIA POR SULFATAMIENTO	Defecto Conexión
ALAMEDA CENTRAL	Av. Hidalgo	Av. Juárez	CENTRO	1	SE CABLEA ALIMENTADOR PRINCIPAL POR DAÑO POR CORTO CIRCUITO EN CABLEADO	Cable de Alimentación Dañado
Francisco I. Madero	Fray Pedro de Gante	Eje Central Lázaro	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE BALASTRO 90W Y LAMPARA PGZ 90W	Lámpara apagada



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Reporte de luminarias reparadas en el Centro Histórico Perímetro A

Dirección	Entre calles		Colonia	Cantidad	Motivo	Incidencia
REPÚBLICA DE ECUADOR, COL. CENTRO	República de Brasil	República de Argentina	CENTRO	6	SE REALIZA CONEXION DE PUNTAS DE ALIMENTADOR POR PUNTAS SULFATADAS PDL 057762-057768 CONTROL 057768	Control dañado
ALAMEDA CENTRAL	Av. Hidalgo	Av. Juárez	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE BALASTRO COSMO DE 140W	Lámpara apagada
ALAMEDA CENTRAL	Av. Hidalgo	Av. Juárez	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE BALASTRO COSMO DE 140W	Lámpara apagada
ALAMEDA CENTRAL	Av. Hidalgo	Av. Juárez	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXION DE LINEAS DE LUMINARIA POR CORTADO EL CABLE	Defecto Conexión
GLORIETA DE CUITLAHUAC	Comonfort	Matamoros	CENTRO	1	Se realiza retiro de cable q pusieron los locatarios, no afectando nuestro circuito por que viene aereo	Cables Expuestos o Materiales
ALAMEDA CENTRAL	Av. Hidalgo	Av. Juárez	CENTRO	1	SE ENCUENTRA LUMINARIA ENCENDIDA CORRECTAMENTE NO LLEVA OTRO BRAZO	Control Limpieza
AV. JUÁREZ, COL. CENTRO	Balderas	Azueta	CENTRO	1	Cambio de lampara balastro y soquet y reconeccion de lineas	Defecto Conexión
AV. JUÁREZ, COL. CENTRO	Balderas	Azueta	CENTRO	1	reconexión de líneas	Defecto Conexión




SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Reporte de luminarias reparadas en el Centro Histórico Perímetro A

Dirección	Entre calles		Colonia	Cantidad	Motivo	Incidencia
ALAMEDA CENTRAL	Cara Av. Hidalgo	Av. Juárez	CENTRO HISTORICO	1	SE REALIZA RECONEXION DE LUMINARIA AL CIRCUITO TAMBIEN SE CHECA RELOJ FECHA Y HORA CORRECTA	Defecto Conexión
ALAMEDA CENTRAL	Cara Av. Hidalgo	Av. Juárez	CENTRO HISTORICO	39	SE REALIZA RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTADOR Y SE RETABLECE BREAKER RELOJ FECHA Y HORA. CIRCUITO 081498 al 081459	Control dañado
ALAMEDA CENTRAL	Cara Av. Hidalgo	Av. Juárez	CENTRO HISTORICO	13	SE REALIZA RECONEXION DE ALIMENTADOR PRICIPAL Y SE RESTABLECE BREAKER Y RELOJ FECHA Y HORA. CIRCUITO 081368 al 081381	Control dañado
ARCOS DE BELÉN	Buen Tono	Luis Moya	CENTRO	1	Cambio de lampara y balastro y reconexión de líneas,	Lámpara apagada
ALAMEDA CENTRAL	Cara Av. Hidalgo	Av. Juárez	CENTRO HISTORICO	1	Reconexión de lineas	Lámpara apagada
ROLDÁN	Manzanares	Corregidora	CENTRO HISTORICO	1	se realiza reconexión en líneas de alimentación	Defecto Conexión
ROLDÁN	Manzanares	Corregidora	CENTRO HISTORICO	1	se realiza reconexión en líneas de alimentación	Defecto Conexión
ROLDÁN	Manzanares	Corregidora	CENTRO HISTORICO	1	se realiza reconexión en líneas de alimentación	Defecto Conexión
			TOTAL	102		



SOS-AP | ene - dic

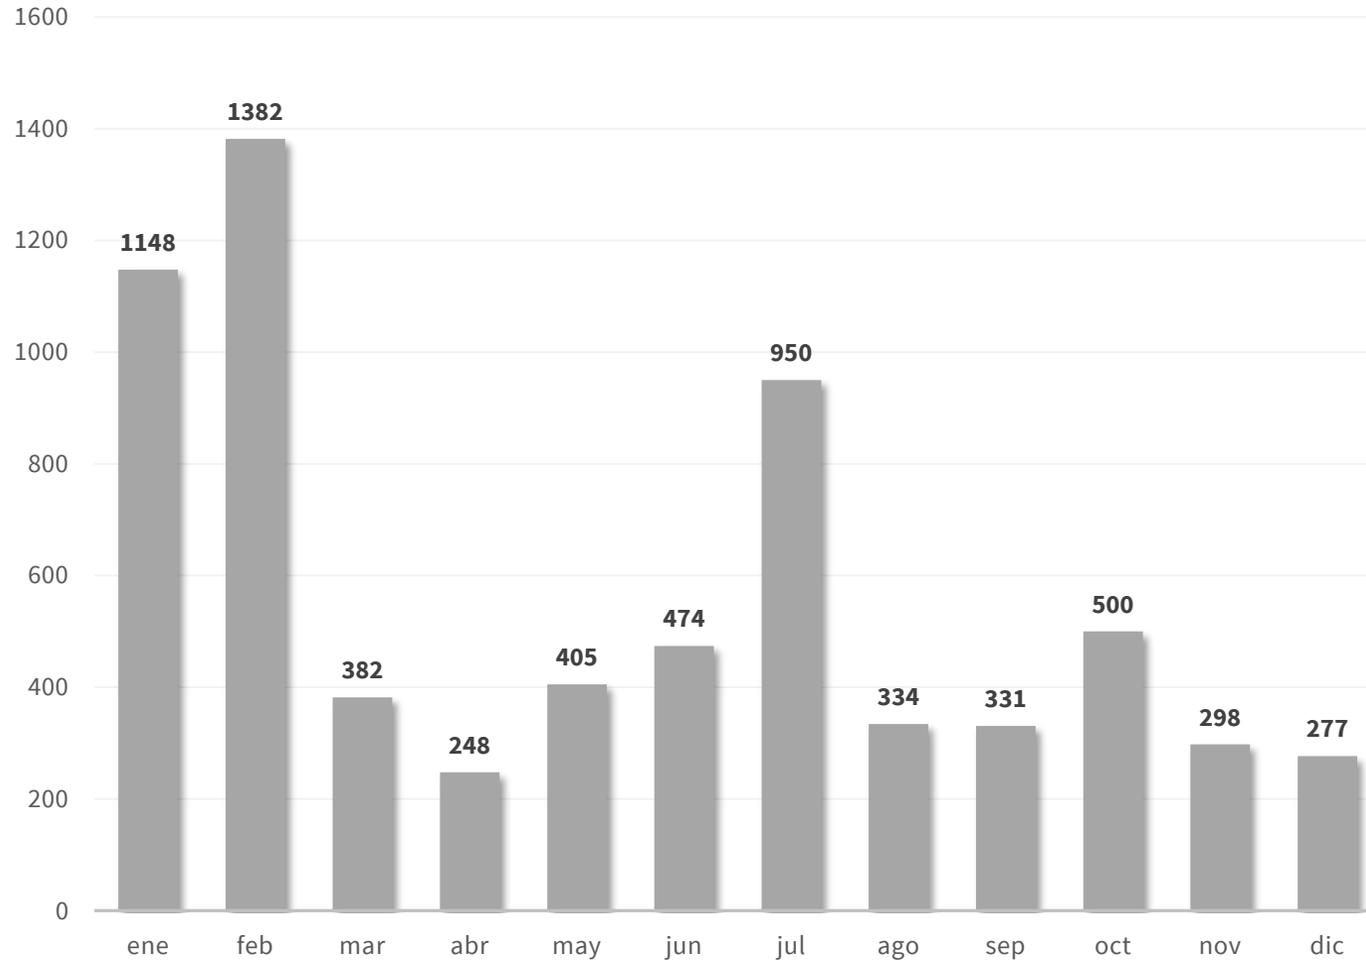


Perímetro A

6,729
Luminarias reparadas en PA



SOS-AP | ene - dic

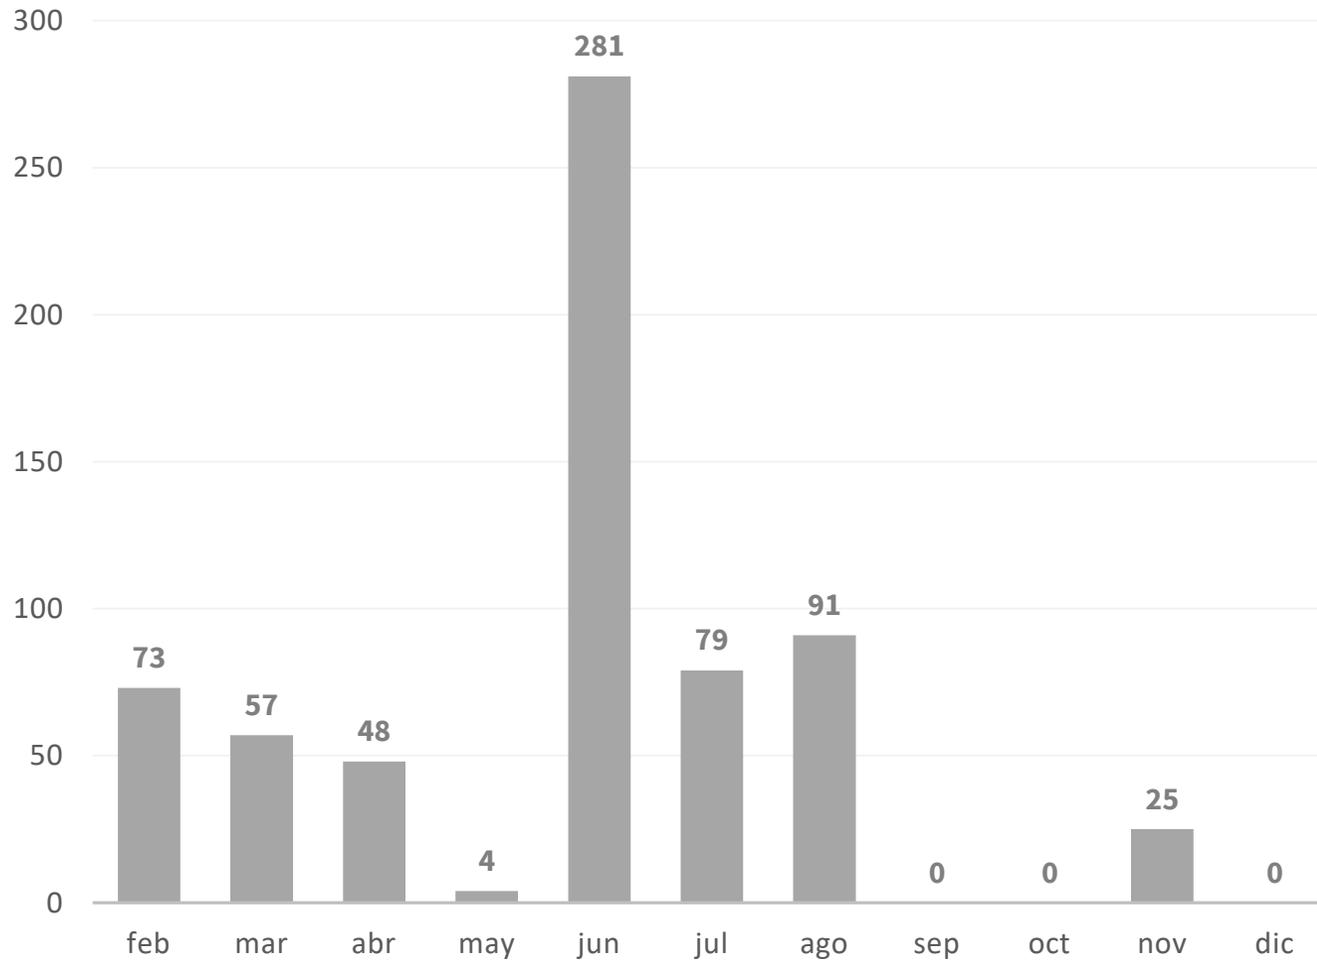

Perímetro B

658

Luminarias reparadas en PB



STC-METRO


Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 30/12	Próximo reporte
Infraestructura	Número de escaleras electromecánicas con falla o algún problema (línea base: 75 escaleras en 29 estaciones)	Quincenal	7 escaleras detenidas	14 de enero
Infraestructura	Número de elevadores en reparación (línea base: 19 elevadores en 29 estaciones)	Quincenal	0 elevadores detenidos	14 de enero



STC-METRO | feb - dic


131

Reparaciones en escaleras electromecánicas

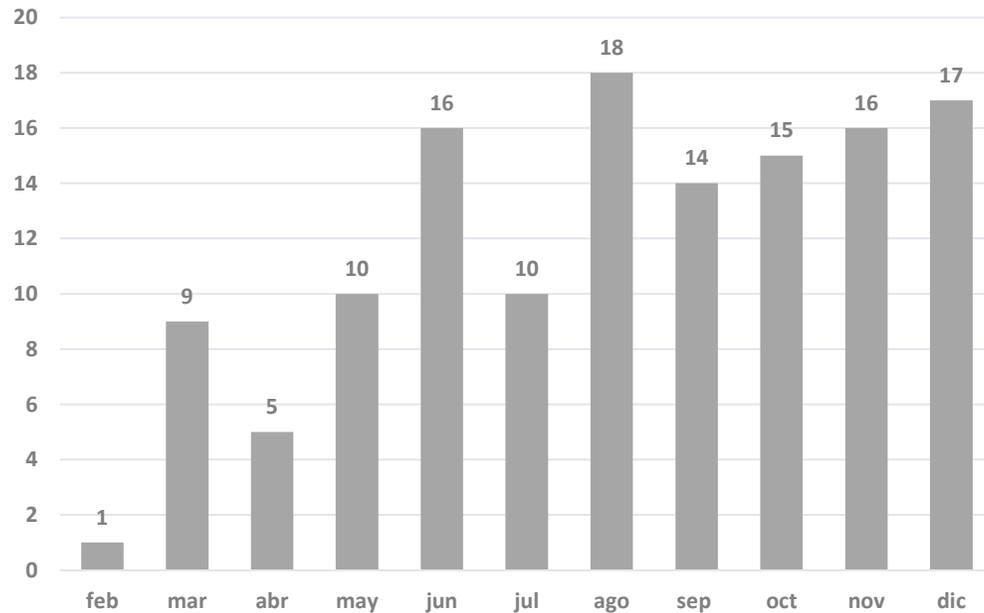

26

Reparaciones en elevadores

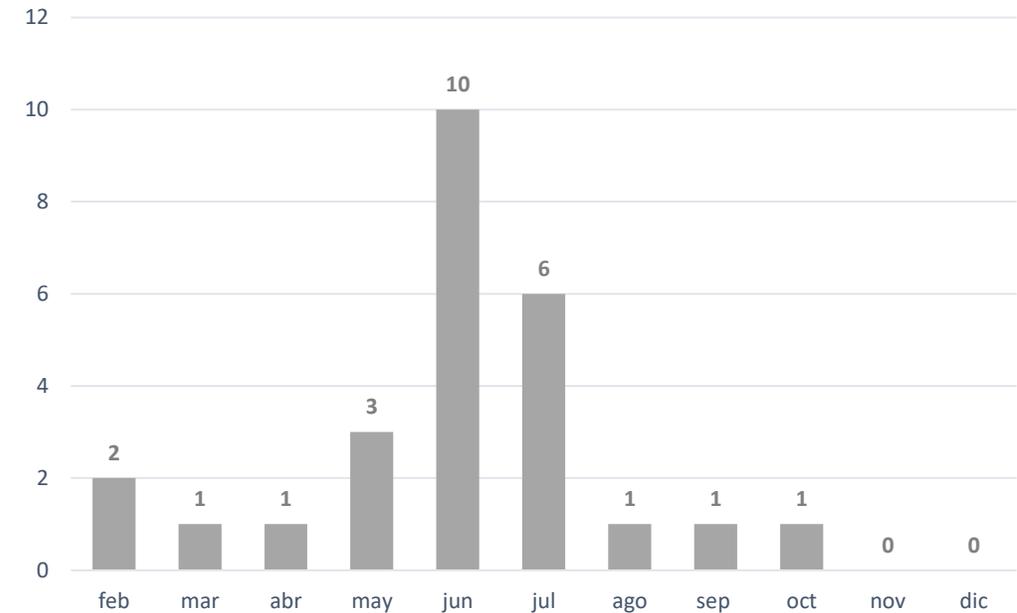




INVI | ene - nov

53.9%

Avance porcentual de obra en proceso*

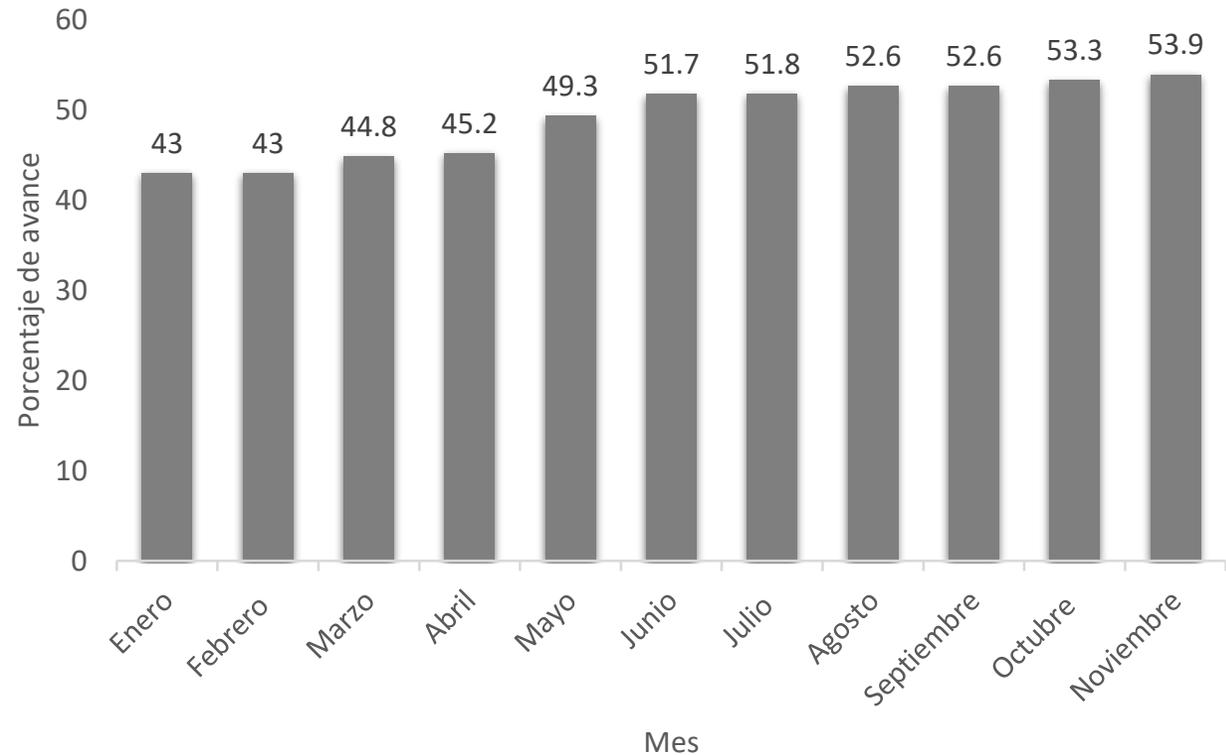

(*) de una meta de 18 predios ubicados en el Centro Histórico



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO

PROSOC | ene - dic


52.14%

Avance
porcentual
de obra en
proceso*

(*) de una meta de 62 Unidades
Habitacionales en el Centro
Histórico



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

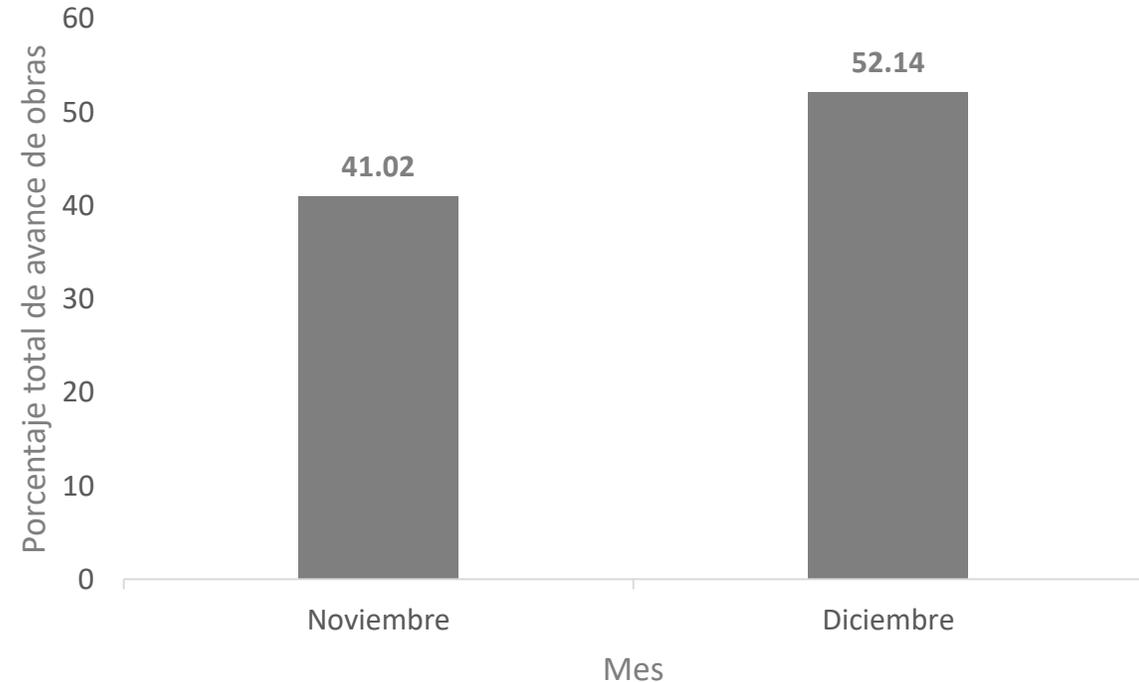



ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte al 16/12	Reporte al 30/12	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura Tecnológica	Número de puntos de conexión wifi habilitados en postes de C5 (Línea base: 561)	Semanal	399	469	07 de enero

¿Cómo saber dónde están?

Ingresa al módulo **WiFi más cercano en App CDMX**






ADIP | ene - nov

Puntos de conexión WI-FI habilitados

469

Puntos de conexión WI-FI habilitados*

(*) de una meta de 561 puntos, representando un avance del 83.60%

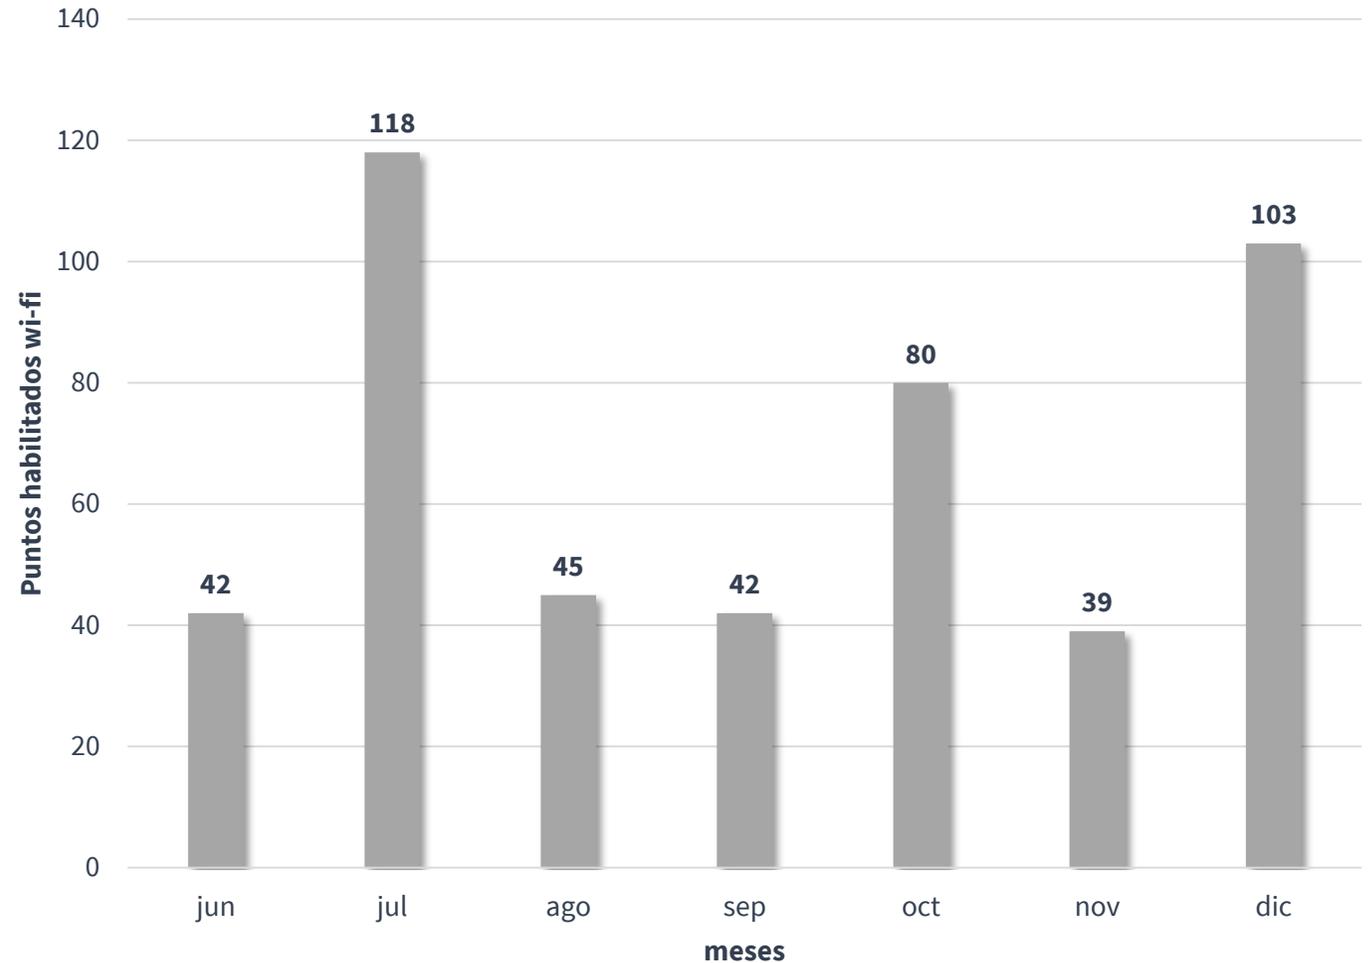



INAH

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte al 16/12	Reporte al 30/12	Próximo reporte	Observaciones
Obras en el Centro Histórico	Número de trámites de solicitud de autorización de obra en inmuebles ubicados en el Centro Histórico	Semanal	14	4	07 de enero	Anexo 1
	Número de autorizaciones de obra en inmuebles ubicados en el Centro Histórico	Semanal	13	5	07 de enero	Anexo 2



INAH

Anexo 1. Tramites de solicitudes de autorización de obra en inmuebles ubicados en el "Centro Histórico de la Ciudad de México" ingresados en la Ventanilla Única del 17 al 30 de diciembre de 2019

Fecha de ingreso	Ubicación	Nº	Tipo de Obras
19-dic-19	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	10	OBRA NUEVA
19-dic-19	BUCARELI	19	REPOSICIÓN DE PISO Y SUSTITUCIÓN DE RAMPAS
19-dic-19	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	56	TERMINACIÓN LIC 545/19
19-dic-19	PASEO DE LA REFORMA	159	DEMOLICIÓN



INAH

Anexo 2. Autorizaciones de obra en inmuebles ubicados en el Centro Histórico del 17 al 30 de diciembre de 2019

Ubicación	N°	Tipo de obra	Autorización
DONCELES	36	REMOCIÓN DE BUTACAS	579/19
BELISARIO DOMÍNGUEZ	61	RESTAURACIÓN	580/19
EMILIANO ZAPATA	45	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA	581/19
REPÚBLICA DE CHILE	7	REMODELACIÓN	582/19
REPÚBLICA DE ECUADOR	94	MANTENIMIENTO	583/19



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

INAH | jun-dic


129

Trámites de autorización ingresados en ventanilla

134

Autorizaciones de Obra emitidas

Gestiones de Obra en Inmuebles del Centro Histórico

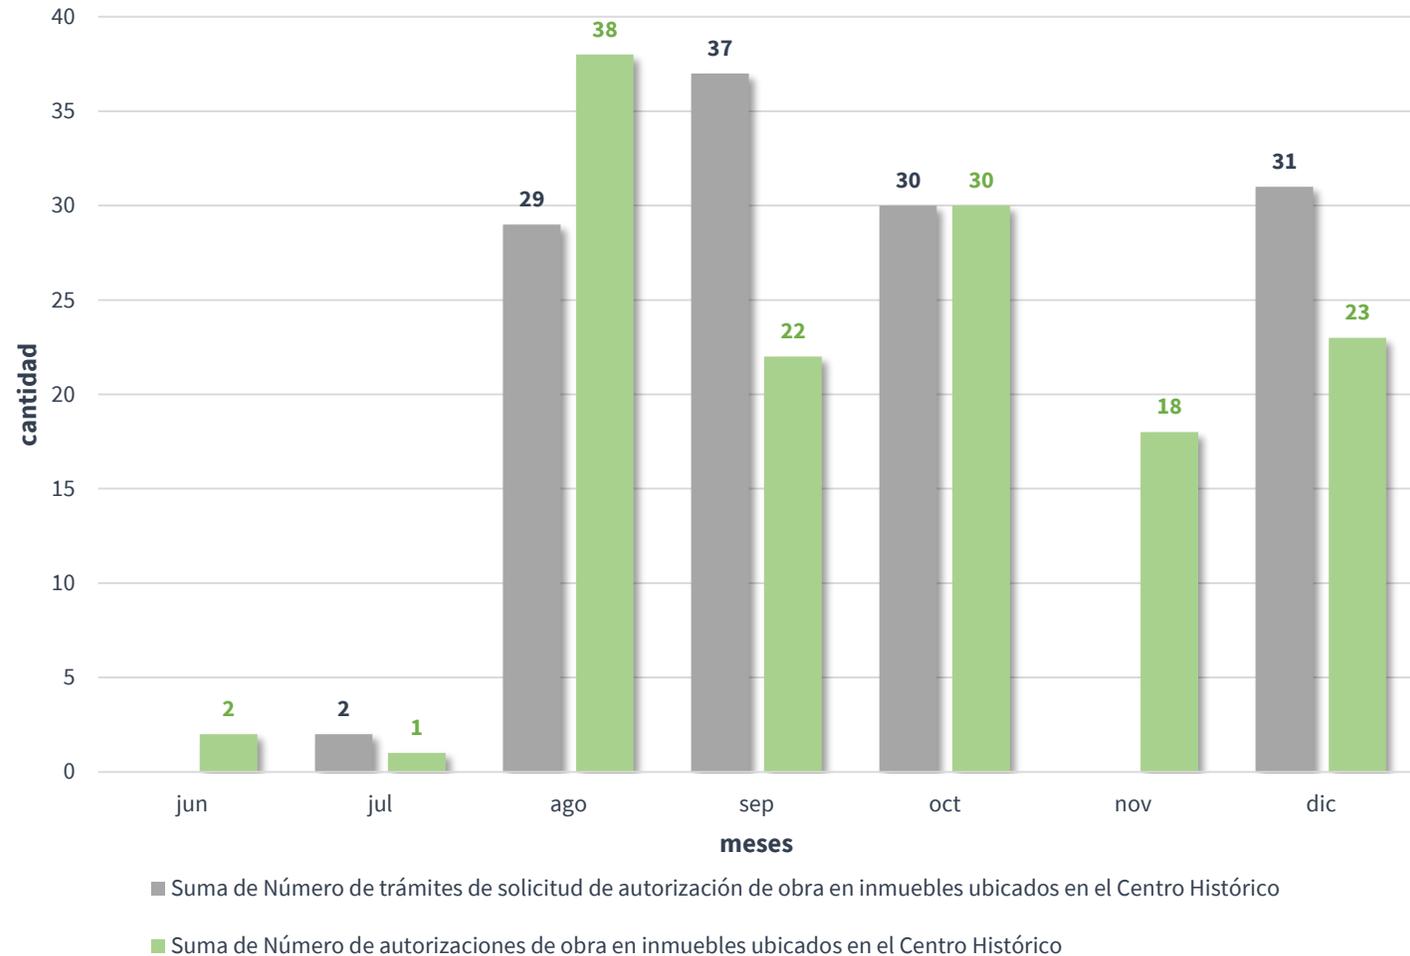



INBAL

Tema	Indicador	Periodicidad	Al mes de Noviembre	Del 25/11 al 16/12	Próximo reporte	Observaciones
Obras en el Centro Histórico	Número de solicitudes ingresadas para intervenciones diversas en inmuebles ubicados en el Centro Histórico	Mensual	34	21	28/01/2020	<p>9 solicitudes de información (6 inmuebles incluidos, 2 inmuebles colindantes, 1 inmueble sin injerencia)</p> <p>12 solicitudes de obras menores (7 inmuebles incluidos, 5 inmuebles colindantes)</p> <p>0 solicitudes de obras mayores</p>



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INBAL

Nº.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COORDINANTE	TIPO	TRABAJOS	VIGENCIA	IMAGEN
1	ERNESTO PUGIBET	70-72	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2608	INCLUIDO	INBA-02-005	NO APLICA	UN AÑO	
2	SAN JERÓNIMO	21	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2610	COORDINANTE	INBA-02-008	NO APLICA	UN AÑO	
3	SAN JERÓNIMO	21	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJOS AUTORIZADOS	2611	COORDINANTE	INBA-02-006	PINTURA EN EXTERIORES E INTERIORES, REPOSICIÓN DE APLANADOS EN EXTERIORES E INTERIORES, ALBAÑILERÍA SUPERFICIAL EN GENERAL, RESANES REPOSICIÓN DE ESTUCOS O FRISOS, INCLUYENDO ELEMENTOS DECORATIVOS EN EXTERIORES E INTERIORES	UN AÑO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA



INBAL

Nº.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJO	VIGENCIA	IMAGEN
4	REPÚBLICA DE CUBA	83	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2628	NO INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
5	JOSÉ MARÍA IZAZAGA	84	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJO AUTORIZADO	2629	COLINDANTE	INBA 02-006	PINTURA EN EXTERIORES E INTERIORES	UN AÑO	
6	ERNESTO PUIGBET	74-76	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2642	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CIUDAD DE MÉXICO
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA



INBAL

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJO	VIGENCIA	IMAGEN
7	REPÚBLICA DE CHILE	7	CENTRO	CUALHTÉNOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2646	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
8	AV. JUÁREZ	58	CENTRO	CUALHTÉNOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2657	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
9	TACUBA	8	CENTRO	CUALHTÉNOC	TRABAJO AUTORIZADO	2672	INCLUIDO	INBA 02-008	REPOSICIÓN DE PISOS ORIGINALES	UN AÑO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA



INBAL

NO.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOUO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJO	VIGENCIA	IMAGEN
10	TACUBA	8	CENTRO	CUALIHÉMOC	TRABAJO AUTORIZADO	2673	INCLUIDO	INBA 02-006	ARREGLO Y REPOSICIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIA, AIRE ACONDICIONADO Y OTRAS ESPECIALES, SIN ALTERACIONES QUE AFECTEN LA ESTRUCTURA O EL DISEÑO DE FACHADAS EXTERIORES E INTERIORES EXISTENTES	UN AÑO	
11	BUCARLI	128	CENTRO	CUALIHÉMOC	TRABAJO AUTORIZADO	2676	INCLUIDO	INBA 02-006	PINTURA EN EXTERIORES E INTERIORES, REPOSICIÓN DE APLANADOS EN EXTERIORES E INTERIORES	UN AÑO	
12	JUÁREZ	60	CENTRO	CUALIHÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2677	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CIUDAD DE MÉXICO
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INBAL

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	CONDAANTE	TIPO	TRABAIOS	VIGENCIA	IMAGEN
13	VENUSTIANO CARRANZA	63	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAIOS AUTORIZADOS	2680	INCLUIDO	INBA 02-006	LIMPIEZA DE FACHADAS, INCLUYENDO ELEMENTOS DE CANTERA, TABIQUE O ALGÚN OTRO MATERIAL PÉTREO	UN AÑO	
14	REPÚBLICA DE BRASIL	53	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAIOS AUTORIZADOS	2687	CONDAANTE	INBA 02-006	REPOSICIÓN DE CANCELERÍAS EN PUERTAS Y VENTANAS EN EXTERIORES E INTERIORES	UN AÑO	
15	REPÚBLICA DE CHILE	7	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAIOS AUTORIZADOS	2703	CONDAANTE	INBA 02-006	REPOSICIÓN DE PISOS ORIGINALES EN INTERIORES, REPOSICIÓN TOTAL DE MATERIALES UTILIZADOS EN ACABOS INCLUSIVE MEJORANDO LA CALIDAD DE LOS MISMOS, ARREGLO Y REPOSICIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULIC, SANITARIA, AIRE ACONDICIONADO Y OTRAS ESPECIALES	UN AÑO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CIUDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA



INBAL

No.	CALLE	NÚMERO	COLOMA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJO	VIGENCIA	IMAGEN
16	VIZCAÍNAS	10	CENTRO	CUAUHTEMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2704	COLINDANTE	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
17	MOTOLONÍA	6	CENTRO	CUAUHTEMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2711	INCLUIDO	INBA 02-005	NO APLICA	UN AÑO	
18	MOTOLONÍA	6	CENTRO	CUAUHTEMOC	TRABAJO AUTORIZADO	2712	INCLUIDO	INBA 02-005	PINTURA EN EXTERIORES	UN AÑO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA



INBAL

Nº.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJO	VIGENCIA	IMAGEN
19	FALMA NORTE	39	CENTRO	CUALHTÉNOC	TRABAJO AUTORIZADO	2717	INCLUIDO	INBA-02-006	ALBAÑILERÍA SUPERFICIAL EN GENERAL, RESENAS, REPOSICIÓN DE ESTUOS O FRISO, INCLUYENDO ELEMENTOS DECORATIVOS EN EL EXTERIOR, COLOCACIÓN DE 30 PIEZAS DE MARMOL NEGRO DE 30X30 EN PACHADA.	UN AÑO	
20	ISABELLA CATÓLICA	30	CENTRO	CUALHTÉNOC	TRABAJO AUTORIZADO	2748	COLINDANTE	INBA-02-006	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE GAS EN PACHADA.	UN AÑO	
21	BUCARU	128	CENTRO	CUALHTÉNOC	TRABAJO AUTORIZADO	2754	INCLUIDO	INBA-02-006	COLOCACION DE REJAS DE TENDIDO	UN AÑO	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

INBAL | feb-nov

189

Solicitudes de información


123

Solicitudes de obras menores

3

Solicitudes de obras mayores

Gestiones de Obra en Inmuebles del Centro Histórico

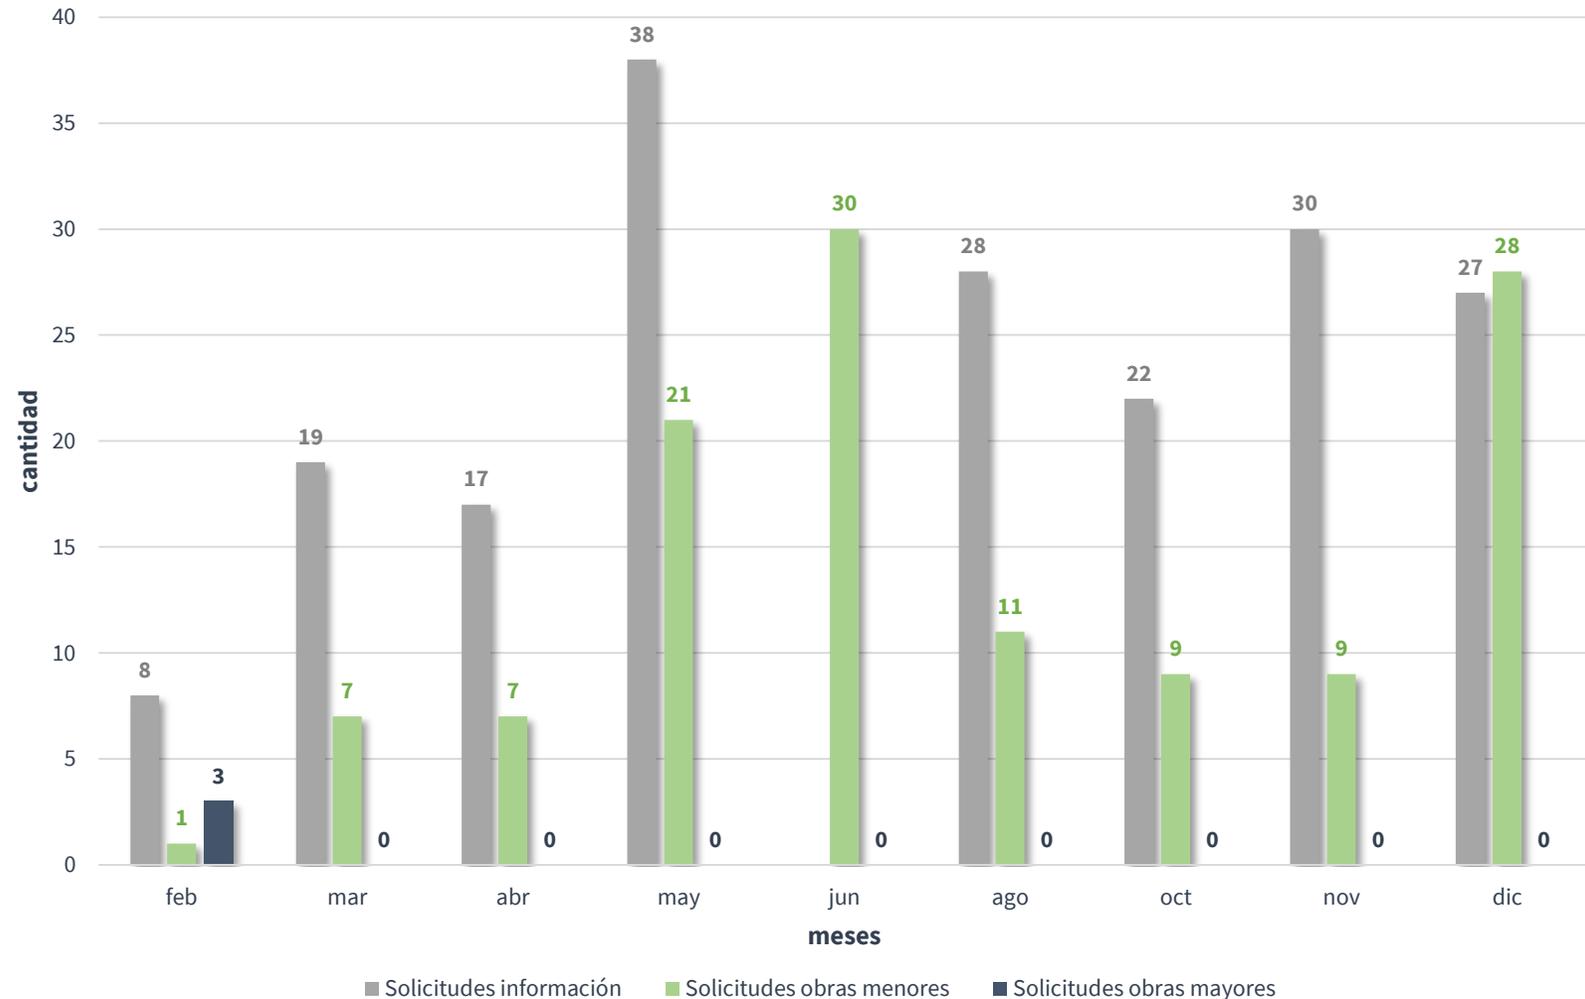




ILIFE | ene - nov

89.9%

Avance porcentual de obra en proceso*

(*) de una meta de 23 escuelas en el Centro Histórico

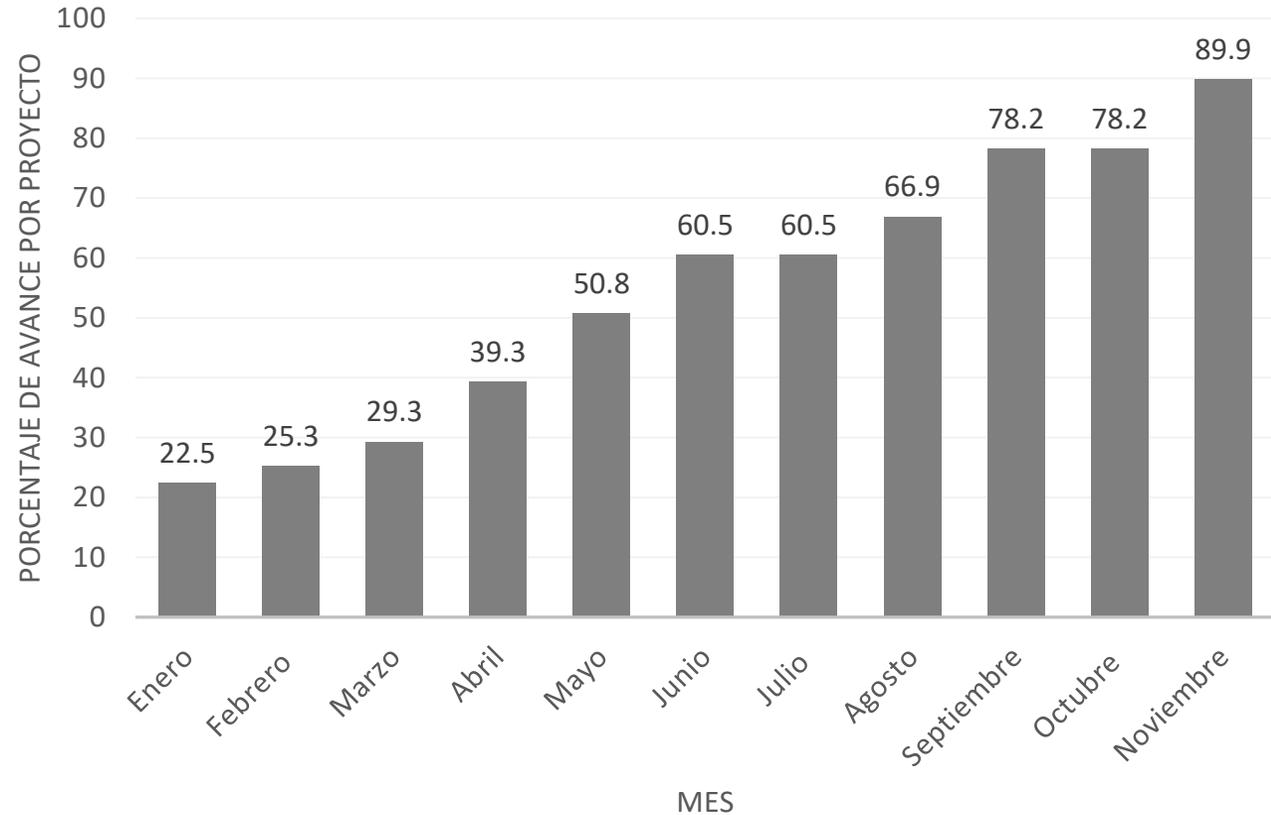



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SEDEMA

El 19 de diciembre, se realizó la plantación de 4 árboles más en la Calle Regina.






SEDEMA | jun - oct

Sujetos forestales plantados

176

Sujetos forestales plantados

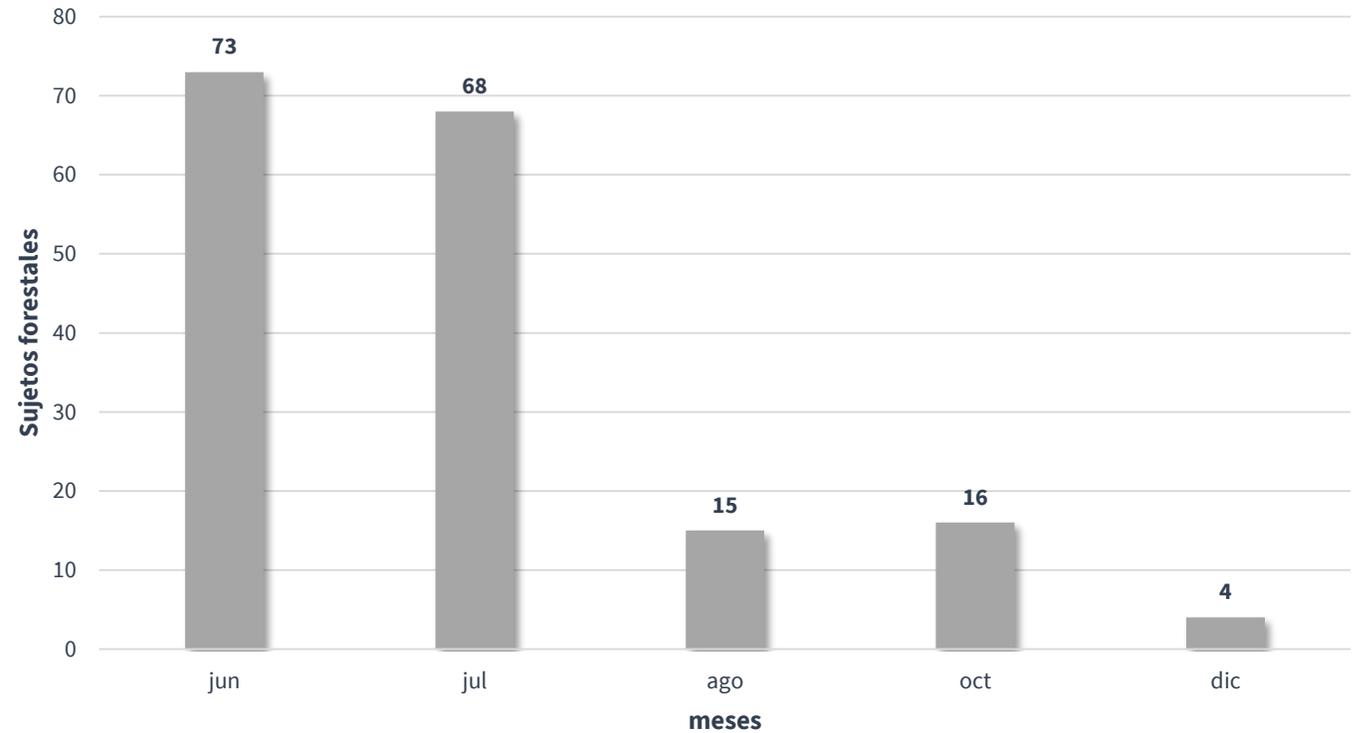

¿Dónde?

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Tacuba | 5. Palma |
| 2. Venustiano Carranza | 6. Francisco I. Madero |
| 3. República de Uruguay | 7. 5 de mayo |
| 4. Mesones | 8. Regina |



SEDECO

Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México

Estatus al 30 de diciembre 2019

Alcaldía	Mercado	Obra y Servicio	Fecha de inicio	Fecha término	AVANCE			
					Empresa	Importe del Contrato	Avance físico	3ra. Visita
Cuauhtémoc	San Camilito	REHABILITACIÓN	01/08/2019	21/12/2019	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLO INMOBILIARIO VILALVA, S.A. DE C.V.	6,669,870.46	72%	10/12/2019
Cuauhtémoc	Lagunilla Ropa y Telas	REHABILITACIÓN	01/08/2019	21/12/2019	PROYECCIÓN Y DISEÑO EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	13,307,986.69	75%	10/12/2019
Cuauhtémoc	San Juan Curiosidades	REHABILITACIÓN	30/07/2019	21/12/2019	DESARROLLO E INGENIERÍA DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	32,346,718.04	40%	10/12/2019

NOTA: El mercado San Juan Curiosidades, fue afectado por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Del local siniestrado en días pasado, el local fue restaurado y YA FUE ENTREGADO A LA LOCATARIA.



SEDECO

Mercado San Juan Curiosidades

Estatus al 31 de diciembre 2019



Local incendiado




Reparación del local incendiado



Se colocaron racks para que se respete el área de ventas de locales ubicados en la calle de Aranda de San Juan Curiosidades



C5 Grafiti - Reportes registrados de robo de cable y/o tapas y coladeras enero a diciembre 22

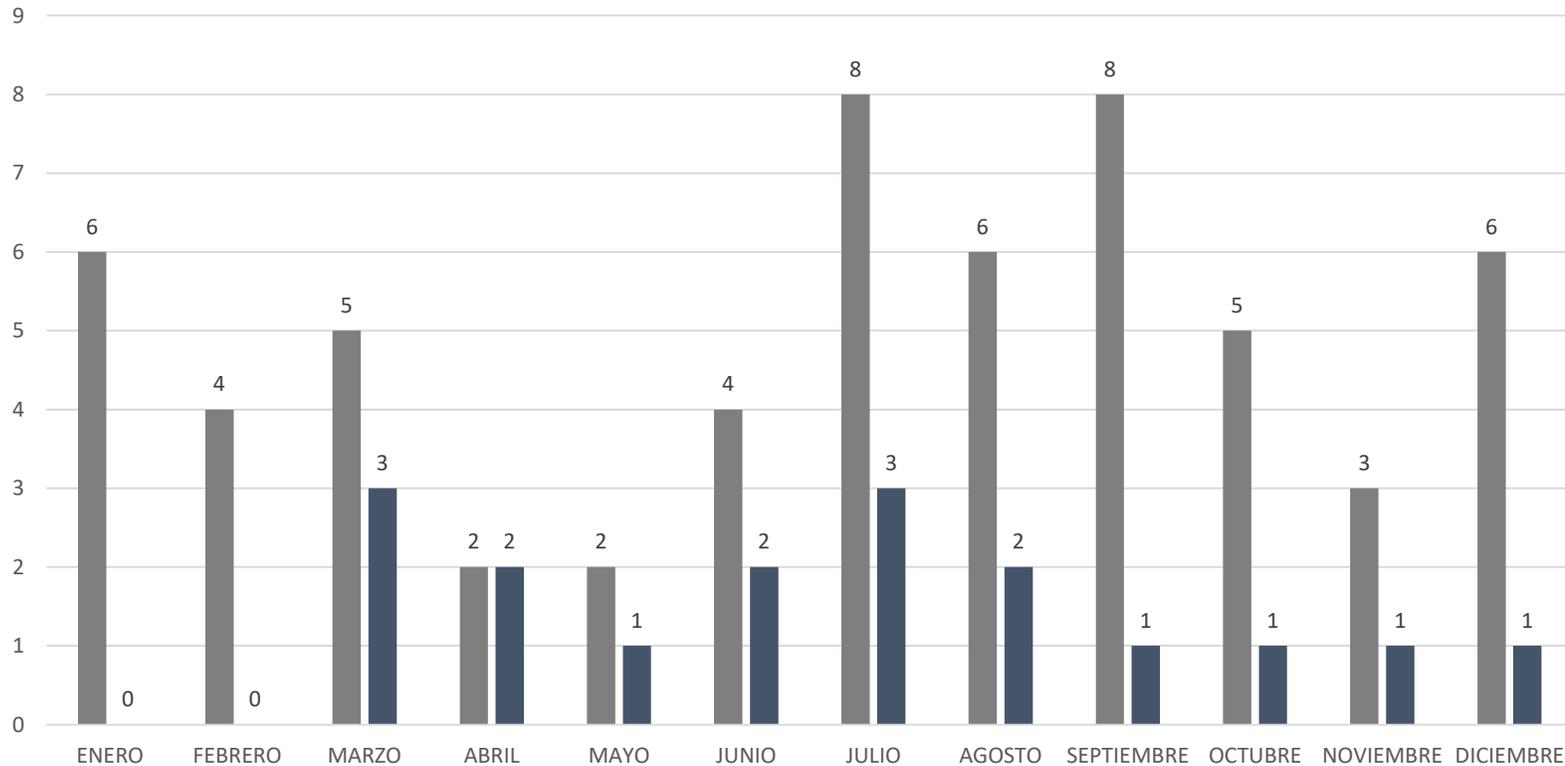

Total


GRAFITI
59

ROBO DE CABLE
Y/O TAPAS Y
COLADERAS
17



PGJ

Histórico de carpetas de investigación por robo de elementos de enero a diciembre

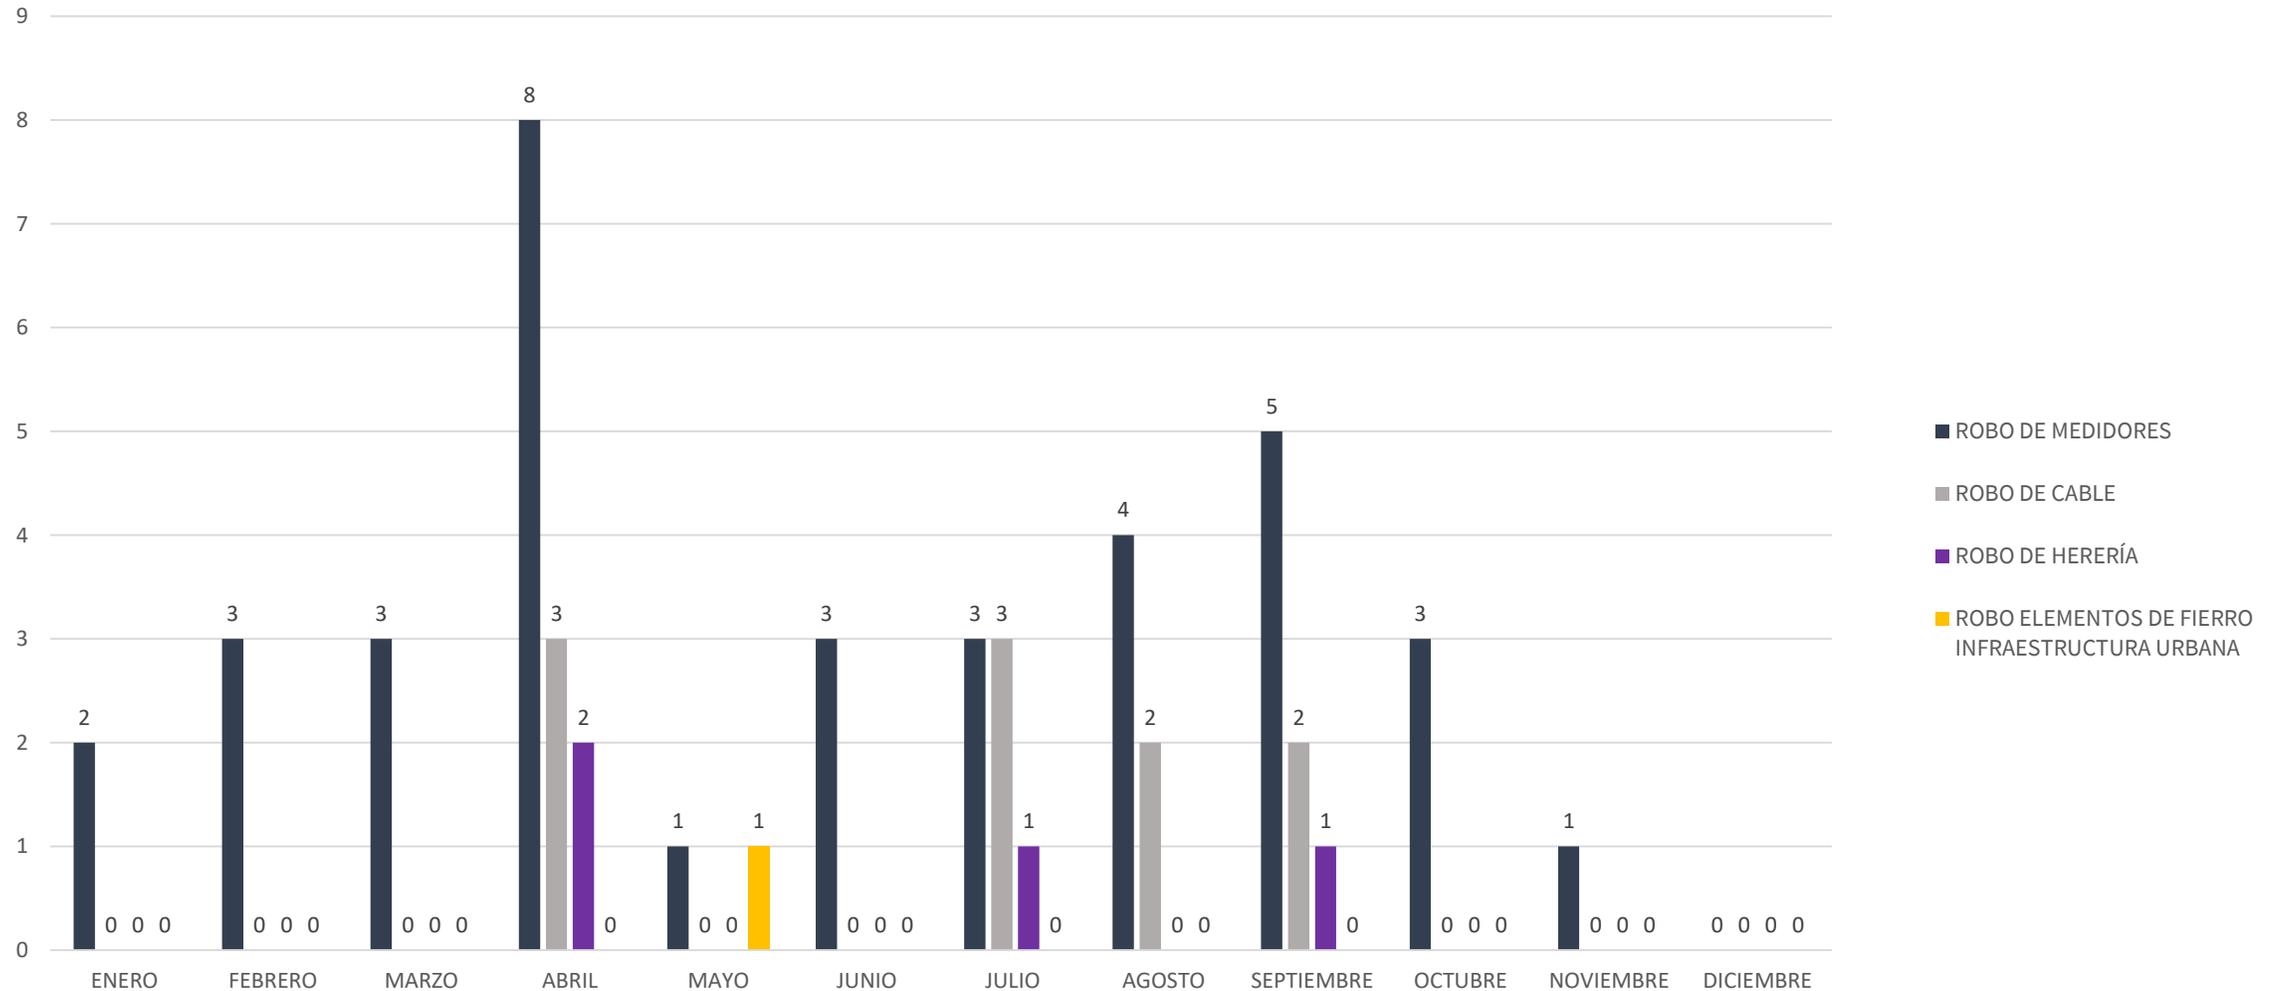



SSC – SCT – DSOT (Tránsito)


Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Del 16 al 30/12	Próximo reporte
Infraestructura Semafórica (Sistema centralizado y aislado 162)	Número de semáforos con mantenimiento preventivo		23	
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo	Quincenal	72	14 de enero



SSC-SCT-DSOT


CORRECTIVO	
APAGADO	1
CABLE DE COMUNICACIÓN	7
CAMBIA	2
CINTILANTE	28
CLOSTER DAÑADO	1
CORTO	1
DESCONECTADO	23
FALSO CONTACTO	1
FOCO FUNDIDO	3
LIMPIEZA	1
TARJETA DAÑADA	3
VISERA ROTA	1
PREVENTIVO	
	23
TOTAL GENERAL	95

MANTENIMIENTO SEMAFORICO

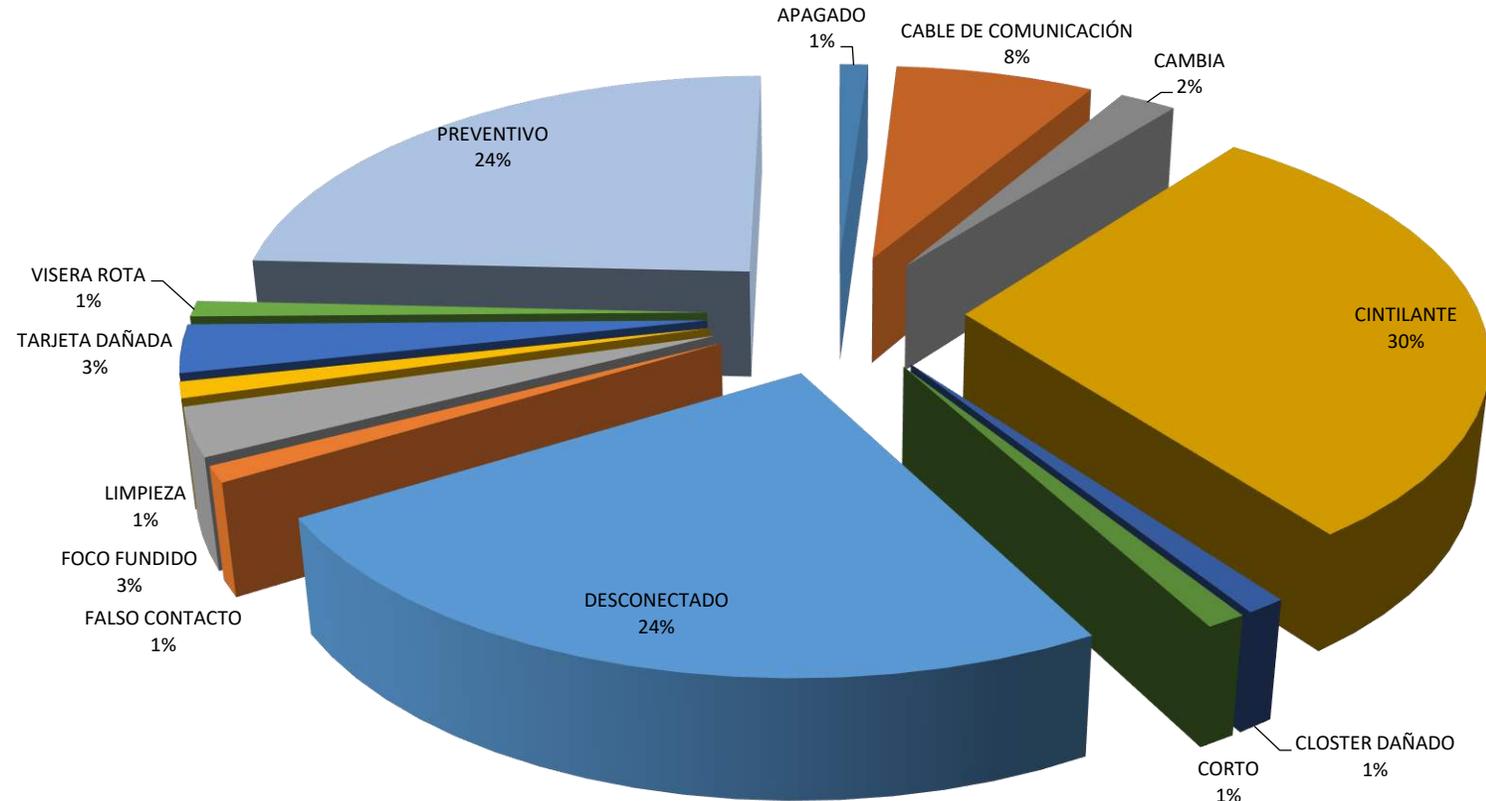



SSC - SCT - DSOT (Tránsito)

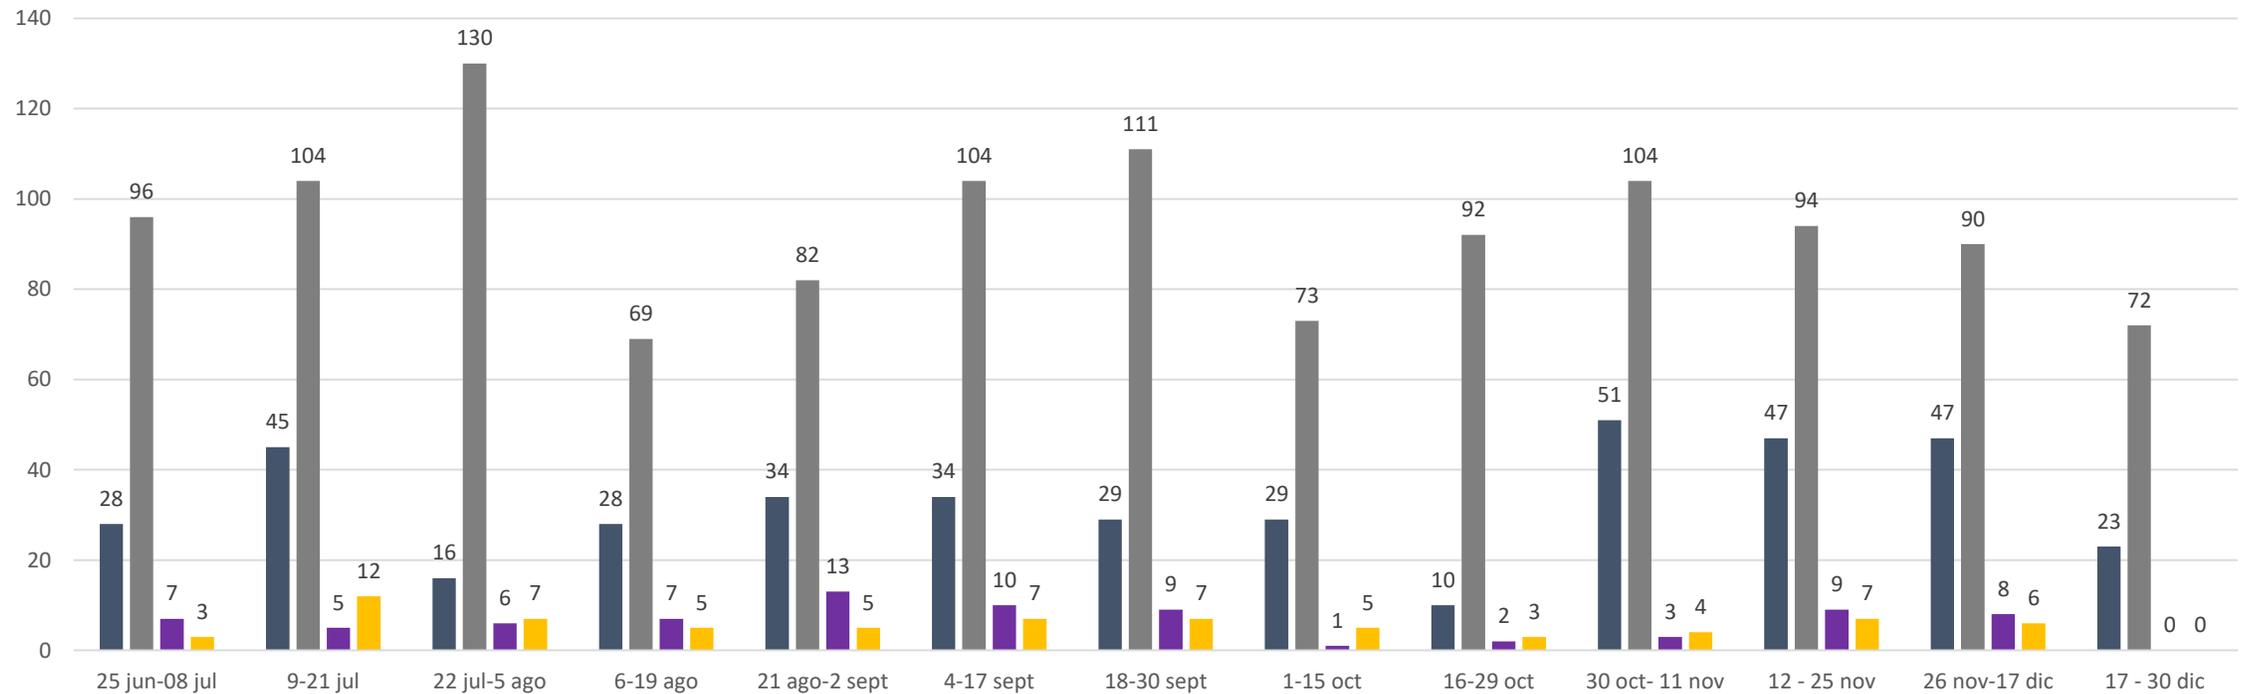

■ Número de semáforos con mantenimiento preventivo

■ Número de semáforos con mantenimiento correctivo por falla

■ Número de cámaras con mantenimiento preventivo

■ Número de cámaras con mantenimiento correctivo por falla



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Corte de transmisión



Matriz de seguimiento a turnos Enero - Diciembre



Dependencia	Atendido	Proceso	Pendiente	Total general
ACH	33	3	1	37
ADIP	1			1
Al. Cuauhtémoc	16	2	4	22
Al. Venustiano Carranza	7			7
C5	7			7
CFE	7	2		9
ILIFE	1			1
INAH	3			3
INBAL		1		1
Metrobús	1			1
PGJ	3			3
SACMEX	9	1	1	11
SEDEMA	6	3		9
SEMOVI	1			1
SGIRPC	1			1
SOS-AP	5			5
SOS-DGOIV	8	1		9
SOS-DGSUS	2			2
SSC	8			8
STC-METRO	1			1
TELMEX	3		1	4
Tránsito	7			7
Total general	130	13	7	150



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO

TURNOS NUEVOS

Del 17 al 30 de diciembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
20/12/2019	ACH	Evitar punto de pepena del personal de limpia sobre la banqueta del Callejón de Lecheras	Al. Cuauhtémoc	Pendiente		
23/12/2019	SOS-DGOIV	Reubicar acometidas de postes de alumbrado público que se van a retirar en la calle de Violeta y Riva Palacio	TELMEX	Pendiente		



TURNOS ATENDIDOS

Del 17 al 30 de diciembre



FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
23/12/2019	Tránsito	Liberación del controlador de la intersección en Avenida Hidalgo y Valerio Trujano, por interrupción con Bodega de herramientas de obra	SOS-DGOIV	Atendido	23/12/2019	



TURNOS PENDIENTES

Del 17 al 30 de diciembre



FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
17/12/2019	ACH	Solicitud de verificación en materia de trampas de grasas a los 19 establecimientos de Motolinia por motivo de la rehabilitación de jardineras	SACMEX	Pendiente		



Matriz de seguimiento a Incidencias del 01 de enero al 30 de diciembre



Dependencia	Atendido	Pendiente	Proceso	Total general
ACH	1,305	20	2	1,327
Al. Cuauhtémoc	47	22	1	70
Al. Venustiano Carranza	4			4
C-5	3			3
CFE	136	64	5	205
CIS		4		4
IUSACELL		2		2
MCM TELECOM		1		1
SACMEX	144	14	4	162
SEDEMA		1	2	3
SGIRyPC	1			1
SOS-AP	128	11	2	141
SOS-DGOIV	11	21		32
SOS-DGSUS		7		7
STC-METRO	3			3
TELMEX	50	7	7	64
TOTAL PLAY			1	1
Tránsito	37		1	38
Total general	1,869	174	25	2,068



VIPP 4. ALAMEDA SECTOR FINANCIERO

Peticiones atendidas vía chat del 17 al 30 de diciembre



TOTAL	TEMA	UBICACIÓN	CALLE	Y CALLE	ATENDIÓ
2	Reparación de alumbrado público	Av. Juárez	Balderas	Luis Moya	SOS-AP
	Reparación de alumbrado público	Bolívar	Tacuba	5 de Mayo	



Atención VIPPSC



VIPP 7. VIZCAÍNAS CORREDOR CULTURAL REGINA

Peticiones atendidas vía chat del 26 de noviembre al 02 de diciembre



TOTAL	TEMA	UBICACIÓN	CALLE	Y CALLE	ATENDIÓ
1	Recolocación de tapa de registro	San Jerónimo	Bolívar	Isabel la Católica	CFE



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 17 al 30 de diciembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
17/12/2019	Al. Cuauhtémoc	Falta tapa de registro	NEZAHUALCÓYOTL	BOLÍVAR	ISABEL LA CATÓLICA				SACMEX	Atendido



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



INCIDENCIAS EN PROCESO

Del 17 al 30 de diciembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFIA ANTES	FOTOGRAFIA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
21/12/2019	VIPP 3 Santo Domingo	Reposición de poste de alumbrado público	DONCELES	PALMA	REPÚBLICA DE BRASIL	Entre el número 79 y 81			SOS-AP	Proceso



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 17 al 30 de diciembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
17/12/2019	Al Cuauhtémoc	Tapa floja	BALDERAS	INDEPENDENCIA	JUÁREZ				SACMEX	Pendiente
18/12/2019	VIPP 3 Santo Domingo	Cableado huele a quemado	DEL CARMEN	REPÚBLICA DE COLOMBIA	REPÚBLICA DE VENEZUELA	Enfrente del hospital Gregorio Salas en Plaza Mienlo			CIS	Pendiente
18/12/2019	VIPP 5 Zocalo	Luminarias encendidas durante el día	MONEDA	CORREO MAYOR	SEMINARIO				SOS-AP	Pendiente



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 17 al 30 de diciembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
18/12/2019	VIPP 4 Alameda Sector Financiero	Falla en alumbrado público	PLAZA SOLIDARIDAD	BALDERAS	DR. MORA				SOS-AP	Pendiente
19/12/2019	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Tapa de registro dañada	ACADEMIA	REPÚBLICA DE GUATEMALA		Esquina			SACMEX	Pendiente
18/12/2019	Al Cuauhtémoc	Falla en el suministro de energía eléctrica	VIZCAINAS	ARANDA	LÓPEZ	Salida de Chedraui			CFE	Pendiente



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL CENTRO HISTÓRICO

INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 17 al 30 de diciembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACION	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFIA ANTES	FOTOGRAFIA DESPUES	ATIENDE	ESTATUS
20/12/2019	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Tapa de registro en mal estado	LAS CRUCES	REPUBLICA DE URUGUAY		Escuna			CPE	Pendientes
20/12/2019	VIPP 1 Santa María la Redonda	Fuga de agua potable	PENSADOR MEXICANO	EJE CENTRAL LAZARO CÁRDENAS	PLAZA 2 DE ABRIL				SACMEX	Pendientes
20/12/2019	VIPP 1 Santa María la Redonda	Fuga de agua potable	PENSADOR MEXICANO	1er CALLEJÓN DE SAN JUAN DE DIOS	VALERIO TRUJANO	Acera norte			SACMEX	Pendientes



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 17 al 30 de diciembre



FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACION	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFIA ANTES	FOTOGRAFIA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
27/12/2019	VIPP 3 Santo Domingo	Tapa de registro en mal estado	REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE BOLIVIA		Esquina, afuera del banco santander			CIS	Pendiente
27/12/2019	VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Falla en alumbrado público	REPÚBLICA DE ECUADOR	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS		casi esquina			SOS-AP	Pendiente
27/12/2019	VIPP 3 Santo Domingo	Falla en el suministro de energía eléctrica	REPÚBLICA DE CUBA	REPÚBLICA DE CHILE	PALMA	No. 66			CFE	Pendiente
27/12/2019	AL Cuauhtémoc	Falla en el suministro de energía eléctrica	MERCADO DE SAN JUAN						CFE	Pendiente



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 17 al 30 de diciembre



FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
30/12/2019	VIPP 6 Anáhuac Heroed Mixcalco	Poste de alumbrado público flojo	CORREGIDORA	CORREO MAYOR	ACADEMIA	Frente al No. 21			SOS-AP	Pendiente
30/12/2019	Al Cuauhtémoc	Caja de válvulas en mal estado	LUIS MOYA	VICTORIA		Esquina			SACMEX	Pendiente
30/12/2019	VIPP R San Pablo	Tapa de registro en mal estado	REPÚBLICA DEL SALVADOR	ROLDÁN	SANTO TOMÁS	No. 193			CFE	Pendiente



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 17 al 30 de diciembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
30/12/2019	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Tapa de registro en mal estado	SANTO TOMÁS	REPÚBLICA DE URUGUAY	REPÚBLICA DEL SALVADOR	No. 30			CFE	Pendiente
30/12/2019	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falta tapa de registro	SANTO TOMÁS	REPÚBLICA DE URUGUAY		Esquina			CFE	Pendiente
30/12/2019	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falta tapa de registro	REPÚBLICA DE URUGUAY	ROLDÁN	SANTO TOMÁS	No.183			ACH	Pendiente



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO

INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 17 al 30 de diciembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
30/12/2019	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Tapa de registro en mal estado	MANZANARES	JESÚS MARÍA	ALHÓNDIGA	No. 6 afuera del local la brocha			ACH	Pendiente
30/12/2019	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Tapa de registro en mal estado	MANZANARES	ROLDÁN		Esquina			ACH	Pendiente
30/12/2019	VIPP 3 Santo Domingo	Tapa de registro suelta	REPÚBLICA DE NICARAGUA	REPÚBLICA DE BRASIL		Esquina			TELMEX	Pendiente



Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Corte de transmisión

Mesa de Obras Irregulares

Balance Informativo

Logros

Se han suspendido en total 16 obras irregulares en 11 meses de trabajo (Febrero a Diciembre)

1. República de Perú 122
2. República de Bolivia 83
3. República de Bolivia 58
4. Motolinia 40
5. Eje Central 94
6. Tacuba 71
7. Nicaragua 11
8. Magnolia 162
9. Allende 25
10. Colón 1
11. Emiliano Zapata 45
12. República de Argentina 94
13. República de Argentina 96
14. Carmen 67
15. Rodríguez Puebla 25
16. 20 de Noviembre 195



República de Bolivia 58




República de Perú 122

Mesa de Obras Irregulares

Balance Informativo

Logros



Se celebraron 10 mesas de trabajo con la participación de 14 dependencias

- ACH
 - INAH
 - INBAL
 - INVEA
 - PAOT
 - FCH
 - C5
 - FEDAPUR de la PGJ
 - SGIRPC
 - Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
 - Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC
 - Alcaldía Cuauhtémoc
 - Alcaldía Venustiano Carranza
- **Se diseñó e implementó el Protocolo para Detener y/o Regularizar Obras Irregulares** para coordinar y agilizar la atención institucional a las mismas.
 - **Se diseñó la Guía de Buenas Prácticas para Intervenciones en Edificios del Centro Histórico** a fin de prevenir el desarrollo de obras irregulares por medio de la orientación a la ciudadanía y a los desarrolladores inmobiliarios.

Pendientes


- **Continuar con el seguimiento a obras irregulares** detectadas para sancionar y/o regularizar
- **Continuar con el fomento a la denuncia ciudadana**



Tacuba 71

Mesa de Obras Irregulares

Balance Informativo



Mesa de Mercados

Balance Informativo

Logros

- **Inicio de la restauración de la obra mural *Influencia de las Vitaminas* del Mercado Abelardo L. Rodríguez** en coordinación con el INBAL, SEDECO, AL. CUAUHTÉMOC y locatarios del mercado.
- **SEDECO ha visitado los 32 mercados públicos** ubicados en el Centro Histórico con la finalidad de realizar un diagnóstico y turnarlo a las Alcaldías para su atención.
- **Cambio de nombres de 4 estaciones del metrobús** para visibilizarlos más y favorecer su productividad económica.
 - ✓ **línea 4** se cambió de *Plaza San Juan* a *Mercados de San Juan*
 - ✓ **línea 7** se cambió de *Garibaldi* a *Garibaldi Mercado Lagunilla*

***En 2020 en la línea 4 se cambiarán los nombres de las estaciones *Circunvalación* a *Mercado Ampudia* y la estación *Teatro del Pueblo* a *Mercado Abelardo L. Rodríguez*.**

Mesa de Gestión Integral de Grasas, Aceites y Residuos Sólidos

Balance Informativo

Se instaló el 7 de mayo con la participación de los enlaces de las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, así como los de SEDEMA, SACMEX, SEDECO, SGIRPC, Cultura y SECTUR con la finalidad de **trabajar en el desarrollo de medidas para el abatimiento del mal manejo de residuos grasos e implementar acciones para su adecuado manejo**, en virtud de que el desecho de estos residuos dañan el sistema de drenaje, causan contaminación y pueden derivar en problemas de salud pública.

Mesa de Gestión Integral de Grasas, Aceites y Residuos Sólidos

Balance Informativo

- El 9 de agosto se realizó sesión informativa sobre el adecuado manejo de grasas dirigida a generadores agremiados en CANACO y CANIRAC.
- El 5 de noviembre se implementó programa piloto de Recolección Domiciliaria de Residuos Grasos de origen vegetal y/o animal en el mercado 2 de Abril.
- El 25 de noviembre se implementó programa piloto de Recolección Domiciliaria de Residuos Grasos de origen vegetal y/o animal en el mercado Abelardo L. Rodríguez.

En los dos casos se implementó el programa piloto en colaboración con la empresa REOIL (Autorizada por SEDEMA, las directivas y locatarios de los mercados).

Mesa de Gestión Integral de Grasas, Aceites y Residuos Sólidos

Balance Informativo



Mercado 2 de abril

Se han recolectado
en 7 semanas

31 litros
de aceite usado

Mesa de Gestión Integral de Grasas, Aceites y Residuos Sólidos

Balance Informativo

Mercado Abelardo L. Rodríguez

Se han recolectado
en 2 semanas

10 litros
de aceite usado





Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Corte de transmisión



SEDECO

MESA DE TRABAJO DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 2019 INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR SEDECO

Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2019

EL PROYECTO DENOMINADO MEJORA DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOS 329 MERCADOS PÚBLICOS DE LA CDMX, AHORA PASA AL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, GAS E HIDROSANITARIAS DE LOS 329 MERCADOS PÚBLICOS ANUNCIADO POR EL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO.

Primera Etapa: Estará integrada por los 50 mercados más grandes y de mayor afluencia que tiene la Ciudad de México.

En la Alcaldía Cuauhtémoc, de 17 grandes mercados contemplados, se revisarán del Centro Histórico (10 mercados públicos): Lagunilla Ropa y telas, Tepito (Granaditas), Tepito Fierros Viejos, Martínez de la Torre, Lagunilla Zona, Tepito Varios, Tepito Zona, Juárez, Arcos de Belem y Lagunilla Varios

En la Alcaldía Venustiano Carranza, de 11 grandes mercados contemplados, se revisarán del Centro Histórico (3 mercados públicos): Merced Nave Mayor, Merced Nave Menor y Merced Banquetón.

La primera etapa estará iniciando el 6 de enero y tomará 2 semanas en concluirse, involucrará la participación de Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como a las Alcaldías.



SEDECO

MESA DE TRABAJO DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 2019 INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR SEDECO

Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2019

Adicionalmente por parte de SEDECO/DGACyD, el 27 de diciembre del 2019, se convocó a los JUD ´S de Mercados Públicos de las Alcaldías y se entregó CIRCULAR, informando sobre “Supervisión Especial de Temporada: Romerías en mercados públicos”, que se llevará a cabo del 23 de diciembre de 2019 al 7 de enero del 2020. Así mismo se instó a las Áreas de Protección Civil de las Alcaldías, para que en coordinación con las JUD DE MERCADOS Y VÍA PÚBLICA, realicen recorridos en Mercados Públicos y se verifique que las instalaciones eléctricas sean las adecuadas y lo más apegado a la NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones eléctricas (utilización).

La Alcaldía de Cuauhtémoc, iniciará recorridos en los mercados públicos a partir del día de hoy, ya que han estado inmersos estos días en el mercado de San Cosme, por el siniestro ocurrido en días pasados. Por otra parte a la Alcaldía Venustiano Carranza, mediante oficio, el día de ayer nuevamente se le instó a realizar recorridos en los mercados públicos dentro de su demarcación.



SEDECO

Mercado la Merced. Siniestro por incendio el 24 de diciembre del 2019

Estatus al 31 de diciembre 2019

Alcaldía	Mercado	NO. OFICIAL	TEMA	PERÍODO	ACCIONES REALIZADAS
					SEDECO
Venustiano Carranza	Merced Nave Mayor	102	Siniestro por incendio	Del 17 al 31 de diciembre del 2019	<ul style="list-style-type: none"> • El 24 de diciembre a las 21:00 horas, se reporta incendio entre las puertas 17 a la 8. • Se da aviso a PC de la Ciudad de México para su atención. • Se delimita la zona de locales directamente afectados por el fuego, con un total contabilizado por SEDECO de 505 locales. • SEDECO gestiona con la STyFe el apoyo para el Seguro de Desempleo a los afectados por el siniestro. • SEDECO genera mesas de atención para CENSO de afectados en las instalaciones de la Alcaldía Venustiano Carranza. • SEDECO apoya junto con Subsecretaría de Programas de Alcaldías en la atención y orientación de locatarios afectados. • SEDECO da seguimiento en coordinación con la Subsecretaría y Secretaría de Obras y Servicios para el apoyo de camiones para sacar escombros producto del incendio. • En cuanto a la “Rehabilitación y Construcción del Mercado Nave Mayor de la Merced”, sigue su proceso, se afecta por el siniestro de incendio un área que ocupaban 58 locales entre las puertas 17 a 19, la mayoría ya tapiada por dicha obra. Derivado de dicho siniestro, se recorrerá el tapial y se reubicarán a los locatarios en Cerrada de Rosario. • SEDECO y Subsecretaría se encuentran coordinándose con PC para delimitar zonas de daños y movimiento de tapial.

SEDECO

Siniestro por incendio el 24 de diciembre del 2019 en Mercado la Merced Nave Mayor

Estatus al 31 de diciembre 2019



Apoyos para remisión de escombros

Realizando censo de locatarios afectados

Programa de revisión de la infraestructura eléctrica en Mercados

Acciones a realizar

- **Se refuerza el Programa de SEDECO en 329 mercados en coordinación con SGRyPC, CFE y las Alcaldías** derivado del siniestro que sufrieron recientemente 3 mercados (San Cosme, la Merced Nave Mayor y Abelardo L. Rodríguez)
- **Las visitas de revisión inician el 6 de enero de 2020 con 50 mercados.** Los más grandes y de mayor afluencia en concluirán en el corto plazo y la visita del resto (279 mercados) se concluirá en tres meses
- **13 mercados se ubican el Centro Histórico**
 - **10 en la Alcaldía Cuauhtémoc** (Lagunilla Ropa y telas, Tepito (Granaditas), Tepito Fierros Viejos, Martínez de la Torre, Lagunilla Zona, Tepito Varios, Tepito Zona, Juárez, Arcos de Belem y Lagunilla Varios)
 - **3 en la Alcaldía Venustiano Carranza** (Merced Nave Mayor, Merced Nave Menor y Merced Banquetón)

Programa de revisión de la infraestructura eléctrica en Mercados

Acciones a realizar

- **SEDECO** Refuerza el Programa de Revisión de la Infraestructura Eléctrica en Mercados y se revisarán los lineamientos del Reglamento de Mercados.
- **SGIRyPC** Diagnóstico integral en los mercados para determinar el Plan Integral de Riesgos para cada mercado con el fin de prevenir y mitigar riesgos. Asimismo se integrará el Comité Interno de Protección Civil de cada uno de los mercados.
- **Alcaldías.** Apoyo en las labores de diagnóstico e implementación del Plan Integral de Riesgos.
- **CFE** Están en guardia permanente las 24 horas del día para atender cualquier incidencia y prevenir los riesgos por medio de la revisión de las instalaciones eléctricas al interior y exterior de los mercados.



Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo



Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PRÓXIMA SESIÓN
14 de enero de 2020
A las 10:30 horas

Transmisión en vivo
