



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Contenido

- Reportes
- Turnos
- Incidencias urbanas



ACH

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 09/07	Semana al 16/07	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Quincenal	1,246 M3	1,242 M3	23 de julio
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Quincenal	2,422 M3	2,385 M3	23 de julio
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Quincenal	33	29	23 de julio



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Eliminación de grafiti

Calles atendidas: 33

Cortinas metálicas: 9

Fachadas: 9

M² totales: 300

***La mayoría son reincidencias**

**60
M²
de cortinas**



**200
M²
de fachadas**



**40
M²
retirados con
thiner**





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Eliminación de grafiti en inmuebles catalogados

Templo de San Miguel Arcángel


(Av. 20 de Noviembre esquina José María Izazaga)

- El primer procedimiento que se está utilizando es a base de un gel desincrustante, se deja actuar 30 minutos, se talla con cepillo de Ixtle y por último se enjuaga con agua a baja presión
- Lo estamos utilizando en la fachada poniente del Templo de San Miguel Arcángel que es principalmente de **tezontle y cantera**
- Ya se terminó de limpiar el Templo.
- Se analizará el resultado y se evaluará si se requiere otro procedimiento para eliminar la marca que queda.

Templo de Tlaxcoaque

(Plaza Tlaxcoaque)

- Se realizaron pruebas con supervisión del INAH utilizando el método de gel y el de esferas de carbonato lanzadas en espiral, estamos en espera de la respuesta del INAH.

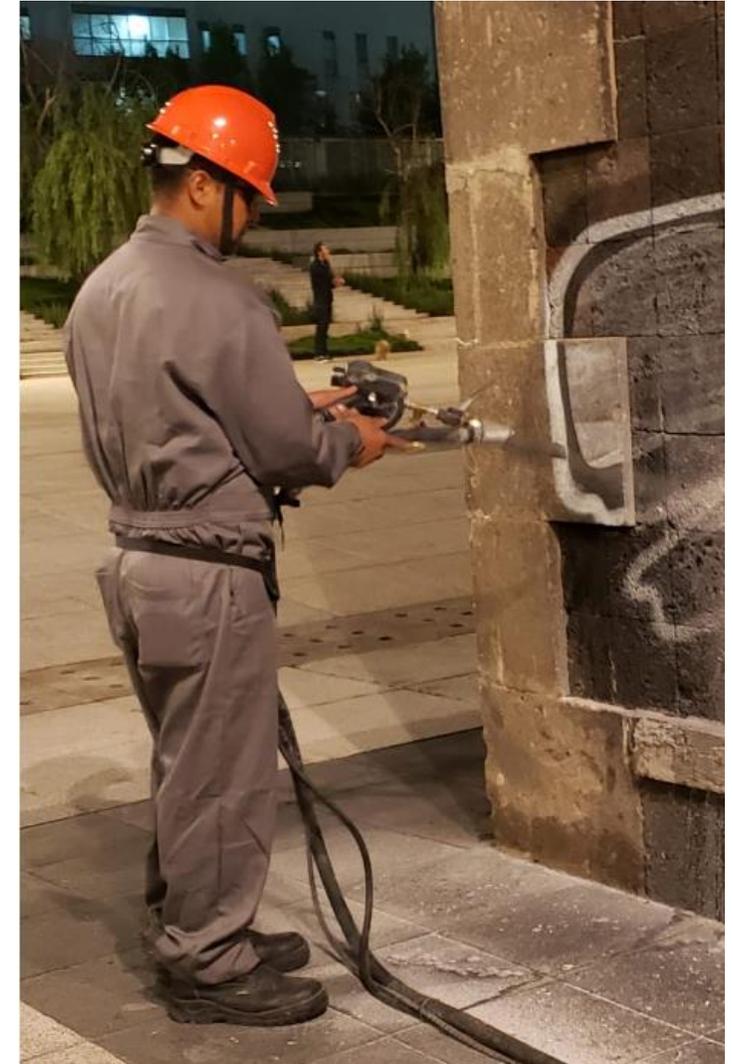



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en las calles de **Regina, Monte de Piedad, 16 de Septiembre, Allende, Mesones, República de Argentina, Motolinia y Av. Hidalgo.**

Los trabajos realizados consistieron en **reposición de registro** en Belisario Domínguez y Monte de Piedad, **reparación de banquetas** en Mesones, República de Argentina, Motolinia y Regina, reposición de bolardos en Allende, 16 de Septiembre y Motolinia, reparación de arroyo vehicular en Mesones y Av. Hidalgo, renivelación de dren en 16 de Septiembre, así como retiro de mobiliario urbano en desuso en Regina.



Dirección General de Agua Potable

SACMEX



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




SACMEX

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

AGUA POTABLE


Sustitución de tubería de 305 mm. (12"), 152 mm. (6") y 101 mm. (4") de diámetro de agua potable y Sustitución de tuberías de 0.38, 0.45 y 0.61 m. de diámetro de drenaje de polietileno de alta densidad, sobre las calles Mina, Galeana, Riva Palacio y Violeta, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.

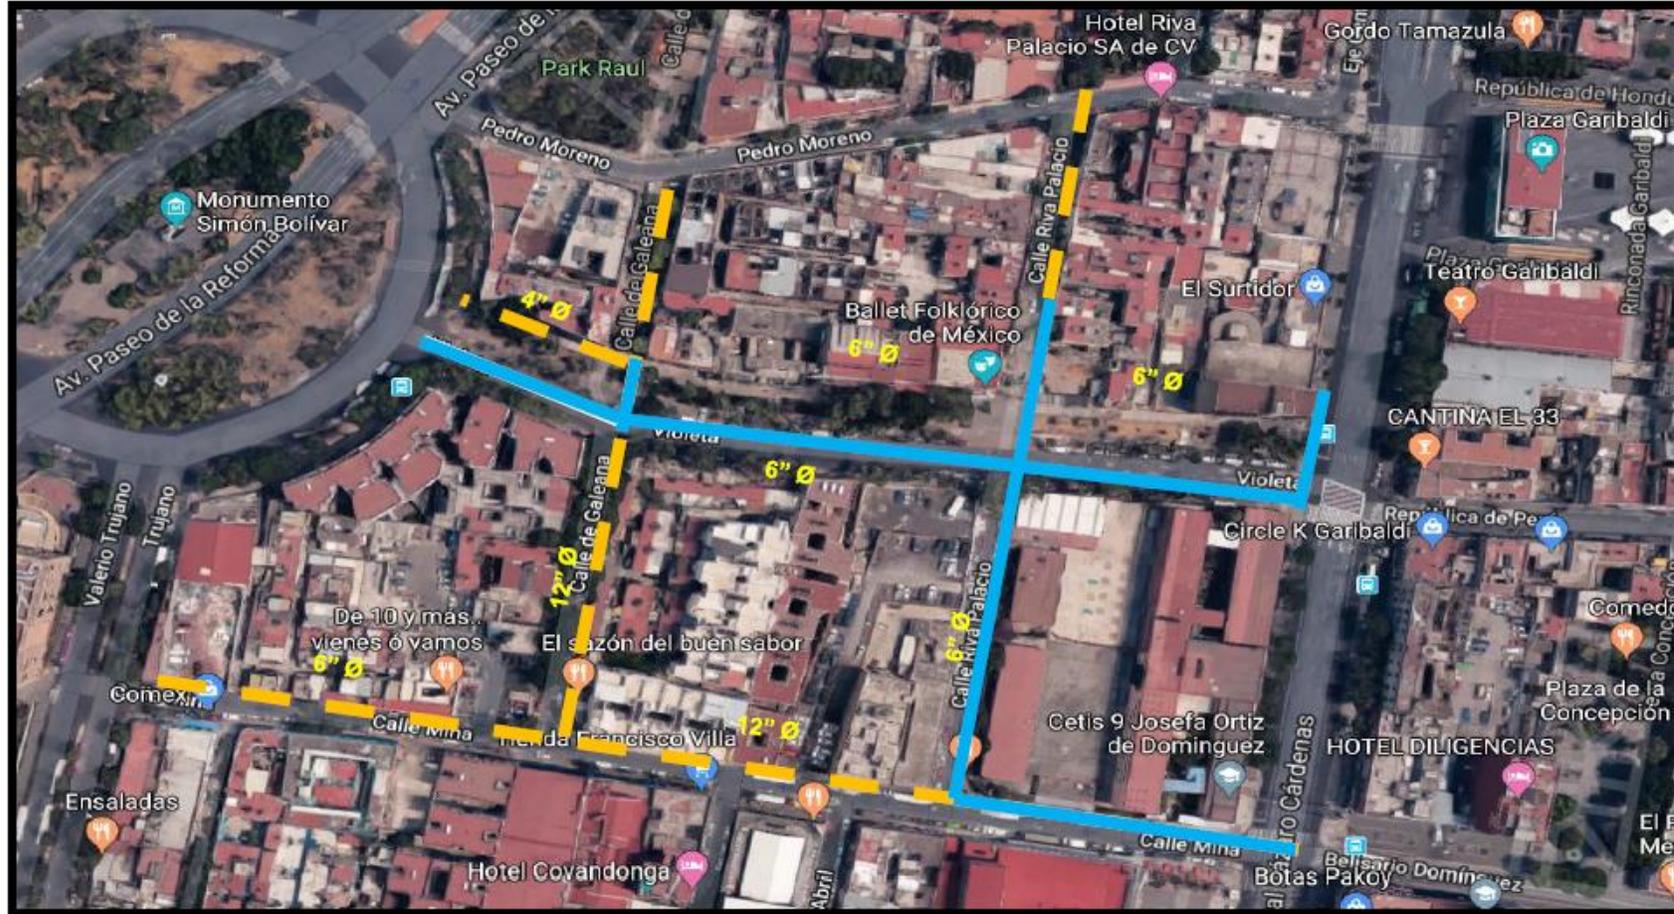

Avance físico programado:	69.68 %	Tubería Existente		1108.00 m.
Avance físico real:	31.70 %	Tubería Instalada		507.00 m.

DRENAJE

Sustitución de tubería de 305 mm. (12"), 152 mm. (6") y 101 mm. (4") de diámetro de agua potable y Sustitución de tuberías de 0.38, 0.45 y 0.61 m. de diámetro de drenaje de polietileno de alta densidad, sobre las calles Mina, Galeana, Riva Palacio y Violeta, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.

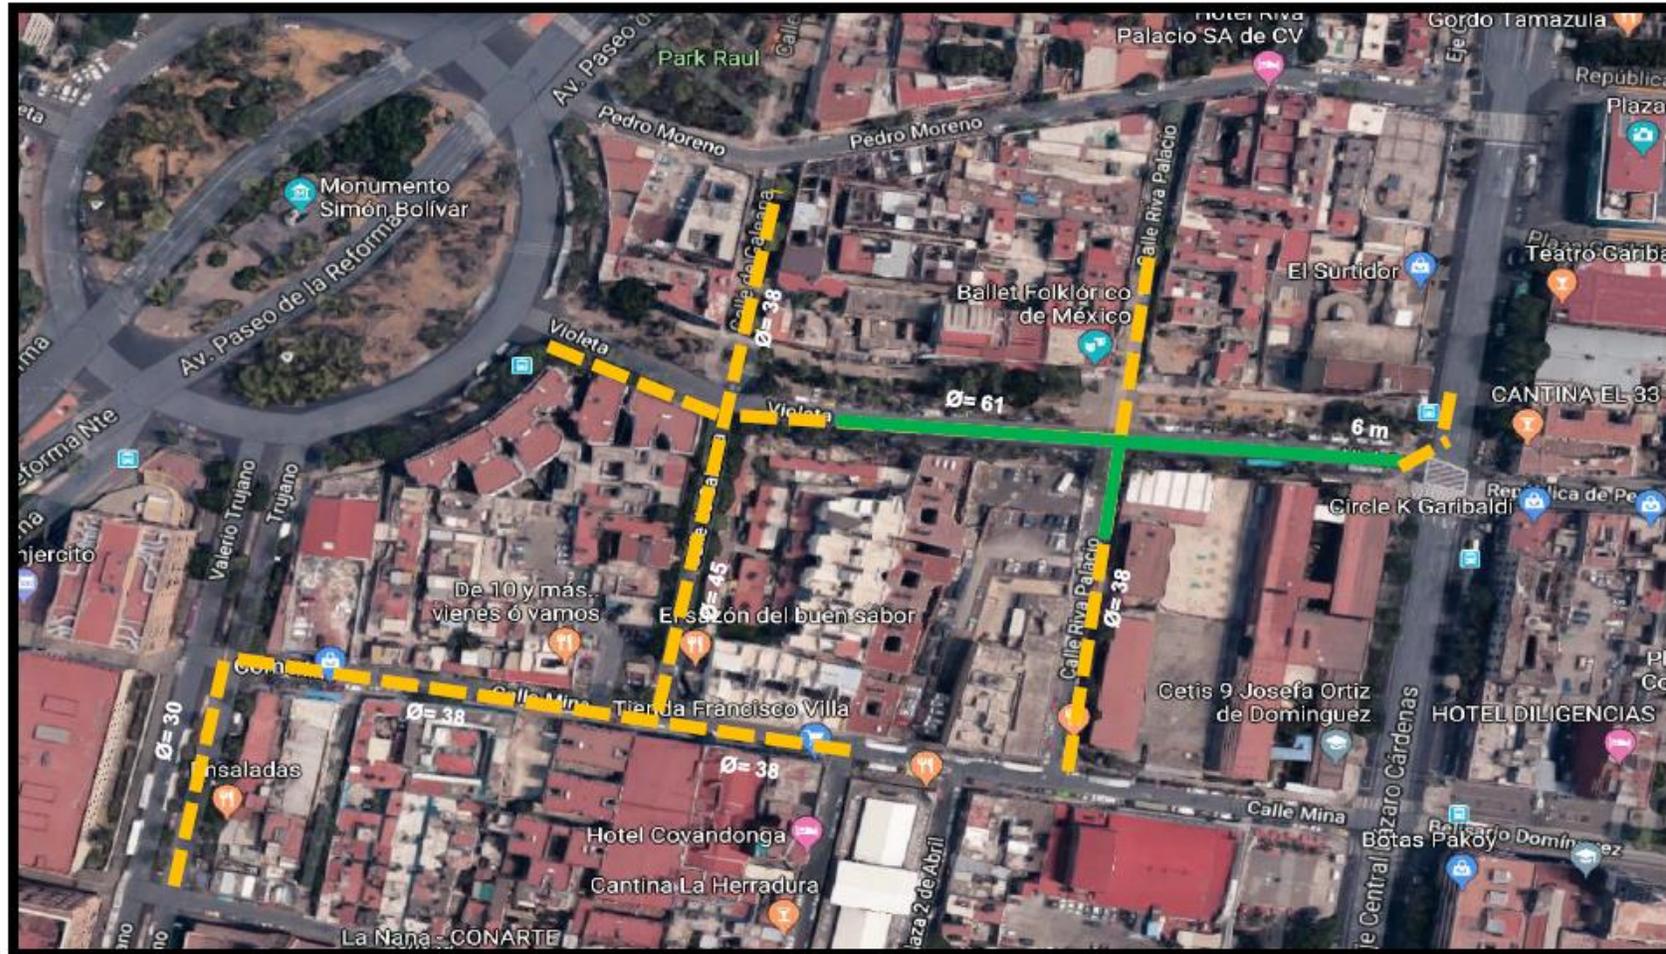

Avance físico programado: 69.68 %
 Avance físico real: 31.70 %

Tubería Existente		852.00 m.
Tubería Instalada		180.00 m.

AGUA POTABLE

Sustitución de tubería de 152 mm. (6") de diámetro de Agua Potable y Sustitución de tuberías de 0.38, 0.45 y 0.61 m. de diámetro de Drenaje de polietileno de alta densidad, sobre las calles Santa Veracruz, 2º y 3er. Callejón San Juan de Dios, Valerio Trujano, Plaza 2 de Abril, Andador Teatro Blanquita y Pensador Mexicano, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.



Avance Físico Programado	34.36%	Tubería Existente		1217.00 m.
Avance Físico Real:	25.01 %	Tubería Instalada		398.00 m.

DRENAJE

Sustitución de tubería de 152 mm. (6") de diámetro de agua potable y Sustitución de tuberías de 0.38, 0.45 y 0.61 m. de diámetro de drenaje de polietileno de alta densidad, sobre las calles Santa Veracruz, 2º y 3er. Callejón San Juan de Dios, Valerio Trujano, Plaza 2 de Abril, Andador Teatro Blanquita y Pensador Mexicano, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.




Avance Físico Programado 34.36%
 Avance Físico Real: 25.01 %

Tubería Existente		1268.00 m.
Tubería Instalada		422.00 m.

AGUA POTABLE

Sustitución de redes de agua potable y drenaje en las Colonias Centro y Guerrero. Sustitución de tubería de 152 mm (6") de diámetro de agua potable y tuberías de 0.38 m de diámetro de polietileno de alta densidad, sobre la calle Soledad entre las calles de Correo Mayor y eje 1 Ote., Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.

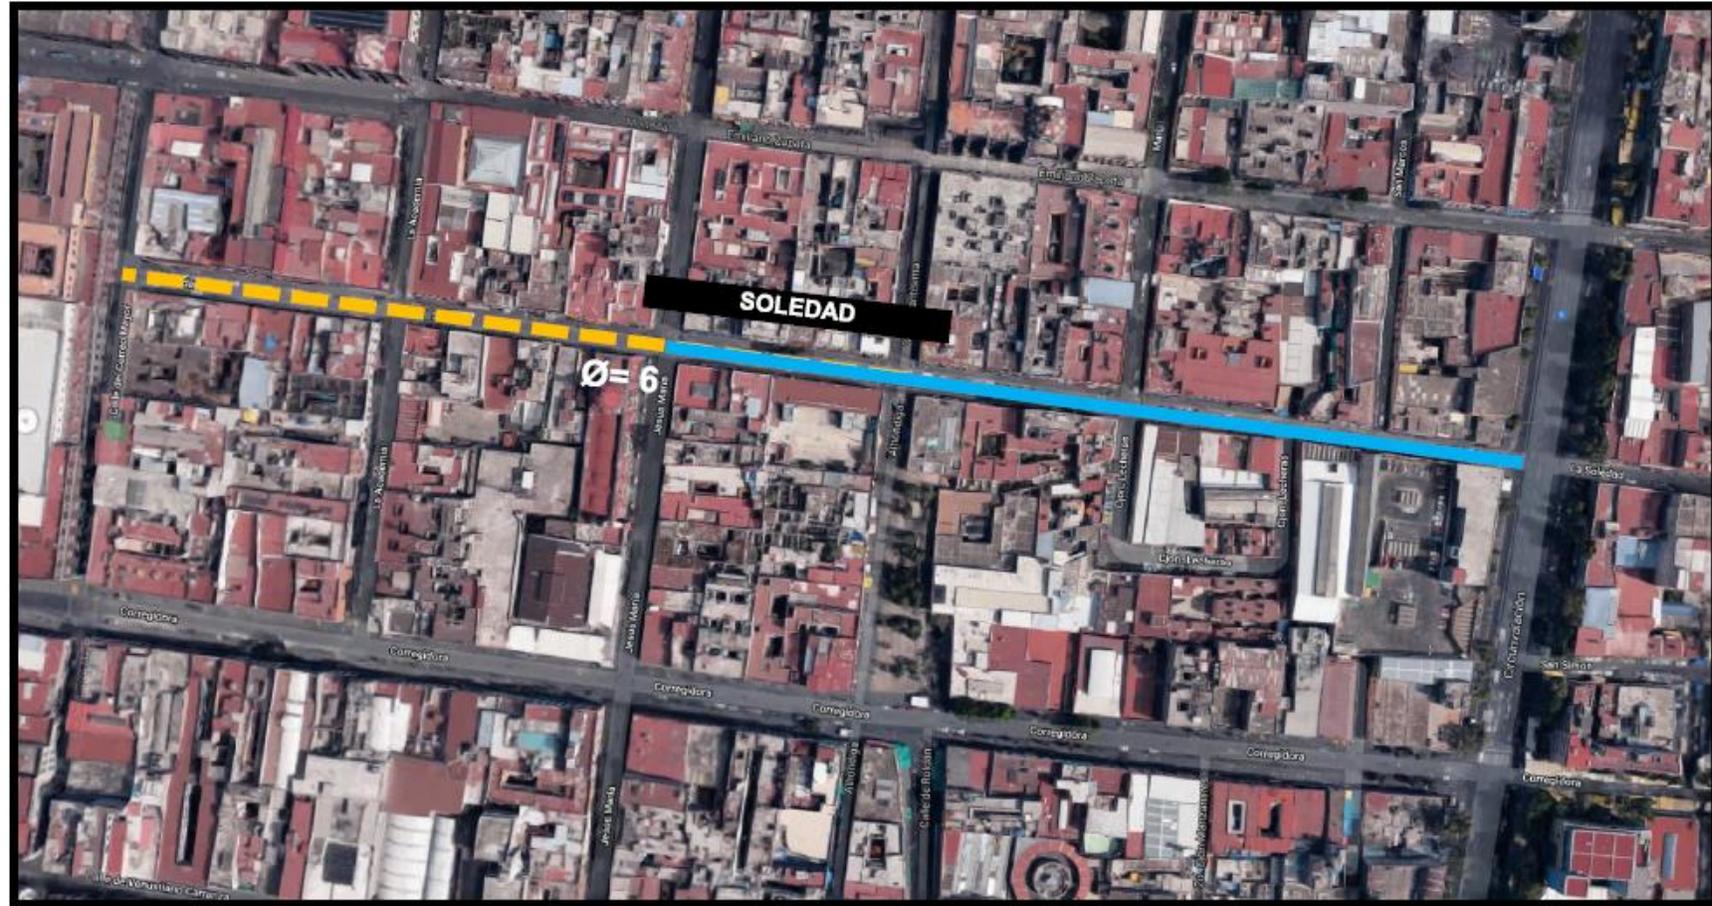

Avance físico programado:	90.80 %	Tubería Existente		572.00 m.
Avance físico real:	64.00 %	Tubería Instalada		348.00 m.

DRENAJE

Sustitución de redes de agua potable y drenaje en las Colonias Centro y Guerrero. Sustitución de tubería de 152 mm (6") de diámetro de agua potable y tuberías de 0.38 m de diámetro de polietileno de alta densidad, sobre la calle Soledad entre las calles de Correo Mayor y eje 1 Ote., Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.




Avance físico programado: 90.80 %
 Avance físico real: 64.00 %

Tubería Existente		529.00 m.
Tubería Instalada		354.00 m.

AGUA POTABLE

Rehabilitación y/o Sustitución de redes de agua potable y drenaje en las Colonias Centro y Guerrero. Sustitución de tubería de 152 mm (6") de diámetro de agua potable y sustitución de tubería de 0.38 m y 0.45 m de diámetro de drenaje de polietileno de alta densidad, sobre la Calle de Leona Vicario entre las calles de Gral. Miguel Alemán y Soledad, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.

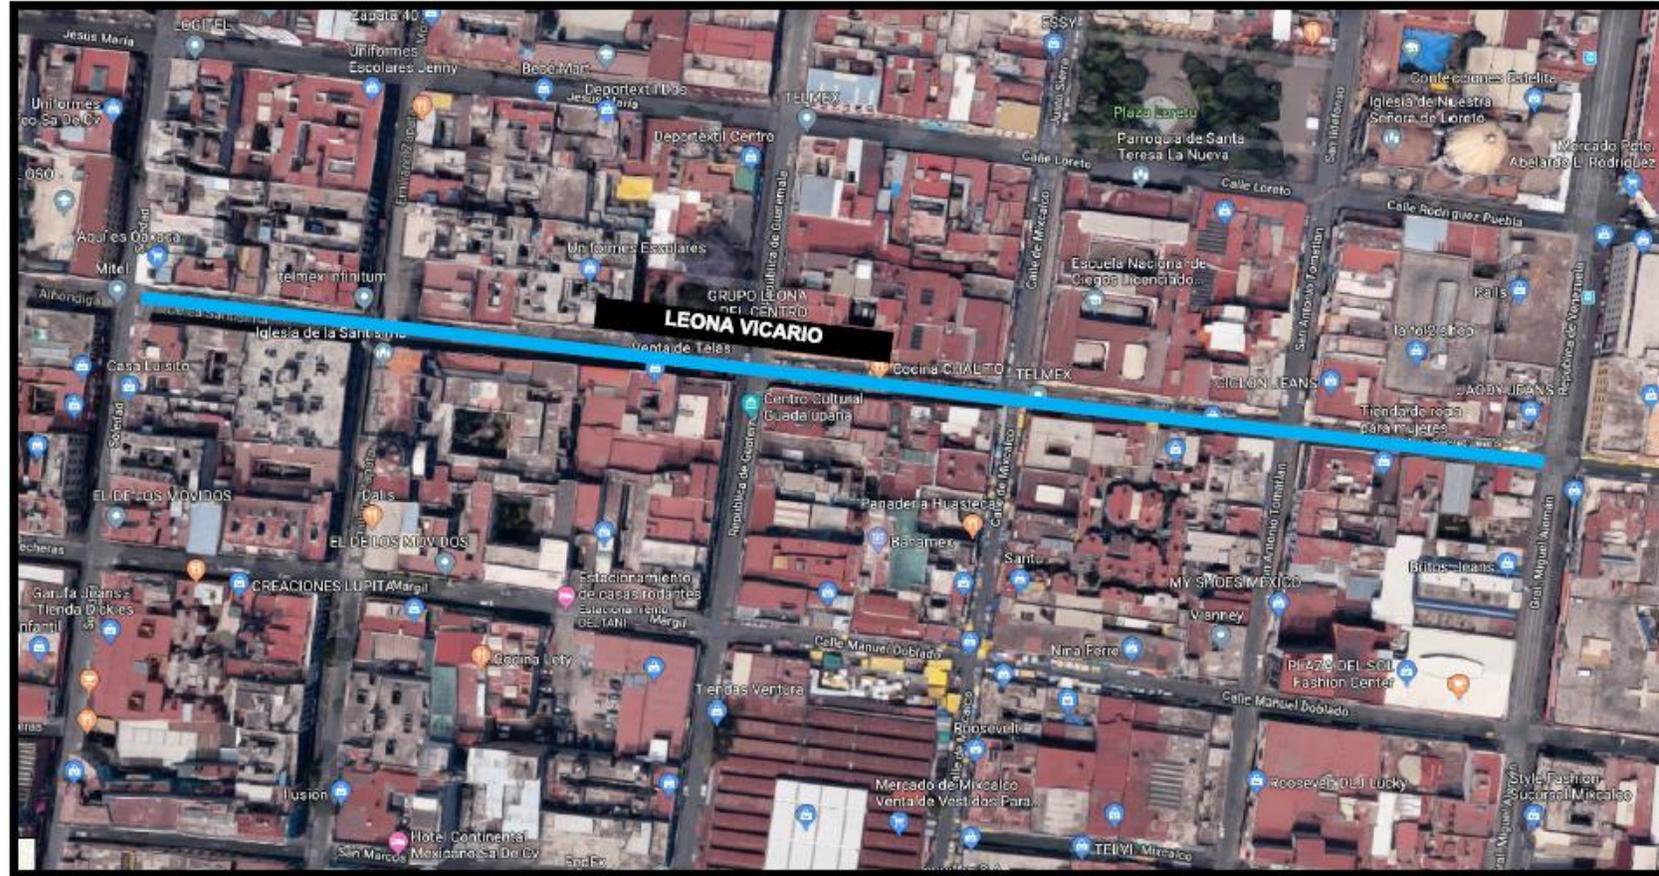

Avance físico Programado:	87.35 %	Tubería Existente		499.00 m.
Avance físico Real:	95.00%	Tubería Instalada		499.00 m.

DRENAJE

Rehabilitación y/o Sustitución de redes de agua potable y drenaje en las Colonias Centro y Guerrero. Sustitución de tubería de 152 mm (6") de diámetro de agua potable y sustitución de tubería de 0.38 m y 0.45 m de diámetro de drenaje de polietileno de alta densidad, sobre la Calle de Leona Vicario entre las calles de Gral. Miguel Alemán y Soledad, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.



Avance físico Programado: 87.35 %
Avance físico Real: 95.00%

Tubería Existente



499.00 m.

Tubería Instalada



422.00 m. (38 cm)
87.00 m (45 cm)



SOS-Alumbrado Público

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 09/07	Semana al 15/07	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	192	49	23 de julio
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	25	0	23 de julio



SOS-Alumbrado Público

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTORICO PERIMETRO A						
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
APARTADO	REP. ARGENTINA	DEL CARMEN	CENTRO	10	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LINEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO
EJE CENTRAL	VIZCAÍNAS	DE LAS VIZCAÍNAS	CENTRO	10	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LINEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO
REPÚBLICA DE COLOMBIA	CARMEN	REP DE ARGENTINA	CENTRO	10	SE RESTABLECE BREAKER	LUMINARIAS APAGADAS
REPÚBLICA DE PERÚ	REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	9	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LINEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIAS APAGADAS
BELISARIO DOMÍNGUEZ	REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	9	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LINEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO
REPÚBLICA DE PERÚ	ALLENDE	REPÚBLICA DE CHILE	CENTRO	1	SE CAMBIA BALASTRO	LUMINARIO APAGADO
			TOTAL	49		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ADIP

Tema	Línea base	Periodicidad	Reporte al 09/07	Reporte al 15/07	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura Tecnológica	Número de puntos de conexión wifi habilitados en postes de C5 (Línea base: 589)	Quincenal	114	126	23 de julio




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ADIP

Ubicación de puntos de acceso gratuito a internet WiFi vía infraestructura C5 (actuales y próximos)

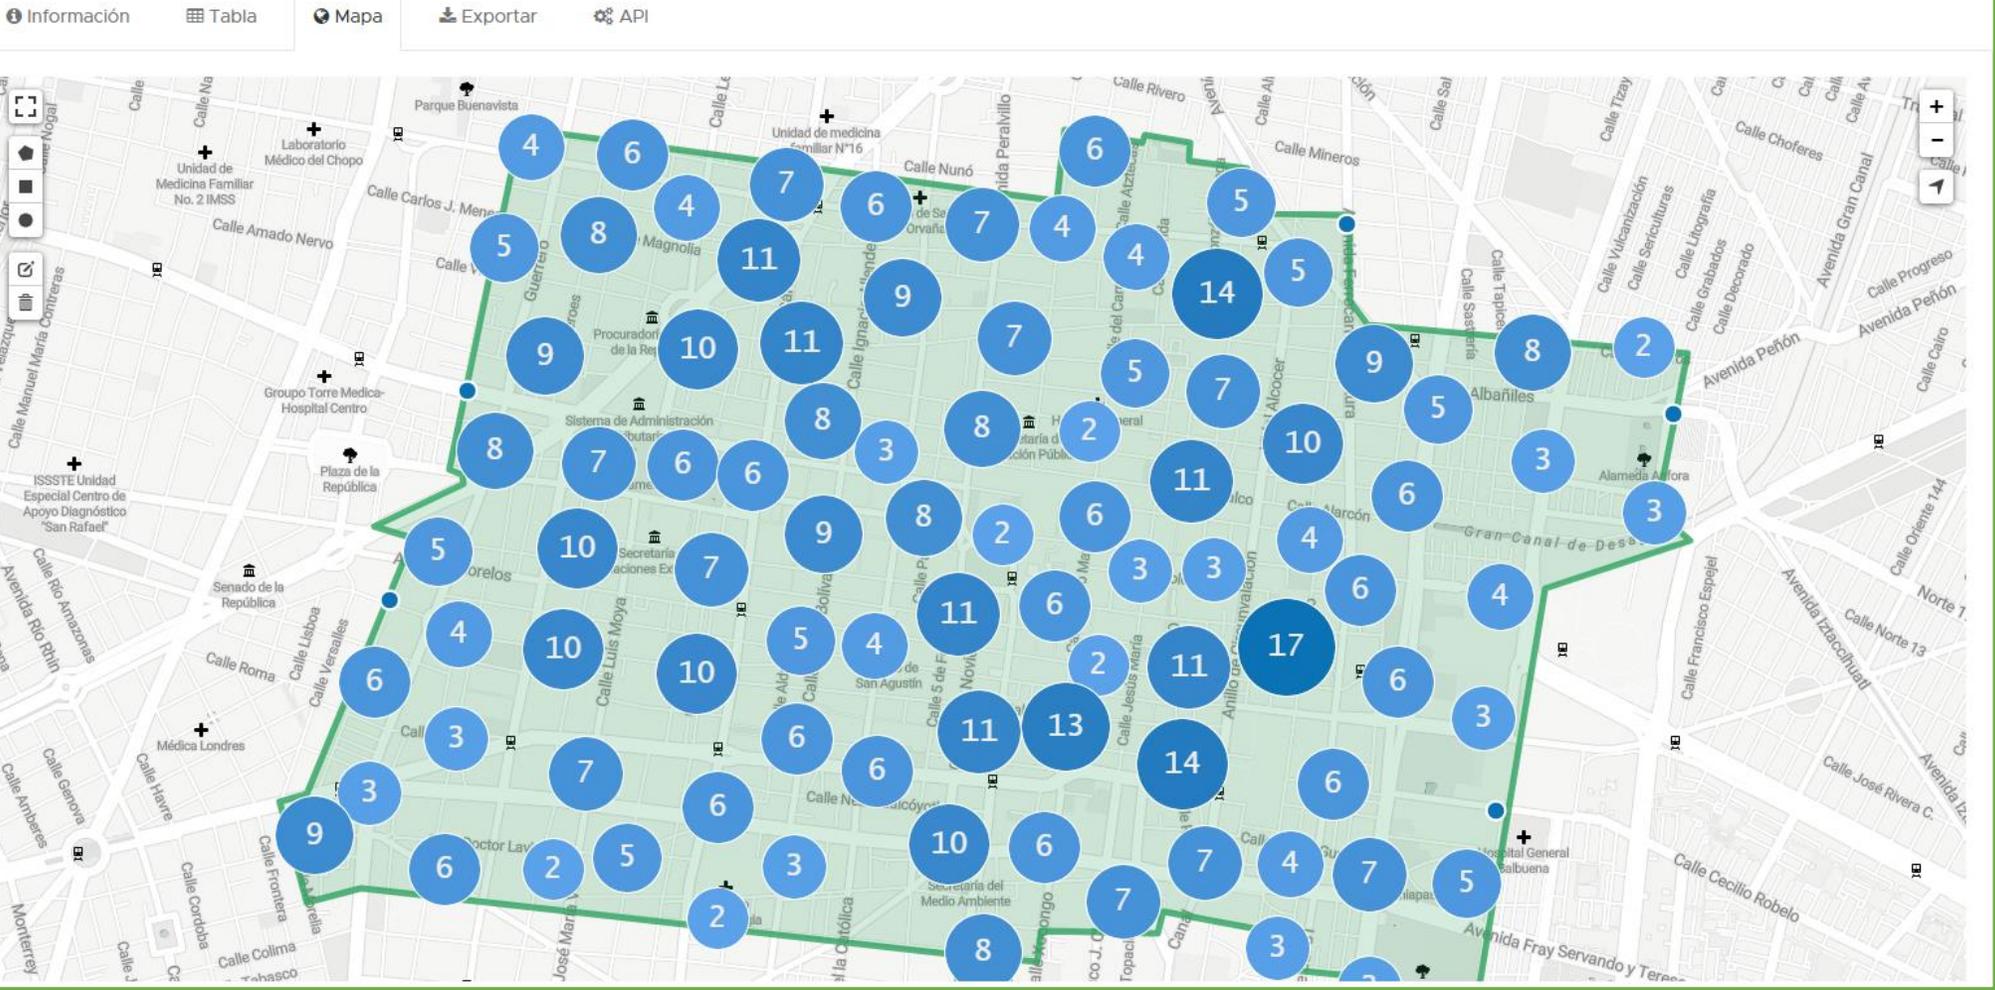



PGJ

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 16/07	Próximo reporte
Infraestructura	Número de delitos de medidores de agua	Semanal	2	23 de julio
Infraestructura	Número de delitos en robos de cableado	Semanal	1	23 de julio

No. CARPETA DE INVESTIGACION	FECHA Y HORA	DELITO	CALLE	COLONIA	SINTESIS DE LOS HECHOS
CI-FCH/CUH-4/UI-3SD/932/07-2019	11/07/2019 14:52	ROBO DE OBJETOS	CORREO MAYOR	CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 9	MANIFIESTA DENUNCIANTE QUE SUSTRAJERON EL MEDIDOR DE AGUA DE SU DOMICILIO, SIN PERCATARSE DE QUIEN LO SUSTRAJÓ NI EN QUE MOMENTO.
CI-FCH/CUH-4/UI-3SD/933/07-2019	11/07/2019 15:07	ROBO DE OBJETOS	PINO SUÁREZ	CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 9	MANIFIESTA LA DENUNCIANTE QUE POR LA MADRUGADA DEL DÍA DE HOY SUSTRAJERON SU MEDIDOR DE AGUA DE SU DOMICILIO, SIN PERCATARSE QUIEN O EN QUE MOMENTO SUSTRAJERON DICHO MEDIDOR.
CI-FCH/CUH-2/UI-3CD/5139/07-2019	15/07/2019 01:51	ROBO DE OBJETOS		CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1	POLICIA PREVENTIVO PONE A DISPOSICION A LOS HOY IMPUTADOS CON EL ANTECEDENTE DE SUSTRAR CABLE DE FIBRA OPTICA DE UN REGISTRO DE DRENAJE



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Turnos e incidencias urbanas

Corte de transmisión
PRIVADO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

Matriz de seguimiento a incidencias urbanas compilado



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Dependencia	Atendido	Pendiente	Proceso	Total general
ACH	20	41	5	66
Al. Cuauhtémoc	10	9	2	21
Al. Venustiano Carranza	4			4
C-5	2			2
CFE	23	66	4	93
IUSACELL		2		2
SACMEX	40	13	2	55
SOS-AP	38	8		46
SOS-DGOIV	1	19		20
SOS-DGOP		1		1
SOS-DGSUS		6		6
STC-METRO	3			3
TELMEX	9	18		27
Tránsito	13		2	15
(en blanco)		4		4
SEDEMA		2		2
SGIRyPC	1			1
Total general	164	189	15	368

Atención chats VIPP Incidencias Urbanas





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 09 al 15 de julio



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
09/07/2019	Registro sin tapa	Av. Hidalgo			ACH	Atendido	16/07/2019	Se rellenó registro de fibra óptica
11/07/2019	Luminarias Apagadas	República de Perú			SOS-AP	Atendido	12/07/2019	
12/07/2019	Luminaria apagada	San Jerónimo			SOS-AP	Atendido	14/07/2019	
13/07/2019	Encharcamiento de calle	Izazaga			Al. Cuauhtémoc	Atendido	13/07/2019	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 09 al 15 de julio



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
11/07/2019	Registro Roto	Correo Mayor				Pendiente		
11/07/2019	Registro Hundido	Roldan				Pendiente		
12/07/2019	Tapa CFE levantada	República de Perú			CFE	Pendiente		
12/07/2019	Pozos de visita en su capacidad máxima	San Jerónimo				Pendiente		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 09 al 15 de julio



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
11/07/2019	Falta tapa de registro	Av. Hidalgo			SACMEX	Pendiente		
13/07/2019	Reparar carpeta asfáltica	Misioneros			SOS-DGOIV	Pendiente		

INCIDENCIAS DE ATENCIÓN URGENTE CFE



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



Allende esq. Donceles



Misioneros esq. Circunvalación



Jesús María esq. Regina



Allende esq. Donceles

INCIDENCIAS DE ATENCIÓN URGENTE TELMEX



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



Santo Tomás esq. Misioneros



Misioneros entre Roldán y
Santo Tomás



Misioneros esq. Roldán



Matriz de seguimiento a turnos compilado



Dependencia	Atendido	Proceso	Pendiente	Total general
ACH	14	8		22
ADIP		1		1
Al. Cuauhtémoc	6	2		8
Al. Venustiano Carranza	2	1		3
C5	4	1		5
CFE	2	2		4
INAH	2			2
Metrobús	1			1
PGJ		1		1
SACMEX	2	2		4
SEDEMA	3			3
SGIRyPC		1		1
SOS-AP	2	1		3
SOS-DGOIV	1			1
SOS-DGSUS	2	1		3
SSC	8			8
STC-METRO	1			1
TELMEX		1		1
Tránsito	3		1	4
Total general	53	22	1	76



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

TURNOS ATENDIDOS

Del 09 al 15 de julio



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
09/07/2019	INAH	Realizar ficha con el procedimiento para remitir a instancias federales por daño a inmuebles catalogados por el INAH, que el INAH lo valide y posteriormente se comparta a SSC, hoy mismo.	ACH	Atendido	09/07/2019	Se realizó ficha, la cual validó el INAH y se compartió en el chat de Control Operativo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

TURNOS EN PROCESO

Del 09 al 15 de julio



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
09/07/2019	SOS	Vaciar el listado de los puntos detectados con robo de cable y luminarias vandalizadas y compartirlo con SSC y C5	ACH	Proceso		
09/07/2019	INBAL	Revisar con la Secretaría de Finanzas la situación de la reparación del pico del Águila del Hemiciclo a Juárez para que se les dé continuidad a su restauración.	ACH	Proceso		Arq. Jaral se reunió el 12 de julio con Luis Daniel Hernández Olivares de la Secretaría de Finanzas, informó que el proveedor del andamio está concluyendo su trámite ante ellos para quedar registrado como proveedor y lo puedan contratar.
09/07/2019	INBAL	Revisar con la Secretaría de Finanzas la situación de la reparación de la Estatua de Francisco I. Madero para que se les dé continuidad a su restauración.	ACH	Proceso		Se realizó reunión, se está en espera de nueva lista de materiales y cotización de los mismos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Próxima sesión

23 de julio de 2019, a las 10:30 horas
