



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

INICIO DE LA TRANSMISIÓN EN VIVO

26 DE FEBRERO 2019



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ORDEN DEL DÍA

- Reportes
- Temas problema / Reporte de avances
- Turnos
- Asuntos generales
- Acuerdos
- Asistencia



Reportes semanales

ACH

SACMEX

ALC. V. CARRANZA /

CUAUHTÉMOC

C5

PGJ

CFE

SOS AP / IV

SSC - POLICÍA AUXILIAR

TELMEX

Continuamos transmitiendo en vivo

Autoridad del Centro Histórico

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Semana al 19/02	Semana al 26/02	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Semanal	1,515	1,609	05 de marzo
Tiraderos clandestinos	Número de calles y/o espacios públicos recuperados de tiraderos clandestinos de cascajo en el Perímetro de la ACH (SE REPORTAN SITIOS ATENDIDOS)	Semanal	48	43	
Limpieza	Metros lineales barridos en el Perímetro de la ACH	Se atienden semanalmente 5,072,886			
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Semanal	2,163	2,252	



Autoridad del Centro Histórico

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Semana al 19/02	Semana al 26/02	Próximo reporte
Limpieza	Número de papeleras repuestas en el Centro Histórico (meta 160)	Semanal	0	0	05 de marzo
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Semanal	17	4	
Supervisión de Proyectos de intervención urbana en el Centro Histórico	Porcentaje de avances de proyectos de intervención urbana en el Centro Histórico	Mensual	Pendiente inicio de trabajos		
Señalética	Número de señalizaciones de obras públicas colocadas por la ACH en el PA	Semanal	30	0	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Autoridad del Centro Histórico

Barrido manual



Autoridad del Centro Histórico

Recolección de residuos sólidos



Autoridad del Centro Histórico

Recolección de residuos sólidos Tiraderos Clandestinos





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SACMEX

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 26/02	Próximo reporte
Coladeras / Registros	Número de coladeras y/o registros colocados (Línea base: 66)	Semanal	0	05 de marzo
Red hidráulica del CH	Porcentaje de avance de la red hidráulica del Centro Histórico	Mensual	Se comunica por oficio falta de autorización presupuestal para los trabajos	05 de marzo




SACMEX

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 26/02	Próximo reporte
Desazolve de red. Perímetro "A" y "B"	Red secundaria de drenaje desazolvada del Perímetro "A" y "B" Línea base Atarjeas: 38,455 ml Pozo de visita: 770 pzas Rejilla de piso: 361 pzas Coladera pluvial: 408 pzas Albañal: 3,843 ml	Semanal	Atarjeas: 32,243 ml	05 de marzo
			Pozos de Visita: 551 pzas	
			Rejilla de Piso: 358 pzas	
			Coladeras Pluviales: 340 pzas	
			Albañal: 3,323 ml	



SACMEX

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN AVANCE DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE CENTRO HISTORICO

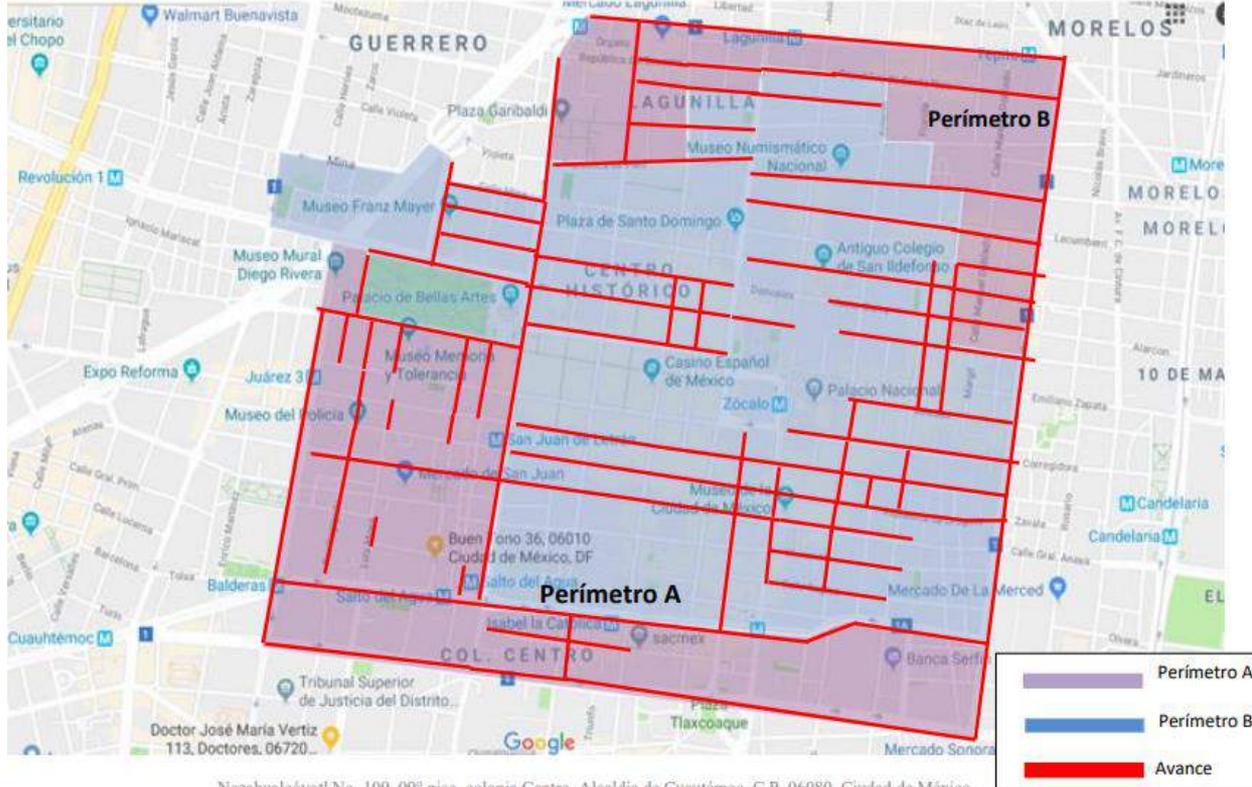

Nezahualcóyotl No. 109, 09º piso, colonia Centro, Alcaldía de Cuauhtémoc, C.P. 06080, Ciudad de México,
Tel. 5130 4444 ext. 1947 y 1949

Semana del 19/02 al 25/02



Alcaldía Venustiano Carranza

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Semana al 26/02	Observaciones
Tiraderos clandestinos	Número de calles y/o espacios públicos recuperados de tiraderos clandestinos de desechos sólidos en el PB de VC	Semanal	26 (30.2 ton)	Se recolectaron 30.2 toneladas de Residuos sólidos
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias en PB de la VC	Semanal	25	
Barrido	Metros lineales barridos en vías secundarias del PB de VC	Semanal	119,000	
Recolección de Residuos Sólidos	Metros cúbicos de residuos sólidos recolectados en el PB de VC	Semanal	2,528.68	La recolección corresponde a 200.2 metros cúbicos del Mercado de Sonora, 1,617 metros cúbicos del Mercado Merced, 246.4 metros cúbicos de Recolección Domiciliaria y 465.08 metros cúbicos corresponden a tiraderos
Liberación de cámaras del C-5	Número de cámaras del C-5	Semanal	0	Avance del 34 % de las 129 cámaras del C5 que solicitaron liberar (44 cámaras liberadas).



RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACOZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.5	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.5	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.5	S-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	1.8	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	S-9



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Alcaldía Venustiano Carranza

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	0.4	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	2	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	2.5	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	0.3	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	0.2	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	0.3	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	3	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.2	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	3.1	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	3	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.4	S-9




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Alcaldía Venustiano Carranza

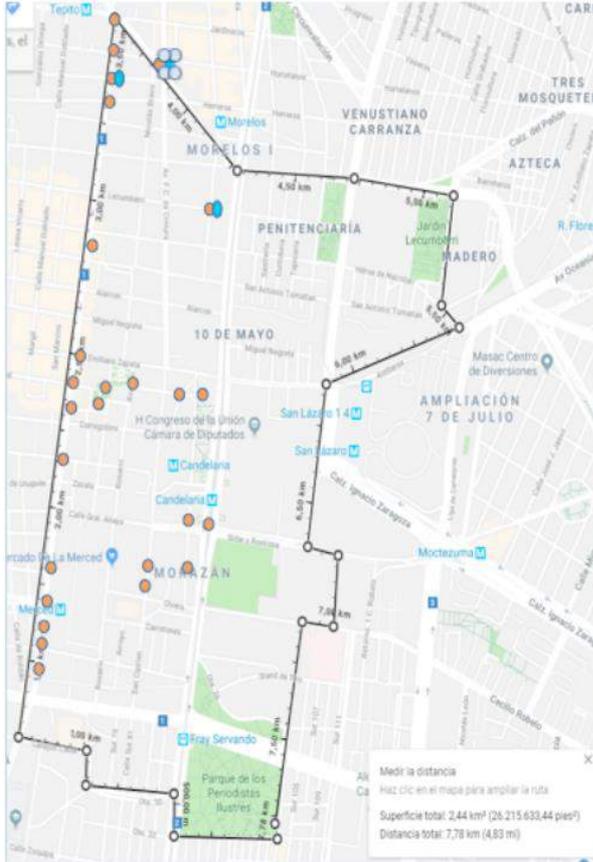

Montón Tradicional



Recolección de cascajo



Semana del 19/02 al 25/02



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

Alcaldía Cuauhtémoc



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

COORDINACION TERRITORIAL CENTRO HISTÓRICO

SERVICIOS DE OBRA								
No.	TIPO DE OBRA	METRAJE O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AVANCE %	CANTIDAD DE MATERIAL UTILIZADO	UBICACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO	PERIODO DE EJECUCION	JORNADAS DE TRABAJO
1	RETIRO DE ESCOMBRO EN VIA PÚBLICA	M3	12 COSTALES	100%		BÓLIVAR ENTRE NEZAHUALCOYOTL Y IZAZAGA	12/02/20129	1
2	RETIRO DE ESCOMBRO EN VIA PÚBLICA	M3	4M3	100%		REP DE ARGENTINA ESQ. REP DE COSTARICA	12/02/20019	1
3	DESAZOLVE	REGISTROS	7	100%		ROLDAN # 127 G-102 ENTRE PTE. DE STO. TOMAS Y FRAY SERVANDO	14/520/2019	0.5



COORDINACION TERRITORIAL CENTRO HISTÓRICO

SERVICIOS DE OBRA								
No.	TIPO DE OBRA	METRAJE O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AVANCE %	CANTIDAD DE MATERIAL UTILIZADO	UBICACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO	PERIODO DE EJECUCION	JORNADAS DE TRABAJO
4	DESAZOLVE	SONDEO	50MTS	100%		ROLDAN # 127 G-102 ENTRE PTE. DE STO. TOMAS Y FRAY SERVANDO	14/520/2020	0.25
5	DESAZOLVE	AZOLVE	2	100%	COSTALES	ROLDAN # 127 G-102 ENTRE PTE. DE STO. TOMAS Y FRAY SERVANDO	14/520/2021	0.25
6	RETIRO DE ESCOMBRO AL INTERIOR DEL PREDIO	M3	12	100%	COSTALES	ROLDAN # 127 ENTRE PTE. DE STO. TOMAS Y FRAY SERVANDO	15/02/2019	1



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

Alcaldía Cuauhtémoc



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

COORDINACION TERRITORIAL CENTRO HISTÓRICO

SERVICIOS DE OBRA								
No.	TIPO DE OBRA	METRAJE O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AVANCE %	CANTIDAD DE MATERIAL UTILIZADO	UBICACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO	PERIODO DE EJECUCION	JORNADAS DE TRABAJO
7	DESAZOLVE	COLADERAS PLUVIALES	5	100%		ORGANO ENTRE EJE CENTRAL Y ALLENDE	19/02/2019	25
8	DESAZOLVE	ALBAÑAL	4MTS	100%		ORGANO ENTRE EJE CENTRAL Y ALLENDE	19/02/2019	0.15
9	DESAZOLVE	REJILLAS	3	100%		ORGANO ENTRE EJE CENTRAL Y ALLENDE	19/02/2019	0.1



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

Alcaldía Cuauhtémoc



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

COORDINACION TERRITORIAL CENTRO HISTÓRICO

SERVICIOS DE OBRA

No.	TIPO DE OBRA	METRAJE O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AVANCE %	CANTIDAD DE MATERIAL UTILIZADO	UBICACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO	PERIODO DE EJECUCION	JORNADAS DE TRABAJO
10	DESAZOLVE	SONDEANDO	2MTS	100%		ORGANO ENTRE EJE CENTRAL Y ALLENDE	19/02/2019	0.25
11	DESAZOLVE	AZOLVE	3	100%	COSTALES	ORGANO ENTRE EJE CENTRAL Y ALLENDE	19/02/2019	0.25
12	DESAZOLVE ENTRAMO CALLE	COLADERAS DE BANQUETA	7	100%		CJON DE VAQUITA ENTRE REP DE HONDURAS Y REP DE ECUADOR	20/02/2019	1



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Alcaldía Cuauhtémoc

COORDINACION TERRITORIAL CENTRO HISTÓRICO

SERVICIOS DE OBRA								
No.	TIPO DE OBRA	METRAJE O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AVANCE %	CANTIDAD DE MATERIAL UTILIZADO	UBICACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO	PERIODO DE EJECUCION	JORNADAS DE TRABAJO
13	DESAZOLVE AL EXTERIOR	SOLICITO EL VACTOR NO LAS BARRILLAS YA QUE LA RED PRINCIPAL ESTA OBSTRUIDA		100%		HEROES DE GRANADITAS # 131 ENTRE MANUEL DOBLADO Y VIDAL ALCOECER	21/02/2019	1
14	DESAZOLVE ENTRAMO CALLE	REGILLA	1	100%		HEROES DE GRANADITAS # 131 ENTRE MANUEL DOBLADO Y VIDAL ALCOECER	21/02/2019	0.25
15	DESAZOLVE ENTRAMO CALLE	SONDEO	40MTS	100%		HEROES DE GRANADITAS # 131 ENTRE MANUEL DOBLADO Y VIDAL ALCOECER	21/02/2019	0.25



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

Alcaldía Cuauhtémoc



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

COORDINACION TERRITORIAL CENTRO HISTÓRICO

SERVICIOS DE OBRA								
No.	TIPO DE OBRA	METRAJE O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AVANCE %	CANTIDAD DE MATERIAL UTILIZADO	UBICACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO	PERIODO DE EJECUCION	JORNADAS DE TRABAJO
16	DESAZOLVE ENTRAMO CALLE	AZOLVE	6	100%	COSTALES	HEROES DE GRANADITAS # 131 ENTRE MANUEL DOBLADO Y VIDAL ALCOGER	21/02/2019	0.25
17	DESAZOLVE	COLADERAS PLUVIALES	1	100%		REP DE HONDURAS # 59 ENTRE COMONFORT Y REP DE BRASIL	21/02/2019	0.5
18	DESAZOLVE	SONDEO	10MTS	100%		REP DE HONDURAS # 59 ENTRE COMONFORT Y REP DE BRASIL	21/02/2019	0.258
19	DESAZOLVE	AZOLVE	4	100%	COSTALES	REP DE HONDURAS # 59 ENTRE COMONFORT Y REP DE BRASIL	21/02/2019	0.25
20	DESAZOLVE	COLADERA DE BANQUETA	1	100%		JUSTO SIERRA # 41 ENTRE EL CARMEN Y LORETIO	21/02/2019	5
21	DESAZOLVE	SONDEANDO	6MTS	100%		JUSTO SIERRA # 41 ENTRE EL CARMEN Y LORETIO	21/02/2019	0.5



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

Alcaldía Cuauhtémoc



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

COORDINACION TERRITORIAL CENTRO HISTÓRICO

SERVICIOS DE OBRA								
No.	TIPO DE OBRA	METRAJE O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AVANCE %	CANTIDAD DE MATERIAL UTILIZADO	UBICACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO	PERIODO DE EJECUCION	JORNADAS DE TRABAJO
22	DESAZOLVE	COLADERAS DE BANQUETA	3	100%		REP DE NICARAGUA TRAMO CALLE ENTRE REP DE ARGENTINA Y REP DOMINICANA	21/02/2019	0.5
23		SONDEO	3MTS	100%		REP DE NICARAGUA TRAMO CALLE ENTRE REP DE ARGENTINA Y REP DOMINICANA	21/02/2019	0.25
24		AZOLVE	2	100%	COSTALES	REP DE NICARAGUA TRAMO CALLE ENTRE REP DE ARGENTINA Y REP DOMINICANA	21/02/2019	0.25



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

Alcaldía Cuauhtémoc



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

COORDINACION TERRITORIAL CENTRO HISTÓRICO

SERVICIOS DE OBRA

No.	TIPO DE OBRA	METRAJE O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AVANCE %	CANTIDAD DE MATERIAL UTILIZADO	UBICACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO	PERIODO DE EJECUCION	JORNADAS DE TRABAJO
25	DESAZOLVE	REGISTRO	1	100%	SE REALIZO EL DESAZOLVE DEL REGISTRO AL INT DEL PREDIO SIN PODER RESOLVER YA QUE ESTA DAÑADO EL ALBAÑAL	SAN PABLO ENTRE TOPACIO Y ROLDAN	21/02/2019	1



CFE

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	al 26/02	Próximo reporte
Coladeras y/o registros colocados	Número de coladeras y/o registros colocados que afectan la red eléctrica	Semanal	8	05 Marzo
Cortes de energía eléctrica	Número de atenciones de emergencias por falta de energía eléctrica que implique rompimiento de banquetas o de arroyo vehicular	Mensual	27	05 Marzo (Febrero 19)
Red eléctrica del Centro Histórico	Porcentaje de avance de actualización de la red eléctrica del Centro Histórico	Mensual	99.5%	



SOS - AP

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Al 26/02	Próximo reporte
Proyecto de intervención urbana en el Centro Histórico	Porcentaje de avance de intervención urbana	Mensual	- -	05 Marzo
Alumbrado Público	Número de puntos de luz (PDL) atendidos y reparados en zona de contrato PPS (Censo sin finalizar de 3, 549)	Semanal	130 Perímetro A 59 Perímetro B	
Alumbrado Público	"Puntos de luz (PDL) en iluminación artística atendidos (Censo de 3, 500)"	Mensual	- -	05 Marzo



SOS - Infraestructura Vial

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Al 19/02	Al 26/02	Próximo reporte
Obras de infraestructura vial	Porcentaje de avance de obra de los cruces seguros en el CH	Semanal	38.50%	89.88%	05 de marzo



SOS - Infraestructura Vial

Intersección	Avance
Eje 1 A Sur José María Izazaga-José María Pino Suárez	100.00%
Eje Central Lázaro Cárdenas-Calle Vizcaínas	90.00%
Eje Central Lázaro Cárdenas-Eje 1 A Sur-José María Izazaga-Arcos de Belén	69.50%
José María Pino Suárez-Venustiano Carranza	100.00%



Reportes quincenales

Continuamos transmitiendo en vivo



METRO

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Al 26/02	Próximo reporte
Infraestructura	Número de escaleras electromecánicas reparadas (Línea base: 75/29 estaciones)	Quincenal	1	05 de marzo
Infraestructura	Número de elevadores reparados (Línea base: 19/29 estaciones)	Quincenal	2	



METRO

Mesa de infraestructura – Autoridad del Centro Histórico Informe del 11 al 24 de febrero de 2019.

Tipos de equipos	Equipos en Estaciones del Metro en el Centro Histórico			
	Total instalados	Reporte de fallas	Reparados	En operación
Elevadores	19	1	1	18
Escaleras electromecánicas	75	2	2	74



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes mensuales

SSC-Preventiva
(Cuauhtémoc / V. Carranza)

INAH

CULTURA

INBAL (Reporta hoy)

INVI

ILIFE

METROBÚS

SEDEMA

SEDUVI

FCH

ADIP

Continuamos transmitiendo en vivo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

INBAL

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	05/02	Observaciones
Obras y proyectos de intervención urbana	Número de solicitudes atendidas o ingresadas para diversas intervenciones en Centro Histórico	Mensual	26	Total de solicitudes ingresadas 26 <ul style="list-style-type: none"> • 19 Solicitudes de información • 7 Solicitud de obras menores • 0 Solicitudes de obras mayores
Obras y proyectos de intervención urbana	Número de recomendaciones técnicas	Mensual		
Obras y proyectos de intervención urbana	Número con visto bueno	Mensual		
Obras y proyectos de intervención urbana	Número con respuesta NO viable	Mensual		



Reportes por definir

SSC-Tránsito
INVEA

SEMOVI
SCIRPC

Continuamos transmitiendo en vivo



Temas problema

Corte de Transmisión
PRIVADO

Mercado de Artesanías y Curiosidades Mexicanas de San Juan

Coordina	Dependencias que participan	Reuniones celebradas
Autoridad del Centro Histórico	SOS, SEDECO, FCH, ACH y Secretaría de Cultura	1ra: 11 de enero 2da: 25 de enero

Avances:

- Fue enviada nota informativa del status al comisionado para la reconstrucción donde se evaluará factibilidad de aportación de recurso

Pendientes:

- La ACH solicitará por escrito al consejo de admon. de SERVIMET que se considere la asignación de recursos para el pago del proyecto ejecutivo

Obras Irregulares (mesa nueva)

Coordina	Dependencias que participan	Fecha de próxima Reunión
Autoridad del Centro Histórico	SEDUVI, INAH, INBAL, FCH, AL. CUAUTHÉMOC, AL. V. CARRANZA, INVEA, CULTURA, PAOT, SEDEMA, SGIRPC, SSC, C5, PGJ (FEDAPUR)	Jueves 07 de marzo a las 13:00 hrs. en ACH

Avances:

- Reunión celebrada el 22 de febrero
- Cultura presenta seguimiento Del Carmen 69 (Taquito)

Pendientes:

- Se actualizará información de 5 obras irregulares
- Se realizará ruta crítica predio Santo Tomás 28

Secretaría de Cultura

MESA DE INFRAESTRUCTURA - AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO		
Temas de problemática compleja: OBRA SIN AUTORIZACIÓN EN EL CARMEN 69 "EL TAQUITO"		
Entidad	SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	
Autoridades que confluyen en el avance del tema	<ul style="list-style-type: none"> - Secretaría de Cultura de la Ciudad de México - Autoridad del Centro Histórico - Instituto Nacional de Antropología e Historia – CNMH - Alcaldía Cuauhtémoc - Secretaría de Seguridad Ciudadana - Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México - C-5 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX - INVEA 	
Descripción del problema	<p>Con fecha 14 de febrero de 2019 se recibió un oficio en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en donde se informa sobre la ejecución de obras al interior del inmueble que pudieran estar afectando la estructura del mismo. Al 23 de febrero se continúan haciendo obras en el lugar afectando la fachada, según lo denunciado por el propietario del inmueble.</p> <p>Se presentó una queja ante la ventanilla de Atención Ciudadana y a la fecha el propietario no ha tenido respuesta.</p>	
Ruta de trabajo (Plan General)	Paso	Dependencia responsable
	Verificación por parte de las autoridades	INAH, INVEA, Alcaldía Cuauhtémoc,
	Vigilancia	Procuraduría General de Justicia de la CDMX
		Secretaría de Seguridad Ciudadana
		C5



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Secretaría de Cultura

EL CARMEN 69, RESTAURANTE “EL TAQUITO”
25 de febrero de 2019





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Secretaría de Cultura

EL CARMEN 69, RESTAURANTE “EL TAQUITO”

25 de febrero de 2019





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Secretaría de Cultura

EL CARMEN 69, RESTAURANTE “EL TAQUITO”

25 de febrero de 2019





Robo de tapas y coladeras

Coordina	Dependencias que participan	Reuniones celebradas
Autoridad del Centro Histórico	SACMEX, CFE, Alumbrado Público, SOS, PGJ-CUH, C5, Policía Auxiliar, FCH y ACH	1ra: 14 de enero 2da: 23 de enero 3ra: 30 de enero

Avances:

- Presentación de campaña

Pendientes:

- Seguimiento expediente procuradora



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Turnos

**Se solicita apoyo a SSC para prevenir incidencia de
tiraderos clandestinos mediante oficio
ACH-DEPPMCCH-065-2019**

***Corte de Transmisión*
PRIVADO**



Asuntos generales

Corte de transmisión en vivo
PRIVADO




AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

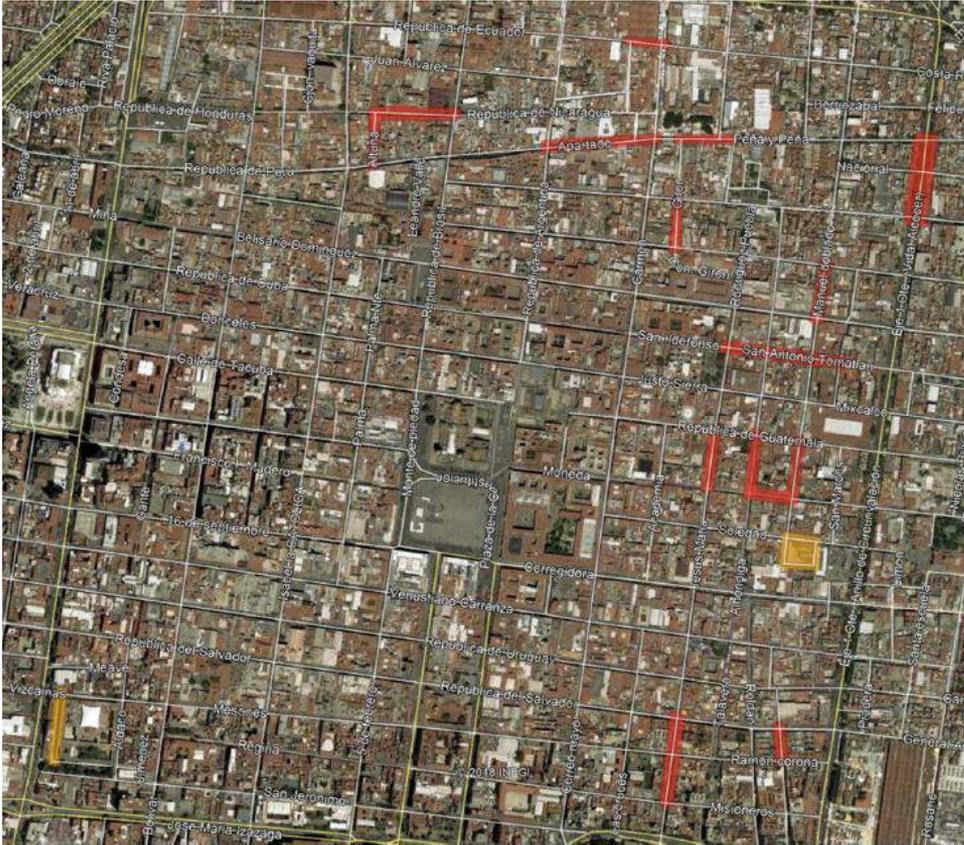

Zonas de riesgo y problema para dar mantenimiento al alumbrado público



Extorsión, a los operadores les piden dinero para dejarles efectuar su trabajo



Zonas cerradas con reja o cadena sin acceso para dar el mantenimiento



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

PROYECTOS DE INTERVENCIÓN URBANA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACCIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL 5 DE FEBRERO DE 2019

Avances Técnicos

Trabajo Interinstitucional:

- **7 febrero** Reunión con Dirección de obras de SACMEX y SOS para compartir especificaciones técnicas y calendarios de ejecución.
- **12 de febrero** Reunión con el Titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para presentar la cartera de proyectos de intervención en el Centro Histórico y definir la ruta de autorización de los recursos de crédito.
- **13 de febrero** Taller de revisión del estudio de movilidad en SEMOVI para presentación preliminar de micro simulaciones Av. Hidalgo y avance del proyecto conceptual
- **13 de febrero** Presentación ante el INAH de los proyectos conceptuales de intervención por parte de ACH, SOS y SACMEX
- **14 de febrero** Presentación ante SEDUVI de los proyectos conceptuales de intervención por parte de la ACH, SOS y SACMEX
- **19 de febrero** Reunión con el Titular de SEMOVI para revisión de avance del estudio de movilidad de AV. Hidalgo
- **22 de febrero** instalación de la mesa interinstitucional de seguimiento a las obras de intervención
- **27 de febrero Recorrido de obra 1: La Antigua Merced**
09:00 de la mañana en la esquina de Soledad y Correo Mayor
- **28 de febrero Recorrido de obra 2: Santa María La Redonda**
09:00 de la mañana en Plaza Santa Veracruz

Avances Sociales

Comercio en Vía Pública:

- **21 febrero** Entrega de **Estudio sobre estado y uso de Plazas Populares del Centro Histórico** (con base en un listado de 52 plazas se realizó un análisis general del espacio subutilizado, este estudio arrojó que existen 76 niveles disponibles, que representan 64 mil m2, es decir, el 45% del espacio disponible de la Plazas Populares del Centro Histórico se encuentra subutilizados).

Integración Comunitaria y Social:

- **6 de febrero** Recorrimos el barrio de Santa María la Redonda con vecinos y representantes de los museos Franz Mayer, Museo Nacional de la Estampa, Centro Cultural La Nana, trabajadores del SAT, Teatro Hidalgo y Templo de Santa María la Redonda **para identificar problemas del entorno urbano**
- **8 y 15 de febrero** Dentro del programa “Viernes de Museo” **con los vecinos del barrio Santa María la Redonda** se visitaron el Museo Kaluz y el Museo Nacional de la Estampa
- **11 de febrero** Reunión con la Directora General de México Unido contra la Delincuencia para conocer su propuesta social en la zona de intervención “Santa María la Redonda” y “La Antigua Merced” para la **regeneración de tejido social y empoderamiento de la ciudadanía con la formación de residentes líderes replicadores de la cultura de paz y la no violencia.**
- **21 de febrero** Reunión con el Consorcio de Arte y Cultura- La Nana para conocer su propuesta de regeneración urbana, social y cultural en el barrio “Santa María la Redonda”

Jornadas de Patrimonio Seguro:

- Zona con mucho arraigo. El 63% de la población refirió que el inmueble es propio. El 80% tiene algún documento que acredita la propiedad; 87% lleva viviendo ahí mas de 4 años
- **7 de febrero Se celebró convenio de colaboración entre la ACH, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, A.C.** con el objeto de asesorar y orientar a la ciudadanía para la regularización de sus bienes inmuebles

A2.

Santa María la Redonda

1. Avenida Hidalgo
2. Pensador Mexicano
3. Santa Veracruz
4. 2 de Abril
5. Callejón de San Juan de Dios
6. Valerio Trujano
7. Jardín del Obispo
8. Galeana
9. Riva Palacio
10. Violeta
11. Mina
12. Eje Central Lázaro Cárdenas



**CRONOGRAMA CARTERA DE PROYECTOS 2019
A2 SANTA MARÍA LA REDONDA**

NOMBRE OFICIAL DEL PROYECTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA HIDALGO Ubicado en Av. Hidalgo en el tramo de Eje 1 Guerrero a Eje Central Lázaro Cárdenas		P. CONCEPTUAL 15 FEB - 07 MZO	P. EJECUTIVO 08 MZO - 08 ABR		LICITACIÓN	INICIO DE OBRA 10 DE JUNIO
		ESTUDIOS DE VIABILIDAD 01 - 28 FEBRERO				
CALLE PENSADOR MEXICANO Ubicado en el tramo Eje Central Lázaro Cárdenas a Valerio Trujano		P. CONCEPTUAL 11 FEB - 11 MZO		P. EJECUTIVO 11 MZO - 17 ABR		LICITACIÓN
		TDR (SACMEJ) 01 - 20 FEB	LICITACIÓN	INICIO DE OBRA 03 DE ABRIL - FINAL DE OBRA 28 DE AGOSTO		INICIO DE OBRA 20 DE JUNIO
CALLE SANTA VERACRUZ Ubicado en el tramo Eje Central Lázaro Cárdenas a Valerio Trujano		P. CONCEPTUAL 11 FEB - 11 MZO		P. EJECUTIVO 11 MZO - 17 ABR		LICITACIÓN
		TDR (SACMEJ) 01 - 20 FEB	LICITACIÓN	INICIO DE OBRA 03 DE ABRIL - FINAL DE OBRA 28 DE AGOSTO		INICIO DE OBRA 20 DE JUNIO
CALLE 2 DE ABRIL Ubicado en Calle 2 de abril en el tramo Mina a Av. Hidalgo y callejón 2 de abril en el tramo Mina a Pensador Mexicano		P. CONCEPTUAL 11 FEB - 11 MZO		P. EJECUTIVO 11 MZO - 17 ABR		LICITACIÓN
		TDR (SACMEJ) 01 - 20 FEB	LICITACIÓN	INICIO DE OBRA 03 DE ABRIL - FINAL DE OBRA 28 DE AGOSTO		INICIO DE OBRA 20 DE JUNIO
CALLEJÓN SAN JUAN DE DIOS Ubicado en el tramo Mina a Av. Hidalgo, Colonia Guerrero		P. CONCEPTUAL 11 FEB - 11 MZO		P. EJECUTIVO 11 MZO - 17 ABR		LICITACIÓN
		TDR (SACMEJ) 01 - 20 FEB	LICITACIÓN	INICIO DE OBRA 03 DE ABRIL - FINAL DE OBRA 28 DE AGOSTO		INICIO DE OBRA 20 DE JUNIO
CALLE VALERIO TRUJANO Ubicado entre Av. Paseo de la Reforma y Av. Hidalgo	P. CONCEPTUAL 18 ENE - 01 FEB	P. EJECUTIVO 05 FEB - 05 MZO			LICITACIÓN	INICIO DE OBRA 08 DE MAYO
JARDÍN DEL OBISPO Ubicado en la intersección de las calles Obrajón, Riva Palacio y Pedro Moreno	P. CONCEPTUAL 18 ENE - 01 FEB	P. EJECUTIVO 05 FEB - 05 MZO			LICITACIÓN	INICIO DE OBRA 08 DE MAYO
CALLE GALFANA Ubicado entre calles Pedro Moreno y Mina		P. CONCEPTUAL 05 - 25 FEB	P. EJECUTIVO 26 FEB - 20 MZO		LICITACIÓN	INICIO DE OBRA 22 DE MAYO
		TDR (SACMEJ) 01 - 20 FEB	LICITACIÓN	INICIO DE OBRA 03 DE ABRIL - FINAL DE OBRA 28 DE AGOSTO		
CALLE RIVA PALACIO Ubicado entre calles Pedro Moreno y Mina		P. CONCEPTUAL 05 - 25 FEB	P. EJECUTIVO 26 FEB - 20 MZO		LICITACIÓN	INICIO DE OBRA 22 DE MAYO
		TDR (SACMEJ) 01 - 20 FEB	LICITACIÓN	INICIO DE OBRA 03 DE ABRIL - FINAL DE OBRA 28 DE AGOSTO		
CALLE VIOLETA Ubicada entre Av. Paseo de la Reforma y Eje Central Lázaro Cárdenas		P. CONCEPTUAL 05 - 25 FEB	P. EJECUTIVO 26 FEB - 20 MZO		LICITACIÓN	INICIO DE OBRA 22 DE MAYO
		TDR (SACMEJ) 01 - 20 FEB	LICITACIÓN	INICIO DE OBRA 03 DE ABRIL - FINAL DE OBRA 28 DE AGOSTO		
CALLE MINA Ubicado en el tramo Eje Central Lázaro Cárdenas a Valerio Trujano		P. CONCEPTUAL 11 FEB - 11 MZO		P. EJECUTIVO 11 MZO - 17 ABR		LICITACIÓN
		TDR (SACMEJ) 01 - 20 FEB	LICITACIÓN	INICIO DE OBRA 03 DE ABRIL - FINAL DE OBRA 28 DE AGOSTO		INICIO DE OBRA 20 DE JUNIO
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS ACERA ORIENTE Ubicado en acera Oriente de Eje Central Lázaro Cárdenas, en el tramo de calle de Tacuba a Plaza Garibaldi	P. CONCEPTUAL 18 ENE - 01 FEB	P. EJECUTIVO 05 FEB - 05 MZO			LICITACIÓN	INICIO DE OBRA 08 DE MAYO

(*) PENDIENTE DEFINIR OBRA DE SACMEJ

REHABILITACIÓN DE LA AV. HIDALGO

Ubicado en: Av. Hidalgo en el tramo de Av. Paseo de la Reforma a Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.



Plano de Localización



Presencia de ambulante



Pavimentos en mal estado y mobiliario obsoleto

ACCIONES:

- Corrección de geometrías y cruces seguros (aplicación de criterios de accesibilidad).
- Reconfiguración vial (incorporación de señalización horizontal y vertical).
- Renovación y nivelación de pavimentos.
- Renovación de alumbrado público.
- Retiro de mobiliario urbano obsoleto.
- Poda y saneamiento.
- Definición de frentes vegetales e incorporación de sujetos arbóreos.

Superficie de intervención:
17 mil 948 m².

Monto de inversión:
23 millones 143 mil 520 pesos.

Población Beneficiada:
13 mil 484 personas




Cruces peatonales amplios e inseguros en vialidad



PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Avenida Hidalgo



Crecimiento de banquetas y sustitución de pavimentos (Recinto).

Incorporación de arbolado y vegetación arbustiva nueva.

Crecimiento de banquetas y sustitución de pavimentos (Recinto).

Crecimiento de banquetas y sustitución de pavimentos (Recinto).





Ordenamiento de flujos vehiculares



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN



Avenida Hidalgo

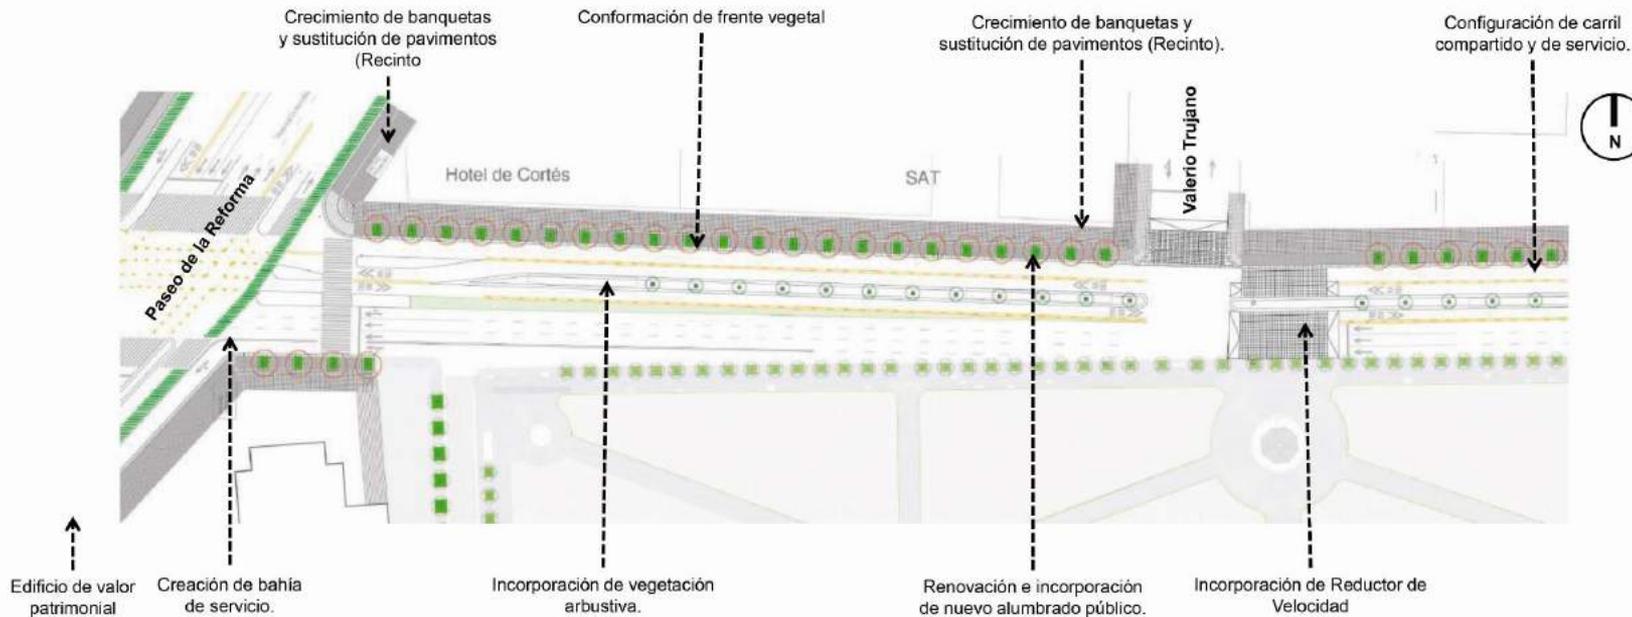

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Avenida Hidalgo

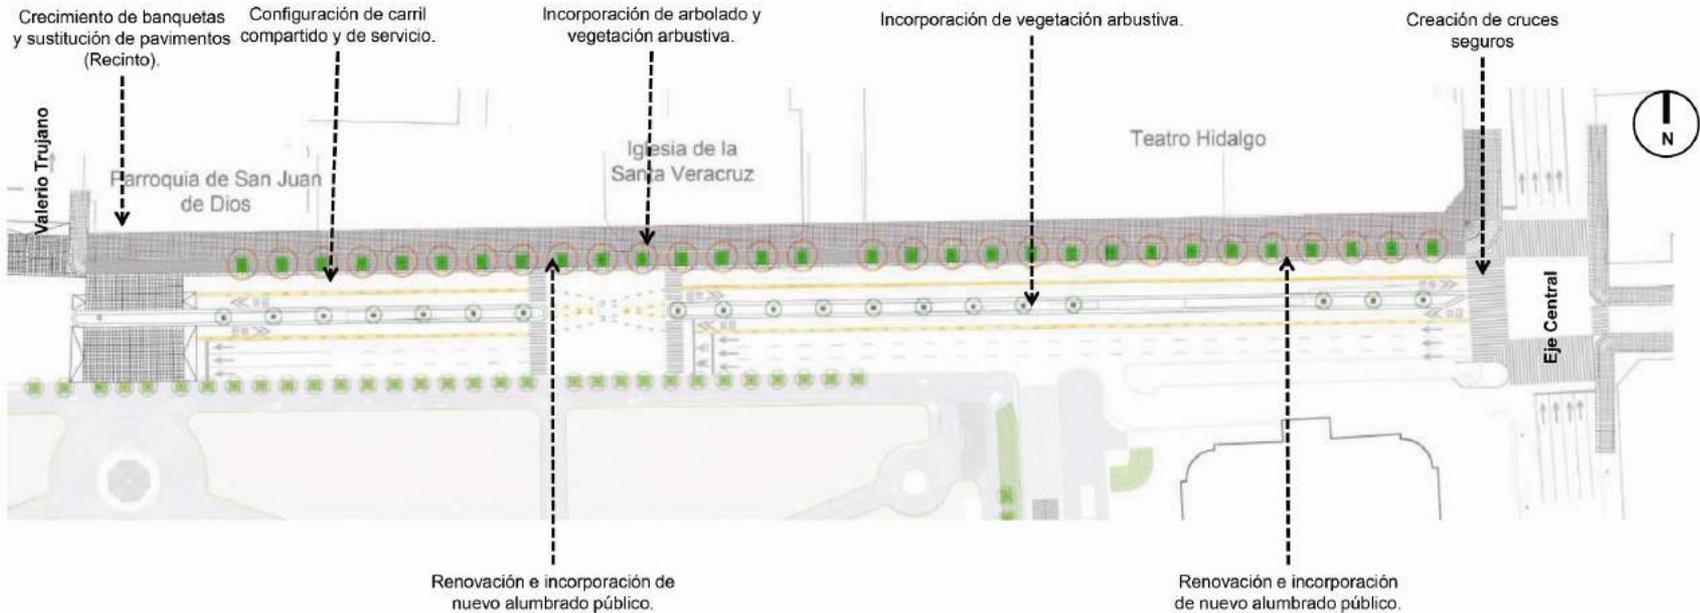

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECCIÓN

Av. Hidalgo

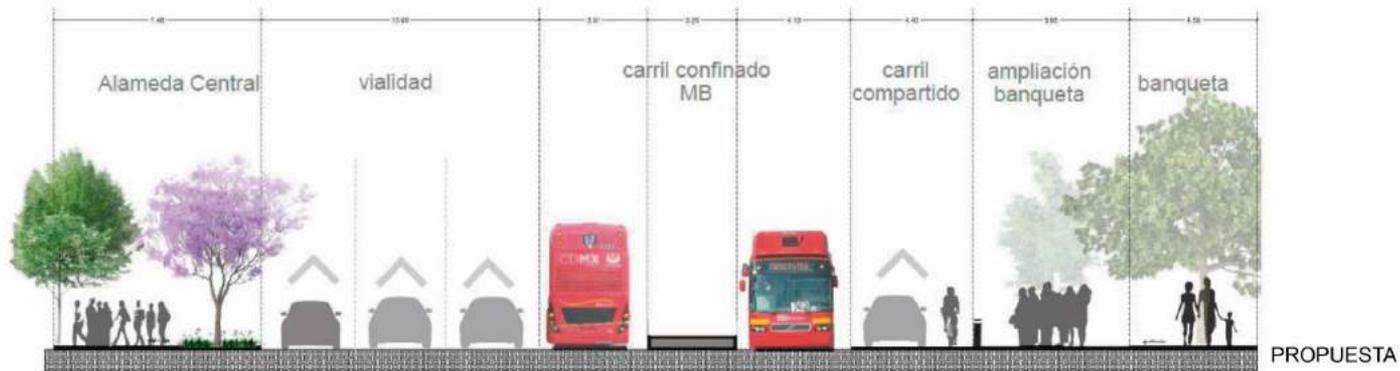


IMAGEN OBJETIVO

Av. Hidalgo



ESTADO ACTUAL



PROPUESTA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

IMAGEN OBJETIVO

Av. Hidalgo



ESTADO ACTUAL



PROPUESTA



IMAGEN OBJETIVO

Av. Hidalgo



ESTADO ACTUAL



PROPUESTA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CALLE PENSADOR MEXICANO

Ubicado en Calle Pensador Mexicano en el tramo Eje Central Lázaro Cárdenas a Valerio Trujano, Colonia Guerrero, Alcaldía en Cuauhtémoc, C.P. 06300, ciudad de México.



Plano de Localización

ACCIONES:

- Corrección de geometrías y cruces seguros (aplicación de criterios de accesibilidad).
- Reconfiguración vial (incorporación de señalización horizontal y vertical).
- Reconfiguración de la plaza de acceso al mercado.
- Renovación y nivelación de pavimentos.
- Nueva infraestructura de agua potable y drenaje.
- Renovación de alumbrado público.
- Retiro de mobiliario urbano obsoleto.
- Poda y saneamiento.
- Definición de frentes vegetales e incorporación de sujetos arbóreos.



Banquetas sin accesibilidad



Banquetas invadidas por vehículos



Estacionamiento excedido



Falta de accesibilidad

Superficie de intervención:
3,313. m²

Monto de inversión:
8 millones 711 mil 600 pesos.

Población Beneficiada:
13 mil 484 personas



Áreas peatonales tomadas por estacionamiento



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Calle Pensador Mexicano



Crecimiento de banquetas y sustitución de pavimentos (Recinto).

Renovación e incorporación de nuevo alumbrado público.

Sustitución de pavimentos (Recinto y tapetes de Mármol Santo Tomas).

Renovación e incorporación de nuevo alumbrado público.

Incorporación de arbolado y vegetación arbustiva.



Creación de bahía de servicio.

Incorporación de arbolado y vegetación arbustiva.

Implementación de cruces seguros

Renovación e incorporación de nuevo alumbrado público.


Crecimiento de banquetas y sustitución de pavimentos (Recinto).




SECCIÓN

Calle Pensador Mexicano

Estado Actual

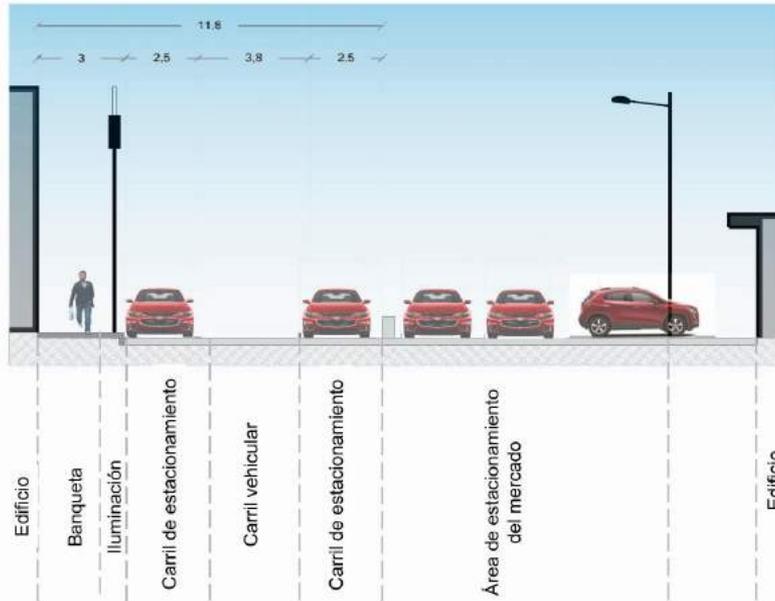

Propuesta

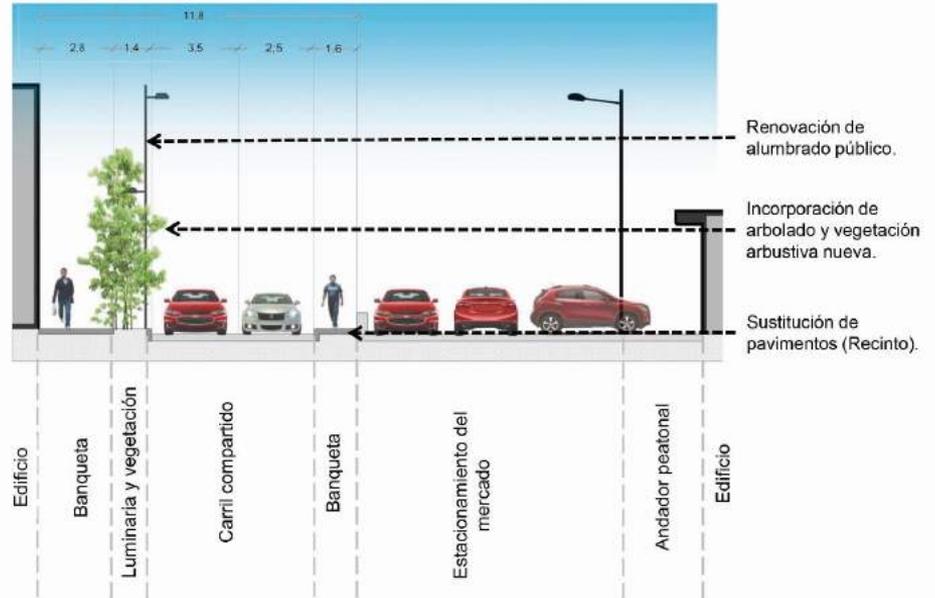

CALLE SANTA VERACRUZ

Ubicado en Calle Santa Veracruz en el tramo Eje Central Lázaro Cárdenas a Valerio Trujano, Colonia Guerrero, Alcaldía en Cuauhtémoc, C.P. 06300, ciudad de México.



Plano de Localización



Estacionamiento excesivo



Falta de iluminación



Banquetas poco accesibles

ACCIONES:

- Corrección de geometrías y cruces seguros (aplicación de criterios de accesibilidad).
- Reconfiguración vial (incorporación de señalización horizontal y vertical).
- Renovación y nivelación de pavimentos.
- Nueva infraestructura de agua potable y drenaje.
- Renovación de alumbrado público.
- Retiro de mobiliario urbano obsoleto.
- Poda y saneamiento.
- Definición de frentes vegetales e incorporación de sujetos arbóreos.

Superficie de intervención:
3,709. m²

Monto de inversión:
9 millones 375 mil 400 pesos.

Población Beneficiada:
13 mil 484 personas




Áreas verdes de baja calidad



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN


Calle Santa Veracruz




SECCIONES

Calle Santa Veracruz

Estado Actual

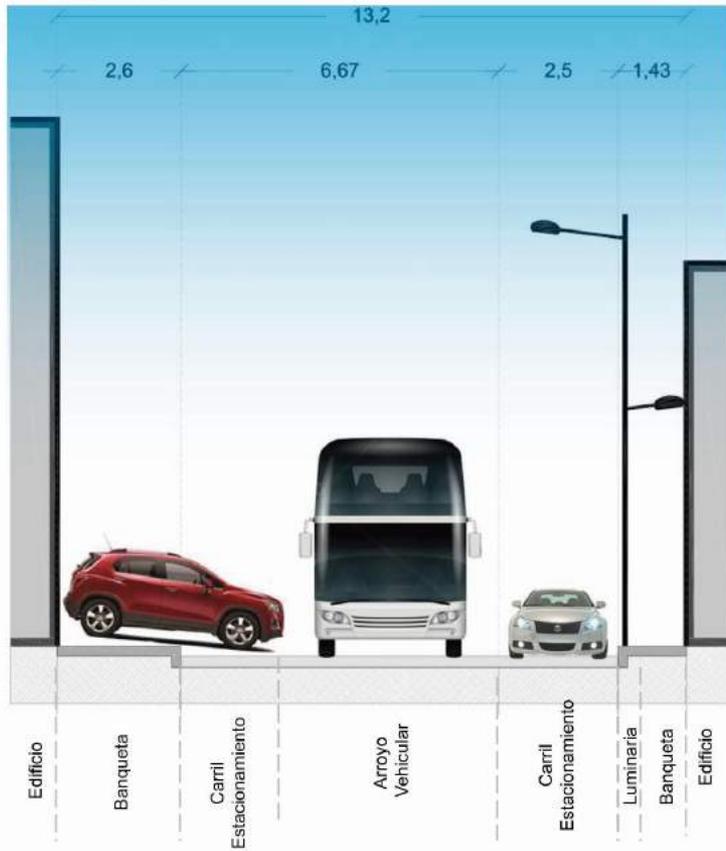

Propuesta

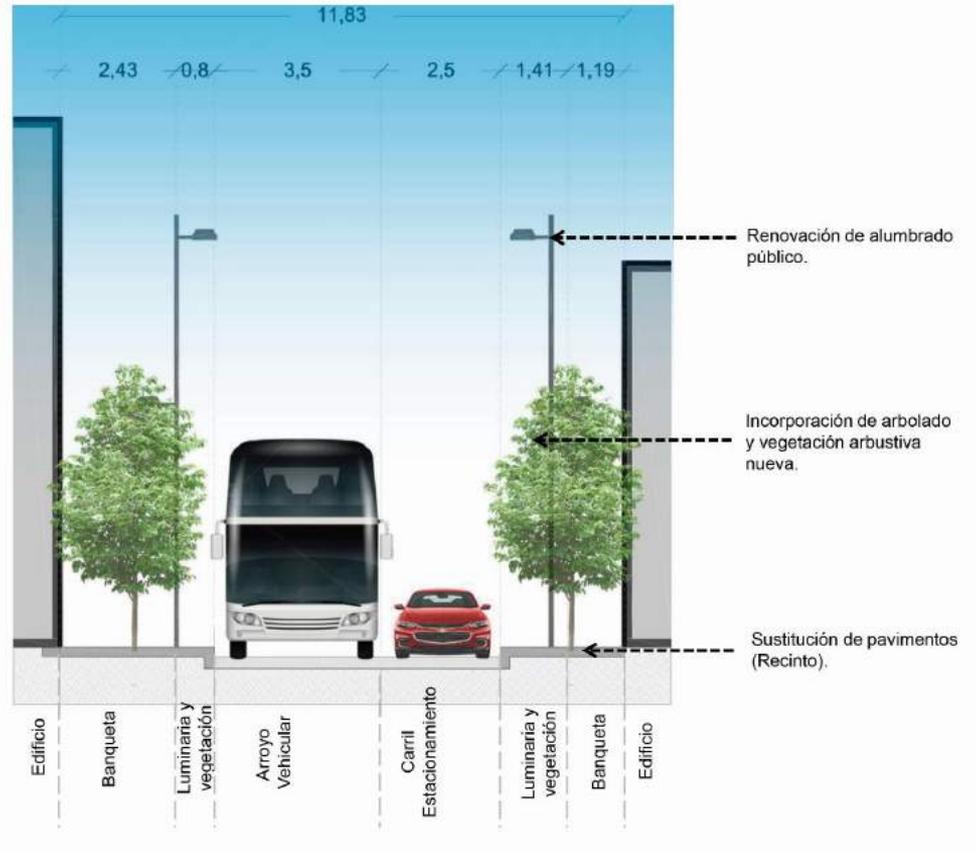

CALLE 2 DE ABRIL

Ubicado en Calle 2 de abril en el tramo Mina a Av. Hidalgo y callejón 2 de abril en el tramo Mina a Pensador Mexicano, Colonia Guerrero, Alcaldía en Cuauhtémoc, C.P. 06300, ciudad de México.



Plano de Localización

ACCIONES:

- Corrección de geometrías y cruces seguros (aplicación de criterios de accesibilidad).
- Reconfiguración vial (incorporación de señalización horizontal y vertical).
- Consolidación de calles peatonales.
- Renovación y nivelación de pavimentos.
- Nueva infraestructura de agua potable y drenaje.
- Renovación de alumbrado público.
- Retiro de mobiliario urbano obsoleto.
- Poda y saneamiento.
- Definición de frentes vegetales e incorporación de sujetos arbóreos.



Banquetas poco accesibles y estacionamiento excesivo



Estacionamiento excesivo.

Superficie de intervención:
3,337. m²

Monto de inversión:
9 millones 645 mil 200 pesos.

Población Beneficiada:
13 mil 484 personas




Estacionamiento sobre cruces peatonales e invasión de banquetas por ambulanteo.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Calles 2 de Abril y Plaza 2 de Abril

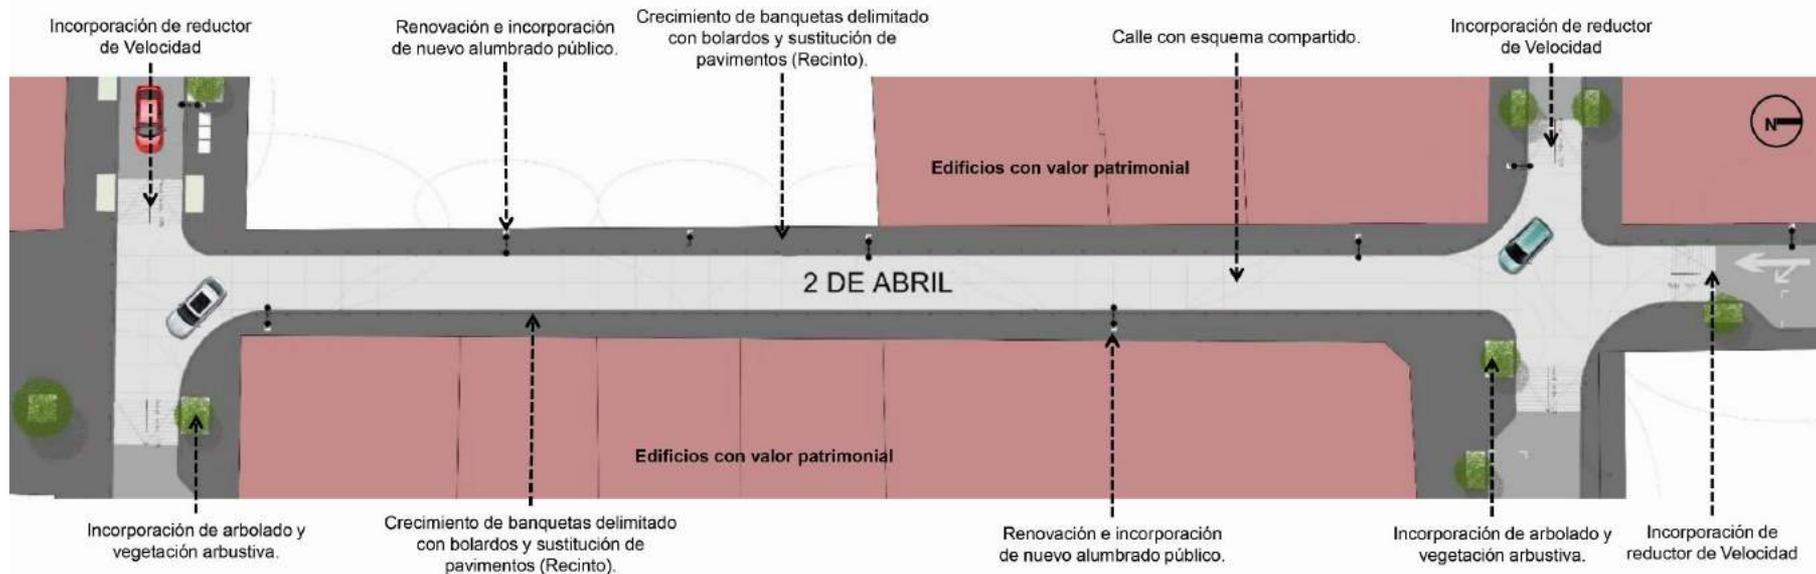


GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO


SECCIONES

Calle 2 de Abril

Estado Actual

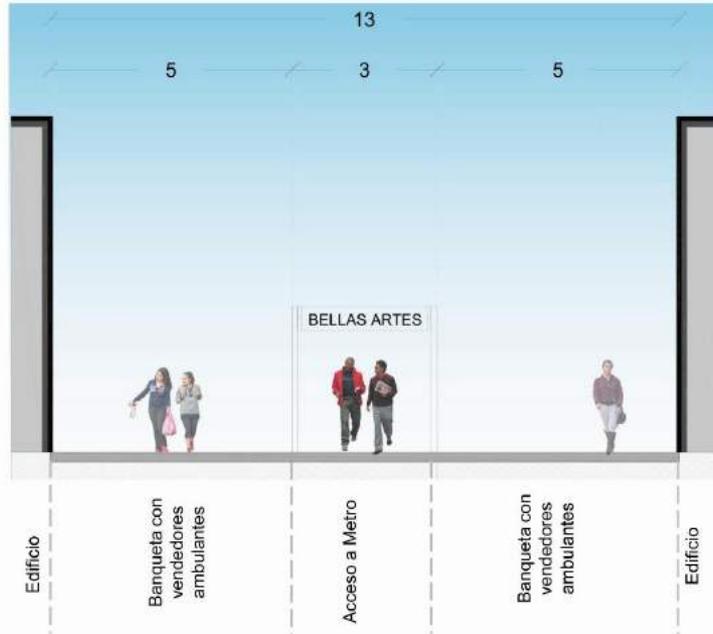

Propuesta

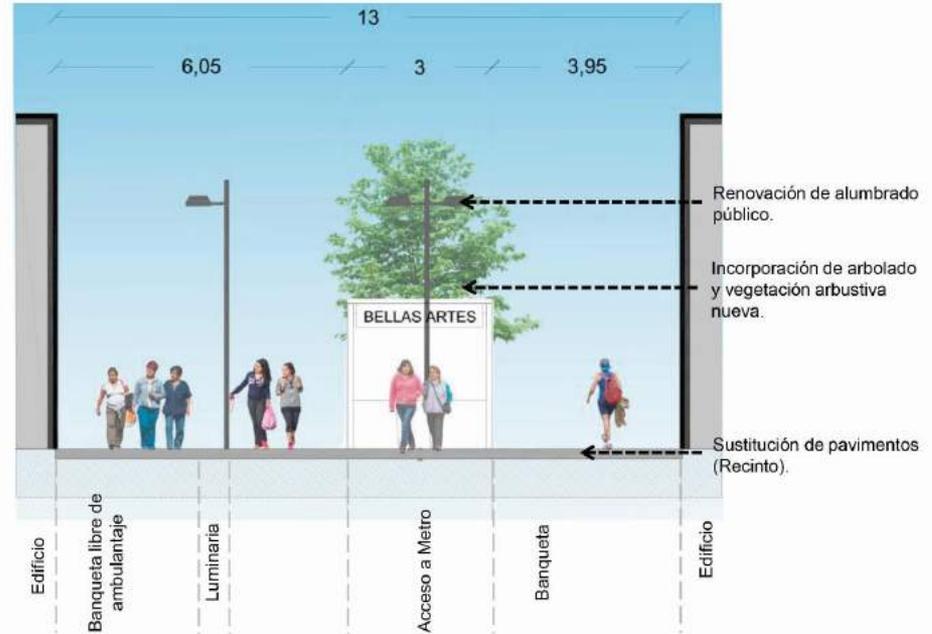

CALLEJÓN SAN JUAN DE DIOS

Ubicado en Calle San Juan de Dios en el tramo Mina a Av. Hidalgo, Colonia Guerrero, Alcaldía en Cuauhtémoc, C.P. 06300, ciudad de México.



Plano de Localización

ACCIONES:

- Corrección de geometrías y cruces seguros (aplicación de criterios de accesibilidad).
- Reconfiguración vial (incorporación de señalización horizontal y vertical).
- Consolidación de calles peatonales.
- Renovación y nivelación de pavimentos.
- Nueva infraestructura de agua potable y drenaje.
- Renovación de alumbrado público.
- Retiro de mobiliario urbano obsoleto.
- Poda y saneamiento.
- Definición de frentes vegetales e incorporación de sujetos arbóreos.



Falta de iluminación e invasión de banquetas por estacionamiento.

Superficie de intervención:
1,599. m²

Monto de inversión:
4 millones 292 mil 200 pesos.

Población Beneficiada:
13 mil 484 personas



Estacionamiento excesivo



Mobiliario urbano obsoleto, iluminación desordenada




Banquetas poco accesibles



PROPUESTA DE INTERVENCIÓN


Calle San Juan de Dios

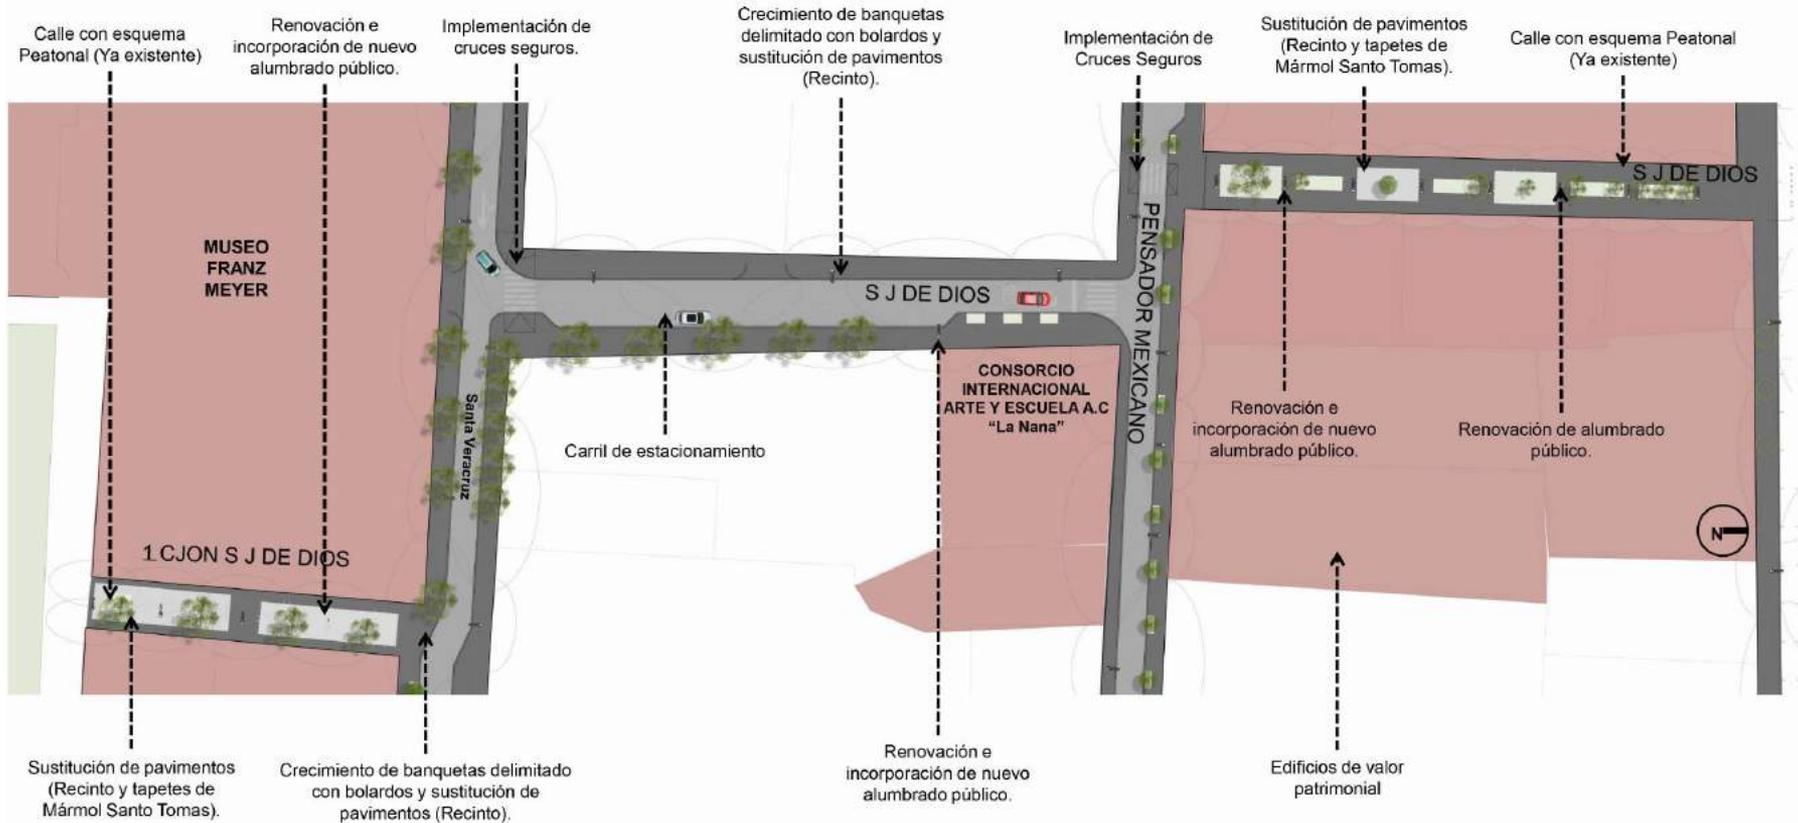


SECCIONES

Calle San Juan de Dios

Estado Actual

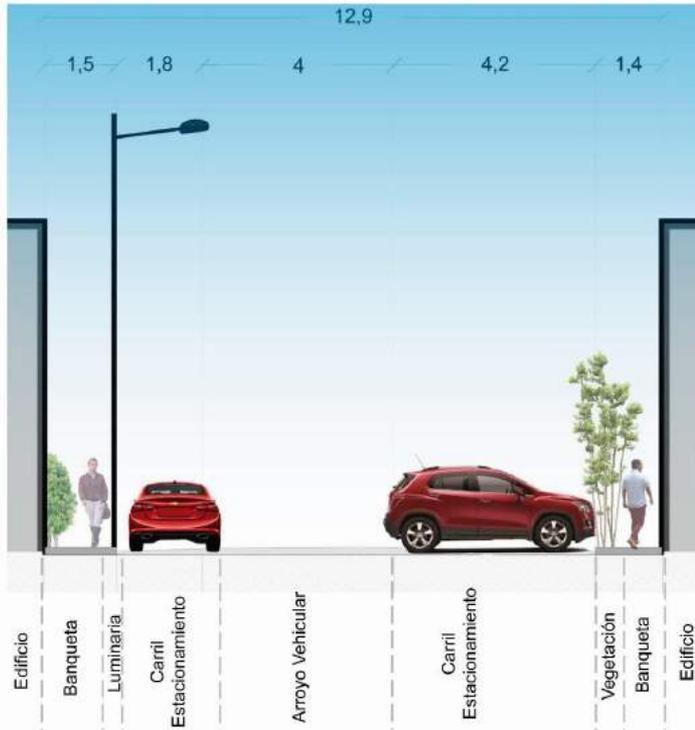

Propuesta

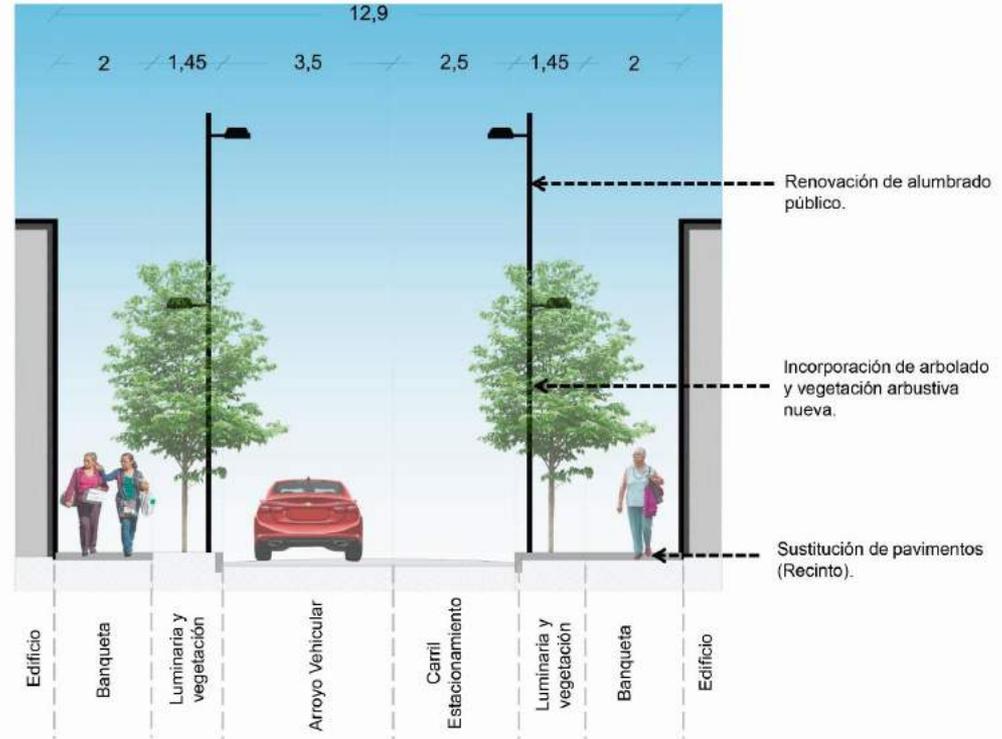

CALLE VALERIO TRUJANO

Ubicado en: Calle Valerio Trujano en el tramo de Av. Paseo de la Reforma a Av. Hidalgo, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México.



Plano de Localización



Estacionamiento informal y circulaciones desordenadas.



Pavimentos en mal estado por raíces de arbolado.



Presencia de mobiliario obsoleto.

ACCIONES:

- Corrección de geometrías y cruces seguros (aplicación de criterios de accesibilidad)
- Reconfiguración vial (incorporación de señalización horizontal y vertical)
- Renovación y nivelación de pavimentos
- Renovación de alumbrado público
- Retiro de mobiliario urbano obsoleto
- Poda y saneamiento
- Definición de frentes vegetales e incorporación de sujetos arbóreos

Superficie de intervención:
4 Mil 157 m².

Monto de inversión:
6 millones 720 mil pesos.

Población Beneficiada:
13 mil 484 personas




Cruces peatonales bloqueados por automóviles.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN


Calle Valerio Trujano

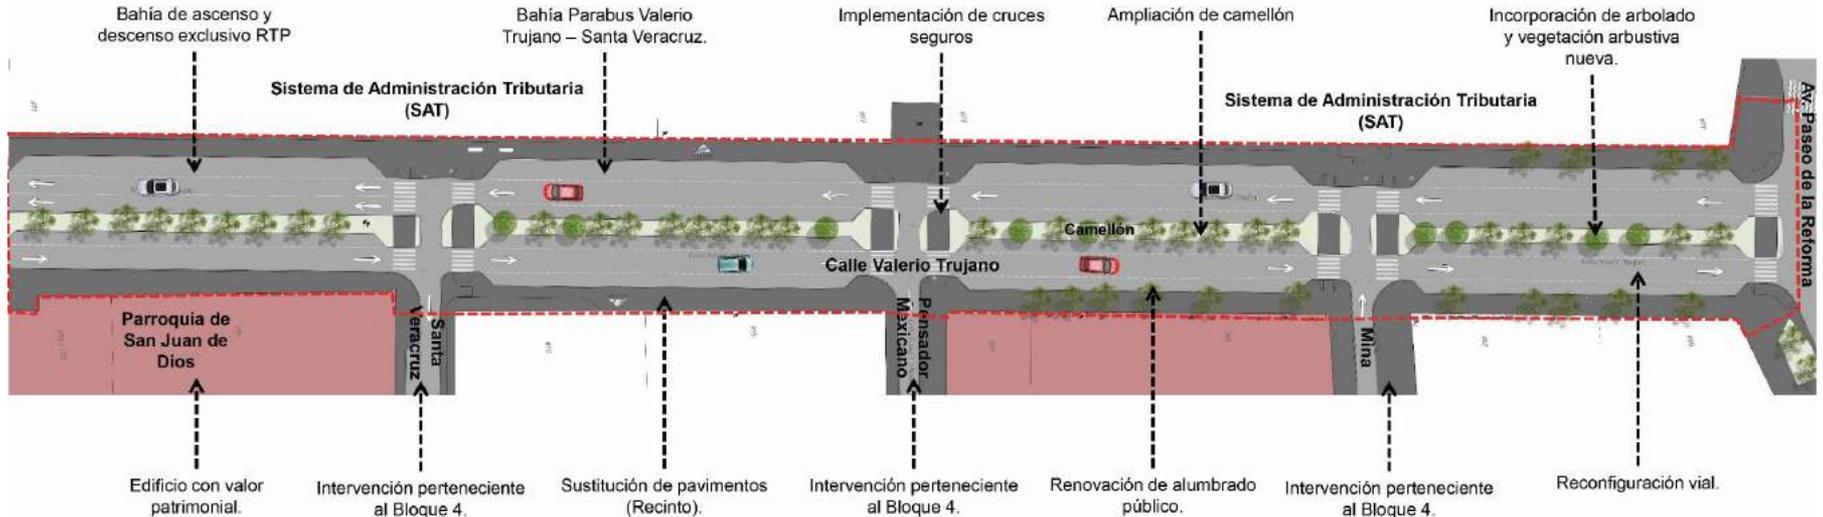


GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECCIÓN

Calle Valerio Trujano. Intersección con la calle Santa Veracruz.

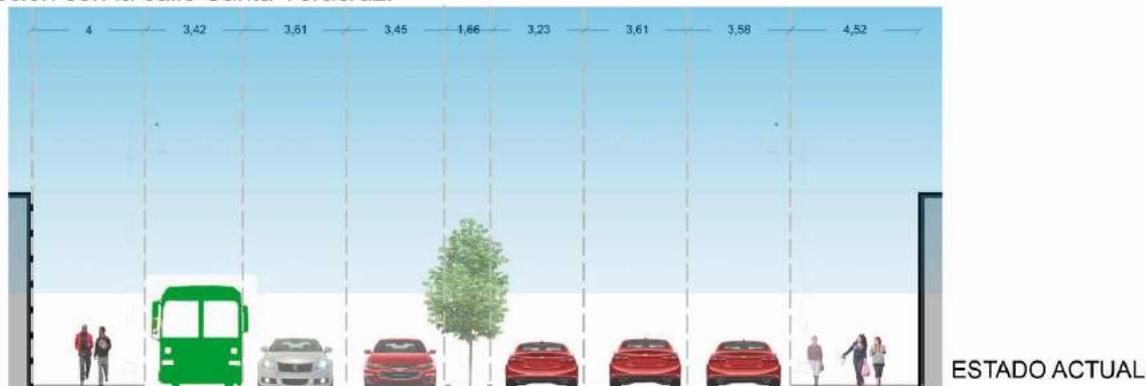

ESTADO ACTUAL

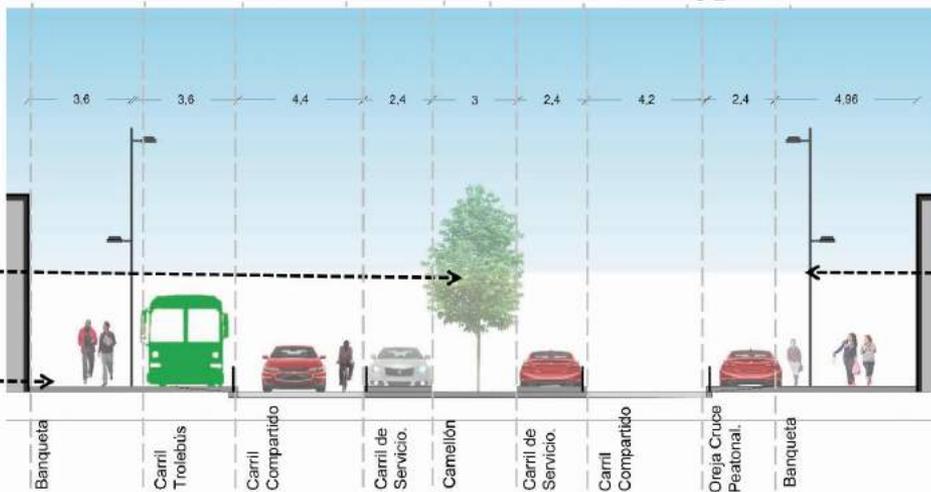

PROPUESTA

Incorporación de arbolado y vegetación arbustiva nueva.

Sustitución de pavimentos (Recinto).

Renovación de alumbrado público.



JARDÍN DEL OBISPO

Ubicado en: Intersección de las calles Obraje, calle Riva Palacio y Pedro Moreno, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México.



Plano de Localización

ACCIONES:

- Corrección de geometrías y cruces seguros (aplicación de criterios de accesibilidad)
- Reconfiguración vial (incorporación de señalización horizontal y vertical)
- Renovación y nivelación de pavimentos
- Renovación de alumbrado público
- Retiro de mobiliario urbano obsoleto
- Poda y saneamiento
- Definición de frentes vegetales e incorporación de sujetos arbóreos



Pavimentos que dificultan la accesibilidad.



Vegetación densa que obstruye la permeabilidad.



Juegos infantiles enrejados y en mal estado.



Rampas inaccesibles.

Superficie de intervención:
Mil 580 m².

Monto de inversión:
3 millones 810 mil 800 pesos.

Población Beneficiada:
13 mil 484 personas



Mobiliario obsoleto y en mal estado.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Jardín del Obispo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

IMAGEN OBJETIVO



ESTADO ACTUAL



PROPUESTA



CALLE GALEANA

Ubicada en: Calle Galeana entre calles Pedro Moreno y Mina, Colonia Guerrero, Del. Cuauhtémoc C.P. 06300, Ciudad de México.



Plano de localización



Percepción de inseguridad



Esquina de Galeana y Pedro Moreno



Jardineras limitan los andadores peatonales

ACCIONES:

- Corrección de geometrías y cruces seguros (aplicación de criterios de accesibilidad)
- Reconfiguración vial (incorporación de señalización horizontal y vertical)
- Renovación y nivelación de pavimentos
- Nueva infraestructura de agua potable y drenaje.
- Renovación de alumbrado público
- Retiro de mobiliario urbano obsoleto e incorporación de mobiliario de estancia.
- Poda y saneamiento
- Definición de frentes vegetales e incorporación de sujetos arbóreos

Superficie de intervención:
2 mil 300. m2

Monto de inversión:
6 millones 774 mil pesos.

Población Beneficiada:
13 mil 484 personas



Falta de banquetas accesibles



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Calle Galeana



Incorporación de arbolado y vegetación arbustiva

Renovación de pavimentos a base de Recinto negro

Renovación de pavimentos a base de Precolados

Complementación de carril ciclista con Reductor de Velocidad

Renovación e incorporación de nuevo alumbrado público.




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO


SECCIONES

Calle Galeana

Estado Actual

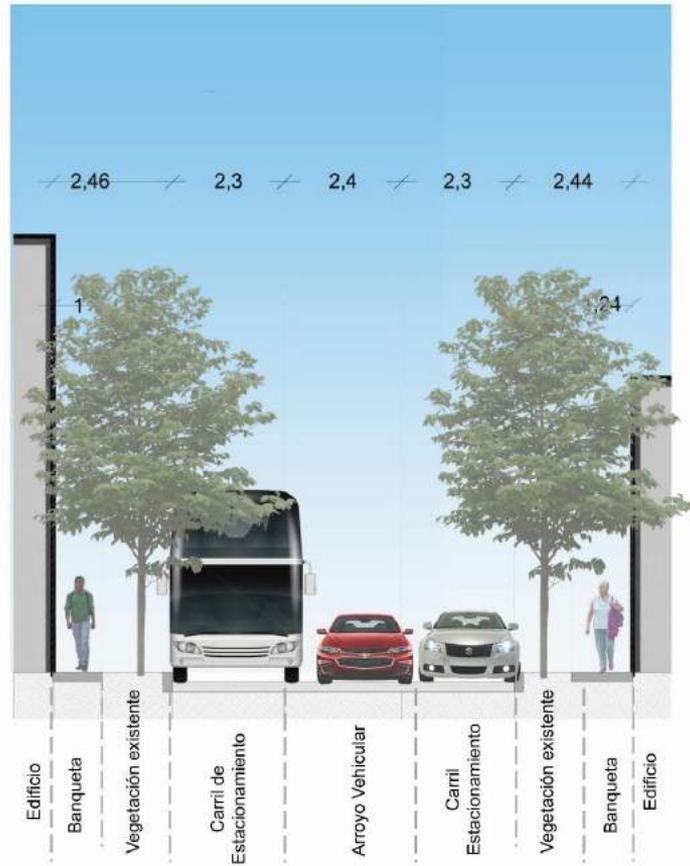

Propuesta

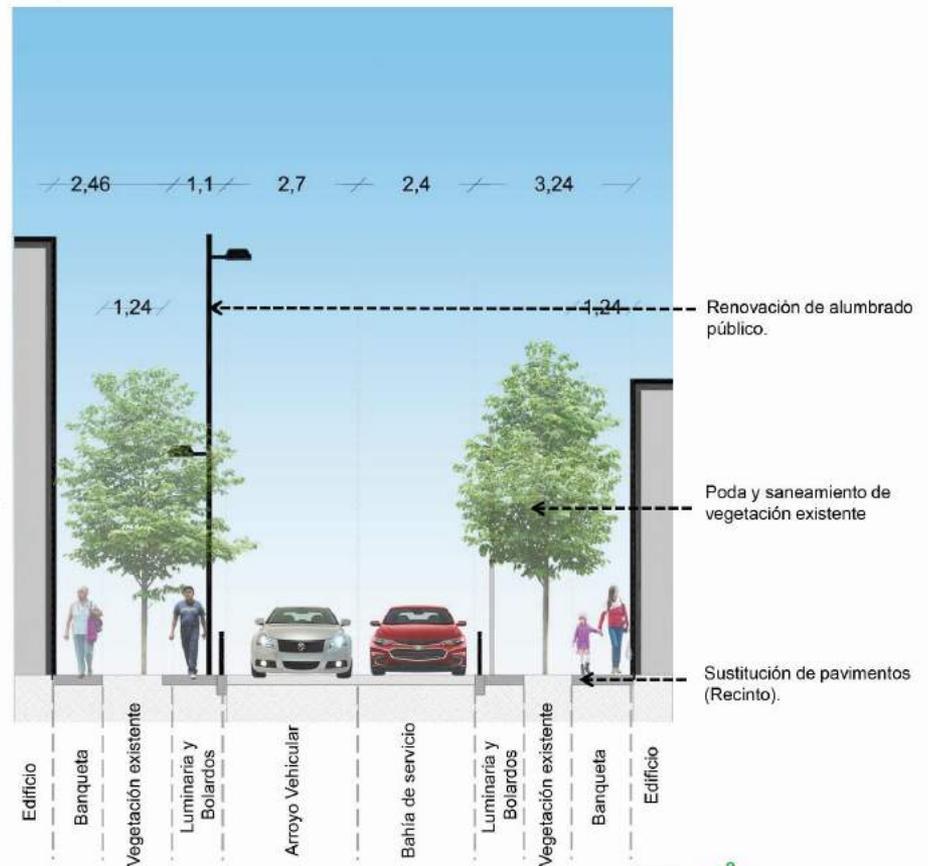

CALLE RIVA PALACIO

Ubicada en: Calle Riva Palacio entre calles Pedro Moreno y Mina, Colonia Guerrero, Del. Cuauhtémoc C.P. 06300, Ciudad de México.



Plano de localización

ACCIONES:

- Corrección de geometrías y cruces seguros (aplicación de criterios de accesibilidad)
- Reconfiguración vial (incorporación de señalización horizontal y vertical)
- Renovación y nivelación de pavimentos
- Nueva infraestructura de agua potable y drenaje.
- Renovación de alumbrado público
- Retiro de mobiliario urbano obsoleto e incorporación de mobiliario de estancia.
- Poda y saneamiento
- Definición de frentes vegetales e incorporación de sujetos arbóreos



Rampa vehicular inaccesible



Objetos mostrencos sobre banqueta



Estacionamiento invasivo



Obstrucción de pasos peatonales

Superficie de intervención:
2 mil 448. m2

Monto de inversión:
6 millones 696 mil pesos.


Población Beneficiada:
13 mil 484 personas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Calle Riva Palacio

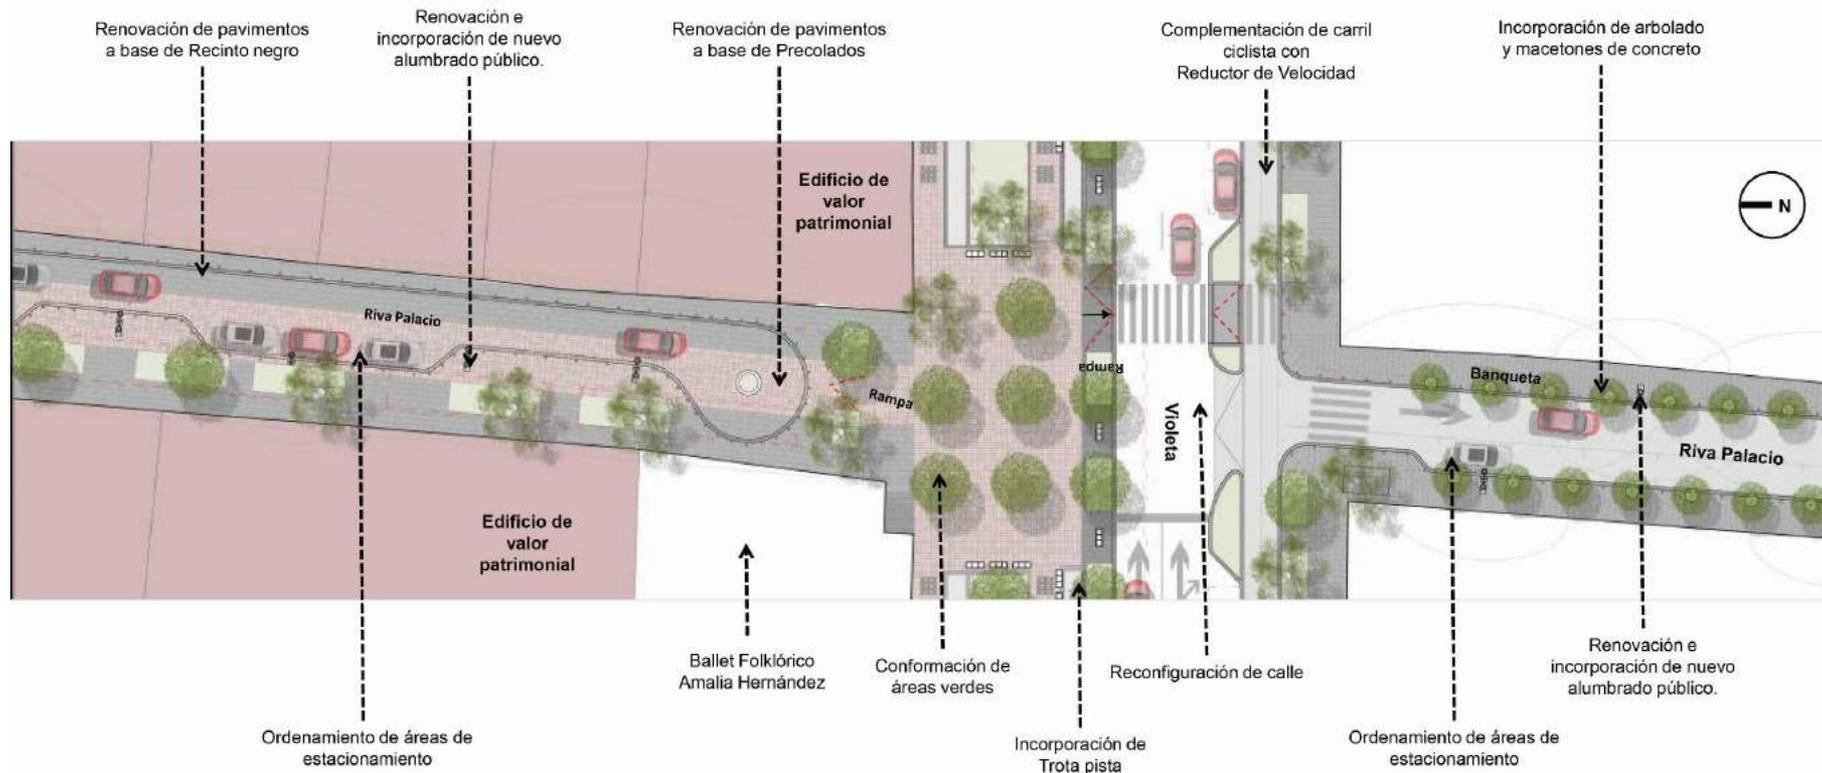


SECCIONES

Calle Riva Palacio

Estado Actual



Propuesta

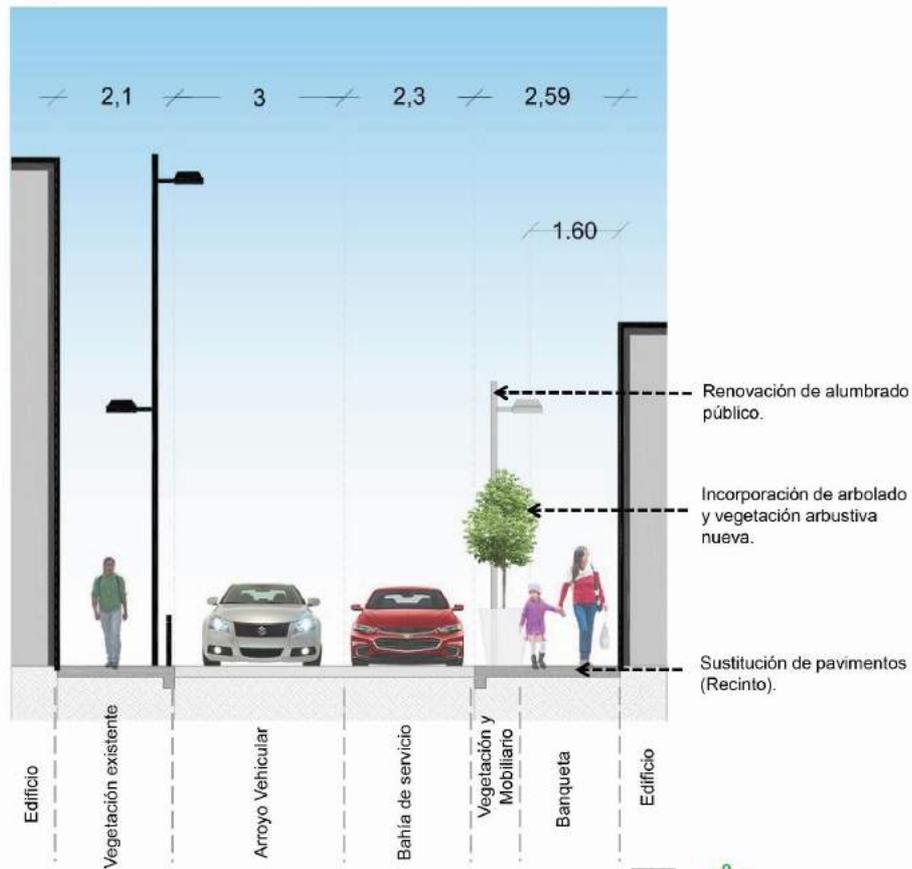

CALLE VIOLETA

Ubicada en: Calle Violeta entre Av. Paseo de la Reforma y Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Guerrero, Del. Cuauhtémoc C.P. 06300, Ciudad de México.



Plano de localización



Falta de Continuidad peatonal



Rampas peatonales en mal estado



Mobiliario urbano obsoleto



Estacionamiento invasivo

ACCIONES:

- Corrección de geometrías y cruces seguros (aplicación de criterios de accesibilidad)
- Reconfiguración vial (incorporación de señalización horizontal y vertical)
- Renovación y nivelación de pavimentos
- Nueva infraestructura de agua potable y drenaje.
- Renovación de alumbrado público
- Retiro de mobiliario urbano obsoleto e incorporación de mobiliario de estancia.
- Poda y saneamiento
- Definición de frentes vegetales e incorporación de sujetos arbóreos

Superficie de intervención:
7 mil 382. m²

Monto de inversión:
17 millones 369 mil pesos.

Población Beneficiada:
13 mil 484 personas



Área de ejercitadores sin sombra



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN


Calle Violeta




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECCIONES

Calle Violeta

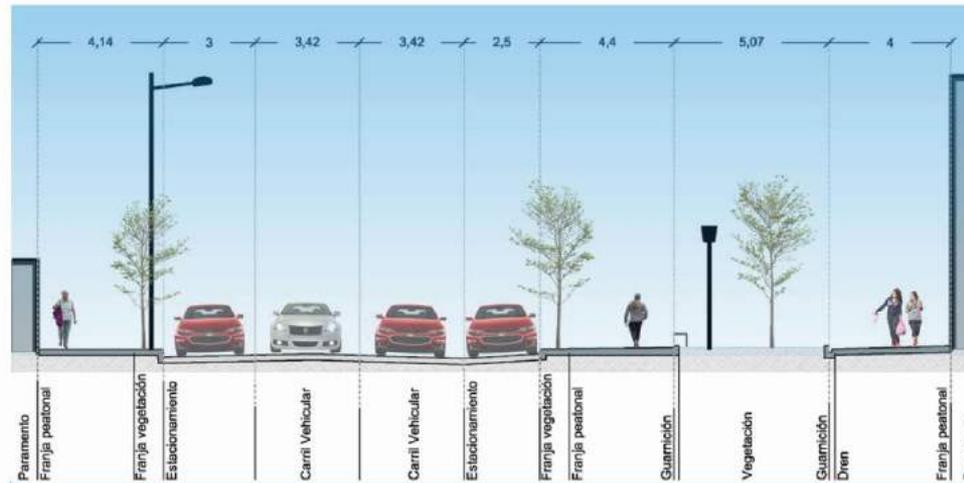

Estado Actual

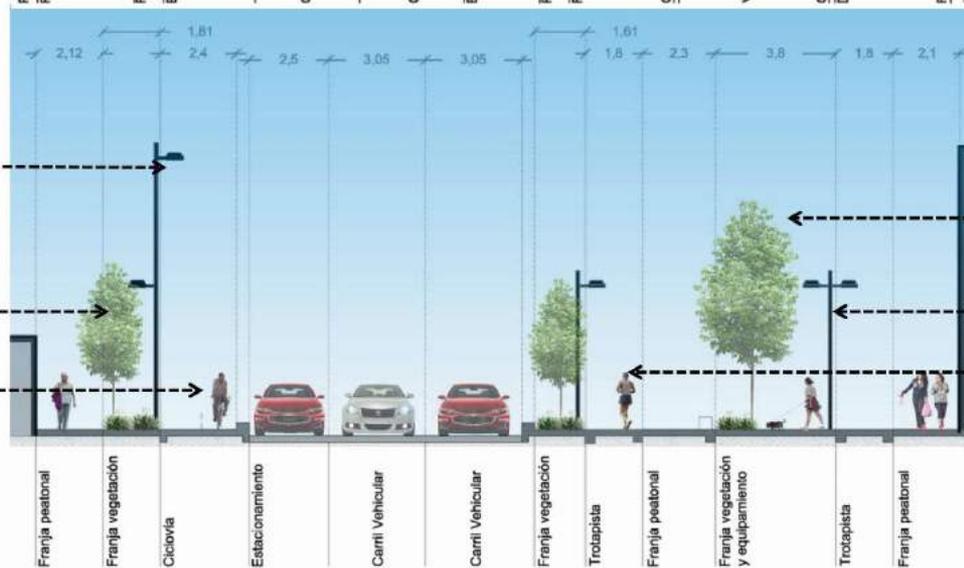

Propuesta

Renovación de alumbrado público.

Incorporación de arbolado y vegetación arbustiva nueva.

Complementación de carril ciclista.

Incorporación de arbolado y vegetación arbustiva nueva.

Renovación de alumbrado público.

Incorporación de Trota pista



CALLE MINA

Ubicado en Calle Mina en el tramo Eje Central Lázaro Cárdenas a Valerio Trujano, Colonia Guerrero, Alcaldía en Cuauhtémoc, C.P. 06300, ciudad de México.



Plano de Localización

ACCIONES:

- Corrección de geometrías y cruces seguros (aplicación de criterios de accesibilidad).
- Reconfiguración vial (incorporación de señalización horizontal y vertical).
- Renovación y nivelación de pavimentos.
- Nueva infraestructura de agua potable y drenaje.
- Renovación de alumbrado público.
- Retiro de mobiliario urbano obsoleto.
- Poda y saneamiento.
- Definición de frentes vegetales e incorporación de sujetos arbóreos.



Estacionamiento excesivo



Carriles con dimensiones excedidas



Falta de continuidad peatonal



Banquetas invadidas



Falta de arbolado

Superficie de intervención:
4 mil 720. m2

Monto de inversión:
12 millones 606 mil 400 pesos.


Población Beneficiada:
13 mil 484 personas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Calle Mina

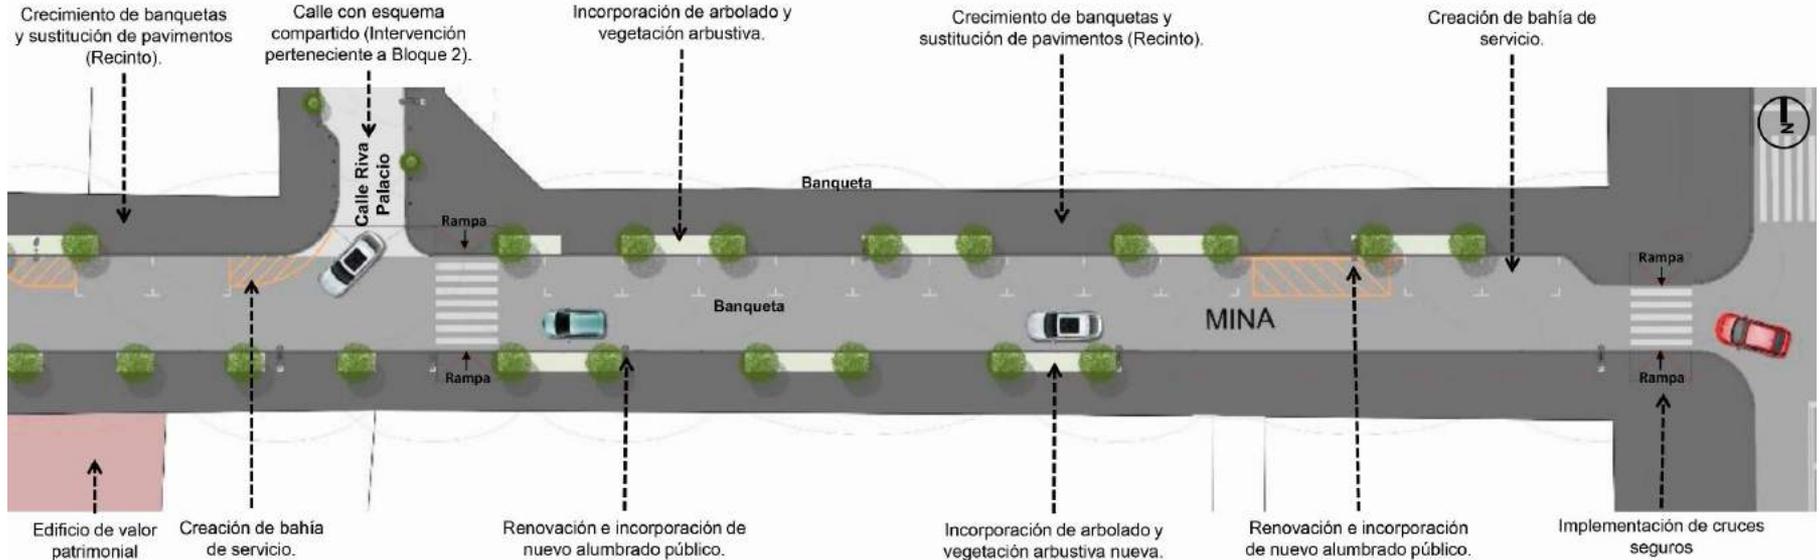


GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO


SECCIÓN

Calle Mina

Estado Actual

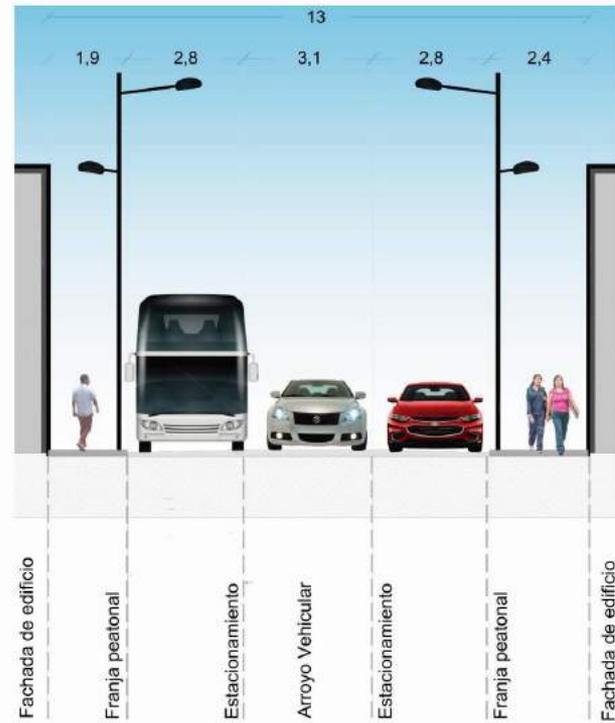

Propuesta

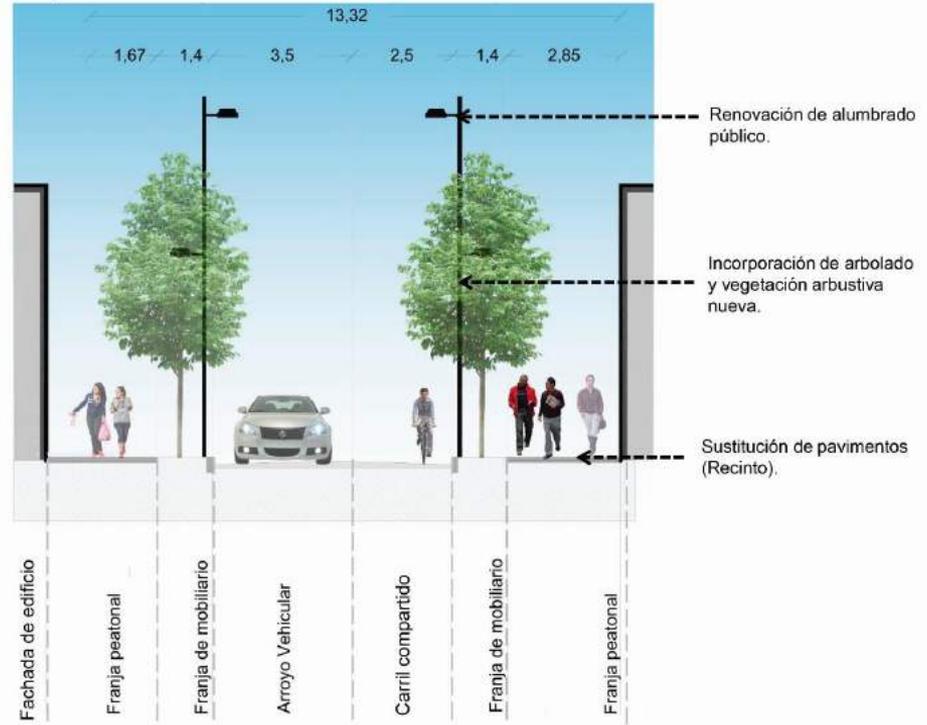

EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS

Ubicado en: Acera Oriente de Eje Central Lázaro Cárdenas, en el tramo de Plaza Garibaldi a calle Madero, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.



Plano de Ubicación

ACCIONES:

- Corrección de geometrías y cruces seguros (aplicación de criterios de accesibilidad)
- Reconfiguración vial (incorporación de señalización horizontal y vertical)
- Renovación y nivelación de pavimentos
- Renovación de alumbrado público
- Retiro de mobiliario urbano obsoleto e incorporación de mobiliario de estancia.
- Poda y saneamiento
- Definición de frentes vegetales e incorporación de sujetos arbóreos



Falta de continuidad peatonal



Falta de accesibilidad y continuidad peatonal



Pavimentos Dañados y en mal estado



Dispositivos de control de tránsito dañados o en mal estado

Superficie de intervención:
2 mil 567. m2

Monto de inversión:
8 millones 215 mil pesos.

Población Beneficiada:
13 mil 484 personas





Obstrucción de pasos peatonales por mobiliario



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Eje Central Lázaro Cárdenas

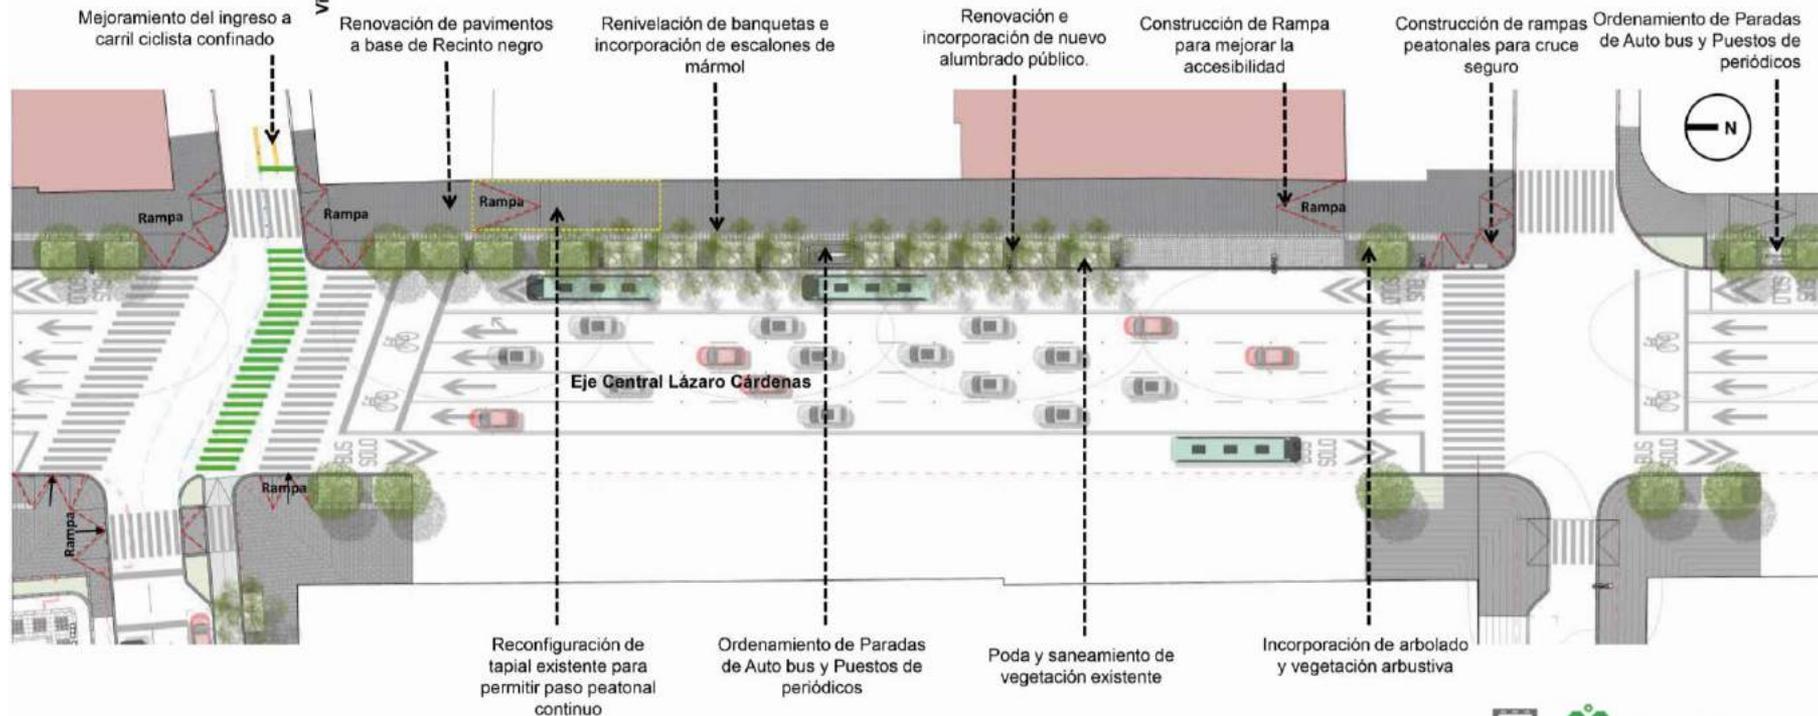


GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO


SECCIÓN

Eje Central Lázaro Cárdenas

Estado Actual

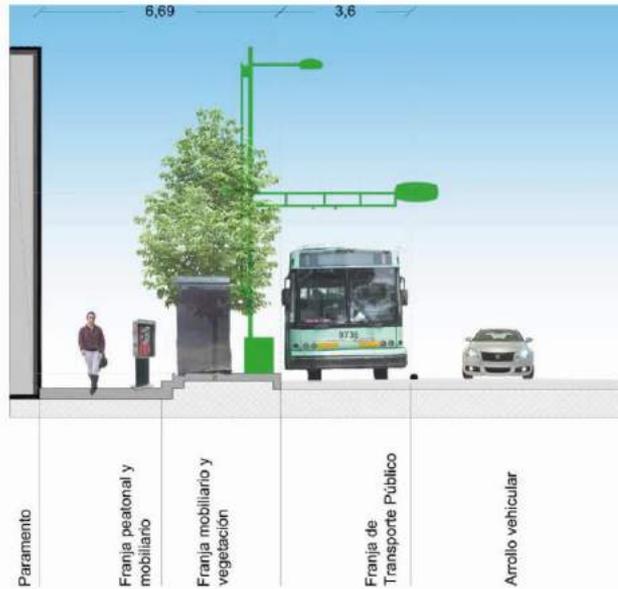


Propuesta

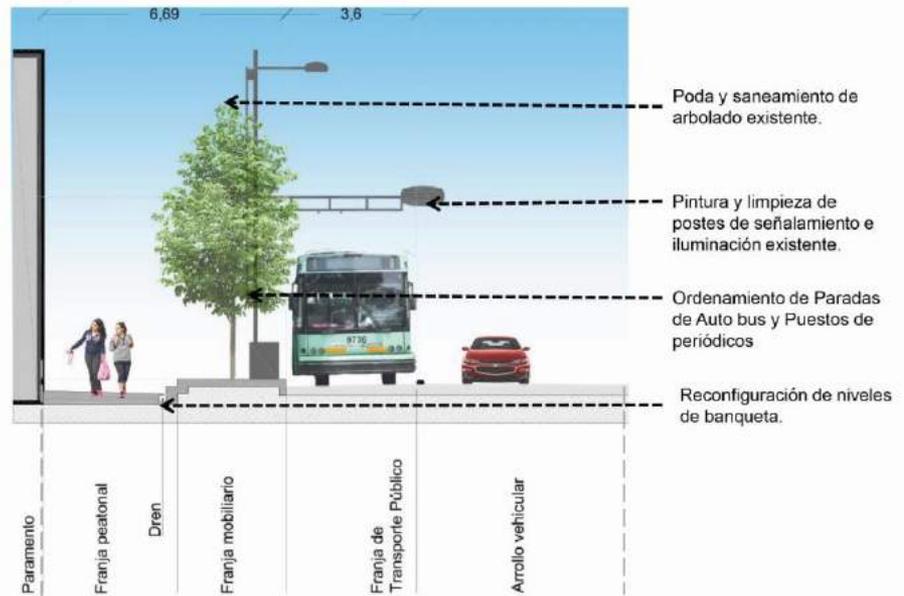

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Eje Central Lázaro Cárdenas

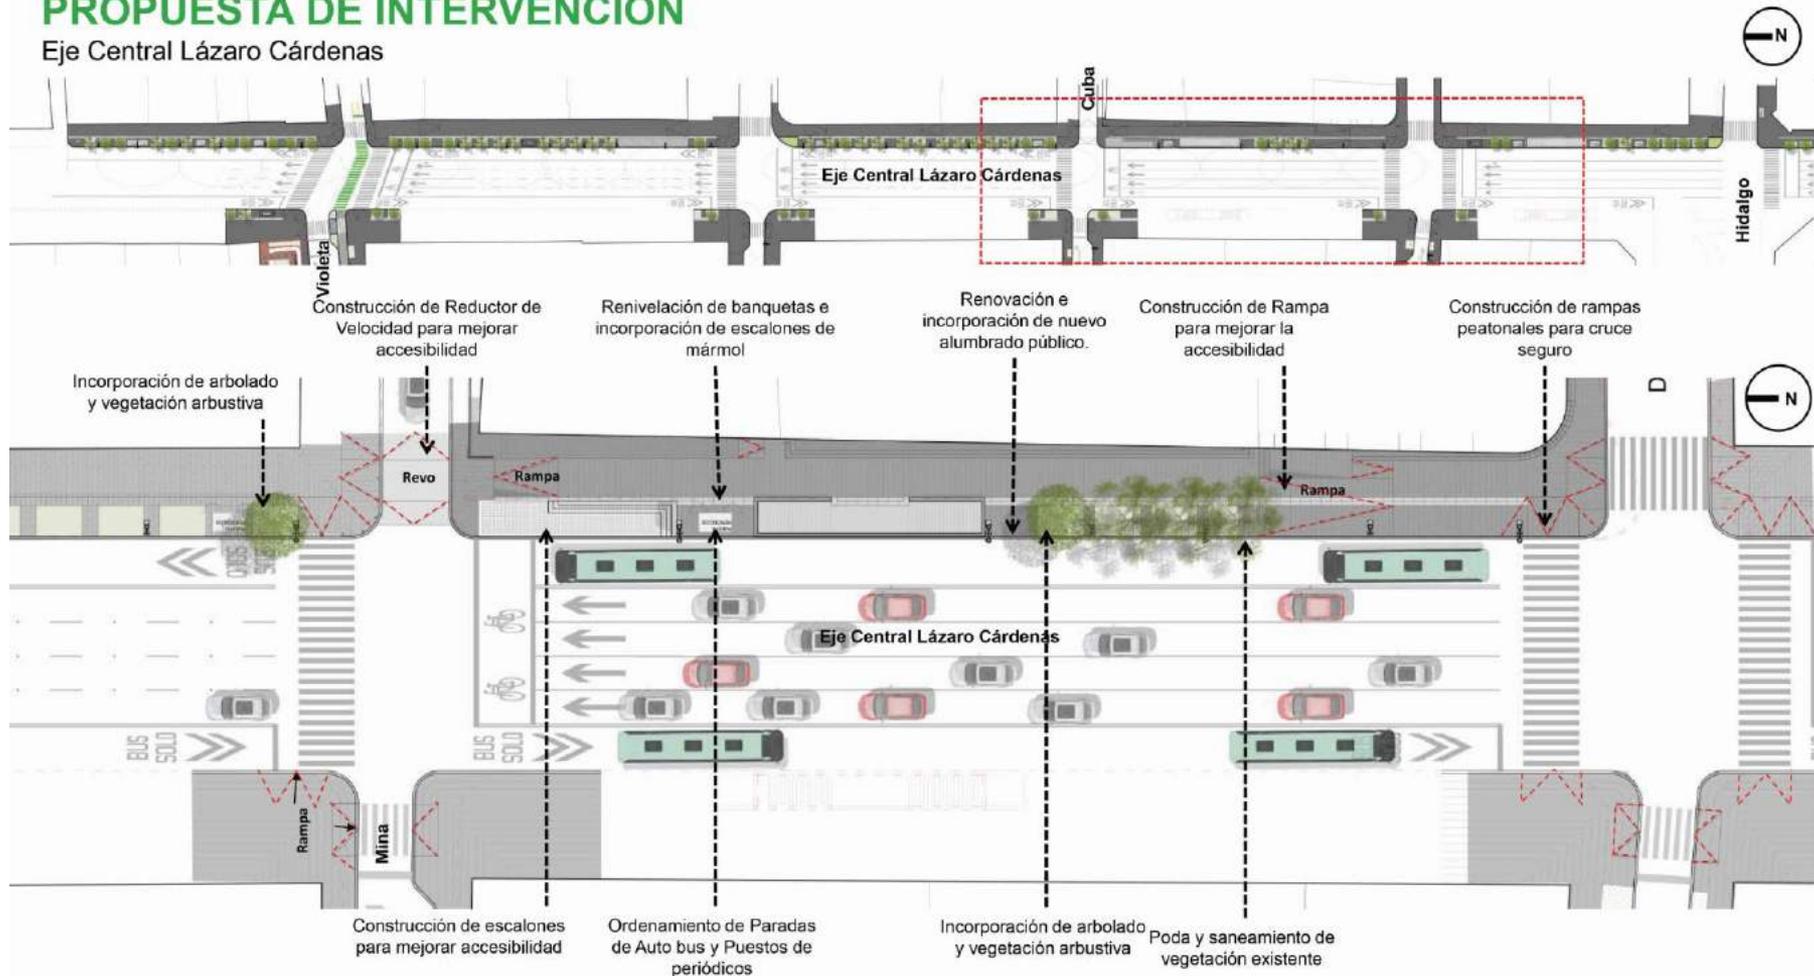


GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO


SECCIÓN

Eje Central Lázaro Cárdenas

Estado Actual

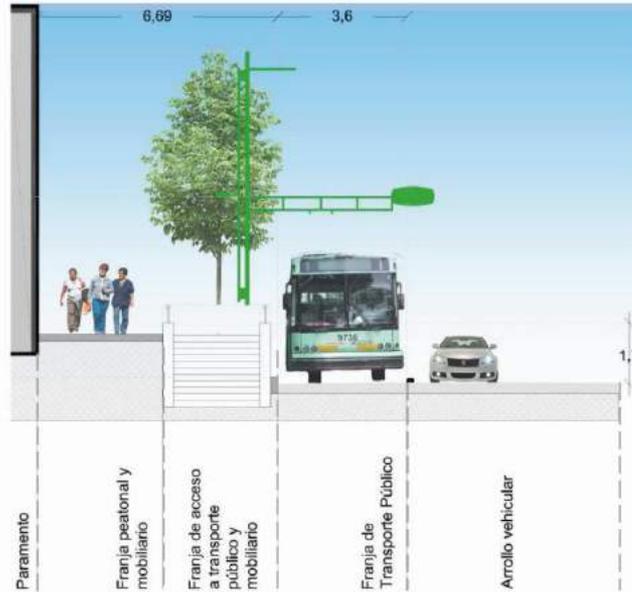

Propuesta

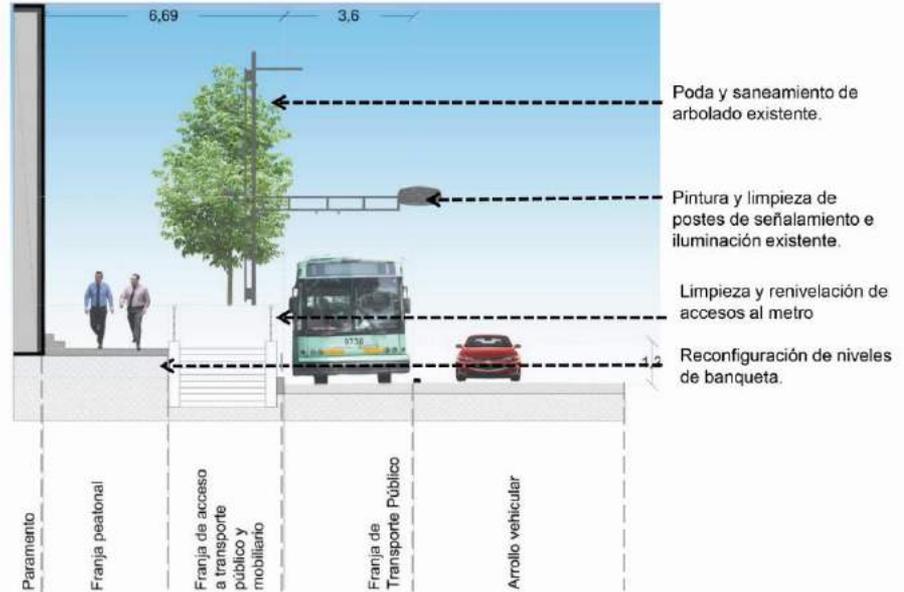


A1. La Antigua Merced

1. Plaza Loreto
2. Plaza de la Santísima
3. Calle de la Santísima
4. Calle Soledad
5. Calle Leona Vicario



**CRONOGRAMA CARTERA DE PROYECTOS 2019
A1 LA ANTIGUA MERCED**

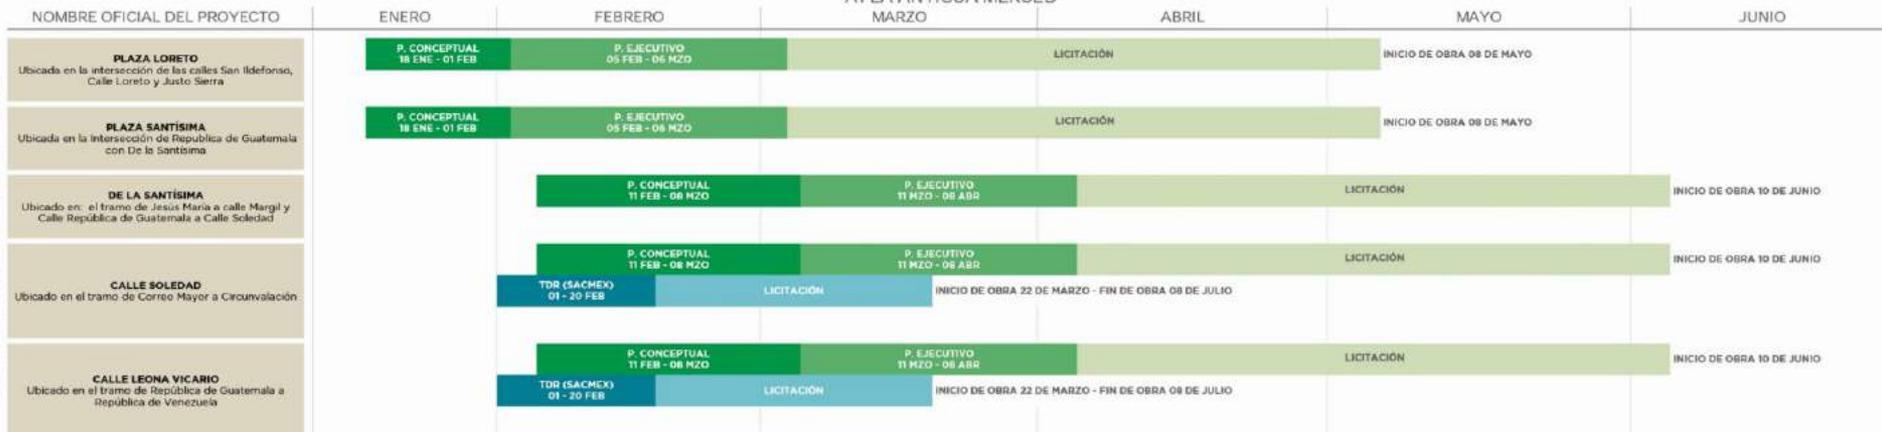

PLAZA LORETO

Ubicado en: Intersección de las calles San Ildefonso, Calle Loreto y Justo Sierra, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.



Plano de Localización

ACCIONES:

- Corrección de geometrías y cruces seguros (aplicación de criterios de accesibilidad).
- Reconfiguración vial (incorporación de señalización horizontal y vertical).
- Renovación y nivelación de pavimentos.
- Renovación de alumbrado público.
- Retiro de mobiliario urbano obsoleto.
- Poda y saneamiento.
- Definición de frentes vegetales e incorporación de sujetos arbóreos.



Falta de mantenimiento en pavimentos y áreas verdes.



Presencia de personas en situación de calle.



Establecimientos de masajes en el interior de la plaza.

Superficie de intervención:
5 Mil 522 m².

Monto de inversión:
11 millones 108 mil 880 pesos.

Población Beneficiada:
13 mil 484 personas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Plaza Loreto


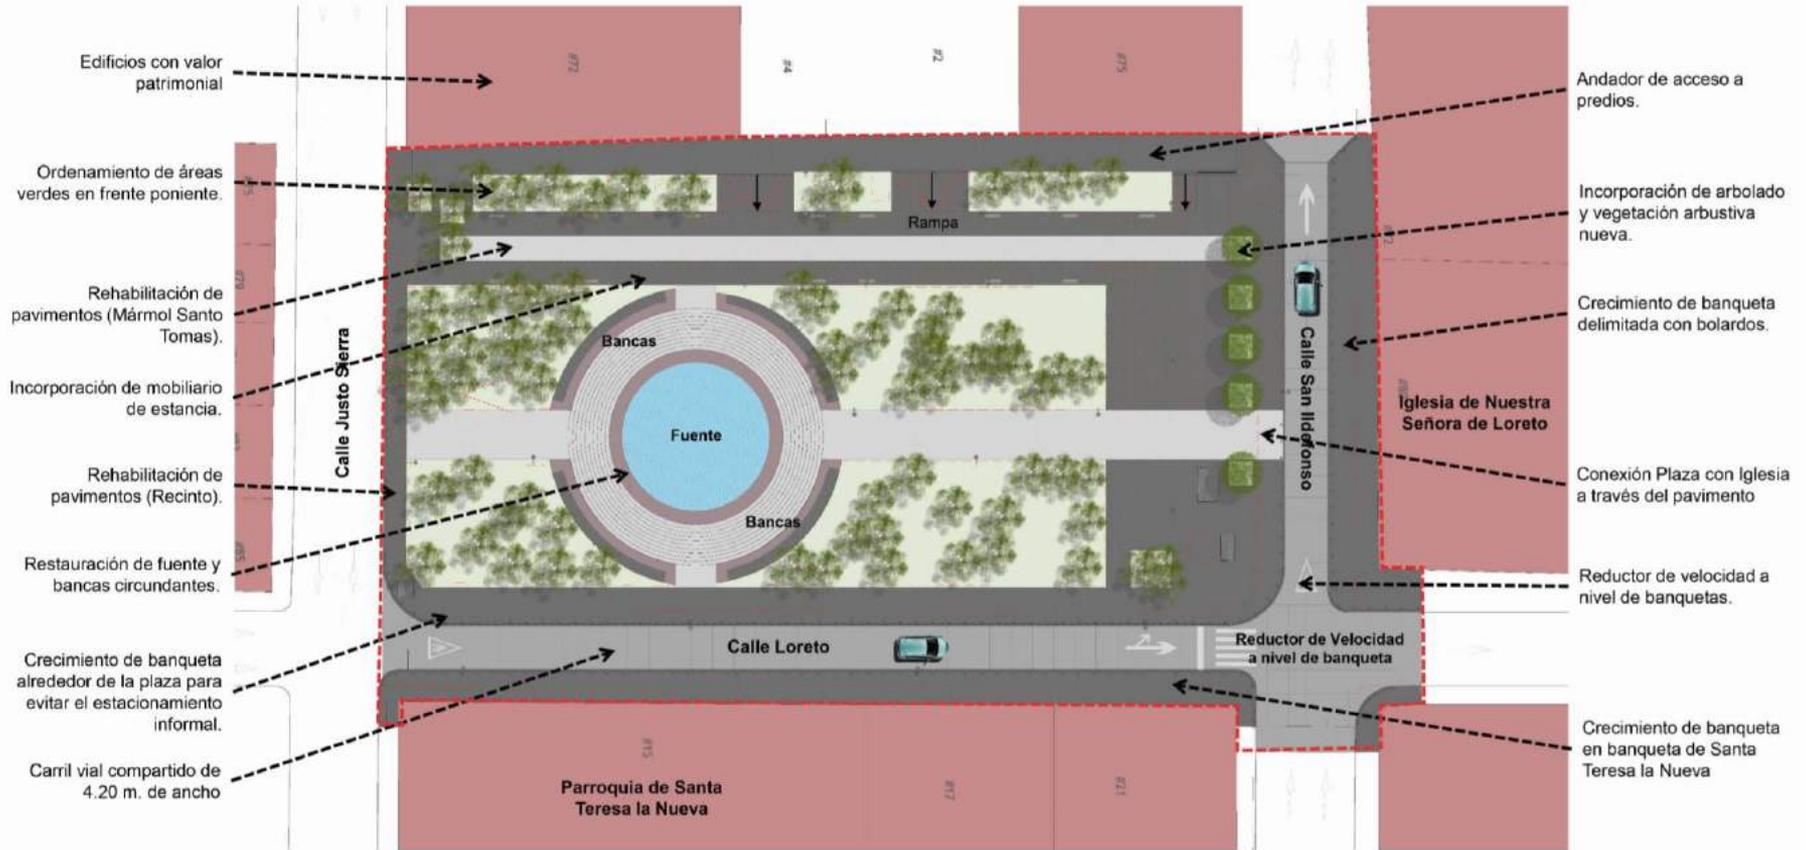


IMAGEN OBJETIVO



ESTADO ACTUAL

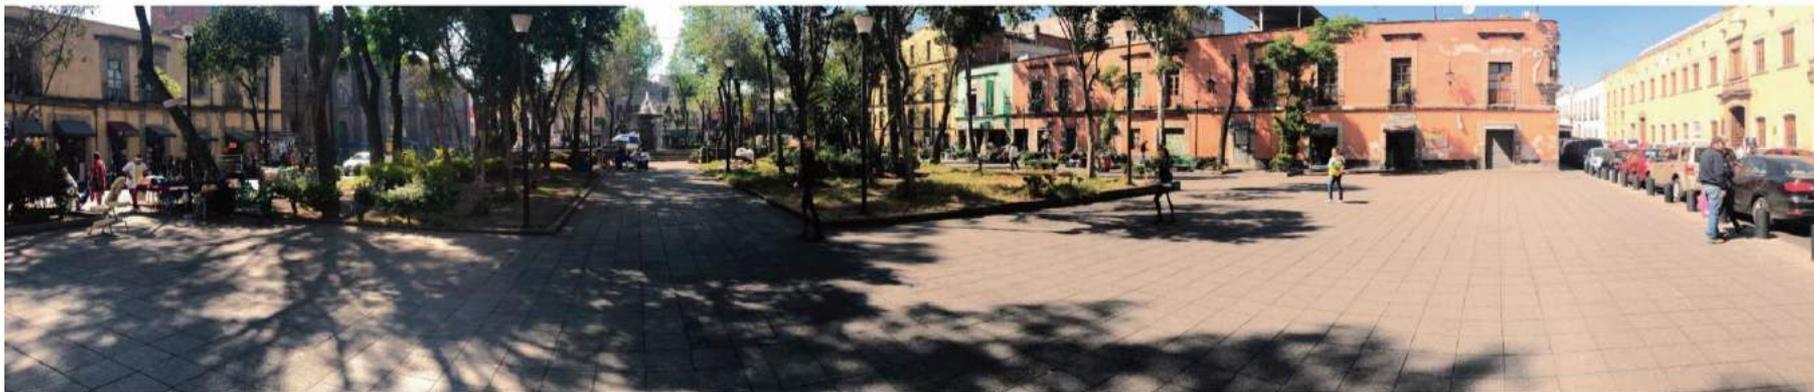

PROPUESTA



PLAZA DE LA SANTÍSIMA

Ubicada en: Intersección de Republica de Guatemala con De la Santísima, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.



Plano de Localización



Comercio ambulante en el frente de calle De la Santísima.



Comercio informal en el interior de la plaza.



Obstáculos en el paso peatonal.

ACCIONES:

- Corrección de geometrias (aplicación de criterios de accesibilidad).
- Reconfiguración vial (incorporación de señalización horizontal y vertical).
- Renovación y nivelación de pavimentos.
- Renovación de alumbrado público.
- Retiro de mobiliario urbano obsoleto.
- Poda y saneamiento.
- Definición de frentes vegetales e incorporación de sujetos arbóreos.

Superficie de intervención:
Mil 366 m².

Monto de inversión:
3 millones 589 mil 600 pesos.

Población Beneficiada:
13 mil 484 personas



Pavimentos en mal estado.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Plaza Santísima



SECCIÓN


Plaza Santísima. Fachada calle De la Santísima.

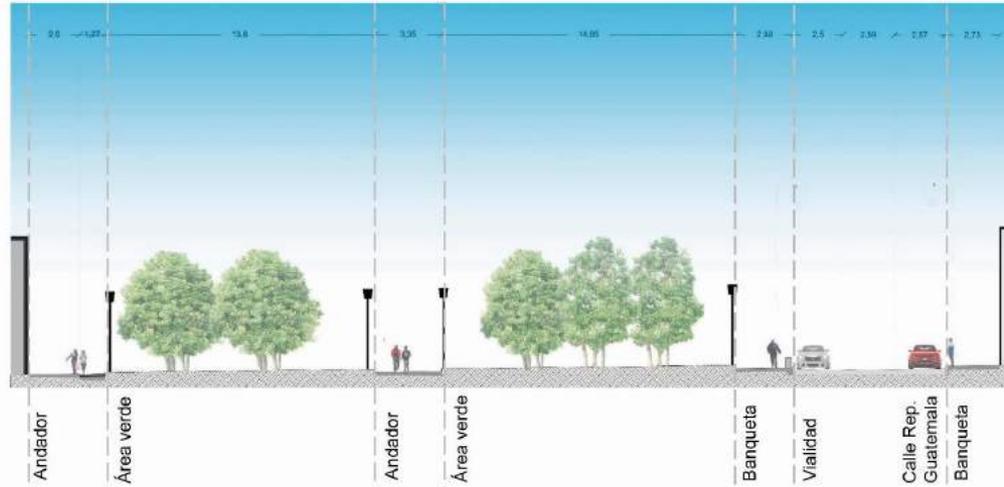

ESTADO ACTUAL

Incorporación de arbolado y vegetación arbustiva nueva.

Sustitución de pavimentos (Recinto).

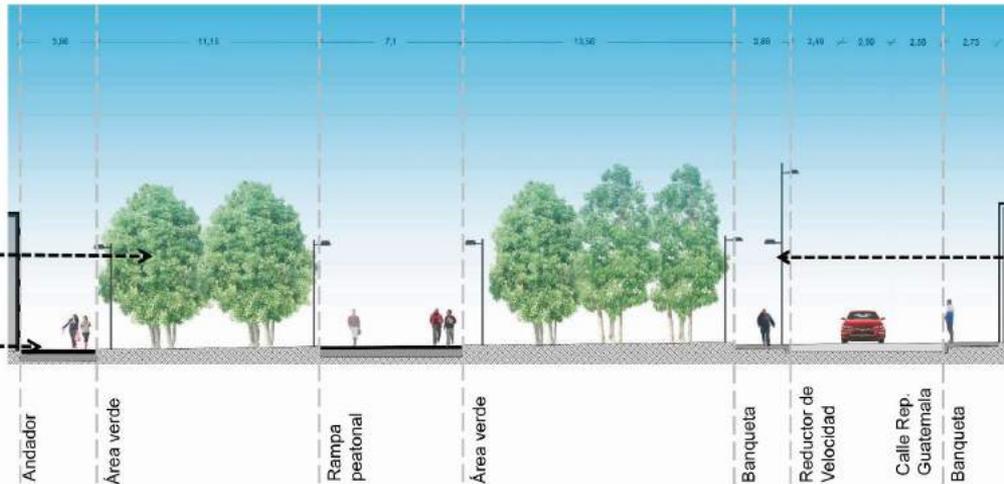

Renovación de alumbrado público.

PROPUESTA



DE LA SANTÍSIMA

Ubicado en: Plaza Santísima en el tramo de Calle Loreto a calle Margil y Calle República de Guatemala y Calle Soledad, Colonia Centro, C.P. 06000, Ciudad de México



Plano de Localización

ACCIONES:

- Corrección de geometrías (aplicación de criterios de accesibilidad).
- Renovación y nivelación de pavimentos.
- Renovación de alumbrado público.
- Retiro de mobiliario urbano obsoleto.
- Incorporación de sujetos arbóreos.
- Nueva infraestructura de agua potable y drenaje.



Espacios en deterioro por falta de mantenimiento..



Hundimientos diferenciales



Foro con pavimentos dañados



Pavimentos en mal estado

Superficie de intervención:
4 mil 532 m².

Monto de inversión:
12 millones 689 mil 600 pesos.

Población Beneficiada:
13 mil 484 personas



Gobierno de la
Ciudad de México

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

De la Santísima



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN


De la Santísima



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

IMAGEN OBJETIVO

De la Santísima

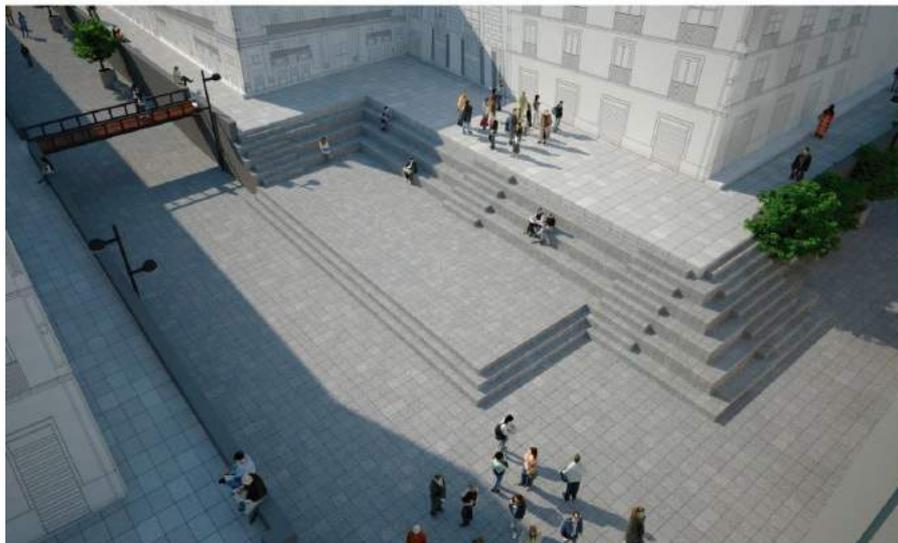

ESTADO ACTUAL



PROPUESTA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CALLE SOLEDAD

Ubicado en: Calle Soledad en el tramo de Correo Mayor a Circunvalación, Colonia Centro, C.P. 06000, Ciudad de México



Plano de Localización

ACCIONES:

- Corrección de geometrías (aplicación de criterios de accesibilidad).
- Renovación y nivelación de pavimentos.
- Renovación de alumbrado público.
- Retiro de mobiliario urbano obsoleto.
- Incorporación de sujetos arbóreos.
- Nueva infraestructura de agua potable y drenaje.



Cruces inseguros



Obstáculos en el paso peatonal



Falta de accesibilidad



Falta de señalización vertical y horizontal



Pavimentos en mal estado

Superficie de intervención:
7 mil 288 m².

Monto de inversión:
18 millones 062 mil 400 pesos.



Población Beneficiada:
13 mil 484 personas



Gobierno de la
Ciudad de México

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN


Calle Soledad

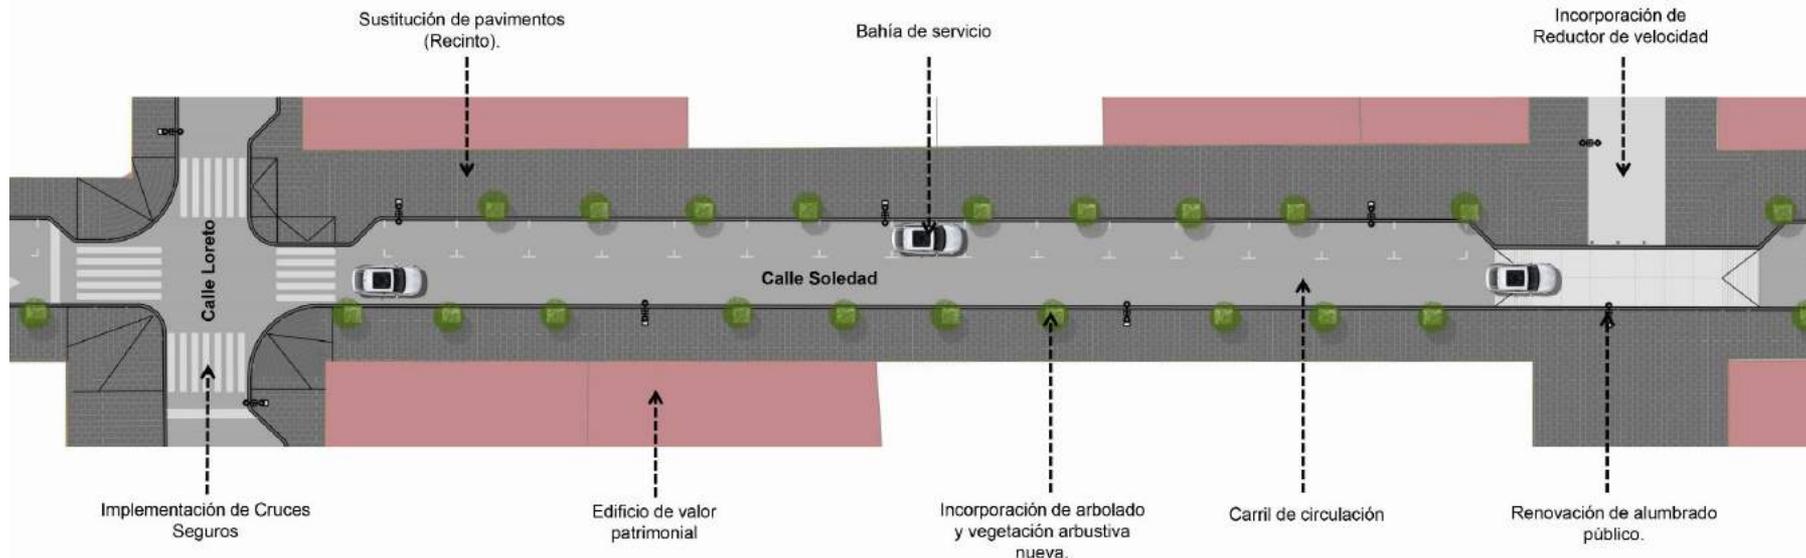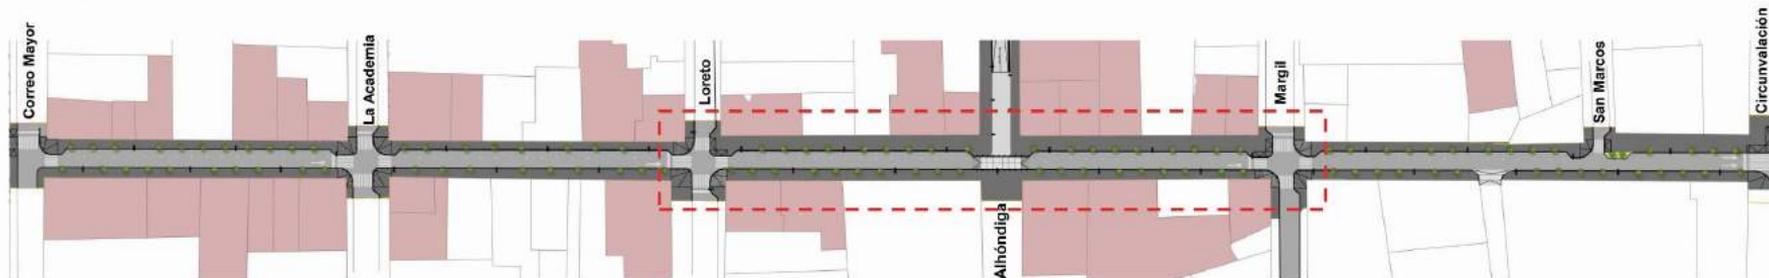


SECCIONES

Calle Soledad

Estado Actual

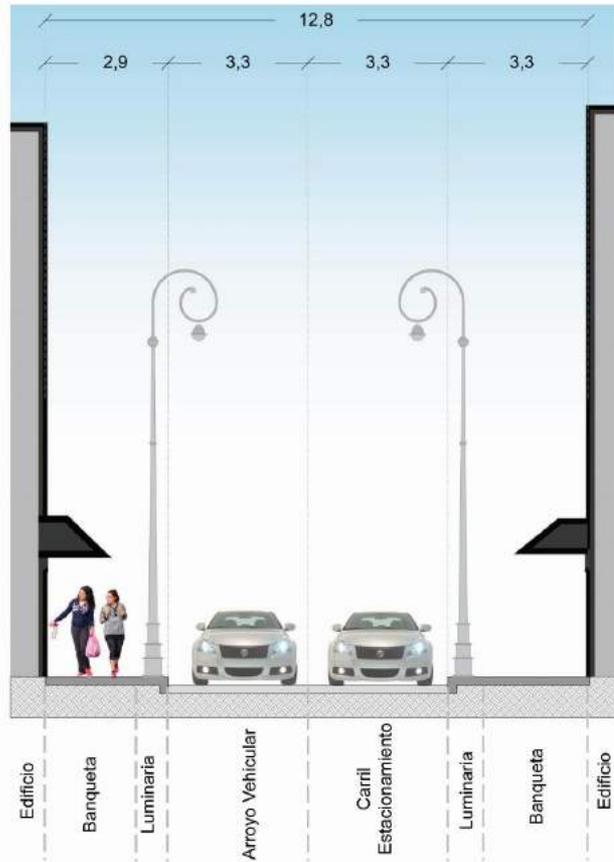

Propuesta

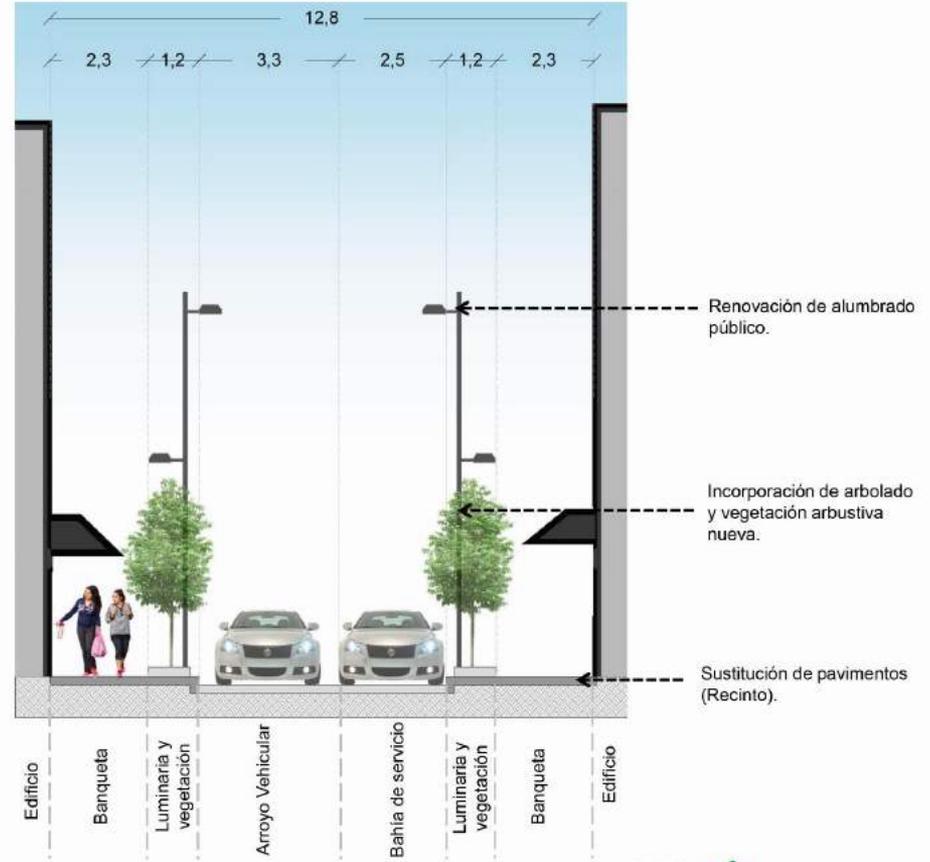

CALLE LEONA VICARIO

Ubicado en: Calle Leona Vicario en el tramo de República de Guatemala a República de Venezuela, Colonia Centro, C.P. 06020, Ciudad de México



Plano de Localización

ACCIONES:

- Corrección de geometrías (aplicación de criterios de accesibilidad).
- Renovación y nivelación de pavimentos.
- Renovación de alumbrado público.
- Retiro de mobiliario urbano obsoleto.
- Incorporación de sujetos arbóreos.
- Nueva infraestructura de agua potable y drenaje.



Obstáculos en paso peatonal



Banquetas no cumplen con dimensiones mínimas



Cruces inseguros



Pavimentos en mal estado

Superficie de intervención:
3 mil 182 m².

Monto de inversión:
8 millones 188 mil 800 pesos.



Población Beneficiada:
13 mil 484 personas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN


Calle Leona Vicario

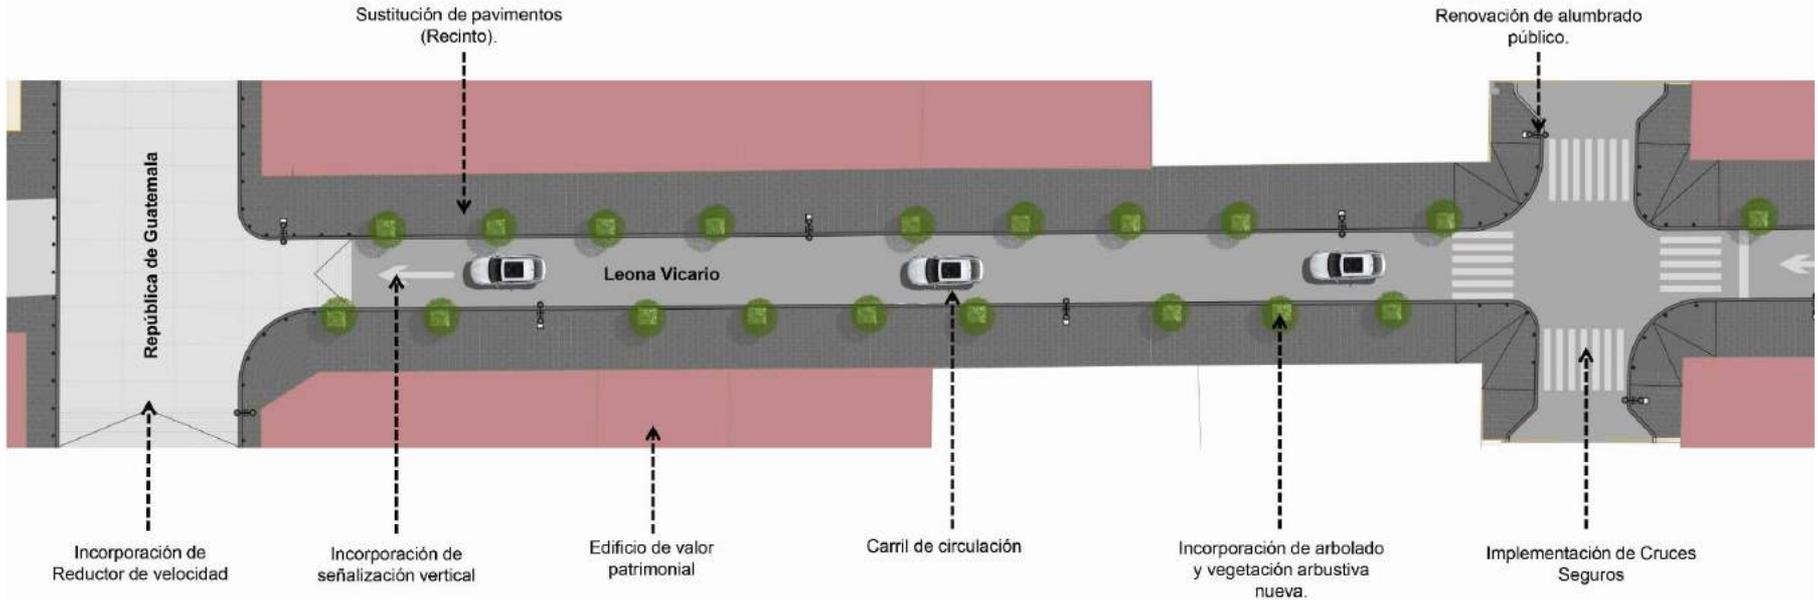


SECCIONES

Calle Leona Vicario

Estado Actual

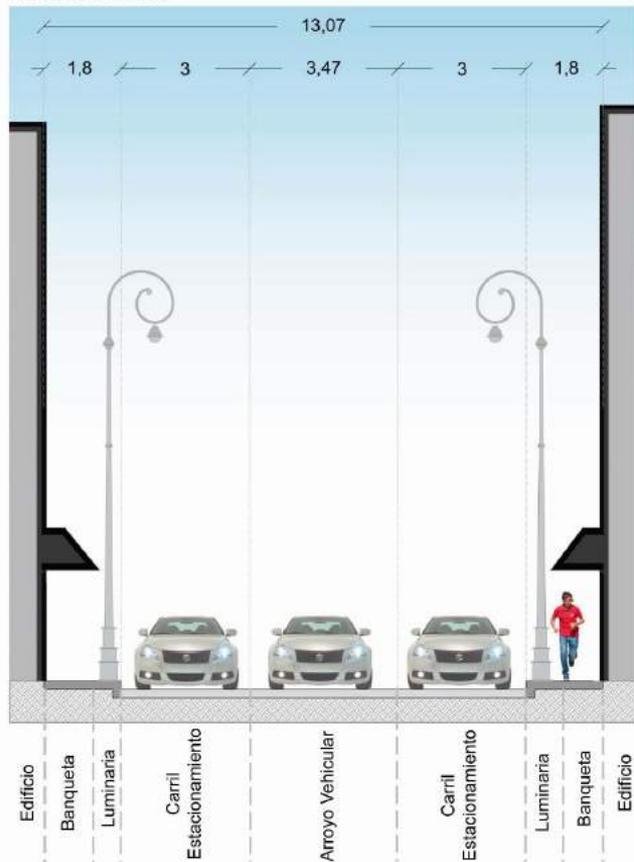

Propuesta

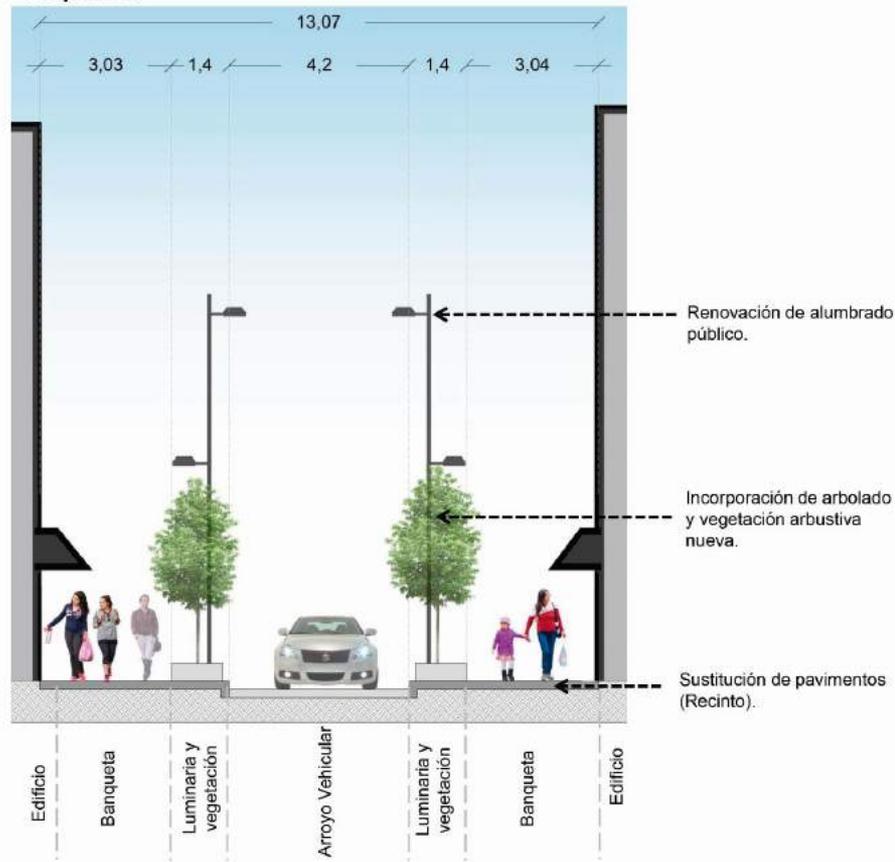



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Acuerdos

Transmisión en vivo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Asistencia

Transmisión en vivo



Gracias

Próxima sesión:
05 de marzo de 2019, a las 10:30 horas
