



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Inicio de la transmisión en vivo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

20 de agosto de 2019



Orden del día

- Reportes
- Turnos e incidencias urbanas
- Mesas de trabajo
- Asuntos generales
- Acuerdos
- Asistencia



ACH

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 12/08	Semana al 19/08	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Semanal	1,251 M3	1,102 m3	27 de Agosto
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Semanal	2,227 M3	2,195 m3	27 de Agosto
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Semanal	43	8	27 de Agosto



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Eliminación de grafiti

Calles atendidas: 34

Cortinas metálicas: 16

Fachadas: 114

M² totales: 736

***La mayoría son reincidencias**

226

M²

de cortinas



353

M²

de fachadas



157

M²

Retiro con gel





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

Eliminación de grafiti (inicio 22 de julio)

Calles intervenidas a la fecha

- Tacuba
- 5 de Mayo
- Madero
- 16 de Septiembre
- Palma

Calles iniciando proceso

- Isabel la católica
- República de Chile
- Motolinía

Se han atendido 93 fachadas

Se han desvanecido 374 m²



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en la acera de **Palacio Nacional** y en **la calle de San Ildefonso**.

Los trabajos realizados consistieron en **levantamiento de piezas sueltas y colocación nuevamente de 309 piezas de recinto** en la banqueta de Palacio Nacional, **colocación de bolardos** en San Ildefonso.





Alc. Cuauhtémoc

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 12/08	Semana al 20/08	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias en PB de Cuauhtémoc	Semanal	218	256	Se realizó la revisión a 474 luminarias. Se detalla la ubicación, el servicio y las observaciones en el Anexo 1
Poda	Número de sujetos forestales podados	Semanal	1	7	Se realizó la poda a 8 sujetos forestales. Se detalla la ubicación, el servicio y las observaciones en el Anexo 1

Alc. Cuauhtémoc

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 12/08	Semana al 20/08	Observaciones
Desazolve	Red de drenaje desazolvada en PB de Cuauhtémoc (m lineales)	Semanal	21	2	Se realizó el desazolve de 23 metros lineales de desazolve, 11 rejillas de piso, 12 coladeras de banquetta y 7 registros. Se detalla la ubicación, el servicio y las observaciones en el Anexo 1
Limpia (Colecta de sólidos)	Escuelas limpias y toque de campana	Semanal	260	254	Se recolectaron 514 m3 de residuos sólidos (40 m3 de residuos orgánicos y 474 m3 de inorgánicos)

Alc. Cuauhtémoc

Reporte de luminarias reparadas

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
DELICIAS # 58	LUIS MOYA	BUEN TONO	CENTRO VIII	10	
NACIONAL # 17	VIDAL ALCOCER	MANUEL DOBLADO	CENTRO II	14	
PLAZA DEL ESTUDIANTE	FLORIDA	APARTADO	CENTRO II	2	
FRAY SERVANDO	SAN PABLO	CJON DE SAN MIGUEL	CENTRO VI	8	
SANTO TOMAS	SAN PABLO	PTE DE SANTO TOMAS	CENTRO VII	8	
SANTO TOMAS	RAMON CORONA	MISIONEROS	CENTRO VII	32	
LUIS MOYA # 65	AYUNTAMIENTO	VICTORIA	CENTRO VIII	6	
PLAZA TOLSA	BALDERAS	ENRICO MARTINEZ	CENTRO VIII	32	
ENRICO MARTINEZ # 25	TOLSA	EMILIO DONDE	CENTRO VIII	24	
CJON MONTERO # 8	PERU	PLAZA GARIBALDI	CENTRO IV	9	
PLAZA SANTOS DEGOLLADO	MARROQUI	INDEPENDENCIA	CENTRO VIII	39	
SOLEDAD	JESUS.MA	CIRCUNVALACION	CENTRO VII	22	
J. J. HERRERA	MANUEL DOBLADO	VIDAL ALCOCER	CENTRO III	12	
			SUBTOTAL	218 LUMINARIAS	

Alc. Cuauhtémoc

Reporte de luminarias reparadas

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
PLAZA SAN JUAN	AYUNTAMIENTO	ERNESTO PUGIBET	CENTRO ALAMEDA	55	
CHIMALPOPOCA # 72	BOLIVAR	ISABEL LA CATOLICA	CENTRO CENTRO	24	
NEZAHUALCOYOTL	BOLIVAR	LAZARO CARDENAS	CENTRO CENTRO	16	
ARANDA	AYUNTAMIENTO	ARCOS DE BELEN	CENTRO ALAMEDA	13	
CALLEJON DE MONTERO # 8	PERU	PLAZA GARIBALDI	CENTRO NORTE	16	
CJON DEL HORMIGUERO # 12	SAN MIGUEL	ESCUELA MEDICO MILITAR	CENTRO MERCED	34	
MESONES	CORREO MAYOR	PINO SUAREZ	CENTRO MERCED	15	
PLAZA SANTOS DEGOLLADO	INDEPENDENCIA	MARROQUI	CENTRO ALAMEDA	56	
ENRICO MARTINEZ	CIUDADELA	MONUMENTO CAÑONES	CENTRO ALAMEDA	27	
			TOTAL	474 LUMIARIAS	

Alc. Cuauhtémoc

Reporte de podas

REPORTE DE PODAS REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
ALDACO # 8	MESONES	SALVADOR	CENTRO VII	1	
TOLSA # 62	FCO DE GARAY	BUCARELI	CENTRO ALAMEDA	1	
BERRIOZABAL # 28	VIDAL ALCOCER	MANUEL DOBLADO	CENTRO ORIENTE	3	
ENRICO MARTINEZ	GRAL PRIM	PLAZA CIUADAELA	CENTRO ALAMEDA	3	
			TOTAL	8 SUJETO FORESTAL PODADO	

Alc. Cuauhtémoc

Reporte de desazolve

REPORTE DE DESAZOLVES REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
ORGANO	REFORMA	ALLENDE	CENTRO I	6 MTS	
HUMBOLT # 34	ESQ	AV. JUAREZ	CENTRO VIII	4 MTS	
PALMA NORTE # 519	BELISARIO DOMINGUEZ	REP. DE CUBA	CENTRO IV	3 MTS	
REP. DE COLOMBIA # 96 INT 6-F	RODRIGUEZ PUEBLA	EL CARMEN	CENTRO II	6 MTS	
REP. COSTA RICA # 4	AZTECAS	FLORIDA	CENTRO I	2 MTS	
JESUS MA EXT-151	ESQ. SAN PABLO	PLAZA SAN PABLO	CENTRO MERCED	2 MTS	
			TOTAL	23 MTS SONDEADOS	



Alc. Venustiano Carranza

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 12/08	Semana al 19/08	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias en el PB de VC	Semanal	2	77	26 de Agosto	Se detalla la ubicación y la causa en el anexo
Tiraderos clandestinos	Número de calles y/o espacios públicos recuperados de tiraderos clandestinos de desechos sólidos en el PB de VC	Semanal	26 (492.8 m ³)	26 (462 m ³)	26 de Agosto	Se recolectaron 30 toneladas diariamente de Residuos Sólidos
Desazolve	Red de drenaje desazolvada en PB de VC (metros lineales)	Quincenal		750 ml	2 de Septiembre	



Reporte de luminarias reparadas

Alc. Venustiano Carranza

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
U.H. EMILIANO ZAPATA			U.H. EMILIANO ZAPATA	8	RECONEXIÓN DE LINEAS
EMILIANO ZAPATA	CONGRESO DE LA UNIÓN		10 DE MAYO	4	MANTENIMIENTO
EMILIANO ZAPATA	F.C. DE CINTURA		10 DE MAYO	2	RECONEXIÓN DE LINEAS
SAN ANTONIOTOMATLÁN NO. 139			10 DE MAYO	1	MANTENIMIENTO
EMILIANO ZAPATA	F. C. INTEROCEÁNICO		10 DE MAYO	1	MANTENIMIENTO
F. C. INTEROCEÁNICO	EMILIANO ZAPATA		10 DE MAYO	2	MANTENIMIENTO
ALBAÑILES	GRABADOS	SERICULTURA	VENUSTIANO CARRANZA	9	RECONEXIÓN DE LINEAS
ANFORA	ALBAÑILES	SAN ANTONIO TOMATLÁN	AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	50	RECONEXIÓN DE LINEAS
			TOTAL	77	

Alc. Venustiano Carranza


RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	2.5	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACUZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCO CER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCO CER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCO CER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.5	S-2
08	VIDAL ALCO CER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	2	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9

Reporte de tiraderos clandestinos

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.5	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.2	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.6	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9

Alc. Venustiano Carranza

Reporte de tiraderos clandestinos

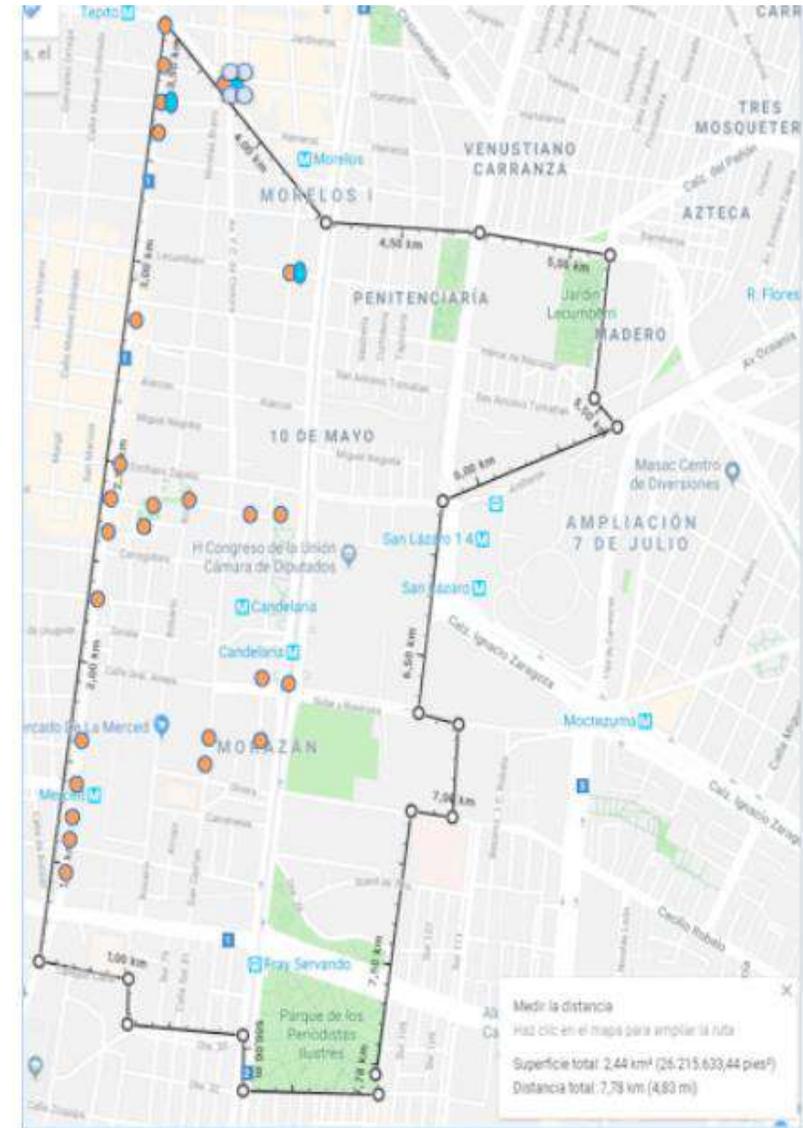

Montón Tradicional ●
 Recolección de cascajo ●
●

Dirección General de Agua Potable

SACMEX



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

AGUA POTABLE

Sustitución de redes de agua potable y drenaje en las Colonias Centro y Guerrero. Sustitución de tubería de 152 mm (6") de diámetro de agua potable y tuberías de 0.38 m de diámetro de polietileno de alta densidad, sobre la calle Soledad entre las calles de Correo Mayor y eje 1 Ote., Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.



Tubería Existente		572.00 m.	Avance Programa	100.00 %
Tubería Instalada		57200 m.	Avance Real	100.00%

DRENAJE

Sustitución de redes de agua potable y drenaje en las Colonias Centro y Guerrero. Sustitución de tubería de 152 mm (6") de diámetro de agua potable y tuberías de 0.38 m de diámetro de polietileno de alta densidad, sobre la calle Soledad entre las calles de Correo Mayor y eje 1 Ote., Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.




Tubería Existente		529.00 m.	Avance Programa	100.00 %
Tubería Instalada		529.00 m.	Avance Real	100.00%



AGUA POTABLE

Rehabilitación y/o Sustitución de redes de agua potable y drenaje en las Colonias Centro y Guerrero. Sustitución de tubería de 152 mm (6") de diámetro de agua potable y sustitución de tubería de 0.38 m y 0.45 m de diámetro de drenaje de polietileno de alta densidad, sobre la Calle de Leona Vicario entre las calles de Gral. Miguel Alemán y Soledad, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.



Tubería Existente



539.00 m.

Avance Programa 100.00%

Tubería Instalada



539.00 m.

Avance Real 100.00%

DRENAJE


Rehabilitación y/o Sustitución de redes de agua potable y drenaje en las Colonias Centro y Guerrero. Sustitución de tubería de 152 mm (6") de diámetro de agua potable y sustitución de tubería de 0.38 m y 0.45 m de diámetro de drenaje de polietileno de alta densidad, sobre la Calle de Leona Vicario entre las calles de Gral. Miguel Alemán y Soledad, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.



Tubería Existente		499.00 m.	Avance Programa	100.00%
Tubería Instalada		499.00 m.	Avance Real	100.00%

AGUA POTABLE

Sustitución de tubería de 305 mm. (12"), 152 mm. (6") y 101 mm. (4") de diámetro de agua potable y Sustitución de tuberías de 0.38, 0.45 y 0.61 m. de diámetro de drenaje de polietileno de alta densidad, sobre las calles Mina, Galeana, Riva Palacio y Violeta, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.



Avance Programa	77.87%	Tubería Existente		1108.00 m.
Avance Real	79.20%	Tubería Instalada		754.00 m.

DRENAJE

Sustitución de tubería de 305 mm. (12"), 152 mm. (6") y 101 mm. (4") de diámetro de agua potable y Sustitución de tuberías de 0.38, 0.45 y 0.61 m. de diámetro de drenaje de polietileno de alta densidad, sobre las calles Mina, Galeana, Riva Palacio y Violeta, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.



Avance Programa	77.87%	Tubería Existente		852.00 m.
Avance Real	79.20%	Tubería Instalada		595.00 m.




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AGUA POTABLE

Sustitución de tubería de 152 mm. (6") de diámetro de Agua Potable y Sustitución de tuberías de 0.38, 0.45 y 0.61 m. de diámetro de Drenaje de polietileno de alta densidad, sobre las calles Santa Veracruz, 2º y 3er. Callejón San Juan de Dios, Valerio Trujano, Plaza 2 de Abril, Andador Teatro Blanquita y Pensador Mexicano, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.



Avance Programa 95.59%

Avance Real 67.62%

Tubería Existente



1217.00 m.

Tubería Instalada



798.00 m.



DRENAJE

Sustitución de tubería de 152 mm. (6") de diámetro de agua potable y Sustitución de tuberías de 0.38, 0.45 y 0.61 m. de diámetro de drenaje de polietileno de alta densidad, sobre las calles Santa Veracruz, 2º y 3er. Callejón San Juan de Dios, Valerio Trujano, Plaza 2 de Abril, Andador Teatro Blanquita y Pensador Mexicano, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.



Avance Programa 95.59%

Avance Real 67.62%

Tubería Existente  1268.00 m.

Tubería Instalada  742.06 m.

P.D. Perforación direccional

E.C.A. Excavación a cielo abierto



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SACMEX

07 DE AGOSTO

Se procedió al desazolve del Mercado Lagunilla sobre el Eje 1 Norte, en 3er turno, de 200 m de atarjea de 0.30m de diámetro, 3 pozos de visita y 5 rejillas de piso extrayendo 0.50 m³ de azolve.



Mercado la Lagunilla

07 DE AGOSTO

Se procedió al desazolve del Mercado Abelardo L. Rodríguez, en 3er turno, de 220 m de atarjea de 0.30 m de diámetro, 4 pozos de visita y 5 rejillas de piso, extrayendo 0.75 m³ de azolve.



Mercado Abelardo L. Rodríguez



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SACMEX

09 DE AGOSTO

Atención a reporte de robo de medidor y fuga de agua. Se informó que ante el robo del medidor y la tubería del cuadro era necesaria una denuncia de hechos ante el Ministerio Público y presentar una copia de la misma a SACMEX para no generar cobro por la instalación.

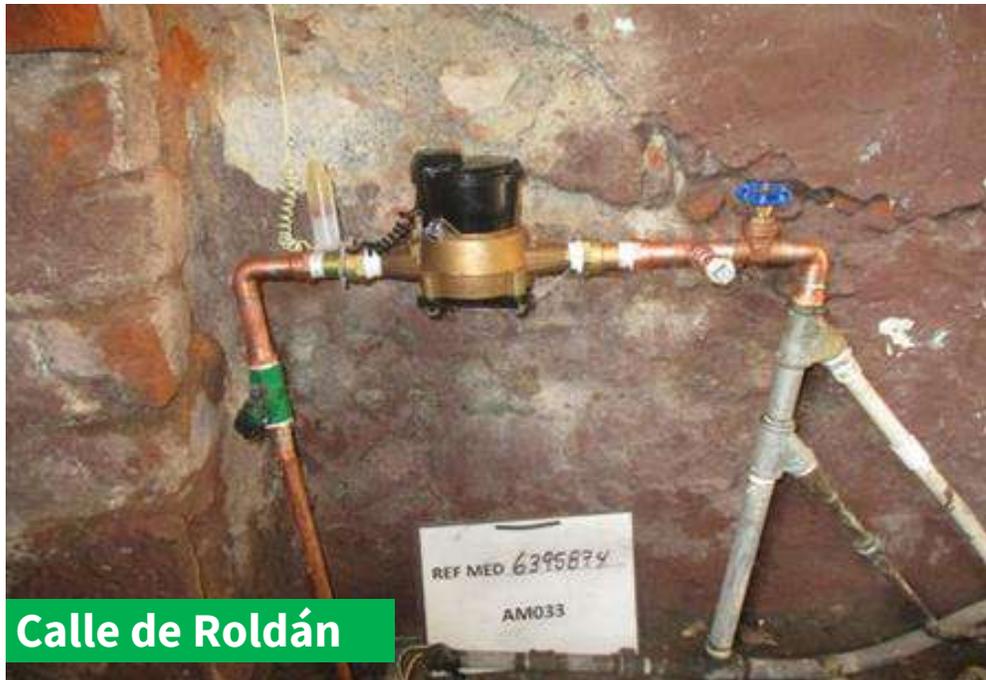

Calle de Roldán

11 DE AGOSTO

Atención a reporte de fuga de agua. Se encontró una fuga en la caja de válvulas en toma de una pulgada.



Academia esq. Moneda



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SACMEX

14 DE AGOSTO

Atención del reporte de falta de agua potable en las oficinas del SAT. Se realizó la verificación de la infraestructura: las válvulas se encontraban abiertas, se destapó el ramal y se observó una presión normal en la toma de 0.500 kg/cm². Para atender la falta de agua se apoyó con 7 pipas de 10,000lts cada una: 3 de la alcaldía Cuauhtémoc, 2 de la alcaldía Benito Juárez y 2 pipas rentadas para abastecer 3 cisternas. Se realizó visita el 16 de agosto para verificar el comportamiento del sistema, encontrándose en situación normal.

Oficinas del SAT

15 DE AGOSTO

Atención a reporte de tapas en mal estado. Reconstrucción de brocales de 4 tapas de agua potable.



Aranda esq. Vizcaínas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SOS-Alumbrado Público

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 12/08	Semana al 19/08	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del Perímetro A del CH PDLs	Semanal	132	90	26 de agosto
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del Perímetro B del CH PDLs	Semanal	10	70	26 de agosto

SOS-Alumbrado Público

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
República de Guatemala	República de Brasil	República de Argentina	Centro	10	Se restablece ITM	Circuito apagado
Plaza de la Constitución	20 de Noviembre	José María Pino Suárez	Centro	20	Se repara corto circuito en líneas de alimentación	Circuito apagado
Corregidora	Academia	Jesús María	Centro	15	Se cambia fotocelda	Circuito apagado
República de Colombia	Del Carmen	República de Argentina	Centro	15	Se restablece ITM	Circuito apagado
República de Perú	Eje Central	Montero	Centro	9	Se restablece ITM	Circuito apagado
Alameda Central	Av. Hidalgo	Av. Juárez	Centro	5	Se realiza conexión de líneas de alimentación	Luminarios apagados
Isabel la Católica	Regina	San Jerónimo	Centro	15	Se cambia fotocelda	Circuito apagado
Moneda	De la Santísima	Jesús María	Centro	1	Se cambia lámpara	Luminario apagado
			TOTAL	90		



SOS-Alumbrado Público

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO B

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
Eje 1 Norte	Zarco	Soto	Guerrero	55	Se realiza reprogramación de Timer	Circuito apagado
Ramón Corona	Circunvalación	Santo Tomás	Centro	15	Se realiza cambio de fotocelda	Luminarios apagados
			TOTAL	70		



SOS-DGOIV

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - PLAZA LORETO-JARDIN DEL OBISPO Y CALLE VALERIO TRUJANO

UBICACIÓN VIALIDAD Y TRAMO	CONCEPTO	UNIDAD	AVANCE REAL			AVANCE PROGRAMADO		META PROGRAMADA	
			EJECUTADO	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	CANTIDAD	%
TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL EN LA PLAZA LORETO; JARDIN OBISPO; ASI COMO LAS CALLE DE VALERIO TRUJANO EN EL TRAMO DE AVENIDA PASEO DE LA REFORMA A LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO	DEMOLICIONES	M3	1,091.06	1,091.06	39.22%	776.14	27.90%	2,781.86	100%
	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	M2	-	-	0.00%	-	0.00%	5,670.32	100%
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES	ML	-	-	0.00%	216.58	10.11%	2,142.26	100%
	COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	M2	-	-	0.00%	-	0.00%	6,045.18	100%



SOS-DGOIV

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - ANTIGUO BARRIO SAN PABLO ZOQUIAPAN									
UBICACIÓN VIALIDAD Y TRAMO	CONCEPTO	UNIDAD	AVANCE REAL			AVANCE PROGRAMADO		META PROGRAMADA	
			EJECUTADO	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	CANTIDAD	%
TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL DEL ANTIGUO BARRIO SAN PABLO ZOQUIAPAN, EN LAS CALLES: SOLEDAD EN EL TRAMO CORREO MAYOR A CIRCUNVALACIÓN: DE LA SANTISIMA, EN EL TRAMO CALLE LORETO A CALLE MARGIL Y CALLE REPÚBLICA DE GUATEMALA A CALLE SOLEDAD; Y DE LA CALLE LEONA VICARIO EN EL TRAMO DE REPÚBLICA DE GUATEMALA A REPÚBLICA DE VENEZUELA	DEMOLICIONES	M3	628.22	628.22	20.71%	758.22	25.00%	3,032.88	100%
	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	M2	-	-	0.00%	1,601.07	16.25%	9,852.72	100%
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES	ML	300.00	300.00	11.36%	660.00	25.00%	2,640.00	100%
	COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	M2	-	-	0.00%	2,212.21	25.00%	8,848.84	100%



SOS-DGOIV

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - CALLES DE GALEANA, SOLEDAD, PEDRO MORENO, FCO. JAVIER MINA, SANTÍSIMA, MARGIL Y LEONA VICARIO

UBICACIÓN VIALIDAD Y TRAMO	CONCEPTO	UNIDAD	AVANCE REAL			AVANCE PROGRAMADO		META PROGRAMADA	
			EJECUTADO	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	CANTIDAD	%
TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL DE LAS CALLES DE: GALEANA, EN LA CALLE DE PEDRO MORENO A LA CALLE DE SAN FRANCISCO JAVIER MINA CALLE RIVA PALACIO EN EL TRAMO DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA; CALLE RIVA PALACIO EN EL TRAMO DE LA CALLE PEDRO MORENO A LA CALLE DE FRANCISCO JAVIER MINA; CALLE VIOLETA EN EL TRAMO DE AVENIDA PASEO DE LA REFORMA A EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS	DEMOLICIONES CONCRETO SIMPLE	M3	422.52	422.52	83.70%	504.78	100.00%	504.78	100%
	DEMOLICIONES DE RECINTO, PRECOLADOS, ADOQUIN.	M3	259.76	259.76	47.91%	542.18	100.00%	542.18	100%
	DEMOLICIONES DE CONCRETO ASFALTICO	M3	136.13	136.13	13.00%	1,046.98	100.00%	1,046.98	100%
	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	M2	-	-	0.00%	-	0.00%	0.00	0%
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES	ML	210.00	210.00	8.31%	1,494.36	59.12%	2,527.59	100%



INVI

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 19/08	Próximo reporte
Proyectos de obra de vivienda	Porcentaje de avance por proyecto (línea base: 18 predios)	Mensual	<i>Por iniciar - 06</i>	
			<i>En proceso - 12 78.96%</i>	



INVI

No.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	STATUS DE OBRA	PERIMETRO A Y B	Julio	Agosto	Porcentaje de avance
1	2 DE ABRIL NO 42	GUERRERO	CUAUHTEMOC	OBRA EN PROCESO	A	42.20%	42.20%	0.00%
2	ACADEMIA NO.33	CENTRO	CUAUHTEMOC	OBRA EN PROCESO	A	48.46%	48.46%	0.00%
3	ARCOS DE BELEN NO 49	CENTRO	CUAUHTEMOC	OBRA EN PROCESO	B	72.00%	82.00%	10.00%
4	EJE 1 PONIENTE GUERRERO NO 164	GUERRERO	CUAUHTEMOC	OBRA EN PROCESO	B	86.92%	86.92%	0.00%
5	EJE 1 PONIENTE GUERRERO NO. 110	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	OBRA EN PROCESO	B	90.81%	90.81%	0.00%
6	MAGNOLIA NO. 12 (ANTES NO. 12 Y 16)	GUERRERO	CUAUHTEMOC	OBRA EN PROCESO	B	71.70%	73.80%	2.10%
7	REPUBLICA DE ARGENTINA NO. 58	CENTRO	CUAUHTEMOC	POR INICIAR	A	0.00%	0.00%	0.00%
8	REPUBLICA DE ARGENTINA NO. 87	CENTRO	CUAUHTEMOC	OBRA EN PROCESO	A	86.26%	86.56%	0.30%
9	REPUBLICA DE PERU NO. 40	CENTRO	CUAUHTEMOC	OBRA EN PROCESO	B	91.35%	92.65%	1.30%
10	ALLENDE NO. 46	CENTRO	CUAUHTEMOC	OBRA EN PROCESO	A	97.00%	98.05%	1.05%
11	LERDO NO. 12	GUERRERO	CUAUHTEMOC	POR INICIAR	B	0.00%	0.00%	0.00%
12	PEDRO MORENO NO. 134	GUERRERO	CUAUHTEMOC	POR INICIAR	B	0.00%	0.00%	0.00%
13	TALAVERA NO. 24	CENTRO	CUAUHTEMOC	POR INICIAR	A	0.00%	0.00%	0.00%
14	VIOLETA NO. 15	GUERRERO	CUAUHTEMOC	POR INICIAR	B	0.00%	0.00%	0.00%
15	PEDRO MORENO NO 156	GUERRERO	CUAUHTEMOC	POR INICIAR	B	0.00%	0.00%	0.00%
16	LECUMBERRI No 66	ZONA CENTRO	CUAUHTEMOC	OBRA EN PROCESO	B	100.00%	100.00%	0.00%
17	BELISARIO DOMINGUEZ NO. 78	CENTRO	CUAUHTEMOC	OBRA EN PROCESO	A	60.90%	60.90%	0.00%
18	NACIONAL NO. 57	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	OBRA EN PROCESO	B	84.98%	85.11%	0.13%



STC-METRO

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 18/08	Próximo reporte	Observaciones
Infraestructura	Número de escaleras electromecánicas con falla o algún problema (línea base: 75 escaleras en 29 estaciones)	Quincenal	7 escaleras detenidas	2 de septiembre	- 68 equipos están funcionando
Infraestructura	Número de elevadores en reparación (línea base: 19 elevadores en 29 estaciones)	Quincenal	No se reportaron fallas	2 de septiembre	- 19 equipos están funcionando



INAH

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 19/06	Próximo reporte	Observaciones
Obras e infraestructura	Trámites autorizados para obra en inmuebles del CH	Quincenal	08	03 de septiembre	
Obras e infraestructura	Trámites de solicitudes de autorización de obra en inmuebles del CH, ingresados en la Ventanilla Única	Quincenal	12	03 de septiembre	



INAH

Trámites autorizados para obra en inmuebles del CH del 1 al 16 de agosto de 2019

Ubicación	N°	Tipo de obra	Nombre del inmueble	Autorización
EMILIANO ZAPATA	57	REALIZACION DE CALAS	"ANTIGUA ACADEMIA DE SAN CARLOS"	359/19
5 DE FEBRERO	26	MANTENIMIENTO DE FACHADA		360/19
EJE CENTRAL LÁZARO CARDENAS	104	MANTENIMIENTO DE FACHADA		368/19
REPÚBLICA DE CUBA	23	REGULARIZACION DE OBRA		370/19
TACUBA	90	TRABAJOS PRELIMINARES		372/19
20 DE NOVIEMBRE	97	TRABAJOS PRELIMINARES		373/19
TACUBA	71	TRABAJOS PRELIMINARES		374/19
PLAZA DE LA CONSTITUCION	S/N	COLOCACION DE ESCULTURA	"CATEDRAL METROPOLITANA"	366/19

INAH

Trámites de solicitudes de autorización de obra en inmuebles del CH, ingresados en la Ventanilla Única del 1 al 16 de agosto de 2019

Fecha de ingreso	Ubicación	Nº	Tipo de Obras	Dictamen	Nombre del inmueble
01-ago-19	5 DE FEBRERO	41	MANTENIMIENTO	NO APROBADO 08-18-19	
06-ago-19	BUCARELI	118	RENIVELACION DE PATIO CENTRAL		
07-ago-19	REP BRASIL	53	PRORROGA DE LICENCIA		
08-ago-19	5 DE FEBRERO	35	MANTENIMIENTO FACHADA		
08-ago-19	RODRIGUEZ PUEBLA	25-A	MANTENIMIENTO		
12-ago-19	TACUBA	12	INSTALACION CANCELERIA		
12-ago-19	REP ARGENTINA	33	MANTENIMIENTO		
13-ago-19	REP URUGUAY	90	MANTENIMIENTO		
13-ago-19	BUCARELI	80	AMPLIACION Y REMODELACION		EDIFICIO GAONA
14-ago-19	RIVA PALACIO	51-7	CAMBIO DE TECHO		
15-ago-19	BELISARIO DOMINGUEZ	13-105	MANTENIMIENTO		
15-ago-19	BELISARIO DOMINGUEZ	13-202	PRORROGA DE LICENCIA		



PGJ

**Carpetas de investigación iniciadas del 1° de enero
al 12 de agosto de 2019**

Tipo de robo	Carpetas
Coladeras	2
Robo de herrería a domicilios y establecimientos	14
Estatuas	1
Cableado	3
Medidores de agua	27



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

INCIDENTES DE GRAFITI Y ROBO DE COLADERAS

Perímetros A y B

Período: 5 de diciembre de 2018 al 18 de agosto de 2019



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

C5

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

II. INCIDENTES POR PINTAS DE GRAFITI Y ROBO DE CABLE Y/O COLADERAS

Colonia	Pinta de Grafitis					Total	
	Diciembre 2018	1er trimestre 2019	2do trimestre 2019	Julio 2019	Agosto 2019	Incidentes	Proporción
Centro	3	15	8	8	3	37	67%
Doctores	0	2	3	1	1	7	13%
Penitenciaria	0	1	1	1	0	3	5%
Guerrero	0	1	1	0	0	2	4%
El Parque	1	0	0	0	0	1	2%
Juárez	0	1	0	0	0	1	2%
Morelos	0	1	0	0	0	1	2%
Obrera	1	0	0	0	0	1	2%
Tránsito	1	0	0	0	0	1	2%
Roma Norte	0	0	1	0	0	1	2%
Merced Balbuena	0	0	0	0	0	0	0%
Candelaria de los Patos	0	0	0	0	0	0	0%
Total	6	21	14	10	4	55	100%


En total se registraron 79 incidentes, 55 de ellos corresponden a pintas de grafiti, mientras que 24 corresponden a robo de coladeras.

Colonia	Robo de Cables o Coladeras					Total	
	Diciembre 2018	1er trimestre 2019	2do trimestre 2019	Julio 2019	Agosto 2019	Incidentes	Proporción
Centro	0	3	6	3	2	14	58%
Guerrero	0	1	2	0	1	4	17%
Doctores	2	1	0	0	0	3	13%
Merced Balbuena	0	0	1	0	0	1	4%
Penitenciaria	0	0	0	1	0	1	4%
Candelaria de los Patos	0	0	1	0	0	1	4%
El Parque	0	0	0	0	0	0	0%
Juárez	0	0	0	0	0	0	0%
Morelos	0	0	0	0	0	0	0%
Obrera	0	0	0	0	0	0	0%
Tránsito	0	0	0	0	0	0	0%
Roma Norte	0	0	0	0	0	0	0%
Total	2	5	10	4	3	24	100%

Destaca el caso de la colonia Centro en la cual se han suscitado más de 60% de los incidentes analizados.



II. INCIDENTES POR PINTAS DE GRAFITI Y ROBO DE CABLE Y/O COLADERAS

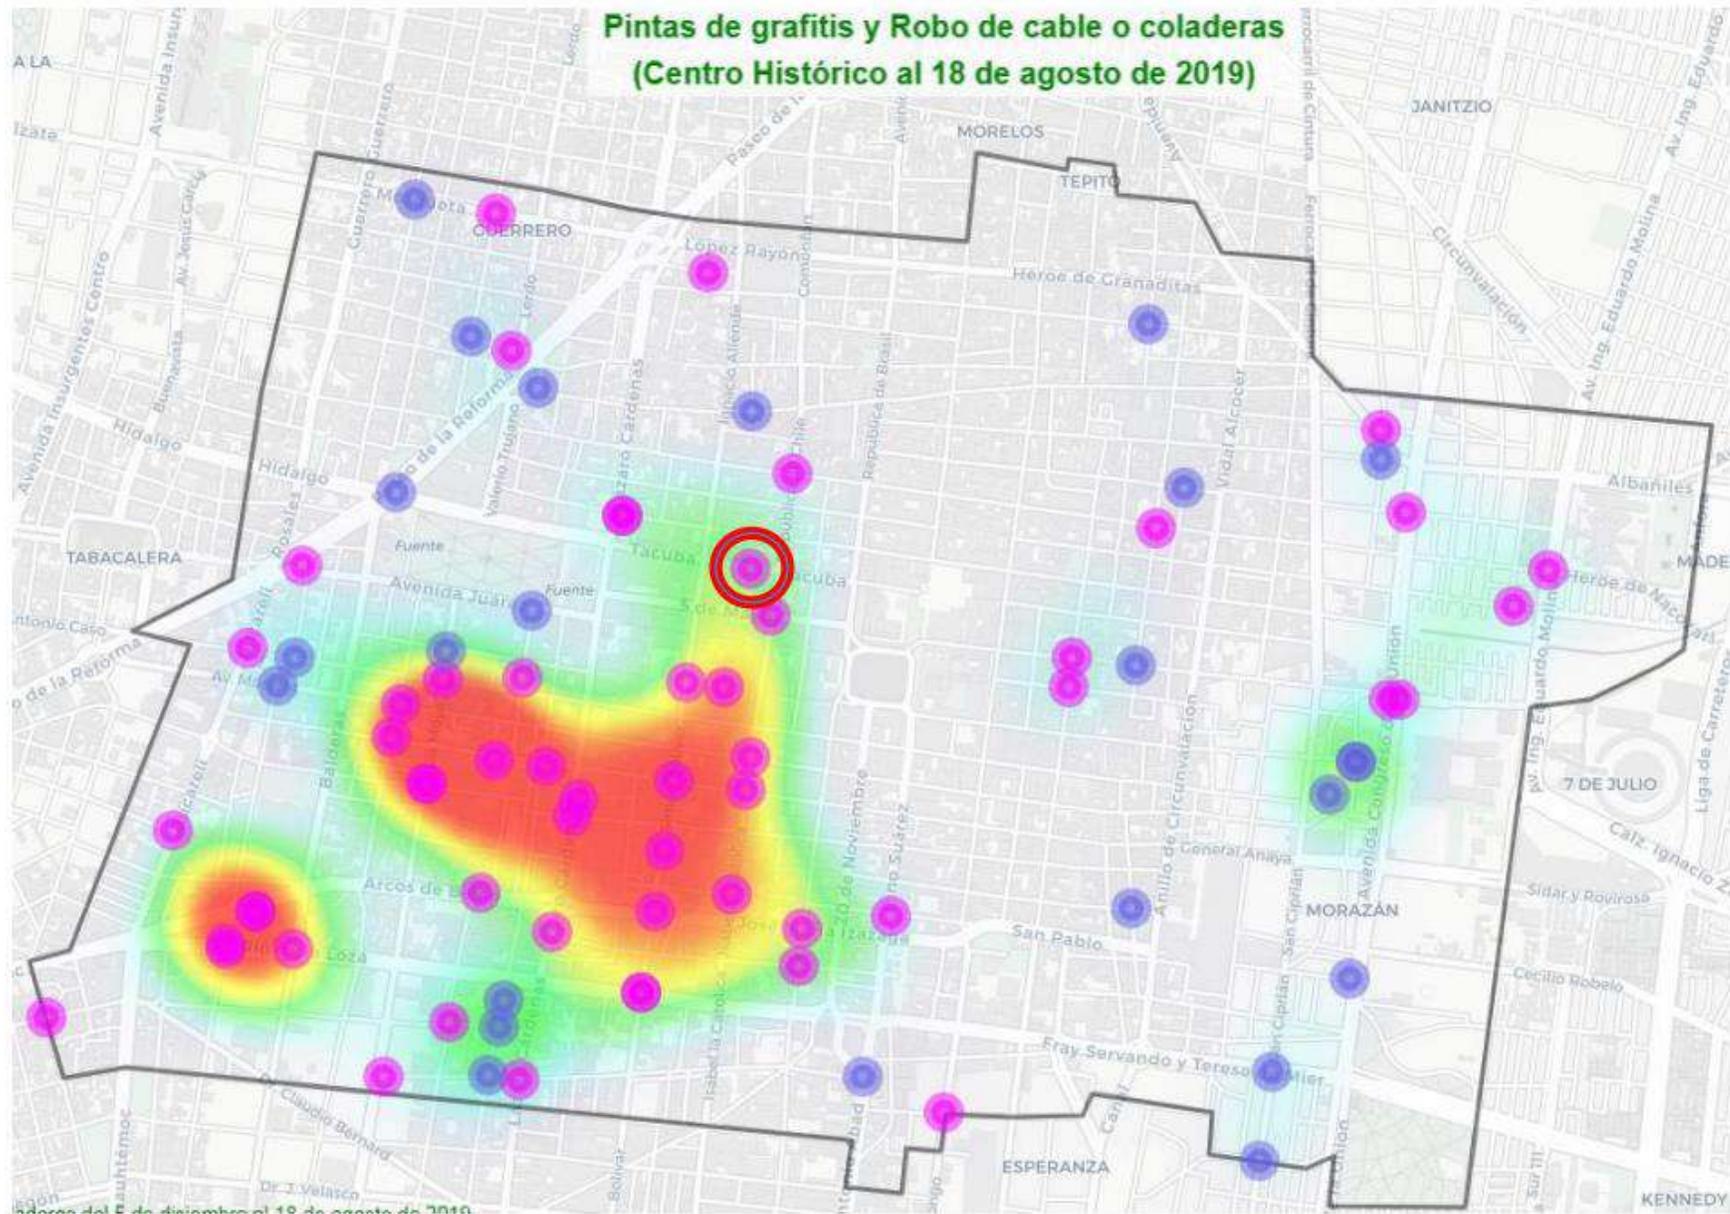

Incidentes por pintas de grafiti y robo de cable y/o coladeras de C5, del 5 de diciembre de 2018 al 18 de agosto de 2019.



- Perímetro A
- Perímetro B
- Robo de cable o coladera
- Pinta de grafiti



III. DISTRIBUCIÓN DE INCIDENTES POR TIPO DE ENTRADA Y DÍA DE LA SEMANA

Incidentes C5

HORA	BOTÓN DE AUXILIO	CÁMARA	LLAMADA DEL 911	RADIO
00:00		2	4	
01:00		3	6	
02:00		2	15	
03:00		3	5	
04:00		5	4	1
05:00		1	2	
06:00				
07:00		1	1	
08:00				
09:00				
10:00				
11:00			1	
12:00				
13:00		1	1	
14:00			1	
15:00			1	
16:00			3	
17:00			1	
18:00			1	
19:00				
20:00			2	
21:00	1		1	
22:00			3	1
23:00		3	3	
Total	1	21	55	2

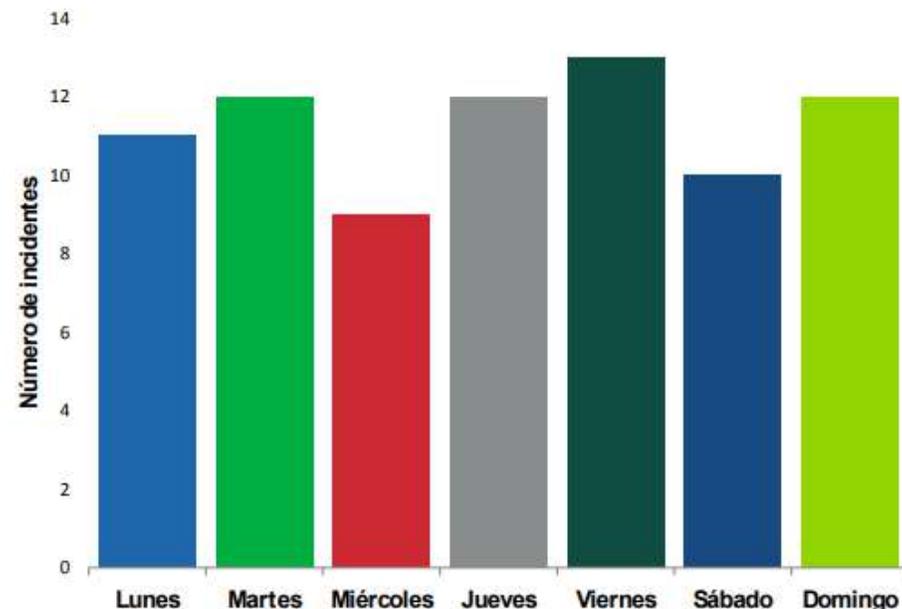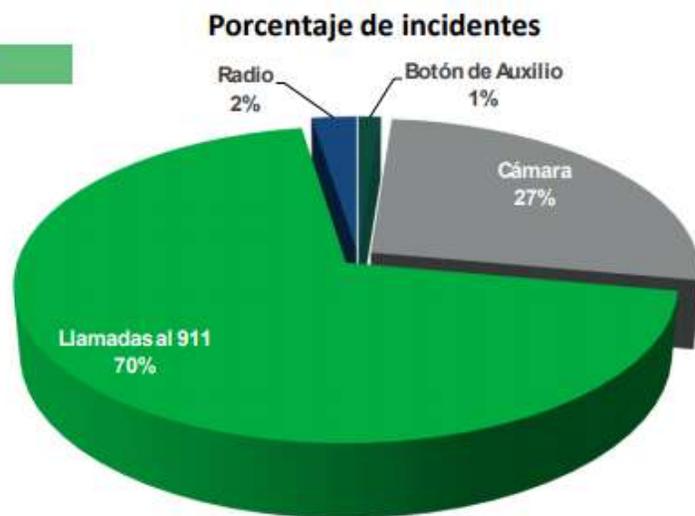

Los incidentes analizados fueron registrados con mayor frecuencia los días **martes, jueves, viernes y domingo**.

El día **miércoles** muestra una menor frecuencia en comparación con el resto de los días.

Incidentes por pintas de grafiti y robo de cable y/o coladeras de C5, del 5 de diciembre de 2018 al 18 de agosto de 2019.



Blindar el
CENTRO HISTÓRICO
en la madrugada

Carpeta Informativa
SSC-C5-PGJ-ACH



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




CENTRO
HISTÓRICO

CIUDAD **INNOVADORA**
Y DE **DERECHOS**

AREA DE ATENCIÓN PRIORITARIA

CALLES ATENDIDAS TRAMO

1.- 20 de Noviembre	De San Antonio Abad a República de El Salvador
2.- San Jerónimo	De Pino Suárez a Bolívar
3.- Regina	De Pino Suárez a Aldaco
4.- Tacuba	De Monte de Piedad a Filomeno Mata
5.- 5 de Mayo	De Monte de Piedad a Eje Central
6.- Isabel la Católica	De Izazaga a Tacuba
7.- República de Chile	De Tacuba a República de Honduras
8.- Av. Juárez	De Balderas a Eje Central
9.- Eje Central	De Madero a Tacuba
10.- Madero	De Eje Central a Monte de Piedad
11.- Cto. Plaza de la Constitución	Todo el Circuito
12.- Donceles	De Eje Central a Palma
13.- Allende	De Tacuba a República del Perú
14.- Independencia	De Dolores a Luis Moya
15.- Bolívar	De Izazaga a Tacuba
16.- Av. Hidalgo	De 2 de Abril a Eje Central
17.- Flamencos	De 20 de Noviembre a San Antonio Abad
18.- Mesones	De Pino Suárez a Eje Central
19.- Jesús María	De San Pablo a Corregidora
20.- Belisario Domínguez	De Eje Central a República de Brasil
21.- República de El Salvador	De Pino Suárez a Eje Central
22.- Santísima	De Soledad a República de Guatemala
23.- Pino Suárez	De Plaza de la Constitución a José María Izazaga
24.- Motolinía	De 16 de Septiembre a Tacuba
25.- Palma	De Venustiano Carranza a Belisario Domínguez
26.- 16 de Septiembre	De Eje Central a Monte de Piedad
27.- 5 de Febrero	De 16 de Septiembre a José María Izazaga
28.- Venustiano Carranza	De Eje Central a Monte de Piedad
29.- República de Uruguay	De Eje Central a Monte de Piedad
30.- Gante	De Venustiano Carranza a Madero
31.- Callejón de Mesones	De Regina a Mesones
32.- San Ildefonso	De República de Argentina a El Carmen
33.- Aldaco	De Vizcaínas a República de El Salvador

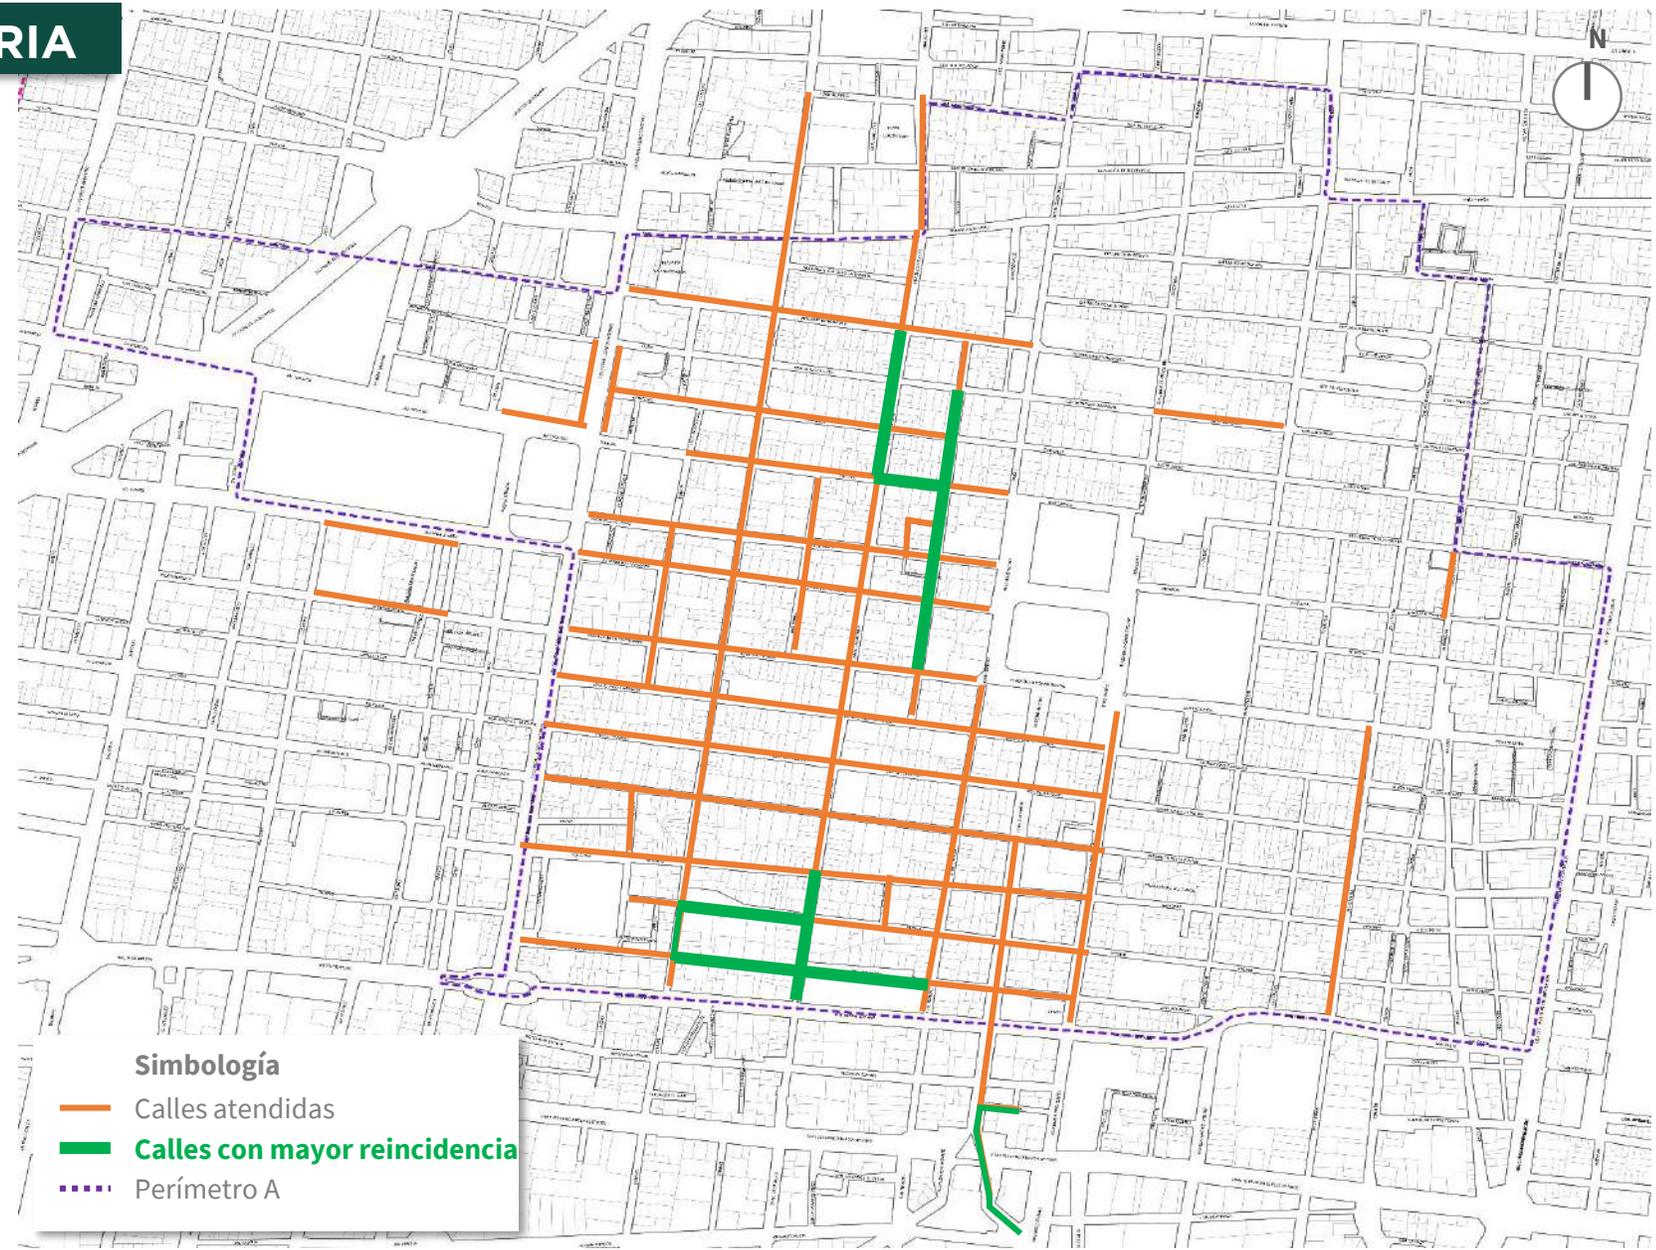

Simbología

- Calles atendidas
- Calles con mayor reincidencia
- - - Perímetro A



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO




CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

Blindar el Centro Histórico en la Madrugada

Objetivo

- Inhibir y castigar el daño al patrimonio, declarado por la UNESCO, registrado de las 24:00 a 5:00 horas, lapso con menor actividad en el Centro Histórico

Dependencias y Roles

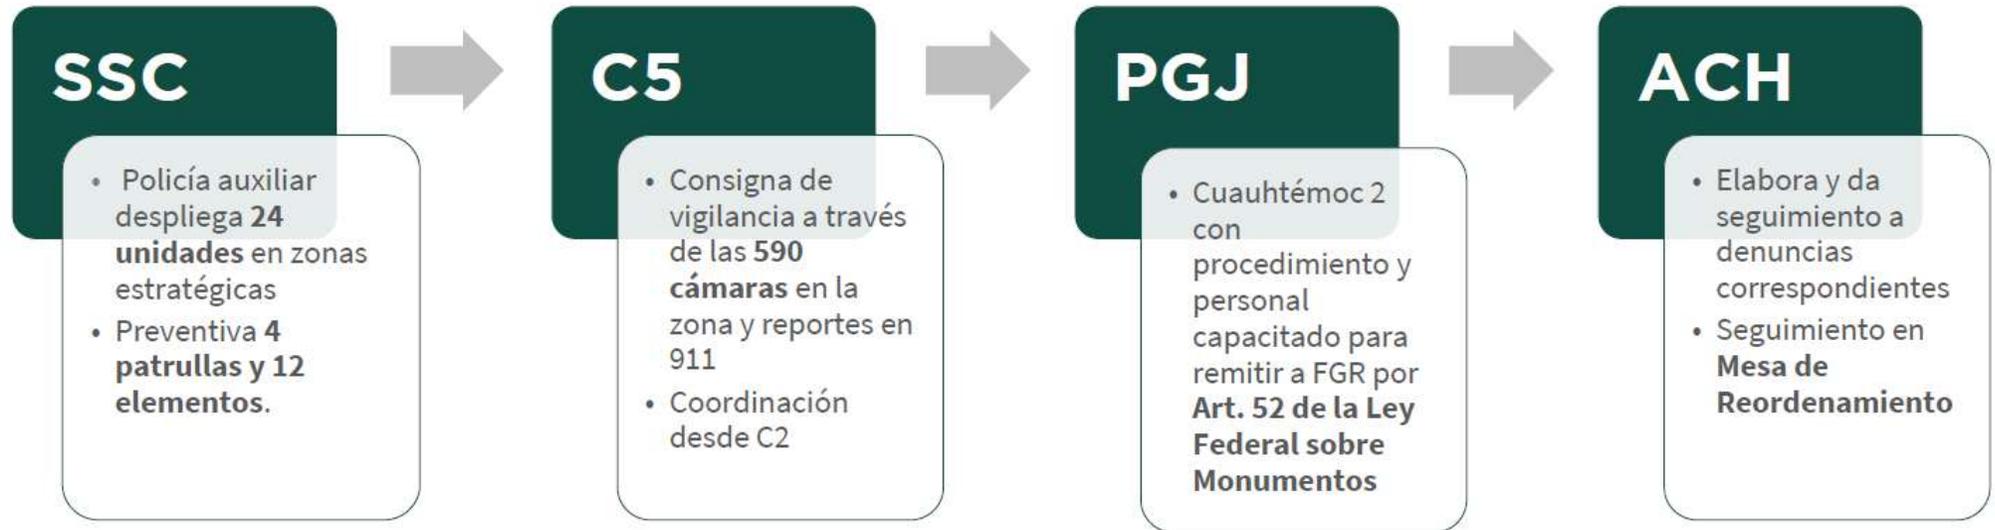



Subsecretaría de Control de Tránsito

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Del 6 al 19 de agosto	Próximo reporte
Semáforos (162)	Número de semáforos con mantenimiento preventivo	Quincenal	28	3 de septiembre
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo		69	
Cámaras (10)	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		7	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo		5	



SSC-SCT-DSOT


MANTENIMIENTO

CORRECTIVO

APAGADO	6
CABLE DE COMUNICACIÓN	1
CINTILANTE	29
CLOSTER DAÑADO	1
CORTO	5
DESCONECTADO	7
DESINSTALACION	1
DESORIENTADO	1
FOCO FUNDIDO	3
INSTALACION	5
MEMORIA DAÑADA	2
OBRA CIVIL	1
PEGADO	2
TARJETA DAÑADA	2
VISERA ROTA	3

PREVENTIVO

TOTAL	97
-------	----

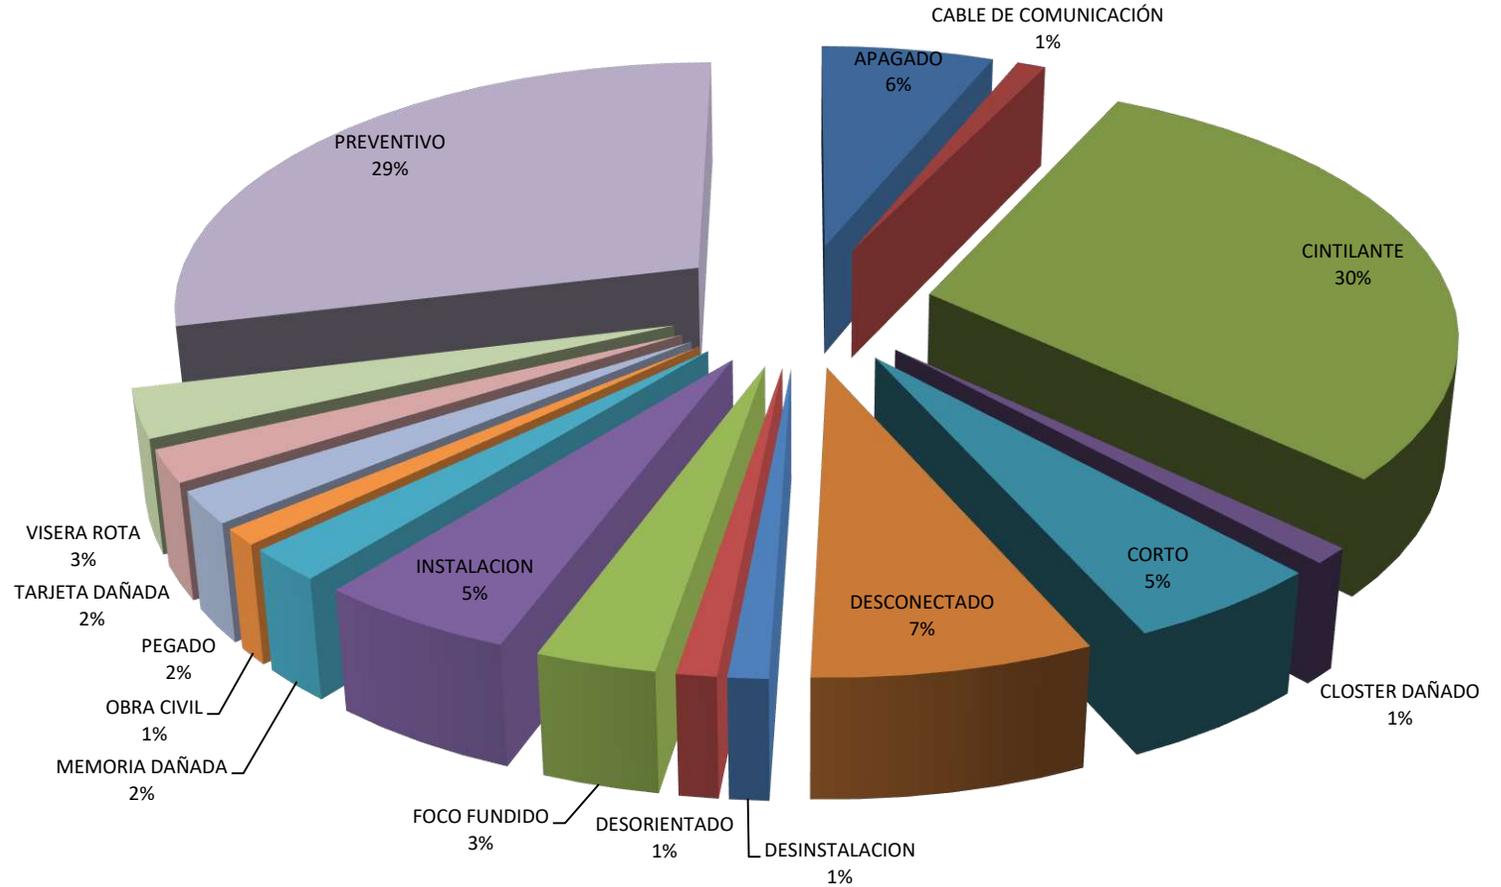



SSC-SCT-DSOT


CORRECTIVOS

CORTO	2
SISTEMA SPRIT	3

PREVENTIVOS

	1
TOTAL	6

MANTENIMIENTO DE CAMARAS TRANSITO

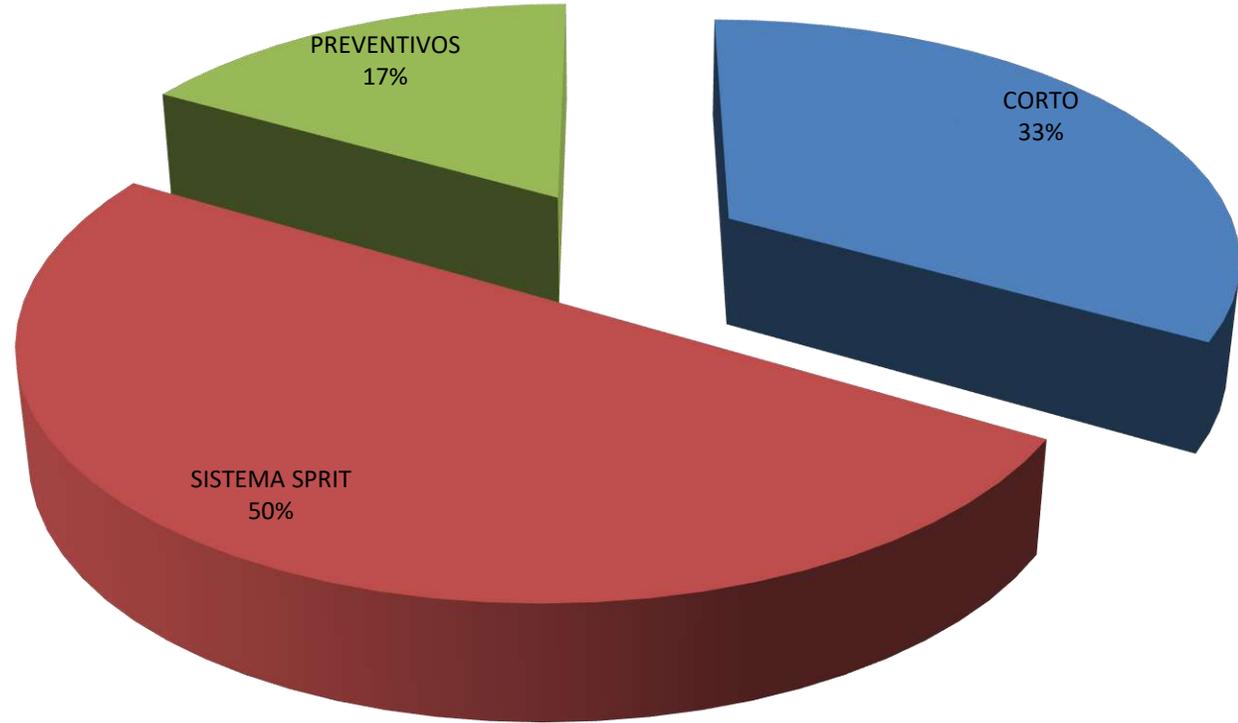



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Acuerdos

Continuamos transmitiendo en vivo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Asistencia

Continuamos transmitiendo en vivo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Próxima sesión

3 de Septiembre de 2019, a las 10:30 horas
